Municipalidad de Guastatoya, Departamento de El Progreso

DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION

LIBRO DE ACTAS DE INICIO DE OBRAS Nº 0083

ACTA NUMERO VEINTICUATRO GUIÓN DOS MIL VEINTIUNO (24-2021).

En Colonia Los Angeles, Barrio Minerva, Guastatoya, Departamento de El Progreso, siendo las ocho de la mañana del día viernes uno de octubre del año dos mil veintiuno, Estando presentes los señores: Lic. Jorge Antonio Orellana Pinto, Alcalde Municipal, Señor Tulio Rafael Pellecer Aldana, Gerente Municipal, Señor Alvaro Antonio Orellana Orellana, Sindico Primero Municipal, Edgar Aníbal Chávez Palencia, Director Municipal de Planificación, Diego Antonio Cifuentes Mazariegos, propietario de la empresa: "MEGA-CONSTRUCCIONES EN INGENIERIA CIVIL Y TERRESTRE" y la Licda. Elena Ermely Calderón Fajardo, Secretaria Municipal, que deja constancia de lo siguiente: **PRIMERO:** Que en la presente fecha la empresa: MEGA-CONSTRUCCIONES EN INGENIERIA CIVIL Y TERRESTRE dio inicio al proyecto: MEJORAMIENTO CALLE 2 CON ADOQUIN, COLONIA LOS ANGELES, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO **SEGUNDO:** El proyecto en mención, se financiará con fondos de inversión de la municipalidad de Guastatoya. **TERCERO:** Leída la presente, se acepta y en constancia firmamos dando fe de lo anterior, treinta minutos después de su inicio. ----------

Lic. Jorge Antonio Orellana Pinto
Alcalde Municipal

Tulio Rafael Pellecer Aldana
Gerente Municipal

Alvaro Antonio Orellana Orellana
Síndico Primero

Alvaro Antonio Orellana Orellana
SINDICO I
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

MEGA-CONSTRUCCIONES
EN INGENIERIA CIVIL Y TERRESTRE
Tel: 41980189

Edgar Aníbal Chávez Palencia
Director Municipal de Planificación

DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION

Diego Antonio Cifuentes Mazariegos
MEGA-ONSTRUCCIONES EN INGENIERIA CIVIL Y TERRESTRE

Licda. Elena Ermely Calderón
Secretaria Municipal

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

ALCALDE

CONTRATO DE EJECUCION DE PROYECTOS TREINTA Y CUATRO GUION DOS MIL VEINTIUNO (34-2021)

MEJORAMIENTO CALLE 2 CON ADOQUIN, COLONIA LOS ANGELES, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

NOG. 15327159

En el Municipio de Guastatoya, del departamento de El Progreso, el día **VEINTIOCHO (28) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO (2021)**. **NOSOTROS:** Por una parte comparezco Yo, **JORGE ANTONIO ORELLANA PINTO,** de cincuenta años de edad, casado, guatemalteco, Licenciado en Administración de Empresas, domiciliado en el departamento de El Progreso, me identifico con el documento personal de identificación –DPI-, Código Único de Identificación –CUI-, dos mil quinientos setenta espacio cincuenta y tres mil novecientos sesenta y cuatro espacio cero dos cero uno, (2570 53964 0201), extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala; DE LA CALIDAD CON QUE ACTUO. Actúo en calidad de **Alcalde Municipal,** de la ciudad de Guastatoya, del departamento de El Progreso, calidad que acredito, con la certificación del acta de toma de posesión, dos guion dos mil veinte (2-2020), de fecha quince de enero de dos mil veinte, contenida en el libro número dos mil seiscientos cuarenta y siete (2647), de sesiones extraordinarias del Concejo Municipal, debidamente autorizado por la Contraloría General de Cuentas, y el Acuerdo número cero cero uno guión dos mil diecinueve (001-2019), de la Junta Electoral Departamental de El Progreso, con el número de **CUENTADANCIA Te tres guion dos guion uno (T3-2-1);** y por la otra parte comparezco Yo, **DIEGO ANTONIO CIFUENTES MAZARIEGOS,** de veintinueve años de edad, soltero, guatemalteco, Técnico en Administración de Empresas, Domiciliado en el Departamento de San Marcos, me identifico con el Documento Personal de Identificación (DPI), Código Único de Identificación, dos mil ciento setenta y uno espacio treinta y tres mil quinientos noventa y dos espacio mil doscientos uno (2171 33592 1201), extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, actúo en calidad de Propietaria de la Empresa Mercantil denominada **MEGA-CONSTRUCCIONES EN INGENIERIA CIVIL Y TERRESTRE,** Empresa debidamente registrada en el Registro Mercantil de la República, Guatemala, Patente de Comercio número de registro ochocientos dos mil novecientos nueve (802909), folio novecientos sesenta (960), libro mil diecisiete (1017), de Empresas Mercantiles, número de expediente cincuenta mil ciento treinta y dos guion dos mil dieciocho (50132-2018), categoría única; con dirección del propietario novena (9ª) calle, catorce guion sesenta y siete (14-67) zona tres (3), San Marcos, San Marcos, con número de Identificación Tributaria ochenta y tres millones cuatrocientos cuarenta y siete mil quinientos cincuenta y cinco (83447555), con Registro de actualización del Registro General de Adquisiciones del Estado Expediente 202060385 RGAE-2021 Resolución 202172815, constancia 202173404, con vigencia hasta el diez de marzo de dos mil veintitrés, con el cual hace constar la capacidad económica y las especialidades de la empresa referida, ambas constancias emitidas por el Registro General de Adquisiciones del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas. Ambos comparecientes manifestamos encontrarnos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles y que las representaciones que acreditamos son suficientes de conformidad con la ley y a nuestro juicio para celebrar el presente contrato, toda la documentación indicada se tiene a la vista y en lo sucesivo simplemente se denominará LA MUNICIPALIDAD y "EL CONSTRUCTOR", sujetándonos a las cláusulas siguientes.

PRIMERA: El Licenciado **JORGE ANTONIO ORELLANA PINTO**, Alcalde Municipal, manifiesto que actúo en representación de la Municipalidad de Guastatoya del departamento de El Progreso, y expongo que de

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

ALCALDE

conformidad con el Punto Resolutivo emitido por el Honorable Concejo Municipal, contenido en el Acuerdo del Despacho Municipal **114-2021, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno,** del libro de Acuerdos de la Alcaldía Municipal, debidamente autorizado por la Contraloría General de Cuentas, en la cual la Autoridad Superior aprueba la adjudicación realizada por la Junta de Cotización, para la ejecución del proyecto denominado **MEJORAMIENTO CALLE 2 CON ADOQUIN, COLONIA LOS ANGELES, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO,** de conformidad con las bases técnicas, especificaciones generales y planos presentados. El presente contrato se suscribe con fundamento en los artículos 9, numeral 6) literal b), artículo 47, 49, del a Ley de Contrataciones del Estado y sus Reformas y Artículo 42 del Reglamento de la misma ley, 53 literal I del Decreto 12-2002 Código Municipal y sus reformas; se tienen incorporados al instrumento contractual el proceso establecido en la Ley de Contrataciones del Estado, la oferta presentada por el constructor y la adjudicación correspondiente.

SEGUNDA: El Constructor se compromete a ejecutar para la Municipalidad de Guastatoya, el proyecto **MEJORAMIENTO CALLE 2 CON ADOQUIN, COLONIA LOS ANGELES, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO,** obra que se encuentra en el sector urbano, de este municipio el que se ejecutará de conformidad con el presupuesto presentado por la Empresa Constructora.

Renglón No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario (Q)	Precio Total (Q)
1	TRAZO Y ESTAQUEADO	ML	166.00	11.00	1,826.00
2	CORTE NIVELACION Y NIVELACION A NIVEL DE SUB RASANTE EXISTENTE	M2	871.00	38.00	33,098.00
3	COLOCACION + COMPACTACION DE BASE GRANULAR DE ESPESOR DE 0.10 MTS.	M2	812.00	60.00	48,720.00
4	COLOCACION DE ADOQUIN TRAFICO LIVIANO	M2	812.00	280.00	227,360.00
5	CAMA DE ARENA DE ASIENTO	M2	812.00	10.00	8,120.00
6	LLAVES DE COFINAMIENTO	ML	168.00	155.00	26,040.00
7	BORDILLO PREFABRICADO	ML	279.00	190.00	53,010.00
9	LIMPIEZA FINAL	UNIDAD	1	1,326.00	1,326.00
				TOTAL	**399,500.00**

El tiempo de entrega de la obra es de **CUATRO (4) MESES CALENDARIO,** de conformidad con el cronograma de ejecución presentado por el constructor, el plazo referido se computará a partir de la aprobación del contrato a la fecha de aprobación de la liquidación del mismo.

TERCERA: EL CONSTRUCTOR: Por su parte manifiesta que respecto a la ejecución del proyecto reitera que se compromete a lo siguiente: a) entregar totalmente terminada la obra a satisfacción de la Municipalidad de Guastatoya. b) a contratar un Profesional quien será el Supervisor de Proyectos Residente, quien conjuntamente con el Ingeniero Supervisor de la Municipalidad informarán en forma simultánea a la Autoridad Administrativa, al Concejo Municipal y a la Contraloría General de Cuentas de la Nación cuando lo requiera, de

los avances físicos del proyecto y las estimaciones de pago, para el efecto deberán presentar las fotocopias de la bitácora del Proyecto, autorizada por la Contraloría General de Cuentas.

CUARTA: El señor Alcalde Municipal en representación de la Municipalidad de Guastatoya, manifiesta que está de acuerdo en las condiciones del constructor, especialmente en lo que respecta al total del proyecto; así como en el tiempo de entregar la obra, ambos de común acuerdo llegaron a establecer la forma de pago de la manera siguiente:

QUINTA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato pactado entre la Municipalidad y la Empresa **MEGA-CONSTRUCCIONES EN INGENIERIA CIVIL Y TERRESTRE,** asciende a la cantidad de **TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS QUETZALES (Q. 399,500.00), incluido el impuesto al valor agregado –IVA-,** los que se pagarán con fondos de –INVERSION- de conformidad con la constancia de disponibilidad presupuestaria emitida por el Encargado del Presupuesto, de conformidad con la estructura presupuestaria 23-00-001-000-24, RENGLON # 331, FUENTE DE FINANCIAMIENTO 42-0161-0001. Los pagos se efectuarán de conformidad con el artículo 58 de la Ley de Contrataciones del Estado, de la manera siguiente: a). Un anticipo del veinte por ciento (20%) equivalente a la cantidad de SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS QUETZALES (Q. 79,900.00), el que se entregará previo a cumplir con los siguientes requisitos: **I).** Otorgar a la Municipalidad **PLAN DE INVERSIÓN, FIANZA DE ANTICIPO, FIANZA DE CUMPLIMIENTO,** las cuales garantizarán la correcta aplicación del mismo con fundamento en Artículos 64, 65, 66, de la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas y los artículos 53, 54, 55, 56, 58 Y 59 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y, **II).** Los **PAGOS SIGUIENTES**, ***se efectuarán de conformidad con las estimaciones de pago de conformidad con el artículo 59 de la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas, en el cual la Municipalidad de Guastatoya, hará los pagos contra las estimaciones periódicas de trabajo ejecutado y aceptado, las que podrán efectuarse mensualmente, trabajos debidamente comprobados, con los informes presentados por el Supervisor del Proyecto Residente juntamente con el Supervisor de Proyectos de la Municipalidad de Guastatoya***. **III).** El último pago equivalente al 100% de avance físico del proyecto, presentando para el efecto, **GARANTIA DE CONSERVACION DE OBRA, CALIDAD O FUNCIONAMIENTO, FIANZA DE SALDOS DEUDORES, ACTA DE RECEPCIÓN DEL PROYECTO POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD E INFORME FINAL DE LOS SUPERVISORES PROFESIONALES DEL PROYECTO.**

SEXTA: SANCIONES: El constructor se compromete a entregar los trabajos conforme el contrato suscrito. Y en caso de atraso por parte del Constructor en la entrega de los trabajos, se determinará el atraso en la entrega de la obra con base en las fechas de terminación, parciales o total, fijadas en el programa de ejecución convenido, debiendo aplicarse las multas sin perjuicio de la facultad que tiene la entidad contratante para exigir el cumplimiento del contrato para rescindirlo. Para efecto de la multa, se tomará en cuenta solo la parte proporcional del atraso, por lo que su aplicación no debe afectar la parte del cumplimiento parcial. Se sancionará con el pago de una multa que se aplique al contratista entre el uno al cinco por millar del monto de los trabajos, que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente, por cada día de atraso en que incurra el contratista desde la fecha de terminación pactada hasta la total conclusión de los mismos, en ningún caso podrán ser superiores en su conjunto al monto de la garantía de cumplimiento. Asimismo, el Constructor deberá cumplir con los trabajos estipulados en el presente contrato y la Municipalidad no concederá ningún plazo de prórroga

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
ALCALDE

a excepción de los siguientes casos: a). si se trata de órdenes de trabajo extra u otros convenios, b). Indicar claramente el plazo improrrogable que se le otorgue al constructor para el trabajo correspondiente y deberá solicitarlo dentro del plazo que indica el Artículo 43, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas.

En relación a lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas, el atraso de la entrega de la obra, por causa imputable al contratista será sancionado del 1 al 5 por millar del monto de las obras que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente, calculando a partir de las fechas pactadas de la entrega parcial o total con respecto a la ejecución convenida con la entidad contratante. Dicha multa solamente se tomará de la parte proporcional del atraso, sin afectar el cumplimiento parcial.

Tasa de cálculo	Días
1o/oo	1 a 20
2o/oo	21 a 30
3o/oo	31 a 60
4o/oo	61 a 120
5o/oo	121 hasta su cumplimiento

La entidad ejecutora será la que emita las sanciones correspondientes.

SEPTIMA: OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR: El constructor se obliga a presentar informes periódicos, cronograma de ejecución de la obra, bitácora de los trabajos de conformidad con el Artículo 37 inciso a). del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, deben de autorizar los libros en la Dirección de Infraestructura Pública de la Contraloría General de Cuentas, así como permitir en cualquier momento que las personas autorizadas por la Municipalidad supervisen las actividades que se desarrollan, asimismo instruirá a su personal para que se le preste la debida colaboración a las personas que supervisan y que son parte de esta Municipalidad, el Constructor deberá de revisar cuidadosamente los documentos contractuales y señalará cualquier omisión o error, contradicción o incongruencia que observe a este respecto, deberá formular la consulta y observación del caso antes de los quince días de ejecutar el proyecto, el constructor previamente a la adquisición de materiales deberá proporcionar a la Municipalidad cuando esto lo requiere muestras de materiales para analizarlos y aprobarlos. El Constructor queda facultado para retirar de la obra a cualquier trabajador que considere incompetente, negligente insubordinado o perjudicial a la buena marcha de dichos trabajos. El constructor deberá de aprobar las herramientas, materiales, mano de obra, transporte y demás elementos necesarios.

OCTAVA: CLAUSULA RELATIVA AL COHECHO: Yo el Contratista, bajo juramento de Ley, manifiesto que conozco las penas relativas al delito de cohecho así como las disposiciones contenida en el Capítulo III del Título XIII del Decreto 17-73 del Congreso de la República, Código Penal. Adicionalmente, conozco las normas jurídicas que facultan a la Autoridad Superior de la entidad afectada para aplicar las sanciones administrativas que pudieren corresponderme, incluyendo la inhabilitación en el sistema GUATECOMPRAS".

NOVENA: OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD: a) La Municipalidad se obliga a efectuar el pago en tiempo y en formas convenidas, b). Faccionar el acta de inicio y avances físicos y actas de recepción para realizar la liquidación final de los trabajos a ejecutar y prestar la colaboración necesaria para el constructor para

realizar los mismos, c). Designar a la persona o Personas que supervisen los trabajos del proyecto citado anteriormente previa inspección final.

DECIMA: OTRAS OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR: a). Se compromete a sostener el precio de la oferta, b). Entregar la obra en el tiempo y lugar indicado, c). Ejecutar la obra con material de buena calidad y garantizados de conformidad con lo que estipula la ley de contrataciones del estado, d). Contratar mano de obra necesaria y suficiente para la realización del proyecto, y se compromete a obtener en este municipio el cual será calificado por el constructor, e). Es responsable por el trabajo ejecutado por las personas que contrate así como de los daños y perjuicios que causen a terceras personas como consecuencia de la realización de la obra contratada. f). De conformidad con el artículo 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, se podrá ampliar el monto del contrato, previo que sean aprobadas las ordenes de cambio, ordenes de trabajo suplementario o acuerdo de trabajo extra, y se suscribirá un contrato adicional de conformidad con el contenido relativo a la Ley de la materia.

DECIMA PRIMERA: FIANZAS: 1. El constructor se obliga a presentar:

1. **FIANZA DE SOSTENIMIENTO DE OFERTA** no menor del uno por ciento (1%) ni mayor del cinco por ciento (5%) del valor del contrato, que cubrirá el periodo comprendido desde la recepción y apertura de plicas hasta la aprobación de las adjudicaciones, y, en todo caso, tendrá una vigencia de ciento veinte (120) días, como lo establece el artículo 64 de la Ley de Contrataciones.

2. **FIANZA DE CUMPLIMIENTO:** Como requisito previo para la aprobación del presente contrato de conformidad con el Artículo 65 de la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas, que garantizara el cumplimiento de todas las obligaciones estipuladas en el contrato, el contratista deberá prestar fianza, deposito en efectivo o constituir hipoteca en los porcentajes y condiciones que señale el reglamento. Para el caso de obras, además esta garantía cubrirá las fallas o desperfectos que aparecieren durante la ejecución del contrato, antes que se constituya la garantía de conservación. **Por un valor del diez por ciento (10%) del monto del contrato respectivo.**

La Garantía de Cumplimiento deberá estar vigente, según el caso:

1. Cuando se trate de la adquisición de bienes, suministros y servicios hasta que la entidad interesada extienda la constancia de haber recibido a su entera satisfacción la garantía de calidad o de funcionamiento, o haberse prestado el servicio en su caso;
2. Cuando se trate de construcción de obras, hasta que la entidad interesada extienda la constancia de haber recibido a su satisfacción la garantía de conservación de obra.

Para los casos en que las bases el contrato respectivo, se contemplen recepciones parciales para el cumplimiento del objeto del contrato, se podrá ajustar la garantía de cumplimiento conforme se establezca en dichos instrumentos y siempre que se cuente con la constancia a que se refiere el presente artículo.

3. **FIANZA DE ANTICIPO:** Previo a recibir cualquier suma por concepto de anticipo, el contratista constituirá garantía mediante fianza o hipoteca por el monto de un cien por ciento (100%) del mismo. La garantía podrá reducirse en la medida que se amortice el valor del anticipo cubriendo siempre el máximo del saldo deudor y estará vigente hasta su total amortización. El reglamento establecerá el procedimiento de reducción y lo concerniente en los casos de rescisión, resolución y terminación de contrato.

MEGA-CONSTRUCCIONES
Tel: 41930189

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
ALCALDE

4. **FIANZA DE CONSERVACION DE LA OBRA O DE LA CALIDAD DE FUNCIONAMIENTO:** El contratista responderá por la conservación de la obra, mediante depósito en efectivo, fianza, hipoteca o prenda, a su elección, que cubra el valor de las reparaciones de las fallas o desperfectos que le sean imputables y que aparecieren durante el tiempo de responsabilidad de dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha de recepción de la obra. Tratándose de bienes y suministros, deberá otorgarse garantía de calidad y/o funcionamiento, cuando proceda. La garantía de conservación de obra, o de calidad y/o funcionamiento, deberá otorgarse por el equivalente al quince por ciento (15%) del valor original del contrato, como requisito previo para la recepción de la obra, bien o suministro. El vencimiento del tiempo de responsabilidad previsto en el párrafo anterior, no exime al contratista de las responsabilidades por destrucción o deterioro de la obra debido a dolo o culpa de su parte, por el plazo de cinco (5) años, a partir de la recepción definitiva de la obra.

Garantía de Conservación de obra, calidad o funcionamiento. El contratista dentro de los veinte (20) días calendario previo a la finalización de la vigencia de la garantía de cumplimiento de contrato, deberá presentar la garantía de conservación de obra, calidad o funcionamiento, según corresponde de conformidad con lo siguiente:

a) Para el caso de obras, la garantía de conservación de obras.
b) Para el caso de maquinaria, medios de transporte, equipos instalados u otros equipos cuyo funcionamiento deba garantizarse por el contratista en el tiempo que determina La Ley o el contrato, la garantía de funcionamiento.
c) Para el caso de bienes que no se incluyen en los indicados en la literal anterior, corresponderá a la entidad contratante determinar la procedencia de la presentación de la garantía de calidad.

Para las adquisiciones de suministros e insumos consumibles que por su naturaleza sean de alta rotación y a los servicios, no les será aplicable la presentación de la garantid a de calidad o funcionamiento, en virtud de su fungibilidad y la intangibilidad de determinados servicios; debiendo en todo caso, sujetar su plazo en el contrato respectivo, siendo responsabilidad de la entidad contratante establecer en las bases y en el contrato, los medios u otras garantías que aseguren el cumplimiento del contratista respecto al objeto del contrato.

5. **FIANZA DE SALDOS DEUDORES** Para garantizar el pago de saldos deudores que pudieran resultar a favor del Estado, de la entidad correspondiente o de terceros en la liquidación, el contratista deberá prestar fianza, depósito en efectivo; constituir hipoteca o prenda, a su elección, por el cinco por ciento (5%) del valor original del contrato. Esta garantía deberá otorgarse simultáneamente con la de conservación de obra como requisito previo para la recepción de la obra, bien o suministro. Aprobada la liquidación, si no hubiere saldos deudores, se cancelará esta garantía.

MEGA-CONSTRUCCIONES
ING. GENER A. CIVIL Y TERRESTRE
Tel: 41920189

Las fianzas descritas en el presente contrato, deberán formalizarse mediante póliza emitida por instituciones autorizadas para operar en Guatemala, de conformidad con las siguientes disposiciones: La vigencia de las fianzas será exactamente igual al plazo contractual y deberá ajustarse ante cualquier ampliación o variación del contrato, manteniendo las condiciones de cobertura que aplicaron al contrato original. Lo anterior no es aplicable a las fianzas de conservación de obra, de calidad, de funcionamiento o de saldos deudores. a) Las fianzas garantizarán exacta y fielmente las obligaciones a cargo del contratista o proveedor. Estas obligaciones deben estar estipuladas en el contrato original y en cada una de las modificaciones documentadas. b) El funcionario que corresponda será responsable de exigir la actualización de las fianzas otorgadas por el contratista o proveedor. De omitirlo, el funcionario incurrirá en incumplimiento de deberes. c) El contratista o

proveedor que omita actualizar la fianza otorgada ante modificaciones del contrato original, se hará acreedor a una multa y a la suspensión inmediata de los pagos a que tenga derecho. d) Cuando la garantía consistiere en depósitos, deberá hacerse en Quetzales o por medio de cheque certificado. Cuando la garantía sea hipotecaria o prendaria, se formalizará a través de escritura pública debidamente registrada. En todo caso, quedará a criterio del contratista o proveedor la garantía a proporcionar. Las fianzas deberán publicarse en el sistema GUATECOMPRAS. Las juntas a las que se refiere el artículo 10 de esta Ley, serán responsables de verificar la autenticidad de las fianzas de sostenimiento de oferta, y las autoridades suscriptoras de los contratos serán responsables de verificar la autenticidad de las demás fianzas a las que se refiere este capítulo. El sistema GUATECOMPRAS llevará un registro de las fianzas presentadas, así como de las solicitudes de ejecución, ejecución de fianzas y pago de las mismas. Con fundamento en el artículo 69 de la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas

DECIMA SEGUNDA: FORMA DE EFECTUAR LOS TRABAJOS DEL CONSTRUCTOR: El constructor efectuará los trabajos bajo estricta responsabilidad bajo la supervisión de un Profesional del Ramo, colegiado activo de quién deberá presentar la certificación o constancia correspondiente; asimismo incluirá los materiales, mano de obra, equipo y demás elementos necesarios para la correcta aplicación y ejecución del proyecto, mismas que se estarán supervisando por el Ingeniero Supervisor de Obras Municipales, quien cuenta con el aval y aprobación de la Corporación Municipal, así como de la comisión de recepción de la citada obra. El Constructor se compromete a dejar limpias las áreas donde se ejecute el proyecto.

DECIMA TERCERA: CONTROVERSIAS: Toda controversia que pudiera surgir entre los contrayentes en lo que se refiere a la interpretación cumplimiento, aplicación y ejecución de este contrato será resuelto en el menor tiempo posible en forma conciliatoria entre ambas partes y en última instancia de no ponerse de acuerdo en el Tribunal correspondiente de lo contencioso administrativo de conformidad con el Artículo 102 de la citada ley; asimismo que se acepta los procedimientos señalados en el Código Procesal Civil y Mercantil, renunciando el constructor al fuero de su domicilio y señalando como lugar para recibir notificaciones y citaciones BARRIO EL CALVARIO, GUASTATOYA, EL PROGRESO.

DECIMA CUARTA: TERMINACION DEL CONTRATO: La Municipalidad puede dar por terminado, resuelto y/o rescindido el presente contrato en forma unilateral y sin responsabilidad de su parte en los siguientes casos: a). Por vencimiento del plazo pactado, siempre que no haya ocurrido prórroga, b). Si el constructor incumple con sus obligaciones, c). Si paraliza sin causa justificada los trabajos por más de diez días consecutivos, d). Por rescisión de mutuo acuerdo, e). Si el constructor le fueren embargado bienes y que evidentemente afecten el cumplimiento del contrato.

DECIMA QUINTA: PROHIBICIONES: EL CONSTRUCTOR: declara bajo juramento de ley y bien enterados de las penas relativas al delito de perjurio que no se encuentra comprendido dentro de las limitaciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Y que, si en el transcurso del proceso de adquisición o en la ejecución de un contrato se presenta alguna de las prohibiciones definidas en el artículo 80 de la Ley, el contratista o proveedor deberá hacerlo de conocimiento

MEGA-CONSTRUCCIONES
EN INGENIERIA CIVIL Y TERRESTRE
tel: 4193089

de la autoridad competente dentro de los dos días siguientes al conocimiento del acaecimiento de la prohibición, para que ésta analice la situación planteada y resuelva sobre el proceso del contrato.
La falta de aviso sobre el acaecimiento de alguna de las prohibiciones definida en la Ley, será causal suficiente para la inhabilitación del contratista o proveedor, quien de conformidad con la ley será responsable de compensar a la entidad contratante por los daños y perjuicios ocasionados.
El trámite de la inhabilitación y de la rehabilitación es responsabilidad de la entidad contratante o ejecutora, quien deberá cumplir con el procedimiento, plazos y condiciones que definan las Normas de Uso del Sistema GUATECOMPRAS y, en todo caso, debe respetarse el derecho de defensa.
La inhabilitación y la rehabilitación en el Sistema GUATECOMPRAS implica la correspondiente inhabilitación o rehabilitación en el Registro General de Adquisiciones del Estado.

DECIMA SEXTA: INSPECCION, RECEPCION Y LIQUIDACION FINAL: 1. El constructor deberá de permitir en cualquier momento que las personas autorizadas por la Municipalidad Inspeccionen las instalaciones, actividades y trabajos que realicen e instruirá a su personal para que atiendan a las personas nombradas proporcionándoles toda información requerida. 2. La Municipalidad nombrará una comisión receptora de los trabajos y harán la inspección correspondiente ante la presencia del constructor su representante legal y posteriormente informarán al Concejo Municipal si se puede faccionar el acta de recepción respectiva para que la Dirección de Administración Financiera efectúe la liquidación final o en su defecto si hay que corregir algunos trabajos o complementar otros, en este último caso deberá indicar cuales son los trabajos a efectuar y el tiempo a emplear y si el plazo es necesario se incluye dentro del tiempo contractual o le concede o no algún tiempo adicional.

DECIMA SEPTIMA: APROBACION: Para que el presente contrato surta sus efectos legales y obligue a las partes al cumplimiento de las cláusulas contenidas deberá ser aprobado de conformidad con el artículo 42 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas.


DECIMA OCTAVA: ACEPTACION DEL CONTRATO: En todos los términos y condiciones estipuladas LA MUNICIPALIDAD Y EL CONSTRUCTOR aceptan para si el presente contrato el que se encuentra contenido en ocho (8), hojas membretadas impresas de un solo lado, leemos íntegramente lo escrito y bien enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo aceptamos, ratificamos y firmamos. Damos Fe.

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
ALCALDE

MEGA-CONSTRUCCIONES EN INGENIERIA CIVIL Y TERRESTRE Tel: 41980189

LIC. JORGE ANTONIO OBELLANA PINTO
ALCALDE MUNICIPAL

DIEGO ANTONIO CIFUENTES MAZARIEGOS
MEGA-CONSTRUCCIONES EN INGENIERIA CIVIL Y TERRESTRE



GUASTATOYA

CONSTANCIA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

GUASTATOYA
DAFIM
Dirección de Administración Financiera Municipal

CDF No. 034
Ejercicio Fiscal: 2021

MONTO RESERVADO VIGENTE (Q): Q 400,000.00
MONTO EN LETRAS: CUATROCIENTOS MIL 00/100

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
FECHA DE EMISION: **miércoles, 22 de septiembre de 2021**
MODALIDAD DE COMPRA O CONTRATACION: **COTIZACION**
NUMERO DE OPERACIÓN GUATECOMPRAS:

DESCRIPCION DEL PROCESO:

MEJORAMIENTO CALLE 2 CON ADOQUIN, COLONIA LOS ANGELES BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

NIT:
NOMBRE O RAZON SOCIAL:
CORREO ELECTRONICO:

PROGRAMCION No.: Q 400,000.00

ESTUCTURA (S) PRESUPUESTARIA (S) ASIGNADA (S) ES 23-00-001-000-24, RENGLON # 331
UNA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 42-0161-0001.`

MEJORAMIENTO CALLE 2 CON ADOQUIN, COLONIA LOS ANGELES BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

CUATROCIENTOS MIL 00/100 **Q 400,000.00**

Edgar Ivan Monterroso Gonzalez
Encargado del Presupuesto

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO
ENCARGADO DE PRESUPUESTO
EDGAR IVAN MONTERROSO GONZALEZ
TU NUEVA MUNI

ULTIMA LINEA

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO:

1. Nombre del proyecto: Forma Capital Fijo

MEJORAMIENTO CALLE 2 CON ADOQUIN, COLONIA LOS ANGELES, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

2. Institución responsable: GOBIERNOS LOCALES

3. Unidad ejecutora responsable: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
Planifición Institucional

4. Modalidad de planificación : Planificación Institucional

4.1. Modalidad especifica:

Finalidad-Función-Division:

5. [illegible]ción anterior:
TRANSPORTE
Sub-función anterior :
TRANSPORTE

6. Ubicación geográfica:

Departamento	Municipio
EL PROGRESO	GUASTATOYA

7. Área de influencia: Local

Responsable del proyecto:

Nombre: JORGE ANTONIO ORELLANA PINTO
Cargo: ALCALDE MUNICIPAL
Teléfono: 7945-1603
Email: dmp.guastatoya@gmail.com

DIAGNÓSTICO:

8. A[illegible]cedentes:

LOS VECINOS DE LA COLONIA LOS ANGELES, DEL BARRIO MINERVA, DESDE HACE MUCHOS AÑOS VIENEN GESTIONANDO EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA CALLE, POR TAL MOTIVO DECIDIO FACULTAR AL CONSEJO COMUNITARIO DE DEASSOLLO PARA GESTIONAR ANTE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA DICHO PROYECTO

9. Problemática:

10. Justificación:

ACTUALMENTE LOS VECINOS SE VEN OBLIGADOS A TRANSITAR POR CALLES TOTALMENTE DETERIORADAS, LO QUE VIENE A OCASIONAR PERDIDA EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE DEDICA CADA UNO DE ELLOS

11. Descripción:

EL PROYECTO CONSISTE EN EL MEJORAMIENTO DE LA CALLE 2 DE LA COLONIA LOS ANGELES DEL BARRIO MINERVA, DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO

12. Objetivos:

12.1 General:

CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS VECINOS DE LA COLONIA LOS ANGELES A TRAVEZ DEL MEJORAMIENTO DE LA CALLE

12.2 Específicos:


MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL


13. Resultados esperados:

RESULTADOS DE LA FASE ACTUAL :

1. Fase actual: EJECUCION

2. Beneficiarios directos:

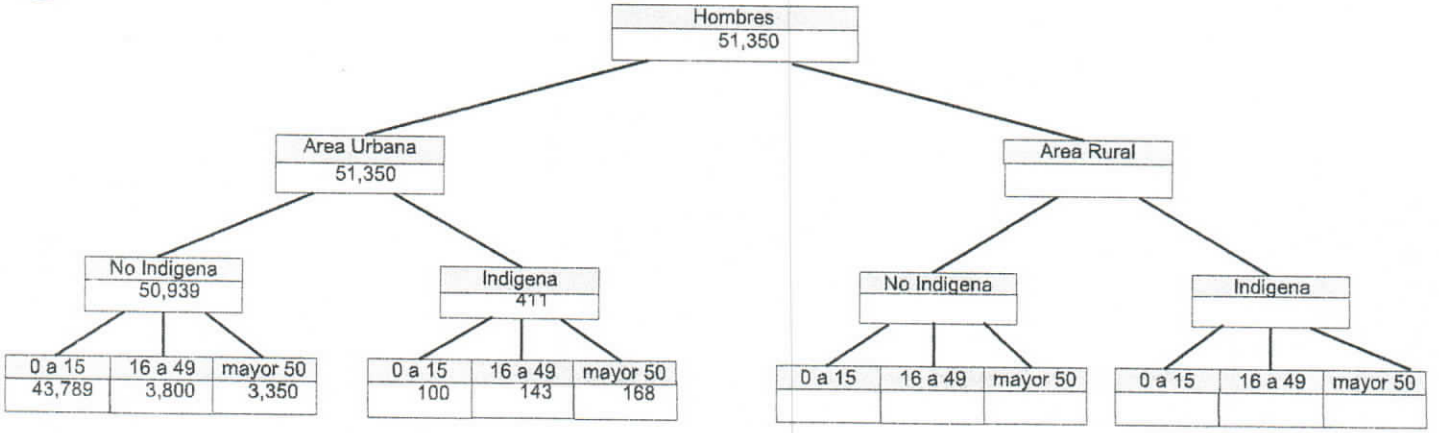

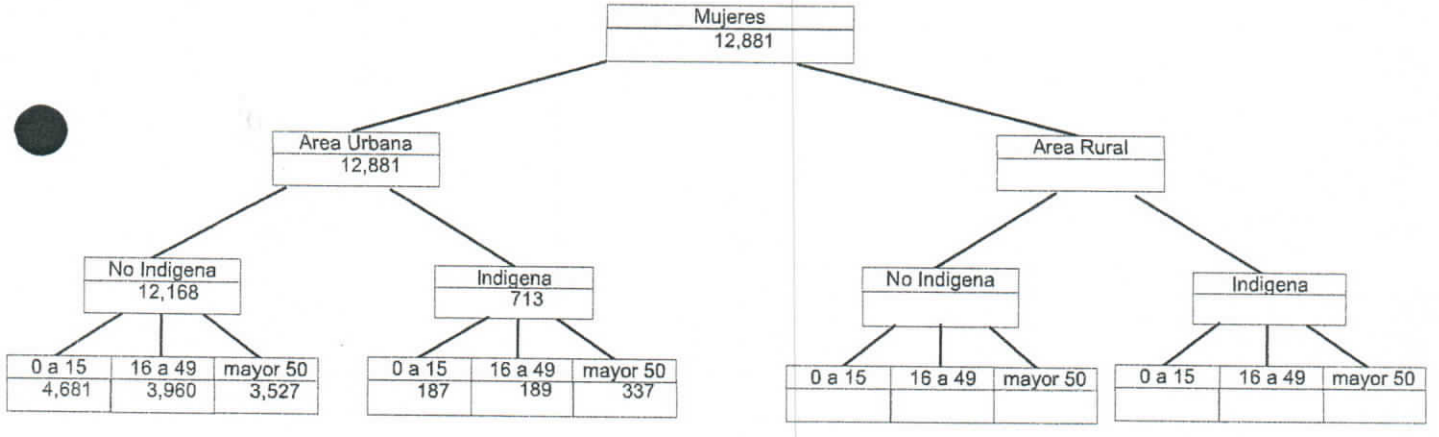

3. Costo/eficiencia:

4. TIR: %

5. VAN:

6. Empleo a requerir:

	Durante la ejecución en hombre/mes	Durante la operación en hombre/mes
Calificada		
No calificada		

7. Situación del terreno: Ninguno

8. Diseños (especificaciones):

9. Vida útil del proyecto: 20 años

10. Fecha de inicio de la operación: 01-JAN-22

11. Institución responsable de operación: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

12. Costo anual de operación:

0280429 - MEJORAMIENTO CALLE 2 CON ADOQUIN, COLONIA LOS ANGELES, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

SNIP - SEGEPLAN

Solicitud de Financiamiento, ejercicio 2,021

Meta GLOBAL del proyecto :

MEJORAMIENTO CALLE 80.00 Metro cuadrado

Meta ANUAL del proyecto :

MEJORAMIENTO CALLE 80.00 Metro cuadrado

PROGRAMACION FINANCIERA MULTIANUAL:

Fase: **Ejecución**

Fecha de inicio de la fase: 01/01/2021

Fecha de finalización: 31/12/2021

Descripción de la fase a financiar:

DESCRIPCION

Decreto 2018:
Decreto 2019:
Decreto 2020:
Decreto 2021:

Situación presupuestaria: Nuevo

Estructura programática:---

Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2021	Programado 2022	Programado 2023	Progamado 2024	Total
TOTAL :	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
Recursos internos :	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
Gobierno central :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunidad :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aporte municipal :	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
Otros aportes :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras fuentes :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL 2021

Fuente de Financiamiento	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
TOTAL						57,100	57,100	57,100	57,100	57,300	57,100	57,200
Recursos internos						57,100	57,100	57,100	57,100	57,300	57,100	57,200
Gobierno central :												
Comunidad :												
Aporte municipal :						57,100	57,100	57,100	57,100	57,300	57,100	57,200
Otros aportes :												
Otras fuentes:												

PROGRAMACION FISICA MULTIANUAL

Rubro	Unidad de medida	Programado 2,021	Programado 2022	Programado 2023	Programado 2024
Construcciones complementarias	m²	80			
Movimiento de tierras	m²	80			
Trabajos preliminares	m²	80			
Superficie de rodadura	m²	80			
Sub bases y bases	m²	80			

PROGRAMACION FISICA ANUAL

2,021

Rubro	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre

Construcciones compleme						11	11	11	11	11	15	10
Movimiento de tierras						11	11	11	11	15	11	10
Trabajos preliminares						11	11	11	11	11	15	10
Superficie de rodadura						11	11	11	11	11	15	10
Sub ba[illegible] y bases						11	11	11	11	11	15	10

GOBIERNO DE GUATEMALA
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

RGAE
Registro General de Adquisiciones del Estado

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN Y PRECALIFICACIÓN COMO PROVEEDOR DEL ESTADO

Última fecha de actualización: 10 de marzo de 2021

202173404

EL INFRASCRITO REGISTRADOR DEL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Hace constar

Que a la presente fecha DIEGO ANTONIO CIFUENTES MAZARIEGOS con NIT 83447555 se encuentra INSCRITO en el REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO, al folio 130839 del Libro de INSCRIPCIONES y registro numero 7018 del LIBRO DE REGISTRO DE PROVEEDORES, en estatus **HABILITADO**.

Esta constancia le habilita para proveer: OBRAS A ENTIDADES DEL ESTADO, HASTA UN MONTO MAXIMO DE CONTRATACIÓN DE DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL QUETZALES (Q. 2,400,000.00). Como resultado de la evaluación de la capacidad técnica y financiera del proveedor.

Asimismo, precalificado en la especialidad o especialidades siguientes: (Si no se listan especialidades, se debe a que el proveedor no acreditó documentación de respaldo requerida).

- 4103 Mantenimiento y remodelación de edificios
- 4298 Adoquinado y empedrado
- 4211 Carreteras pavimentadas

A partir del 6 de junio de 2019, las constancias emitidas por el RGAE, reflejarán además del nombre de las especialidades el código de cada una de ellas, esto con el fin de facilitar el proceso de revisión a las entidades reguladas por el artículo 1 de la ley de Contrataciones del Estado.

Última fecha de modificación: 10 de marzo de 2021.

Plazo de vigencia: La precalificación operada tiene vigencia hasta el 10 de marzo de 2023.

Resolución número 202172815, de fecha 10 de marzo de 2021.

Lugar y fecha de emisión: Guatemala, 10 de marzo de 2021.

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO
-TU NUEVA MUNI-
JUNTA DE COTIZACION

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO SIN FIRMA, SU AUTENTICIDAD PUEDE SER VERIFICADA INGRESANDO EL NUMERO DE LA CONSTANCIA EN LA OPCIÓN VALIDAR CONSTANCIAS EN EL PORTAL www.rgae.gob.gt **O A TRAVÉS DEL CODIGO QR DE ESTE DOCUMENTO.**

Notas: Los términos de la presente constancia se basan en la información y documentación presentada por el interesado bajo los términos y condiciones establecidos por el Registro General de Adquisiciones del Estado en el que declara que dicha información y documentación corresponden a la persona individual o jurídica identificada en esta constancia y sabiendo de la pena relativa al delito que establece el artículo 459 del Código Penal. No asumiendo el Registro responsabilidad alguna por omisión o actos previos posteriores, realizados por los proveedores que transgredan el marco legal.

La presente constancia no sustituye, reemplaza o releva el marco normativo aplicable a la recepción de ofertas, la calificación y adjudicación del negocio conforme lo establecido en el artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado -LCE-, así como el cumplimiento de los procedimientos de suscripción y aprobación del contrato, y lo relativo a las garantías y seguros relacionados al cumplimiento contractual regulados en la -LCE-.

Fecha de impresión 10 de marzo de 2021

MEGA-CONSTRUCCIONES
EN INGENIERIA CIVIL Y TERRESTRE
Tel: 41980189

GUASTATOYA

Municipalidad de

GUASTATOYA

Departamento de El Progreso, Guatemala, C.A.

info@muniguasta.com

www.muniguastatoya.com

Telefax: 7945-1594, 7945-1602, 7945-1603

Guastatoya, jueves, 11 de noviembre de 2021

SEÑOR(es):

ALCALDE MUNICIPAL Y
HONORABLE CORPORACION
GUASTATOYA, EL PROGRESO

Respetables señor(es):

El motivo del presente es para informar los resultados de la siguiente estimacion de pago:

No. De Supervision de Avance Físico:	**ESTIMACION No.1**		
Nombre del Proyecto:	**MEJORAMIENTO CALLE 2 CON ADOQUIN, COLONIA LOS ANGELES, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO**		
No. De Contrato del Proyecto:	34-2021	**Fecha del Contrato:**	28/09/2021
NOG.	15327159		
Estimacion del Avance Fisico:	41.0000000%		
Monto de Estimacion del Avance Físico:	Q163,795.00	**en letras:**	CIENTO SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO QUETZALES CON 00/100 CENTAVOS
Amorización del Anticipo:	Q32,759.00	**en letras:**	TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE QUETZALES CON 00/100 CENTAVOS
Cantidad Líquida a Recibir:	Q131,036.00	**en letras:**	CIENTO TREINTA Y UN MIL TREINTA Y SEIS QUETZALES CON 00/100 CENTAVOS

Se adjunta anexo que contiene el detalle de la presente estimacion para que se continúe con lo procedente.

Agradeciendo desde ya, me suscribo.

Atentamente,

ING. CARLOS RAMIRO ORTEGA LIMA
COLEGIADO: 7118
SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

Carlos Ramiro Ortega Lima
Ingeniero Civil
Col. 7118

GUASTATOYA esta cambiando

ESTIMACION No.1

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO CALLE 2 CON ADOQUIN, COLONIA LOS ANGELES, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO			PERIODO DEL: 01-10-21	AL 11-11-21
FECHA INICIO DEL PROYECTO:	1 de octubre de 2021	CONCEPTO	NUMERO	Fecha Solicitud:	11 de noviembre de 2021
TIEMPO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO EN MESES:	4	CONTRATO	34-2021	FECHA 28-09-21	AVANCE AUTORIZADO POR LA UNIDAD EJECUTORA A LA EMPRESA CONSTRUCTORA:
FECHA DE FINALIZACION	1 de febrero de 2021	MONTO DE CONTRATO		Q 399,500.00	
NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA:	MEGA-CONSTRUCCIONES EN INGENIERIA CIVIL Y TERRESTRES	SNIP		280429	41.0000000%
REPRESENTANTE LEGAL EMPRESA CONSTRUCTORA:	DIEGO ANTONIO CIFUENTES MAZARIEGOS	NOG		15327159	GUASTATOYA

No.	DESCRIPCION DEL RENGLON DE TRABAJO	TRABAJO FISICO												COSTO FINANCIERO					
		Cantidad Contratada								Cantidad Ejecutada				Costo de Ejecución				Monto por ejecutar	
		Unidad	Cantidad Contratada	Orden de Cambio	Orden de Trabajo Sup	Acuerdo Trabajo Extra	Cantidad Actual	Precio Unitario Q.	Costo Total Estimado	Este Periodo	Acumulado Anterior	Total a la fecha	%	Este Periodo	Acumulado Anterior	TOTAL A LA FECHA	%	Por Estimar	%
1	Trazo y estaqueado	ML	166.00				166.00	Q 11.00	Q 1,826.00	108.114		108.114	65.13%	Q 1,189.25		Q 1,189.25	65.13%	Q 636.75	34.87%
2	Corte y nivelación del terreno a nivel de sub rasante existente	m2	871.00				871.00	Q 38.00	Q 33,098.00	871		871	100.00%	Q 33,098.00		Q 33,098.00	100.00%	Q -	0.00%
3	Colocación + compactación de base granular de espesor de 0.10 mts.	M2	812.00				812.00	Q 60.00	Q 48,720.00	812		812	100.00%	Q 48,720.00		Q 48,720.00	100.00%	Q -	0.00%
4	Colocacion de adoquin trafico liviano	M2	812.00				812.00	Q 280.00	Q 227,360.00	270		270	33.25%	Q 75,600.00		Q 75,600.00	33.25%	Q 151,760.00	66.75%
5	Cama de asiento de arena	M2	812.00				812.00	Q 10.00	Q 8,120.00	270		270	33.25%	Q 2,700.00		Q 2,700.00	33.25%	Q 5,420.00	66.75%
6	Llave de confinamiento	ml	168.00				168.00	Q 155.00	Q 26,040.00	16.05		16.05	9.55%	Q 2,487.75		Q 2,487.75	9.55%	Q 23,552.25	90.45%
7	Bordillo prefabricado	ML	279.00				279.00	Q 190.00	Q 53,010.00	0		0	0.00%	Q -		Q -	0.00%	Q 53,010.00	100.00%
8	Limpieza final	UNIDAD	1.00				1.00	Q 1,326.00	Q 1,326.00	0		0	0.00%	Q -		Q -	0.00%	Q 1,326.00	100.00%
								TOTAL CONTRATADO	Q399,500.00			VALOR DE LA ESTIMACION		Q 163,795.00	Q -	Q 163,795.00	41.0000000%	Q 235,705.00	59.00000%
												AMORTIZACION DEL ANTICIPO		Q 32,759.00					
												TOTAL LIQUIDO A RECIBIR		Q 131,036.00					

SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES
CARLOS RAMIRO ORTEGA LIMA

Carlos Ramiro Ortega Lima
Ingeniero Civil
Col. 7118

Municipalidad de
GUASTATOYA
Departamento de El Progreso, Guatemala, C.A.
info@muniguasta.com
www.muniguastatoya.com
Telefax: 7945-1594, 7945-1602, 7945-1603

Guastatoya, jueves, 11 de noviembre de 2021

SEÑOR(es):

ALCALDE MUNICIPAL Y
HONORABLE CORPORACION
GUASTATOYA, EL PROGRESO

Respetables señor(es):

Respetuosamente me dirijo a usted, con el proposito de REMITIR el INFORME DE SUPERVISION que acontinuacion se describe:

Nombre del Proyecto:	**MEJORAMIENTO CALLE 2 CON ADOQUIN, COLONIA LOS ANGELES, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO**		
No. De Contrato del Proyecto:	34-2021	**Fecha del Contrato:**	28/09/2021
NOG.	15327159		
Empres constructura:	MEGA-CONSTRUCCIONES EN INGENIERIA CIVIL Y TERRESTRES		

Se realizo la visita al proyecto antes en mencion para hacer constar los avances de los renglones contratados en su avance fisico notificado por la empresa Constructora los cuales se describen a continuacion:

Municipalidad de
GUASTATOYA
Departamento de El Progreso, Guatemala, C.A.
info@muniguasta.com
www.muniguastatoya.com
Telefax: 7945-1594, 7945-1602, 7945-1603

108.114 ML DE Trazo y estaqueado
871 m2 DE Corte y nivelación del terreno a nivel de sub rasante existente
812 M2 DE Colocación + compactación de base granular de espesor de 0.10 mts.
270 M2 DE Colocacion de adoquin trafico liviano
270 M2 DE Cama de asiento de arena
16.05 ml DE Llave de confinamiento

TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR

57.89 ML DE Trazo y estaqueado
542 M2 DE Colocacion de adoquin trafico liviano
542 M2 DE Cama de asiento de arena
151.95 ml DE Llave de confinamiento
279 ML DE Bordillo prefabricado
1 UNIDAD DE Limpieza final

Estimacion del Avance Fisico:	41.0000000%

Se adjunta anexo que contiene el detalle de la presente estimacion para que se continúe con lo procedente.

Agradeciendo desde ya, me suscribo.

Atentamente,


ING. CARLOS RAMIRO ORTEGA LIMA
COLEGIADO: 7118
SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

Carlos Ramiro Ortega Lima
Ingeniero Civil
Col. 7118

Municipalidad de
GUASTATOYA
Departamento de El Progreso, Guatemala, C.A.
info@muniguasta.com
www.muniguastatoya.com
Telefax: 7945-1594, 7945-1602, 7945-1603


INFORME FOTOGRAFICO	MEJORAMIENTO CALLE 2 CON ADOQUIN, COLONIA LOS ANGELES, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO



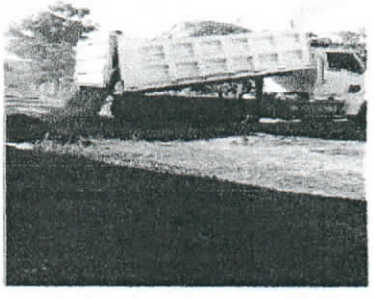





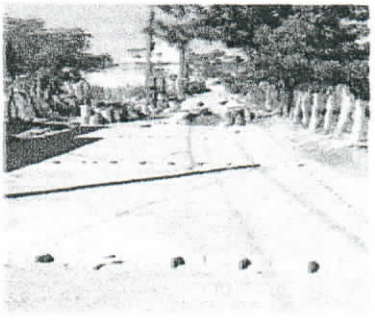

GUASTATOYA esta cambiando

MEGA-CONSTRUCCIONES
EN INGENIERIA CIVIL Y TERRESTRE
9ª. Calle 14-67, zona 3, San Marcos,

Guastatoya, El Progreso, 11 de noviembre de 2021

Señores:
Alcalde y Honorable Concejo Municipal
Municipalidad de Guastatoya,
Departamento de El Progreso.
Presentes:

Reciban un cordial saludo, deseándole éxitos en sus labores diarias.

Por este medio yo: **DIEGO ANTONIO CIFUENTES MAZARIEGOS**, me identifico con documento personal de Identificación DPI No. **2171335921201**, **PROPIETARIO Y REPRESENTANTE LEGAL** de la empresa: **MEGA-CONSTRUCCIONES EN INGENIERIA CIVIL Y TERRESTRE**, **SOLICITO: PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1,** que equivale al **41 %** de **Avance Físico** correspondiente al Proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO CALLE 2 CON ADOQUIN, COLONIA LOS ANGELES, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO." Contrato 34-2021** de fecha veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno **(28/09/2021).**

Para el efecto acompaño la documentación requerida para realizar dicho trámite.

Atentamente:

F _____
DIEGO ANTONIO CIFUENTES MAZARIEGOS
PROPIETARIO Y REPRESENTANTE LEGAL
MEGA-CONSTRUCCIONES
EN INGENIERÍA CIVIL Y TERRESTRE

MEGA-CONSTRUCCIONES
EN INGENIERIA CIVIL Y TERRESTRE
9ª. Calle 14-67, zona 3, San Marcos,

Guastatoya, El Progreso, 10 de noviembre de 2021

Ing.
RAMIRO ORTEGA
Supervisor Municipal
Municipalidad de Guastatoya,
Departamento de El Progreso.
Presente:

Reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en sus labores diarias.

Por este medio yo: **DIEGO ANTONIO CIFUENTES MAZARIEGOS**, me identifico con documento personal de Identificación DPI No. **2171335921201**, **PROPIETARIO Y REPRESENTANTE LEGAL** de la empresa: **MEGA-CONSTRUCCIONES EN INGENIERIA CIVIL Y TERRESTRE, SOLICITO: SUPERVISION Y VERIFICACIÓN,** del Proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO CALLE 2 CON ADOQUIN, COLONIA LOS ANGELES, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO." Contrato 34-2021** de fecha veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno **(28/09/2021).** Que hasta la fecha cuenta un **Avance Físico del 41 %**.

Para el efecto acompaño la documentación requerida para realizar dicho trámite.

Atentamente:

F_____
DIEGO ANTONIO CIFUENTES MAZARIEGOS
PROPIETARIO Y REPRESENTANTE LEGAL
MEGA-CONSTRUCCIONES
EN INGENIERÍA CIVIL Y TERRESTRE

MEGA-CONSTRUCCIONES
EN INGENIERIA CIVIL Y TERRESTRE
9ª. Calle 14-67, zona 3, San Marcos.

ESTIMACION No. 1

NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE 2 CON ADOQUIN, COLONIA LOS ANGELES, BARRIO
EJECUTOR: MEGA-CONSTRUCCIONES EN INGENIERÍA CIVIL Y TERRESTRE

COMUNIDAD: COLONIA LOS ANGELES, BARRIO MINERVA
MUNICIPIO: GUASTATOYA
DEPARTAMENTO: EL PROGRESO

FECHA DE CONTRATO 28/09/2021
No. CONTRATO 34-2021.

							CANTIDADES EJECUTADAS					COSTO EJECUTADO				PENDIENTE DE EJECUTAR		
No.	DESCRIPCIÓN DEL RENGLON DE TRABAJO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	COSTO TOTAL	% POR RENGLON	ESTE PERIODO	PERIODO ANTERIOR	ACUMULADO A LA FECHA	TOTAL A LA FECHA	%	ESTE PERIODO	PERIODO ANTERIOR	TOTAL A LA FECHA	%	CANTIDAD	VALOR	%
	CONJUNTO																	
1	TRAZO Y ESTAQUEADO	166.00	ML	Q 11.00	Q 1,826.000	0.46%	108.11	0.00	108.11	Q 1,189.25	0.29%	Q 1,189.25	Q -	Q 1,189.25	0.29%	57.89	Q 636.75	0.16%
2	CORTE NIVELACION Y NIVELACION A NIVEL DE SUB RASANTE EXISTENTE	871.00	METROS²	Q 38.00	Q 33,098.000	8.28%	871.00	0.00	871.00	Q 33,098.00	8.28%	Q 33,098.00	Q -	Q 33,098.00	8.28%	0.00	Q -	0.00%
3	COLOCACION + COMPACTACION DE BASE GRANULAR DE ESPESOR DE 0.10 MTS	812.00	METROS²	Q 60.00	Q 48,720.000	12.20%	812.00	0.00	812.00	Q 48,720.00	12.20%	Q 48,720.00	Q -	Q 48,720.00	12.20%	0.00	Q -	0.00%
4	COLOCACION DE ADOQUIN TRAFICO LIVIANO	812.00	METROS²	Q 280.00	Q227,360.000	56.91%	270.00	0.00	270.00	Q 75,600.00	18.92%	Q 75,600.00	Q -	Q 75,600.00	18.92%	542.00	Q151,760.00	37.99%
5	CAMA DE ARENA DE ASIENTO	812.00	METROS²	Q 10.00	Q 8,120.000	2.03%	270.00	0.00	270.00	Q 2,700.00	0.68%	Q 2,700.00	Q -	Q 2,700.00	0.68%	542.00	Q 5,420.00	1.36%
6	LLAVES DE CONFINAMIENTO	168.00	ML	Q 155.00	Q 26,040.000	6.52%	16.05	0.00	16.05	Q 2,487.75	0.62%	Q 2,487.75	Q -	Q 2,487.75	0.62%	151.95	Q 23,552.25	5.90%
7	BORDILLO PREFABRICADO	279.00	ML	Q 190.00	Q 53,010.000	13.27%	0.00	0.00	0.00	Q -	0.00%	Q -	Q -	Q -	0.00%	279.00	Q 53,010.00	13.27%
8	LIMPIEZA FINAL	1.00	UNIDAD	Q 1,326.00	Q 1,326.000	0.33%	0.00	0.00	0.00	Q -	0.00%	Q -	Q -	Q -	0.00%	1.00	Q 1,326.00	0.33%
					Q 399,500.00	**100.00%**				**Q 163,795.00**	**41.00%**	**Q 163,795.00**	**Q -**	**Q 163,795.00**	**41.00%**		**Q235,705.00**	**59.00%**

COSTO ORIGINAL DEL CONTRATO:	Q 399,500.00
ANTICIPO	Q 32,759.00
PLAZO CONTRACTUAL	120 DIAS CALENDARIO

TOTAL DE ESTA ESTIMACION No. 1	**Q 163,795.00**
AMORTIZACION	**Q 32,759.00**
LIQUIDO A RECIBIR	**Q 131,036.00**

Diego Antonio Cifuentes Mazariegos
Propietario y Representante Legal
MEGA-CONSTRUCCIONES EN INGENIERÍA CIVIL Y TERRESTRE


Roberto Antonio Cotton De León
INGENIERO CIVIL COL. No. 4434

Ing. Civil Roberto Antonio Cotton de León
Superintendente del Proyecto
MEGA-CONSTRUCCIONES EN INGENIERÍA CIVIL Y TERRESTRE

MEGA-CONSTRUCCIONES
EN INGENIERIA CIVIL Y TERRESTRE
9ª. Calle 14-67, zona 3, San Marcos,

INFORME FOTOGRÁFICO
MEJORAMIENTO CALLE 2 CON ADOQUIN, COLONIA LOS ANGELES, BARRIO MINERVA



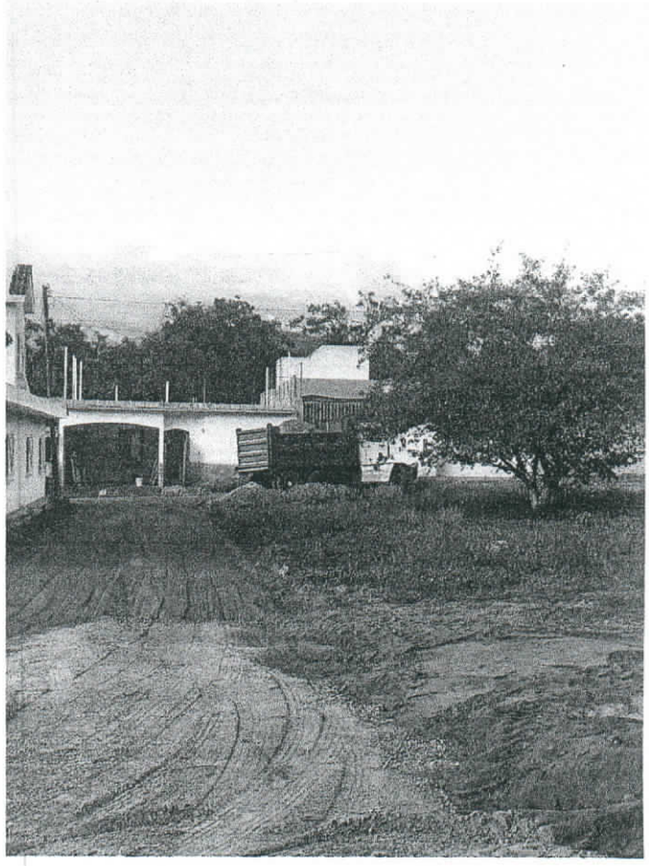






Roberto Antonio Cotton De León
INGENIERO CIVIL COL. No. 4480

MEGA-CONSTRUCCIONES
EN INGENIERIA CIVIL Y TERRESTRE
Tel: 41980189

MEGA-CONSTRUCCIONES
EN INGENIERIA CIVIL Y TERRESTRE
9ª. Calle 14-67, zona 3, San Marcos,

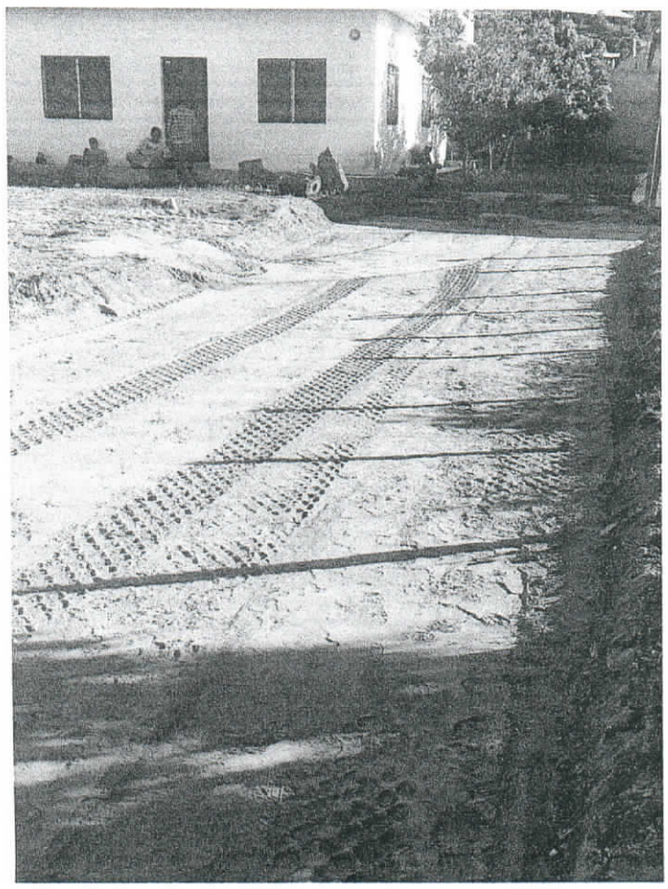

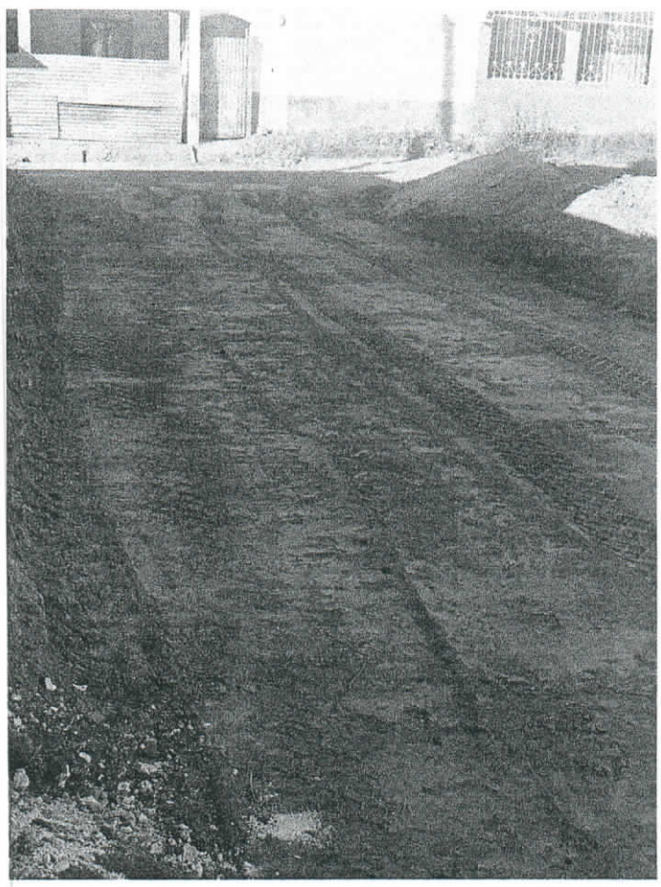


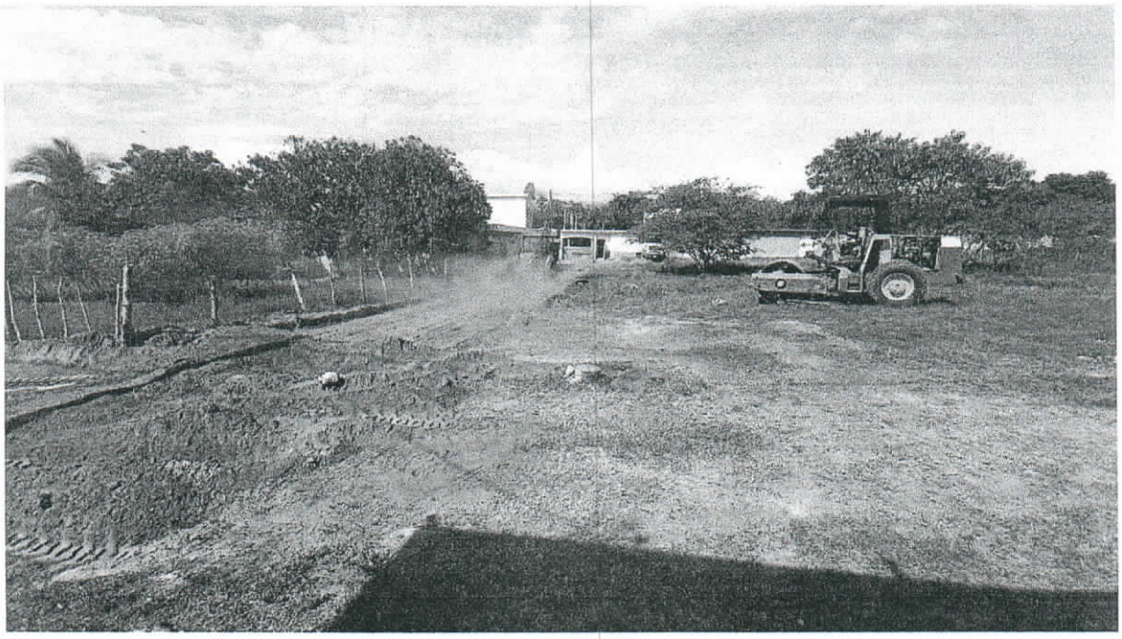


Roberto Antonio Cotton De León
INGENIERO CIVIL COL. No. 4494

MEGA-CONSTRUCCIONES
EN INGENIERIA CIVIL Y TERRESTRE
Tel: 41550789

MEGA-CONSTRUCCIONES
EN INGENIERIA CIVIL Y TERRESTRE
9ª. Calle 14-67, zona 3, San Marcos,

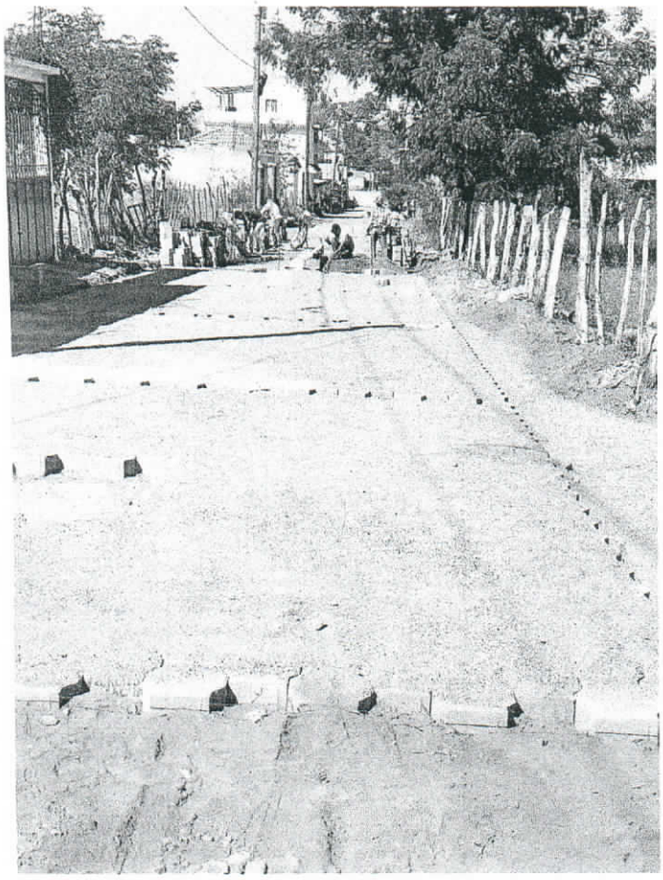



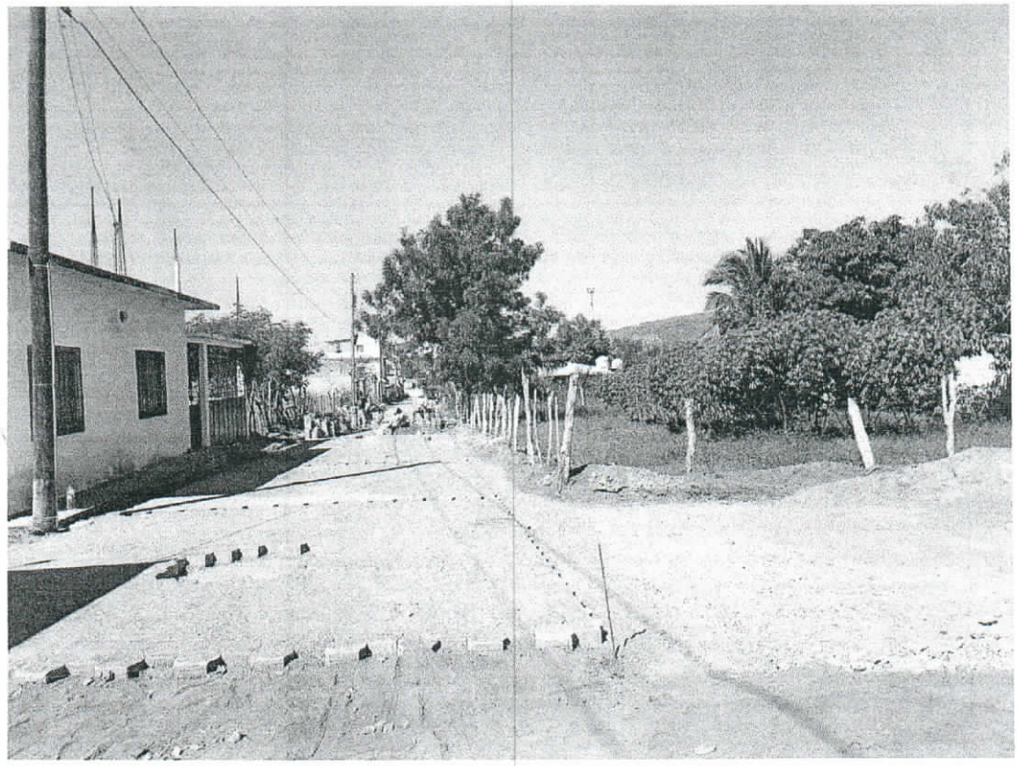

Roberto Antonio Cotton De León
INGENIERO CIVIL COL. No. 4484

MEGA-CONSTRUCCIONES
EN INGENIERIA CIVIL Y TERRESTRE
Tel: 7760189
