MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
\Sirviendo/

5980-0535 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
BARRIO EL CALVARIO, **GUASTATOYA EL PROGRESO**

REPORTE DE PAGO DE PROYECTOS POR CONTRATO 2026

\EXPEDIENTE No. **311** NOG: **28738020** CONTRATO No. **01-2026**

PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO INICIA FRENTE A SUB-ESTACION PNC HACIA SECTOR LA BOMBA, BARRIO LAS JOYAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO

APORTES	% DE AVANCE	ESTIMACION	AMORTIZACION	LIQUIDO A RECIBIR
Aporte MUNICIPALIDAD	**50.00%**			
Q. 2,499,475.00		Q. 249,947.50	Q. 49,989.50	Q. 199,958.00
TOTALES		Q. 249,947.50	Q. 49,989.50	Q. 199,958.00

Se cuenta con Informe de supervisión por parte de la empresa, informe de supervisión por el Supervisor de Obras Municipales, Punto del Concejo Municipal de aprobación de avance, Copia de bitácora.

Lic. Alexis Geovanny Marroquín Orellana
Director Municipal de Planificación

DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
\Sirviendo/

BANRURAL
El amigo que te ayuda a crecer

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
Capital de la amistad

CUENTA UNICA DEL TESORO
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA C.U.T.
CUENTA No. 3-005-09207-3
GUATEMALA, C.A.

CHEQUE No. 90203

No. 20164753

LUGAR Y FECHA: GUASTATOYA, 17 de JULIO del 2026

PAGO A LA ORDEN DE: ***HERNANDEZ, ARGELIA, DELMI, SANDINTRA***

SUMA DE: ***CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO** Q.

QUETZALES.

GT86 BRRL 0101 0000 0030 0509 2073

FIRMA

FIRMA

NO NEGOCIABLE

FORMULARIOS STANDARD, S.A. PBX: 2423 6500

DESCRIPCION DE PAGO: ***PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 50% DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO INICIA FRENTE A SUB ESTACIÓN PNC HACIA SECTOR LA BOMBA, BARRIO LAS JOYAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO 90203

CUENTA No.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	NUMERO DE CHEQUE: 90203 CON NUMERO DE EXPEDIENTE: 311 TRANSACCION No: 66874358 NIT BENEFICIARIO: 97886459 DELMI.ORELLANA1772026 17 de JULIO del 2026		

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	RECIBI CONFORME	DIA	MES	AÑO
			Fernando Hernandez.	17	7	2026

5028205 T0340 4037497 87

Factura

DEYLI SAMANTHA , HERNÁNDEZ ARCHILA
Nit Emisor: 97886459
CONSTRUCTORA KLIFERSA
KILÓMETRO 73 ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO
NIT Receptor: 6206107
Nombre Receptor: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
Dirección comprador: GUASTATOYA, EL PROGRESO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
A4FCB8B3-2511-4D2F-BCFA-A3B93ED89A8B
Serie: A4FCB8B3 Número de DTE: 621890863
Numero Acceso:

Fecha y hora de emision: 17-jul-2026 12:13:38
Fecha y hora de certificación: 17-jul-2026 12:13:38
Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Otros Descuentos(Q)	Total (Q)	Impuestos	
1	Servicio	1	PAGO DEL 50.00% DE AVANCE DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO INICIA FRENTE A SUB-ESTACION PNC HACIA SECTOR LA BOMBA, BARRIO LAS JOYAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO. Estimación: Q.249,947.50 (-) Amortización del anticipo: Q.49,989.50, Liquido a recibir: Q.199,958.00	249,947.50	0.00	0.00	249,947.50	IVA	26,780.089286
			TOTALES:		0.00	0.00	249,947.50	IVA	26,780.089286

* Sujeto a pagos trimestrales ISR

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



Contribuyendo juntos por Guatemala

MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!

5980-0535 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
BARRIO EL CALVARIO, **GUASTATOYA EL PROGRESO**

INFORME DE SUPERVISION

Guastatoya, 10 de Julio de 2026

SEÑOR: JOSE ELIAS HERRERA GUERRA Y CONSEJO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
EL PROGRESO

De la manera más atenta me dirijo a usted deseándole toda clase de éxitos en sus labores diarias.

El motivo de la presente es para hacerle saber lo siguiente:

En visita de supervisión realizada al proyecto denominado **MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO INICIA FRENTE A SUB-ESTACION PNC HACIA SECTOR LA BOMBA, BARRIO LAS JOYAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO,** con número de contrato **01-2026** de fecha 30 de Enero de 2026, ejecutado por la empresa **CONSTRUCTORA KLIFERSA**, financiado por la Municipalidad de Guastatoya, se tiene a la vista el oficio de Julio de 2026 en el cual se hace la solicitud de la estimación del proyecto para un avance del **50.00%**, para lo cual se adjunta el informe de supervisión y el informe de parte de la empresa.

Agradeciendo su atención y en espera de darle seguimiento a este asunto me suscribo de ustedes.

Atentamente

José G. Alexander Aguilar Mejia
Ingeniero Civil
Colegiado No. 9,366

ING. JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA
SUPERVISOR MUNICIPAL, GUASTATOYA
EL PROGRESO

D.M.P.	SUPERVISION DE OBRAS	Dirección Municipal de Planificación

Comunidad.	Contrato Municipal.
Cabecera Municipal, Guastatoya, El Progreso	01-2026

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del proyecto.	Ubicación del proyecto.
MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO INICIA FRENTE A SUB-ESTACION PNC HACIA SECTOR LA BOMBA, BARRIO LAS JOYAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Cabecera Municipal, Guastatoya, El Progreso
Contratista.	**Ubicación del proyecto.**
CONSTRUCTORA KLIFERSA	Cabecera Municipal, Guastatoya, El Progreso
Monto Contratado. Q 2,499,475.00	**Avance Físico.** 50.00%
Informe de Supervisión No. 2	**Fecha.** 10 de Julio de 2025

2. AVANCE DE EJECUCION DEL PROYECTO

No.	Descripcion del Renglón	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Total a la Fecha	Avance Físico %
	TRABAJOS PRELIMINARES						
1.1	LIMPIEZA Y CHAPEO	3.25	M2	Q 6.00	Q 19.50	Q 18,096.00	100%
1.2	REPLANTEO TOPOGRAFICO	-	M	Q 38.19	Q -	Q 18,331.20	100%
1.3	DEMOLICION Y RETIRO DE MATERIAL	-	M2	Q 68.00	Q -	Q 205,088.00	100%
1.4	CORTE DE CAJUELA + CORTES LATERALES ALTURA DE CORTE 0.20m CON RETIRO DE MATERIAL	-	M3	Q 254.00	Q -	Q 110,236.00	100%
	BASE Y COMPACTACIÓN						
2.1	CONFORMACION DE SUBRASANTE	-	M2	Q 21.00	Q -	Q 63,336.00	100%
2.2	TENDIDO + COMPACTACION DE BASE GRANULAR (e=0.15m COMPACTADO)	133.20	M3	Q 313.00	Q 41,691.60	Q 135,842.00	100%
	PAVIMENTO						
3.1	PAVIMENTO CONCRETO 4000 PSI, e=0.15 MTS (PROPORCION 1:2:2, VIBRADO DE CONCRETO)	402.10	M2	Q 518.00	Q 208,287.80	Q 698,859.70	47%
3.2	CORTE Y SELLO DE JUNTAS EN PAVIMENTO Y BORDILLOS	-	M	Q 74.00	Q -	Q -	0%
	BORDILLOS						
4.1	BORDILLO DE CONCRETO PREFABRICADO DE 0.15x0.50x0.30 DE 210 KG/CM2	-	M2	Q 312.50	Q -	Q -	0%
	PINTURA						
5.1	PINTURA DE BORDILLOS EN PARTE INTERNA Y SUPERIOR + VIALETAS	-	M	Q 51.95	Q -	Q -	0%
					Q 249,998.90	Q 1,249,788.90	50.00%

Estos renglones de trabajo dan como resultado un avance físico del **50.00%** **por lo cual se aprueba realizar el pago correspondiente**

3. DESCRIPCION DEL PROYECTO.

Este proyecto consiste en el mejoramiento de la calle entre la subestacion de la pnc y calle hacia la bomba, de guastatoya, el progreso, las cuales se encuentran de terraceria y se van a mejorar utilizando pavimento y bordillos prefabricados

4. RECOMENDACIONES.

Chequear los trabajos realizados para garantizar la durabilidad de los mismos, y terminar los trabajos faltantes, los que no se encuentran al 100 % y los que no se han iniciado aun

SUPERVISOR DE PROYECTOS MUNICIPALES.

José U. Alexander Aguilar Mejía
Ingeniero Civil
Colegiado No. 9,365

ING. JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA
SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES

JOSE ELIAS HERRERA GUERRA
ALCALDE MUNICIPAL GUASTATOYA

D.M.P.	SUPERVISION DE OBRAS	Dirección Municipal de Planificación

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del proyecto.	**Ubicación del proyecto.**
MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO INICIA FRENTE A SUB-ESTACION PNC HACIA SECTOR LA BOMBA, BARRIO LAS JOYAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Cabecera Municipal, Guastatoya, El Progreso

2. INFORME FOTOGRAFICO.













SUPERVISOR DE PROYECTOS MUNICIPALES.

José E. Alexander Aguilar Mejia
Ingeniero Civil
Colegiado No. 9,366

ING. JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA
SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES

JOSE ELIAS HERRERA GUERRA
ALCALDE MUNICIPAL GUASTATOYA

REPORTE DE AVANCE FISICO No. 2

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO INICIA FRENTE A SUB-ESTACION PNC HACIA SECTOR LA BOMBA, BARRIO LAS JOYAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO	
Municiplo: GUASTATOYA	Departamento: EL PROGRESO
Comunidad: CABECERA MUNICIPAL	Fecha de Contrato: 30/01/2026
Fecha de Inicio: 18/03/2026	Fecha de Supervision: 10/07/2026
Fecha de Finalizacion: 17/09/2026	Unidad Ejecutora: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
Contrato No.: 01-2026	Valor del Proyecto: Q.2,499,475.00
Modificaciones:	Valor Original: Q.2,499,475.00
Constructora: CONSTRUCTORA KLIFERSA	Telefono:
Representante legal: DEYLI SAMANTHA HERNANDEZ ARCHILA	

RESUMEN DE RENGLONES

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES DE TRABAJO				ORDEN DE CAMBIO	ORDEN DE TRABAJO SUPLEMENTARIO	ORDEN DE TRABAJO EXTRA	RENGLON MODIFICADO	CANTIDADES EJECUTADAS SEGUNDA ESTIMACION		ACUMULADO A LA FECHA		PORCENTAJE
		CANTIDAD	UNIDAD	P UNITARIO	TOTAL	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	TOTAL
	TRABAJOS PRELIMINARES													
1.1	LIMPIEZA Y CHAPEO	3,016.00	M2	Q 6.00	Q 18,096.00					3.25	Q 19.50	3,016.00	Q 18,096.00	0.72%
1.2	REPLANTEO TOPOGRAFICO	480.00	M	Q 38.19	Q 18,331.20					-	Q -	480.00	Q 18,331.20	0.73%
1.3	DEMOLICION Y RETIRO DE MATERIAL	3,016.00	M2	Q 68.00	Q 205,088.00					-	Q -	3,016.00	Q 205,088.00	8.21%
1.4	CORTE DE CAJUELA + CORTES LATERALES ALTURA DE CORTE 0.20m CON RETIRO DE MATERIAL	434.00	M3	Q 254.00	Q 110,236.00					-	Q -	434.00	Q 110,236.00	4.41%
	BASE Y COMPACTACIÓN													
2.1	CONFORMACION DE SUBRASANTE	3,016.00	M2	Q 21.00	Q 63,336.00					-	Q -	3,016.00	Q 63,336.00	2.53%
2.2	TENDIDO + COMPACTACION DE BASE GRANULAR (e=0.15m COMPACTADO)	434.00	M3	Q 313.00	Q 135,842.00					133.20	Q 41,691.60	434.00	Q 135,842.00	5.43%
	PAVIMENTO													
3.1	PAVIMENTO CONCRETO 4000 PSI, e=0.15 MTS (PROPORCION 1:2:2, VIBRADO DE CONCRETO)	2,898.00	M2	Q 518.00	Q 1,501,164.00					402.10	Q 208,287.80	1,349.15	Q 698,859.70	27.96%
3.2	CORTE Y SELLO DE JUNTAS EN PAVIMENTO Y BORDILLOS	1,495.00	M	Q 74.00	Q 110,630.00					-	Q -	-	Q -	0.00%
	BORDILLOS													
4.1	BORDILLO DE CONCRETO PREFABRICADO DE 0.15x0.50x0.30 DE 210 KG/CM2	924.00	M2	Q 312.50	Q 288,750.00					-	Q -	-	Q -	0.00%
	PINTURA													
5.1	PINTURA DE BORDILLOS EN PARTE INTERNA Y SUPERIOR + VIALETAS	924.00	M	Q 51.95	Q 48,001.80					-	Q -	-	Q -	0.00%
	COSTO TOTAL DEL PROYECTO				Q 2,499,475.00						Q 249,998.90		Q 1,249,788.90	50.00%

VALOR DE ESTIMACION No. 2	Q 249,998.90
AMORTIZACION DEL ANTICIPO (20%)	Q 49,999.78
PENDIENTE DE AMORTIZAR	Q 249,937.22
LIQUIDO A RECIBIR	Q 199,999.12

José F. Alexander Aguilar Mejia
Ingeniero Civil
Colegiado No. 9,306

JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES

JOSE ELIAS HERRERA GUERRA
ALCALDE MUNICIPAL GUASTATOYA

Aldea Casas Viejas, Guastatoya El Progreso

09 de julio del año 2026

Señor:
Alcalde
José Elías Herrera Guerra
Municipalidad de Guastatoya
Departamento de El Progreso
Presente.

Por este medio me dirijo a usted, deseándole muchos éxitos y bendiciones en tan distinguido cargo.

El motivo de la presente es para solicitar se nombre a la comisión respectiva de la oficina de planificación para evaluación física del Proyecto denominado: "MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO INICIA FRENTE A SUB-ESTACION PNC HACIA SECTOR LA BOMBA, BARRIO LAS JOYAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO", según contrato Administrativo Número (01-2026), de fecha treinta de enero del año 2,026, ubicado inicia Frente A Sub-Estación PNC Hacia Sector La Bomba, Barrio Las Joyas, Guastatoya, El Progreso, dicha obra tiene un avance físico del 50.00%; es por ello que se solicita realizar los trámites correspondientes para el desembolso del porcentaje antes mencionado.

Al oficio se adjuntan los siguientes documentos:

- ✓ Cuadro de estimación
- ✓ Registro fotográfico

Agradeciendo la atención prestada, y en espera de una respuesta positiva, me es grato el suscribirme.

Atentamente,

CONSTRUCTORA KLIFERSA
Deyli Samantha Hernández Archila
Aldea Casas Viejas, Guastatoya, El Progreso

F._____
Deyli Samantha Hernández Archila
Propietaria
CONSTRUCTORA KLIFERSA

Aldea Casas Viejas,
Guastatoya, El Progreso.

5460-3193

deylisamantha71@gmail.com

CONSTRUCTORA KLIFERSA

ESTIMACIÓN DE TRABAJO No. 2

MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO INICIA FRENTE A SUB-ESTACION PNC HACIA SECTOR LA BOMBA, BARRIO LAS JOYAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO

UBICACIÓN: BARRIO LAS JOYAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO

MONTO DEL CONTRATO: Q. 2,499,475.00

RENGLONES Y CANTIDADES CONTRATADAS						CANTIDADES EJECUTADAS (ACTUALES Y ACUMULADAS)						% EJECUTADO DEL RENGLÓN	% TOTAL EJECUTADO
No. RENGLÓN	DESCRIPCION DEL RENGLÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ESTE PERIODO	PERIODO ANTERIOR	ACUMULADO	ESTE PERIODO	PERIODO ANTERIOR	ACUMULADO		
	TRABAJOS PRELIMINARES												
1.1	Limpieza y Chapeo	3016.00	m2	Q 6.00	Q 18,096.00	3.25	3,012.75	3,016.00	Q 19.50	Q 18,076.50	Q 18,096.00	100.00%	0.72%
1.2	Replanteo topografico	480.00	m	Q 38.19	Q 18,331.20	0.00	480.00	480.00	Q -	Q 18,331.20	Q 18,331.20	100.00%	0.73%
1.3	Demolicion y retiro de Material	3016.00	m2	Q 68.00	Q 205,088.00	0.00	3,016.00	3,016.00	Q -	Q 205,088.00	Q 205,088.00	100.00%	8.21%
1.4	Corte de Cajuela + Cortes laterales Altura de corte 0.20m con retiro de material	434.00	m3	Q 254.00	Q 110,236.00	0.00	434.00	434.00	Q -	Q 110,236.00	Q 110,236.00	100.00%	4.41%
	BASE Y COMPACTACIÓN												
2.1	Conformacion de Subrasante	3016.00	m2	Q 21.00	Q 63,336.00	0.00	3,016.00	3,016.00	Q -	Q 63,336.00	Q 63,336.00	100.00%	2.53%
2.2	Tendido + compactación de base granular (e= 0.15 m. compactado)	434.00	m3	Q 313.00	Q 135,842.00	133.20	300.80	434.00	Q 41,691.60	Q 94,150.40	Q 135,842.00	100.00%	5.43%
	PAVIMENTO												
3.1	Pavimento concreto 4000 psi, e=0.15 mts (proporción 1:2:2, vibrado de concreto)	2898.00	m2	Q 518.00	Q 1,501,164.00	402.10	947.05	1,349.15	Q 208,288.90	Q 490,571.90	Q 698,860.80	46.55%	27.96%
3.2	Corte y sello de juntas en pavimento y bordillos	1495.00	m	Q 74.00	Q 110,630.00	0.00	0.00	0.00	Q -	Q -	Q -	0.00%	0.00%
	BORDILLOS												
4.1	Bordillo de concreto prefabricado de 0.15x0.50x0.30 de 210 kg/cm2	924.00	m2	Q 312.50	Q 288,750.00	0.00	0.00	0.00	Q -	Q -	Q -	0.00%	0.00%
	PINTURA												
5.1	Pintura en bordillos en parte interna y superior + vialetas	924.00	m	Q 51.95	Q 48,001.80	0.00	0.00	0.00	Q -	Q -	Q -	0.00%	0.00%
			Total cantidad contratada		Q 2,499,475.00		Cantidad ejecutada		Q 250,000.00	Q 999,790.00	Q 1,249,790.00	TOTAL %	50.00%

MONTO BRUTO DE ESTA ESTIMACIÓN	Q 250,000.00
MONTO BRUTO DE ESTA ESTIMACIÓN No. 1	Q 999,790.00
MONTO DE ESTIMACIONES	Q 1,249,790.00
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO 20%	Q 50,000.00
LIQUIDO A RECIBIR	Q 200,000.00

DEYLI SAMANTHA HERNÁNDEZ ARCHILA
PROPIETARIA
CONSTRUCTORA KLIFERSA


CONSTRUCTORA
KLIFERSA
Deyli Samantha Hernández Archila
Aldea Casas Viejas, Guastatoya, El Progreso


ING. JOEL AMADO ORELLANA
SUPERVISOR DE LA EMPRESA

JOEL AMADO ORELLANA
INGENIERO CIVIL
CON ENFASIS EN CONSTRUCCIONES RURALES
COLEGIADO No. 18,357

CONSTRUCTORA KLIFERSA
CONSTRUYENDO DESARROLLO NACIONAL

"MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO INICIA FRENTE A SUB-ESTACION PNC HACIA SECTOR LA BOMBA, BARRIO LAS JOYAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO"

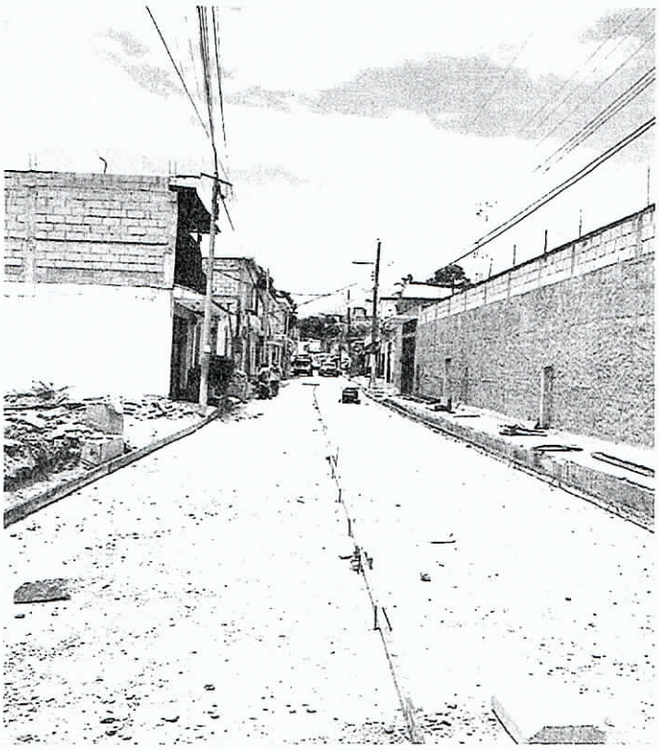

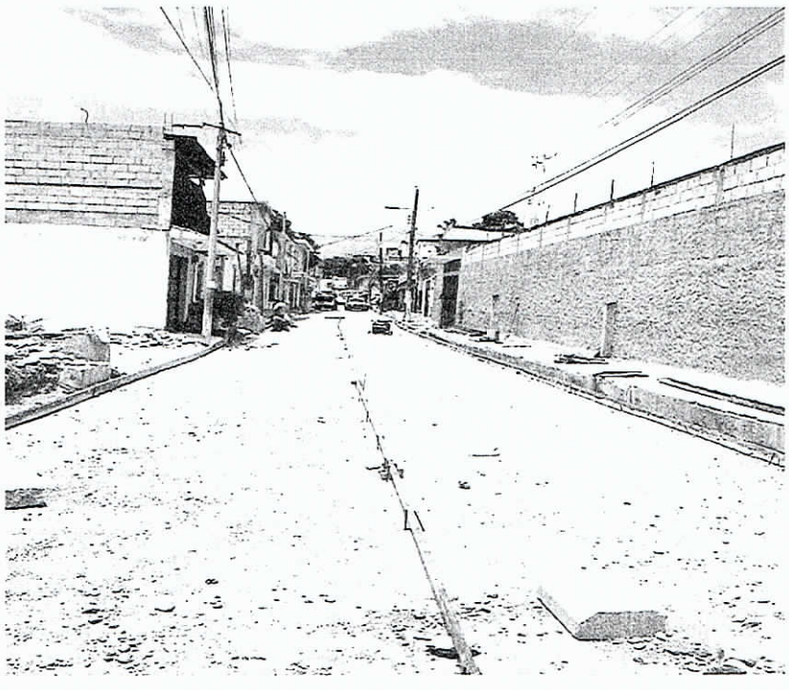

CONSTRUCTORA KLIFERSA
Deyli Samantha Hernández Archila
Aldea Casas Viejas, Guastatoya, El Progreso

Aldea Casas Viejas,
Guastatoya, El Progreso.
5460-3193
deylisamantha71@gmail.com

"MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO INICIA FRENTE A SUB-ESTACION PNC HACIA SECTOR LA BOMBA, BARRIO LAS JOYAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO"









CONSTRUCTORA
KLIFERSA
Deylí Samantha Hernández Archila
Aldea Casas Viejas, Guastatoya, El Progreso

Aldea Casas Viejas,
Guastatoya, El Progreso.
5460-3193
deylisamantha71@gmail.com

"MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO INICIA FRENTE A SUB-ESTACION PNC HACIA SECTOR LA BOMBA, BARRIO LAS JOYAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO"

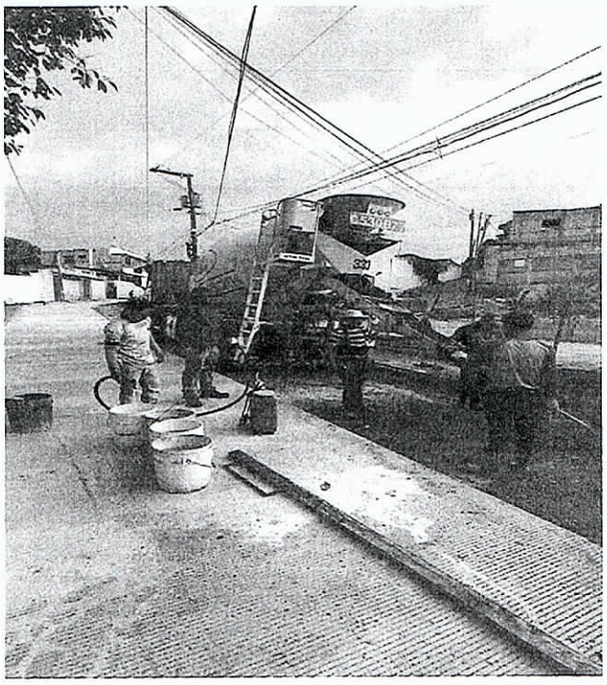


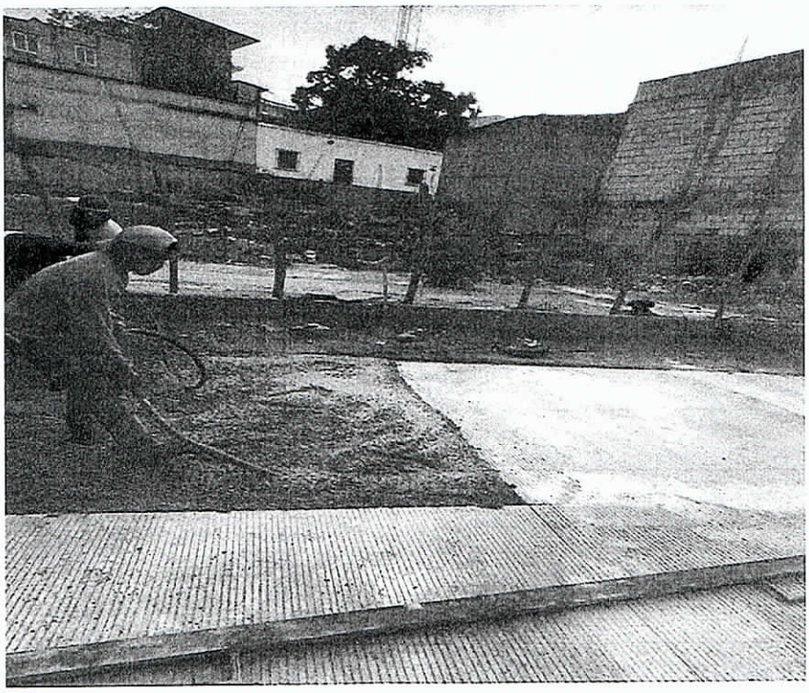


CONSTRUCTORA KLIFERSA
Deylí Samantha Hernández Archila
Aldea Casas Viejas, Guastatoya, El Progreso

Aldea Casas Viejas, Guastatoya, El Progreso.
5460-3193
deylisamantha71@gmail.com


"MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO INICIA FRENTE A SUB-ESTACION PNC HACIA SECTOR LA BOMBA, BARRIO LAS JOYAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO"

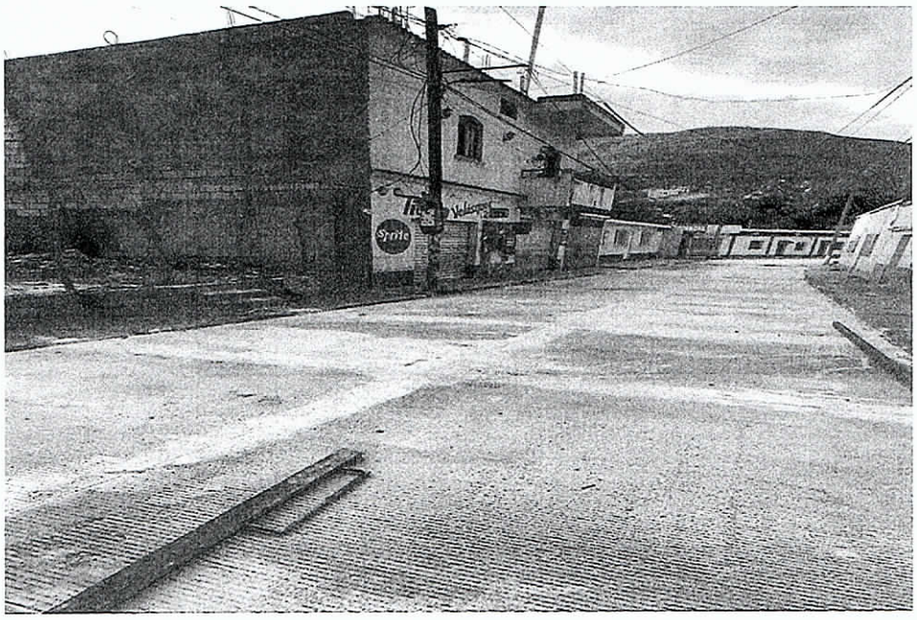

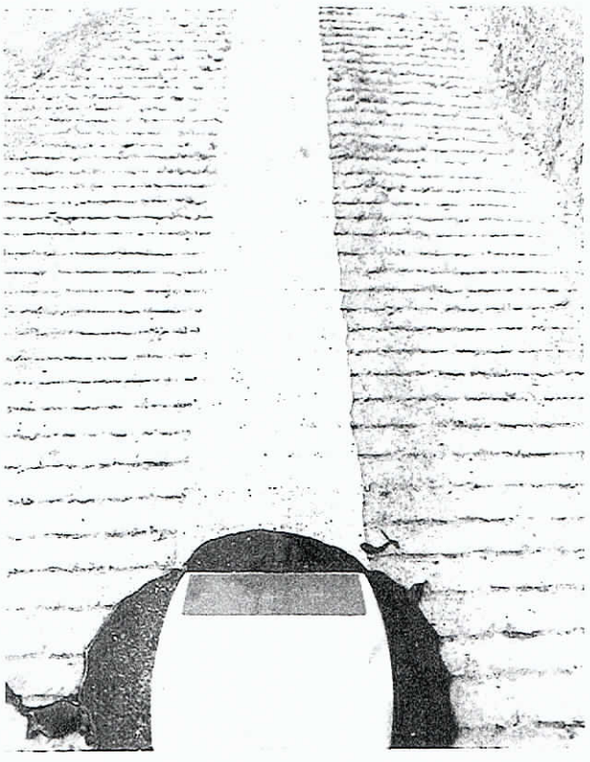

CONSTRUCTORA
KLIFERSA
Deyli Samantha Hernández Archila
Aldea Casas Viejas, Guastatoya, El Progreso

"MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO INICIA FRENTE A SUB-ESTACION PNC HACIA SECTOR LA BOMBA, BARRIO LAS JOYAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO"

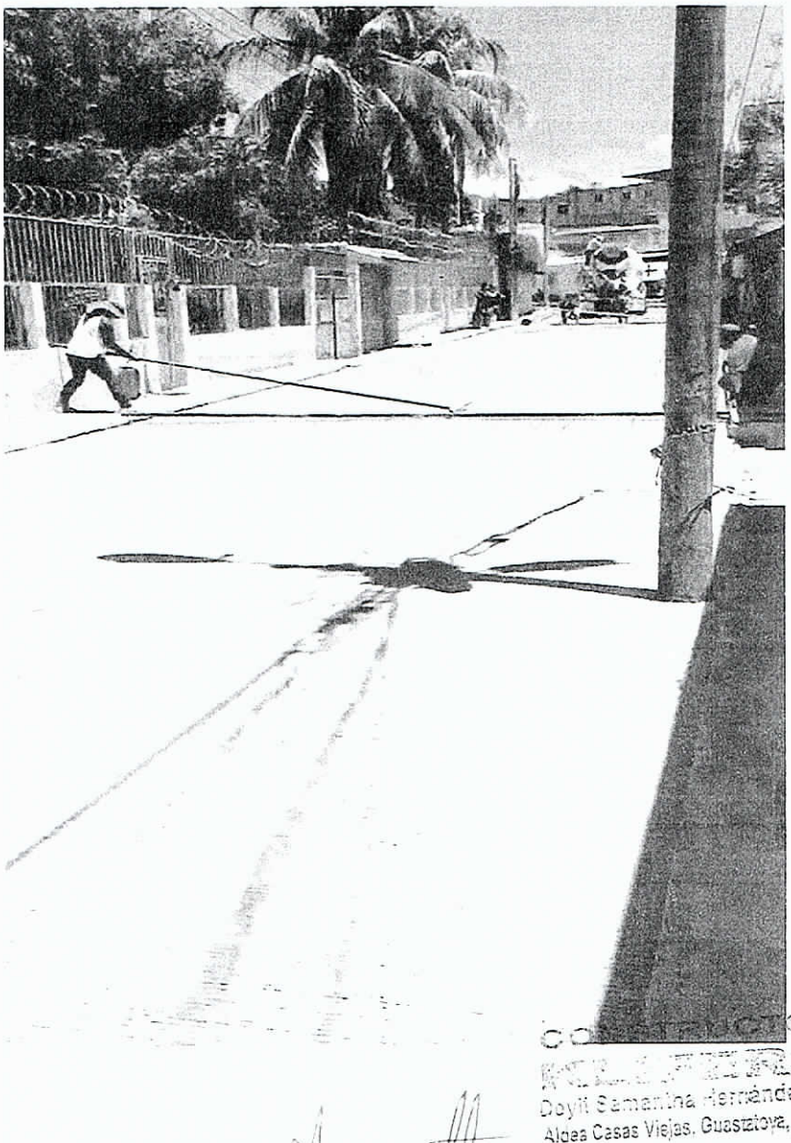

F._____
Deyli Samantha Hernández Archila
Propietaria
CONSTRUCTORA KLIFERSA

LA INFRASCRITA SECRETARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO,

CERTIFICA:

Que para su cumplimiento y efectos consiguientes se transcribe la **AUTENTICIDAD** del punto **CUARTO** del acta **51-2026** de fecha trece de julio de dos mil veintiséis del libro número 3,728 de sesiones ordinarias del Concejo Municipal, debidamente autorizado por la Contraloría General de Cuentas, el que copiado literalmente dice:

CUARTO: La Secretaria Municipal informa al Concejo Municipal que, Licenciado Alexis Geovanny Marroquín Orellana, Director de Planificación, presenta oficio Ref.agmo/DMP/200-2026, de fecha 10 de julio de 2026, el cual en su parte conducente expone: "El motivo de la presente es para informarle que el proyecto **MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO INICIA FRENTE A SUB-ESTACION PNC HACIA SECTOR LA BOMBA, BARRIO LAS JOYAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO**. Contrato administrativo número 01-2026 de fecha 30 de enero de 2026, ejecutado por la empresa **CONSTRUCTORA KLIFERSA**, presentó informe del 50.00% de avance físico. Por lo tanto solicito que apruebe el pago del 50.00% de avance físico del proyecto antes mencionado a la empresa **CONSTRUCTORA KLIFERSA** siendo su propietario la señora **DEYLI SAMANTHA HERNÁNDEZ ARCHILA**. Consiguientemente y en cumplimiento al numeral 1) de la Cláusula Cuarta del contrato en referencia, presenta el informe de supervisión signado por el ingeniero JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA, Supervisor de Obras Municipales, por medio del cual informa de la estimación, del avance físico del referido proyecto, indicando que se encuentra en un avance físico del 50.00%, anexa el detalle que contiene los renglones de trabajo para la presente estimación. **CONSIDERANDO:** Que el artículo 59 del Decreto número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado, establece: "Estimaciones para pago. La entidad contratante podrá hacer pagos parciales al contratista contra estimaciones periódicas de trabajo ejecutado y aceptado, las que podrán efectuarse mensualmente de acuerdo con las estipulaciones pactadas." **CONSIDERANDO:** Que el Artículo 35 literal a), del Decreto 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Código Municipal y sus reformas establece: Atribuciones Generales del Concejo Municipal "son atribuciones del Concejo Municipal: a) La iniciativa, deliberación y decisión de los asuntos municipales...". **POR TANTO:** El Concejo Municipal, con fundamento en lo considerado y las facultades que le confiere el Código Municipal y sus reformas Decreto 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala, **UNANIMIDAD DE VOTOS, ACUERDA: I)** Se tiene por recibido el oficio presentado, agregándose al expediente de mérito. **II) APROBAR**, el pago equivalente al avance físico del 50.00%, a favor de la empresa mercantil **CONSTRUCTORA KLIFERSA**, propiedad de la señora **DEYLI SAMANTHA HERNÁNDEZ ARCHILA** de conformidad con el monto de estimación de avance físico, anexa el detalle que contiene los renglones de trabajo para la presente estimación, presentados por el Supervisor de Obras Municipales del proyecto **"MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO INICIA FRENTE A SUB-ESTACION PNC HACIA SECTOR LA BOMBA, BARRIO LAS JOYAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO"**, el que se ejecuta con el contrato 01-2026. **III)** Se le ordena al Director de Administración Financiera Integrada Municipal, hacer las operaciones contables correspondientes y proceder al pago de conformidad con lo aprobado en el numeral romano II) del presente punto resolutivo. **IV)** Notifíquese.

(Fs) Ilegibles José Elías Herrera Guerra, Alcalde Municipal, Ing. Byron Fernando Calderón Ferrera y Eduardo Ortega Loaiza, Síndicos Primero y Segundo respectivamente, Hernan Archila Morales, Erasmo Beltetón Contreras, Nery Rolando Archila Orellana, Julio Mauricio Marroquín González, Fryda Aimée Estrada Ortiz, Concejales Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto, respectivamente y Licda. Evelyn Yaneth Oajaca Marroquín, Secretaria Municipal.

DADO EN EL PALACIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE GUASTATOYA, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, A CATORCE DÍAS DEL MES DE JULIO DE DOS MIL VEINTISÉIS.

SECRETARIA

LICDA. EVELYN YANETH OAJACA MARROQUÍN
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!
