Municipalidad de Guastatoya, Departamento de El Progreso

JUNTA RECEPTORA Y LIQUIDADORA DE OBRAS

LIBRO DE ACTAS DE RECEPCION DE OBRAS Nº 0265

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DELEGACION DEPARTAMENTAL GUASTATOYA EL PROGRESO GUATEMALA, C. A.

ACTA DE RECEPCION NUMERO 33-2025
IDENTIFICACION DEL PROYECTO NOG 26002485

En el municipio de Guastatoya, del departamento de El Progreso siendo las ocho horas en punto el día martes nueve de diciembre del año dos mil veinticinco; reunidos en el área donde se ejecutó el proyecto; **"MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS BORDOS, ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO."**; los miembros de la comisión receptora y liquidadora integrada por Melvin Mauricio Morales Rodas, Auxiliar de la Dirección Municipal de Planificación; Beverly Mishell Cruz Orellana, Secretaria de la Dirección Municipal de Planificación y Rudy Danilo Orellana Orellana, Encargado de Mantenimiento y Convoy Municipal; quienes fueron nombrados mediante el punto QUINTO del acta de sesiones ordinarias número 01-2025 de fecha uno de enero del año dos mil veinticinco, acompañados por el señor Tomas Reyes Picón, propietario y representante legal de la empresa denominada **"CONSTRUCTORA Y ELECTRICOS M. Y WALRUD"**, el ingeniero José Fulgencio Alexander Aguilar Mejía, Supervisor de Obras Municipales, con el objeto de dejar constancia de lo siguiente: **PRIMERO:** De conformidad con el contrato administrativo número CERO NUEVE guion dos mil VEINTICINCO (09-2025), de fecha cuatro de junio de dos mil veinticinco, suscrito entre el señor Tomas Reyes Picón, propietario de la empresa denominada: **"CONSTRUCTORA Y ELECTRICOS M. Y WALRUD"**, para la ejecución del proyecto "**MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS BORDOS, ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO"**. **SEGUNDO:** El señor Tomas Reyes Picón, representante legal de la empresa **"CONSTRUCTORA Y ELECTRICOS M. Y WALRUD"**, mediante nota de fecha ocho de diciembre de dos mil veinticinco, dirigida al señor Alcalde Municipal, en la cual solicita la recepción del proyecto ya que se encuentra totalmente finalizado; así mismo el informe del ingeniero José Fulgencio Alexander Aguilar Mejía, Supervisor de Obras Municipales, de fecha ocho de diciembre de dos mil veinticinco, mediante el cual hace notar que luego de haber supervisado físicamente lo ejecutado con relación a planos y demás documentos el proyecto en referencia se encuentra totalmente terminado en sus renglones de trabajo, por lo que manifiesta que la obra se ejecutó en un 100% de avance físico; según los renglones finales que se detallan: ----------

Núm.	DESCRIPCION DEL REGLON	CANTIDAD	UNIDAD
1	TRABAJOS PRELIMINARES	1531.00	M2
2	CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO A NIVEL DE RASANTE EXISTENTE	1531.00	M2
3	COLOCACION + COMPACTACION DE BASE GRANULAR DE ESPESOR DE 0.10 MTS	1531.00	M2
4	CAMA DE ASIENTO DE ARENA	1399.00	M2
5	COLOCACION DE ADOQUIN TRAFICO PESADO RESISTENCIA 280 KG/CM2	1322.00	M2
6	LLAVES DE CONFINAMIENTO LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES DE 0.10 X 0.25 MTS RESISTENCIA 280 KG/CM2	637.52	ML
7	BORDILLO FUNDIDO DE 0.10 X 0.30 MTS RESISTENCIA 280 KG/CM2	446.20	ML
8	RAMPA DE INGRESO E=0.15 MTS RESISTENCIA 280 KG/CM2	14.06	M2
9	PINTURA PARA TRAFICO PESADO EN LINEA CENTRAL	1.00	UNIDAD
10	PAVIMENTACIÓN	20.30	M2
11	MURO DE CONTENCION	10.00	M3

TERCERO: Luego de la verificación se procede a la **RECEPCIÓN** del Proyecto antes detallado a entera satisfacción de lo ejecutado, razón por la cual por este acto la Comisión Receptora y Liquidadora se pronuncia favorablemente a lo ejecutado por la empresa **"CONSTRUCTORA Y ELECTRICOS M. Y WALRUD"** siendo el representante legal el señor Tomas Reyes Picón. **CUARTO:** Finalmente esta comisión, solicita que a nivel administrativo se requiera al Director Financiero de la Dirección Administrativa Financiera Integrada Municipal, un informe financiero del presente proyecto para poder proceder posteriormente con el acta de liquidación respectiva. **QUINTO:** De acuerdo a lo anterior se deja constancia plena que el día de hoy se **RECEPCIONA** el proyecto correspondiente y que no tenemos ningún tipo de impedimento para realizar dicha diligencia. **CIERRE:** No habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la presente, treinta minutos después de su inicio, en el mismo lugar y fecha, la que previa lectura se acepta, ratifica y se firma para constancia legal, damos fe quienes en ella intervenimos. ----------

Melvin Mauricio Morales Rodas
Auxiliar de la Dirección Municipal de Planificación
Miembro Titular de la Comisión de Recepción

Beverly Mishell Cruz Orellana
Secretaria de la Dirección Municipal de Planificación
Miembro Titular de la Comisión de Recepción

Rudy Danilo Orellana Orellana
Encargado de Mantenimiento y Convoy Municipal
Miembro Titular de la Comisión de Recepción

Tomas Reyes Picón
Propietario y Representante Legal de la Empresa
CONSTRUCTORA Y ELECTRICOS M. Y WALRUD

CONSTRUCTORA Y ELECTRICOS M Y WALRUD
NIT. 284134-7 / PROP. TOMAS REYES PICON
ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA EL PROGRESO

José F. Alexander Aguilar Mejía
Ingeniero Civil
Colegiado No. 9,366

COMISIÓN DE RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
¡Sirviendo!

José Fulgencio Alexander Aguilar Mejía
Supervisor de Obras Municipal

Constructora y eléctricos M. y WalRud.
Aldea Casas Viejas, Guastatoya, El Progreso
Cel. 5989-4109
tcons53walrud@gmail.com

Guastatoya 08 de diciembre del 2025

Señor José Elías Herrera

Alcalde Municipal de Guastatoya

Señor alcalde de la manera más atenta y respetuosa me dirijo a usted deseándole éxitos al frente de tan importante institución como lo es la Municipalidad de Guastatoya.

El motivo de la presente es para Solicitar Autorice la Estimación al 100% del proyecto denominado Mejoramiento Calle rural Sector los Bordos aldea Tierra Blanca Guastatoya el Progreso.

Agradeciendo de antemano su atención prestada a la presente me despido de usted.

Atentamente

Tomás Reyes Picón

Propietario

CONSTRUCTORA Y ELECTRICOS
M Y WALRUD
NIT. 284134-7 / PROP. TOMAS REYES PICON
ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA EL PROGRESO

Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que

Constructora y eléctricos M y WalRud.
Aldea Casas Viejas, Guastatoya, El Progreso
Cel. 5989-4109
tcons53walrud@gmail.com

PRESUPUESTO GENERAL, ESTIMACION AL 100%
MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS BORDOS, ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO		DOCUMENTO DE CAMBIO No. 1 DECREMENTO			DOCUMENTO DE CAMBIO No. 2 OTS INCREMENTO			DOCUMENTO DE CAMBIO No. 3 ATE INCREMENTO			CANTIDADES MODIFICADAS		
				UNITARIO	TOTAL	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
1	TRABAJOS PRELIMINARES	1,531.00	M2	Q 10.50	Q 16,075.50		Q 10.50	Q -		Q 10.50	Q -				1,531.00	Q 10.50	Q 16,075.50
2	CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO A NIVEL DE RASANTE EXISTENTE	1,531.00	M2	Q 130.23	Q 199,382.13		Q 130.23	Q -		Q 130.23	Q -				1,531.00	Q 130.23	Q 199,382.13
3	COLOCACION + COMPACTACION DE BASE GRANULAR DE ESPESOR DE 0.10 MTS	1,531.00	M2	Q 145.40	Q 222,607.40		Q 145.40	Q -		Q 145.40	Q -				1,531.00	Q 145.40	Q 222,607.40
4	CAMA DE ASIENTO DE ARENA	1,399.00	M2	Q 31.83	Q 44,530.17		Q 31.83	Q -		Q 31.83	Q -				1,399.00	Q 31.83	Q 44,530.17
5	COLOCACION DE ADOQUIN TRAFICO PESADO RESISTENCIA 280 KG/CM2	1,399.00	M2	Q 261.57	Q 365,936.43	77.00	Q 261.57	Q 20,140.89		Q 261.57	Q -				1,322.00	Q 261.57	Q 345,795.54
6	LLAVES DE CONFINAMIENTO LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES DE 0.10 X 0.25 MTS RESISTENCIA 280 KG/CM2	633.00	ML	Q 112.25	Q 71,054.25		Q 112.25	Q -	4.52	Q 112.25	Q 507.37				637.52	Q 112.25	Q 71,561.62
7	BORDILLO FUNDIDO DE 0.10 X 0.30 MTS RESISTENCIA 280 KG/CM2	450.00	ML	Q 137.00	Q 61,650.00	3.80	Q 137.00	Q 520.60		Q 137.00	Q -				446.20	Q 137.00	Q 61,129.40
8	RAMPA DE INGRESO E=0.15 MTS RESISTENCIA 280 KG/CM2	22.00	M2	Q 567.00	Q 12,474.00	7.94	Q 567.00	Q 4,501.98		Q 567.00	Q -				14.06	Q 567.00	Q 7,972.02
9	PINTURA PARA TRAFICO PESADO EN LINEA CENTRAL	1.00	UNIDAD	Q 7,090.12	Q 7,090.12		Q 7,090.12	Q -		Q 7,090.12	Q -				1.00	Q 7,090.12	Q 7,090.12
	TRABAJOS EXTRAS																
10	PAVIMENTACION		M2	Q 550.00								20.30	Q 550.00	Q 11,165.00	20.30	Q 550.00	Q 11,165.00
11	MURO DE CONTENCION		M3	Q 1,350.00								10.00	Q 1,350.00	Q 13,500.00	10.00	Q 1,350.00	Q 13,500.00
	UN MILLON OCHOCIENTOS MIL QUETZALES EXACTOS				Q 1,000,800.00			Q 25,163.47			Q 507.37			Q 24,666.00			Q 1,000,808.90
								2.51%			0.05%			2.46%			100.00%

Vo. Bo. _____
JOSE ELIAS HERRERA GUERRA
ALCALDE MUNICIPAL

TOMAS REYES PICON
CONSTRUCTORA Y LECTRICOS M& WALRUD.

CONSTRUCTORA Y ELECTRICOS
M Y WALRUD
NIT. 284134-7 / PROP. TOMAS REYES PICON
ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA EL PROGRESO

Luis Leonel Urizar Muñoz
Ingeniero Civil
Colegiado 4,001

MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!

5980-0535 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
BARRIO EL CALVARIO, **GUASTATOYA EL PROGRESO**

INFORME DE SUPERVISION

Guastatoya, 08 de Diciembre de 2025

SEÑOR: JOSE ELIAS HERRERA GUERRA Y CONSEJO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
EL PROGRESO

De la manera más atenta me dirijo a usted deseándole toda clase de éxitos en sus labores diarias.

El motivo de la presente es para hacerle saber lo siguiente:

En visita de supervisión realizada al proyecto denominado **MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS BORDOS, ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO,** con número de contrato **09-2025** de fecha 04 de Junio de 2025, ejecutado por la empresa **CONSTRUCTORA Y ELECTRICOS M. Y WALRUD**, financiado por la Municipalidad de Guastatoya, se tiene a la vista el oficio de Diciembre de 2025 en el cual se hace la solicitud de la estimación del proyecto para un avance del **100.00%**, para lo cual se adjunta el informe de supervisión y el informe de parte de la empresa.

Agradeciendo su atención y en espera de darle seguimiento a este asunto me suscribo de ustedes.

Atentamente

José F. Alexander Aguilar Mejia
Ingeniero Civil
Colegiado No. 9,366

ING. JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA
SUPERVISOR MUNICIPAL, GUASTATOYA
EL PROGRESO

D.M.P.	SUPERVISION DE OBRAS	Dirección Municipal de Planificación

Comunidad.	Contrato Municipal.
Aldea Tierra Blanca, Guastatoya, El Progreso	07-2025

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del proyecto.	Ubicación del proyecto.
MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS BORDOS, ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Aldea Tierra Blanca, Guastatoya, El Progreso
Contratista. CONSTRUCTORA Y ELECTRICOS M. Y WALRUD **Monto Contratado.** Q 1,000,800.00	**Ubicación del proyecto.** Aldea Tierra Blanca, Guastatoya, El Progreso **Avance Físico.** 100.00%
Informe de Supervisión No. 3	**Fecha.** 08 de Diciembre de 2025

2. AVANCE DE EJECUCION DEL PROYECTO

No.	Descripcion del Renglón	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Total a la Fecha	Avance Fisico %
1	TRABAJOS PRELIMINARES	-	M2	Q 10.50	Q -	Q 16,075.50	100%
2	CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO A NIVEL DE RASANTE EXISTENTE	-	M2	Q 130.23	Q -	Q 199,382.13	100%
3	COLOCACION + COMPACTACION DE BASE GRANULAR DE ESPESOR DE 0.10 MTS	231.00	M2	Q 145.40	Q 33,587.40	Q 222,607.40	100%
4	CAMA DE ASIENTO DE ARENA	259.00	M2	Q 31.83	Q 8,243.97	Q 44,530.17	100%
5	COLOCACION DE ADOQUIN TRAFICO PESADO RESISTENCIA 280 KG/CM2	317.87	M2	Q 261.57	Q 83,144.36	Q 345,795.54	100%
6	LLAVES DE CONFINAMIENTO LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES DE 0.10 X 0.25 MTS RESISTENCIA 280 KG/CM2	137.52	ML	Q 112.25	Q 15,436.62	Q 71,561.62	100%
7	BORDILLO FUNDIDO DE 0.10 X 0.30 MTS RESISTENCIA 280 KG/CM2	146.20	ML	Q 137.00	Q 20,029.40	Q 61,129.40	100%
8	RAMPA DE INGRESO E=0.15 MTS RESISTENCIA 280 KG/CM2	14.06	M2	Q 567.00	Q 7,972.02	Q 7,972.02	100%
9	PINTURA PARA TRAFICO PESADO EN LINEA CENTRAL	1.00	UNIDAD	Q 7,090.12	Q 7,090.12	Q 7,090.12	100%
10	PAVIMENTACIÓN	20.30	M2	Q 550.00	Q 11,165.00	Q 11,165.00	100%
11	MURO DE CONTENCION	10.00	M3	Q 1,350.00	Q 13,500.00	Q 13,500.00	100%
					Q 200,168.89	Q 1,000,808.90	100.00%

Estos renglones de trabajo dan como resultado un avance físico del **100.00%** **por lo cual se aprueba realizar el pago correspondiente**

3. DESCRIPCION DEL PROYECTO.

Este proyecto consiste en el mejoramiento de la calle que sirve de ingreso hacia la aldea tierra blanca, en el sector los bordos, de guastatoya, el progreso, la cual se encuentra de terraceria y se va a mejorar utilizando pavimento y bordillos fundidos

4. RECOMENDACIONES.

Chequear los trabajos realizados para garantizar la durabilidad de los mismos, y terminar los trabajos faltantes, los que no se encuentran al 100 % y los que no se han iniciado aun

SUPERVISOR DE PROYECTOS MUNICIPALES.

José F. Alexander Aguilar Mejia
Ingeniero Civil
Colegiado No. 9,366

ING. JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA
SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES

ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
¡Sirviendo!

JOSE ELIAS HERRERA GUERRA
ALCALDE MUNICIPAL DE GUASTATOYA


D.M.P.	SUPERVISION DE OBRAS	Dirección Municipal de Planificación


1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del proyecto.	Ubicación del proyecto.
MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS BORDOS, ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Aldea Tierra Blanca, Guastatoya, El Progreso

2. INFORME FOTOGRAFICO.



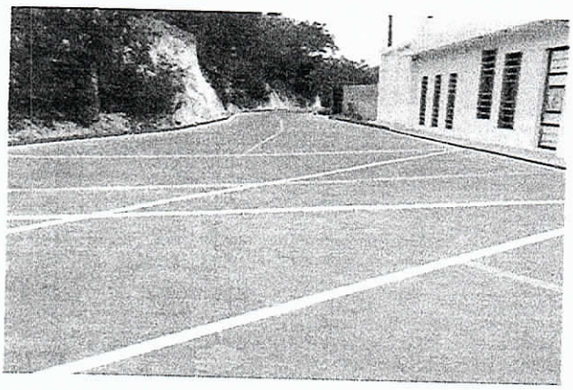

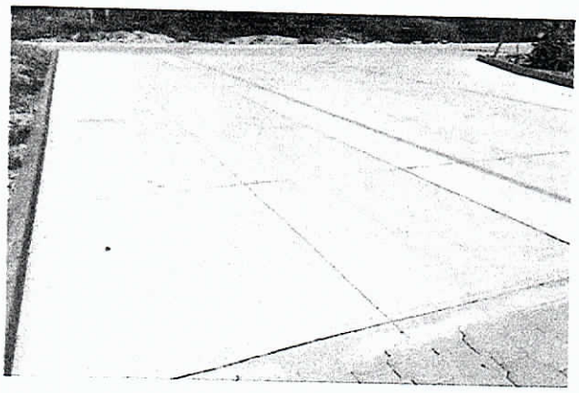







SUPERVISOR DE PROYECTOS MUNICIPALES.

José F. Alexander Aguilar Mejía
Ingeniero Civil
Colegiado No. 9,366

ING. JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA
SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES

ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
¡Sirviendo!

JOSE ELIAS HERRERA GUERRA
ALCALDE MUNICIPAL DE GUASTATOYA

REPORTE DE AVANCE FISICO No. 3

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS BORDOS, ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	
Municipio: GUASTATOYA	Departamento: EL PROGRESO
Comunidad: ALDEA TIERRA BLANCA	Fecha de Contrato: 04/06/2025
Fecha de Inicio: 12/06/2025	Fecha de Supervision: 08/12/2025
Fecha de Finalizacion: 11/10/2025	Unidad Ejecutora: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
Contrato No.: 09-2025	Valor del Proyecto: Q.1,000,800.00
Modificaciones:	Valor Original: Q.1,000,800.00
Constructora: CONSTRUCTORA Y ELECTRICOS M. Y WALRUD	Telefono:
Representante legal: TOMAS REYES PICON	

RESUMEN DE RENGLONES

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES DE TRABAJO				ORDEN DE CAMBIO	ORDEN DE TRABAJO SUPLEMENTARIO	ORDEN DE TRABAJO EXTRA	RENGLON MODIFICADO	CANTIDADES EJECUTADAS TERCERA ESTIMACION		ACUMULADO A LA FECHA		PORCENTAJE
		CANTIDAD	UNIDAD	P UNITARIO	TOTAL	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	TOTAL
1	TRABAJOS PRELIMINARES	1,531.00	M2	Q 10.50	Q 16,075.50				1,531.00	-	Q -	1,531.00	Q 16,075.50	1.61%
2	CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO A NIVEL DE RASANTE EXISTENTE	1,531.00	M2	Q 130.23	Q 199,382.13				1,531.00	-	Q -	1,531.00	Q 199,382.13	19.92%
3	COLOCACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR DE ESPESOR DE 0.10 MTS	1,531.00	M2	Q 145.40	Q 222,607.40				1,531.00	231.00	Q 33,587.40	1,531.00	Q 222,607.40	22.24%
4	CAMA DE ASIENTO DE ARENA	1,399.00	M2	Q 31.83	Q 44,530.17				1,399.00	259.00	Q 8,243.97	1,399.00	Q 44,530.17	4.45%
5	COLOCACION DE ADOQUIN TRAFICO PESADO RESISTENCIA 280 KG/CM2	1,399.00	M2	Q 261.57	Q 365,936.43	77.00			1,322.00	317.87	Q 83,144.36	1,322.00	Q 345,795.54	34.56%
6	LLAVES DE CONFINAMIENTO LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES DE 0.10 X 0.25 MTS RESISTENCIA 280 KG/CM2	633.00	ML	Q 112.25	Q 71,054.25		4.52		637.52	137.52	Q 15,436.62	637.52	Q 71,561.62	7.15%
7	BORDILLO FUNDIDO DE 0.10 X 0.30 MTS RESISTENCIA 280 KG/CM2	450.00	ML	Q 137.00	Q 61,650.00	3.80			446.20	146.20	Q 20,029.40	446.20	Q 61,129.40	6.11%
8	RAMPA DE INGRESO E=0.15 MTS RESISTENCIA 280 KG/CM2	22.00	M2	Q 567.00	Q 12,474.00	7.94			14.06	14.06	Q 7,972.02	14.06	Q 7,972.02	0.80%
9	PINTURA PARA TRAFICO PESADO EN LINEA CENTRAL	1.00	UNIDAD	Q 7,090.12	Q 7,090.12				1.00	1.00	Q 7,090.12	1.00	Q 7,090.12	0.71%
	TRABAJOS EXTRAS													
10	PAVIMENTACIÓN	20.30	M2	Q 550.00	Q 11,165.00			20.30	20.30	20.30	Q 11,165.00	20.30	Q 11,165.00	1.12%
11	MURO DE CONTENCION	10.00	M3	Q 1,350.00	Q 13,500.00			10.00	10.00	10.00	Q 13,500.00	10.00	Q 13,500.00	1.35%
	COSTO TOTAL DEL PROYECTO				Q 1,000,800.00						Q 200,168.89		Q 1,000,808.90	100.00%

VALOR DE ESTIMACION No. 3	Q 200,168.89
AMORTIZACION DEL ANTICIPO (20%)	Q 40,032.00
PENDIENTE DE AMORTIZAR	Q -
LIQUIDO A RECIBIR	Q 160,136.89

José F. Alexander Aguilar Mejía
Ingeniero Civil
Colegiado No. 9,366

JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES

JOSE ELIAS HERRERA GUERRA
ALCALDE MUNICIPAL GUASTATOYA

ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
¡Sirviendo!

Contraloría General de Cuentas
GUATEMALA, C.A.

Bitácora Electrónica

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA Y GESTIÓN AMBIENTAL

UNIDAD DE BITÁCORAS – DATOS DE LA BITÁCORA ELECTRÓNICA –

BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 3005/06/2025

No. CONTRATO	09-2025
FECHA CONTRATO	04/06/2025
MONTO CONTRACTUAL	1,000,800.00
NOG	26002485
NOMBRE DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS BORDOS, ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO
UBICACIÓN DEL PROYECTO	Guastatoya, EL PROGRESO
ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
NOMBRE DEL SUPERVISOR	LUIS LEONEL URIZAR MUÑOZ
EMPRESA EJECUTORA	TOMAS REYES PICON
REPRESENTANTE LEGAL O CONTRATISTA	TOMAS REYES PICON
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA
SUPERVISOR EMPRESA SUPERVISORA	

FECHA DE AUTORIZACIÓN 10/06/2025

BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 3005/06/2025

CONTRATO No. 09-2025

NOMBRE: MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS BORDOS, ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

REGISTRO No.	1
FECHA	24/06/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	BITACORA DE INICIO DE PROYECTO se adjunta acta de inicio para hacer constar el inicio de los trabajos a realizar en el proyecto MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS BORDOS, ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA

DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION

LIBRO DE ACTAS DE INICIO DE OBRAS

Nº 0195

ACTA DE INICIO NO. 15-2025

PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS BORDOS, ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO. IDENTIFICADO CON NOG. 26002485, EN GUATECOMPRAS. ----------

En el Municipio de Guastatoya, Departamento El Progreso, siendo las ocho horas en punto del día jueves doce de junio de dos mil veinticinco, reunidos en el área donde se va a ejecutar el Proyecto, **MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS BORDOS, ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO.** Los señores: José Elías Herrera Guerra, Alcalde Municipal; Ing. José Fulgencio Alexander Aguilar Mejía, Supervisor de Obras Municipales; Tomas Reyes Picón, Representante Legal de la Empresa Constructora; Ing. Luis Leonel Urizar Muñoz, Supervisor Residente del Proyecto; Lic. Alexis Geovanny Marroquín Orellana, Director de la Dirección Municipal de Planificación; con el objeto de dejar constancia de lo siguiente. **PRIMERO:** Se faciona la presente acta para dejar constancia de Inicio del Proyecto: **MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS BORDOS, ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO.** El cual será ejecutado con fondos provenientes del aporte constitucional para la inversión del ejercicio fiscal 2,025 de forma tripartita (Consejo Departamental de Desarrollo, Municipalidad, Consejo Comunitario de Desarrollo); por un Valor de Un Millón Ochocientos Quetzales Exactos (Q. 1,000,800.00), con un plazo de cuatro meses calendario el cual, por adjudicación en los procesos y requisitos de GUATECOMPRAS, lo ejecutará la empresa **CONSTRUCTORA Y ELECTRICOS M. Y WALRUD,** Habiendo sido publicado en el Sistema de Guatecompras la adjudicación bajo el NOG- 26002485, Según Contrato Administrativo No. 09-2025 de fecha cuatro de junio del dos mil veinticinco. **SEGUNDO:** Los señores anteriormente mencionados declaran iniciados los trabajos, los cuales se realizarán con base a planos y especificaciones elaboradas para el presente proyecto y de acuerdo al contrato respectivo. **TERCERO:** El Señor Alcalde Municipal recomienda al representante de la empresa constructora, al supervisor residente de la empresa y supervisor de obras municipales que los trabajos sean ejecutados en base al diseño y especificaciones propias de este proyecto y presentar los avances del mismo para el pago respectivo con la documentación de soporte. **CUARTO:** No habiendo más que agregar se da por terminada la presente en el mismo lugar y fecha media hora después de su inicio. Leída se acepta, ratifica y firma por los que en ella intervenimos Damos fe. ------

José Elías Herrera Guerra
Alcalde Municipal

Lic Alexis Geovanny Marroquín Orellana
Director
Dirección Municipal de Planificación

Tomas Reyes Picón
Representante de la empresa

CONSTRUCTORA Y ELECTRICOS M Y WALRUD
NIT. 7841347-7 PROP. TOMAS REYES PICON
ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA EL PROGRESO

Ing. Luis Leonel Urizar Muñoz
Supervisor Residente

Ing. José Fulgencio Alexander Aguilar Mejía
Supervisor de Obras Municipales

BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 3005/06/2025

CONTRATO No. 09-2025

NOMBRE: MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS BORDOS, ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

REGISTRO No.	2
FECHA	15/07/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	Se construyen muros de contención previo a la colocación de pavimento, se cuenta con personal y materiales suficientes para el avance del proyecto
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA









BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 3005/06/2025

CONTRATO No. 09-2025

NOMBRE: MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS BORDOS, ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

REGISTRO No.	3
FECHA	22/07/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	Se realiza la fundicion de bordillos y la colocación de base, se cuenta con personal y materiales suficientes para el avance del proyecto p
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA













BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 3005/06/2025

CONTRATO No. 09-2025

NOMBRE: MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS BORDOS, ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

REGISTRO No.	4
FECHA	09/08/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	Se tiene lista la base para la colocación de adoquin y el bordillo ya se encuentra fundido
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA







MEJORAMIENTO CALLE BALNEARIO LOS BORDOS, ALDEA TIERRA BLANCA, CUASTATOYA, EL PROGRESO
CODIGO SNIP: 321020
APORTE IVA-PAZ Q.1,000,000.00
1504





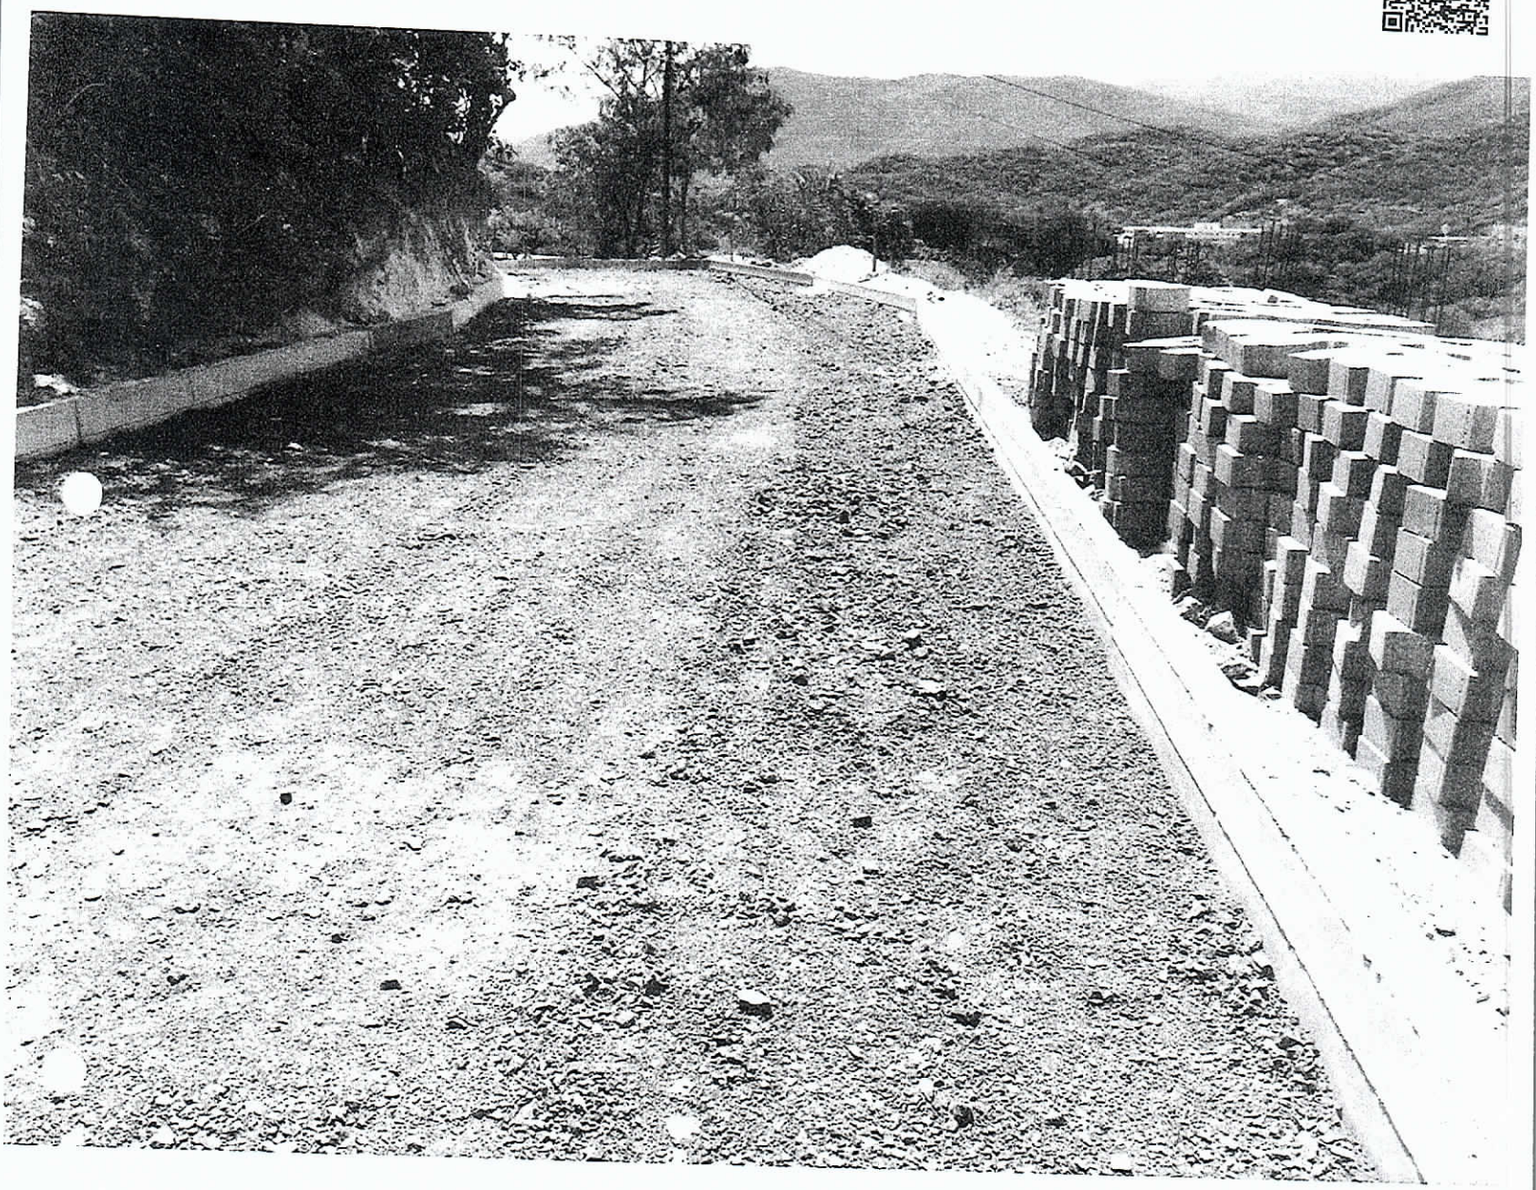



BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 3005/06/2025


CONTRATO No. 09-2025

NOMBRE: MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS BORDOS, ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

REGISTRO No.	5
FECHA	23/08/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	Se realiza la colocación de adoquin y bordillo fundido, se cuenta con personal y materiales suficientes para el avance del proyecto
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA



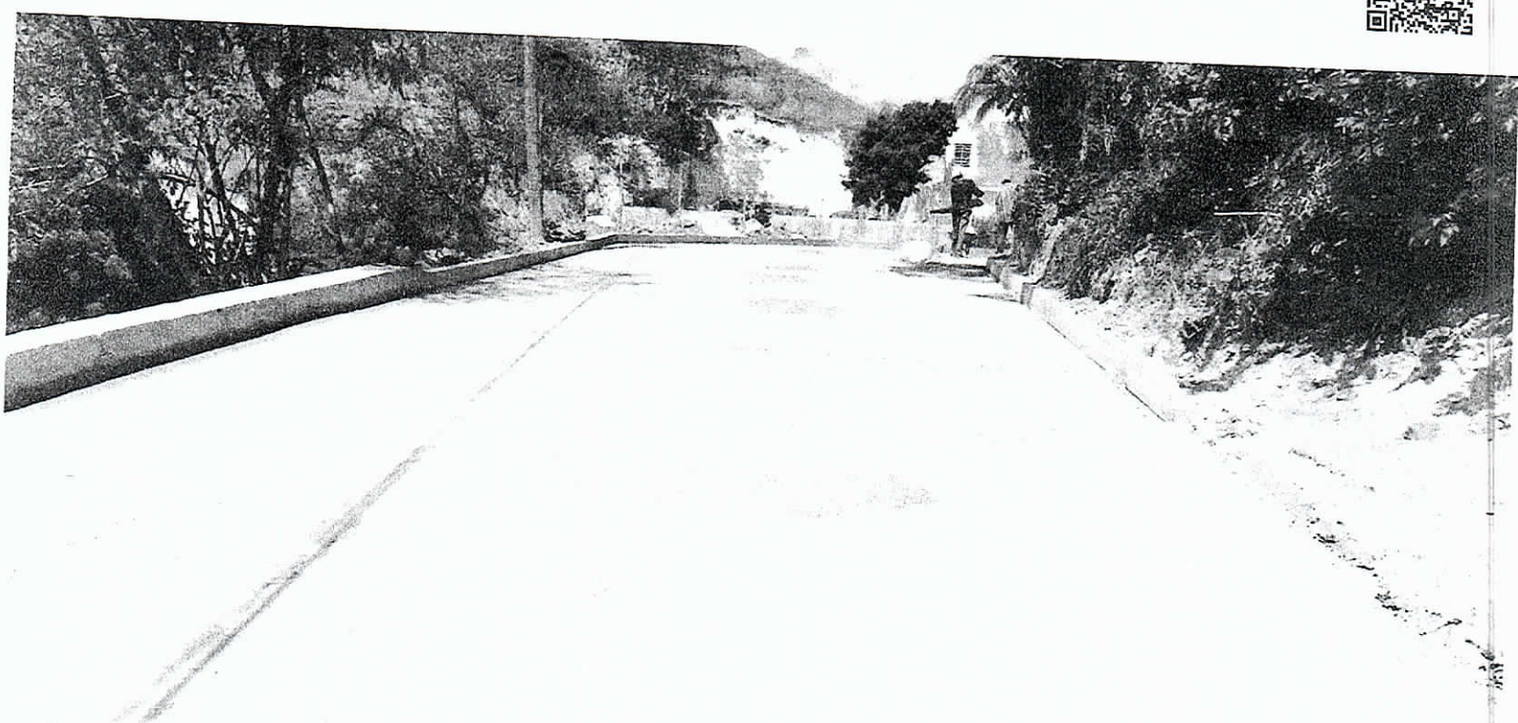









BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 3005/06/2025

CONTRATO No. 09-2025

NOMBRE: MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS BORDOS, ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

REGISTRO No.	6
FECHA	30/08/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	Se continua con la colocación de adoquin y bordillo fundido, se cuenta con personal y materiales suficientes para el avance del proyecto
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA













BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 3005/06/2025

CONTRATO No. 09-2025

NOMBRE: MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS BORDOS, ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

REGISTRO No.	7
FECHA	08/09/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	Se continua con la colocación de adoquin y bordillo fundido, se cuenta con personal y materiales suficientes para el avance del proyecto
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA










APORTE IVA-PAZ Q 1,000,800.00
Costo del Proyecto
1504



BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 3005/06/2025

CONTRATO No. 09-2025

NOMBRE: MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS BORDOS, ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

REGISTRO No.	8
FECHA	20/09/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	Se realiza el tallado de bordillos y la colocación de adoquin, se cuenta con personal y materiales suficientes para el avance del proyecto
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA






1504









BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 3005/06/2025

CONTRATO No. 09-2025


NOMBRE: MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS BORDOS, ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO


ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

REGISTRO No.	9
FECHA	29/09/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	Se realiza la colocación de adoquin y bordillo
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA





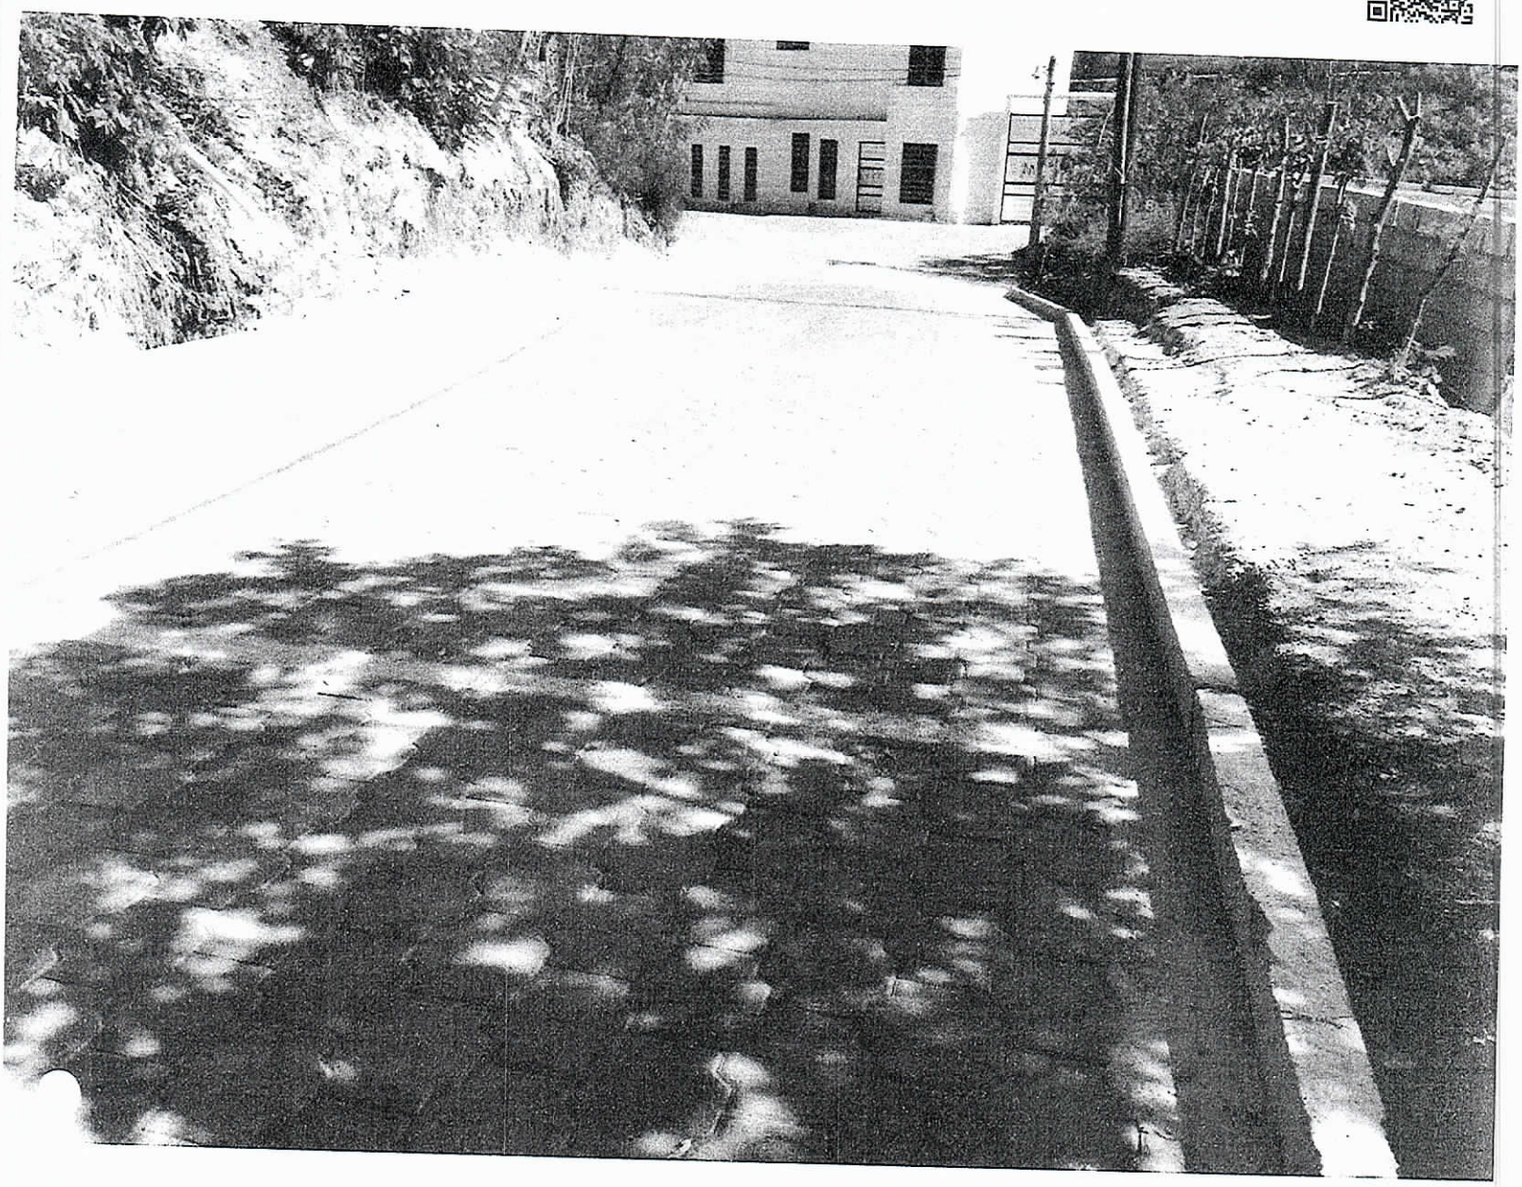

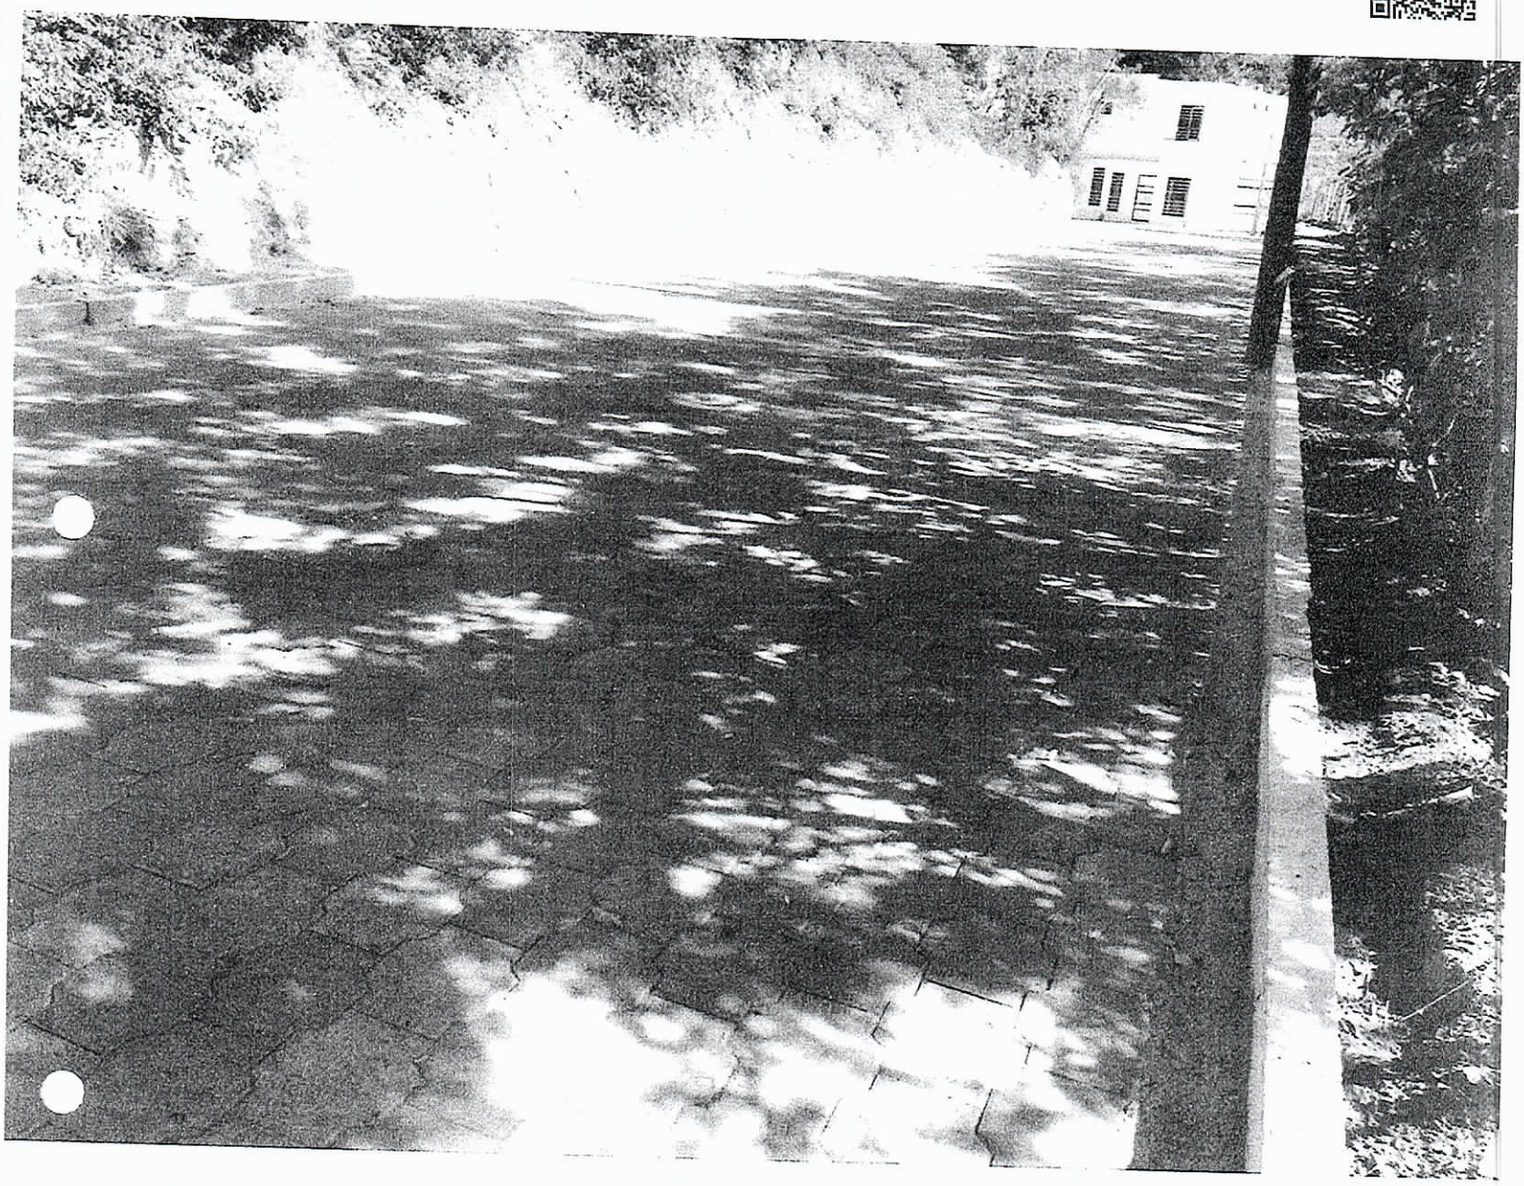








BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 3005/06/2025


CONTRATO No. 09-2025


NOMBRE: MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS BORDOS, ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO


ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA


REGISTRO No.	10
FECHA	25/10/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	El proyecto se encuentra en fase de terminación
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA

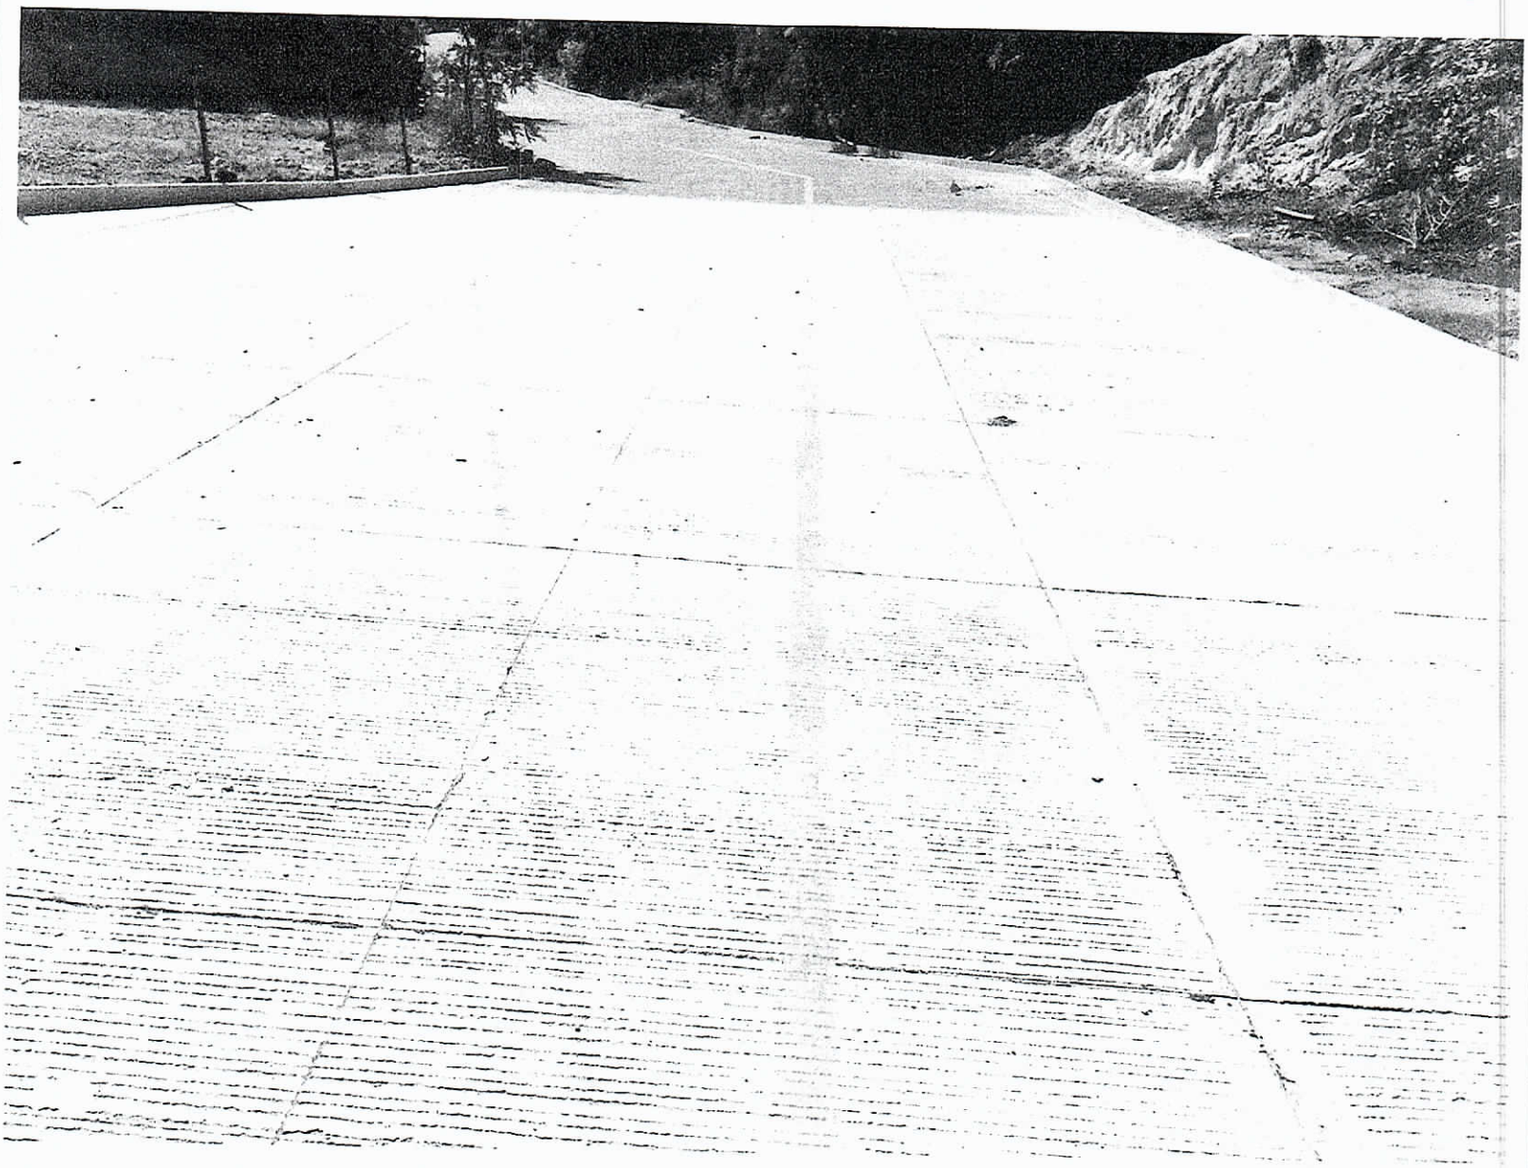

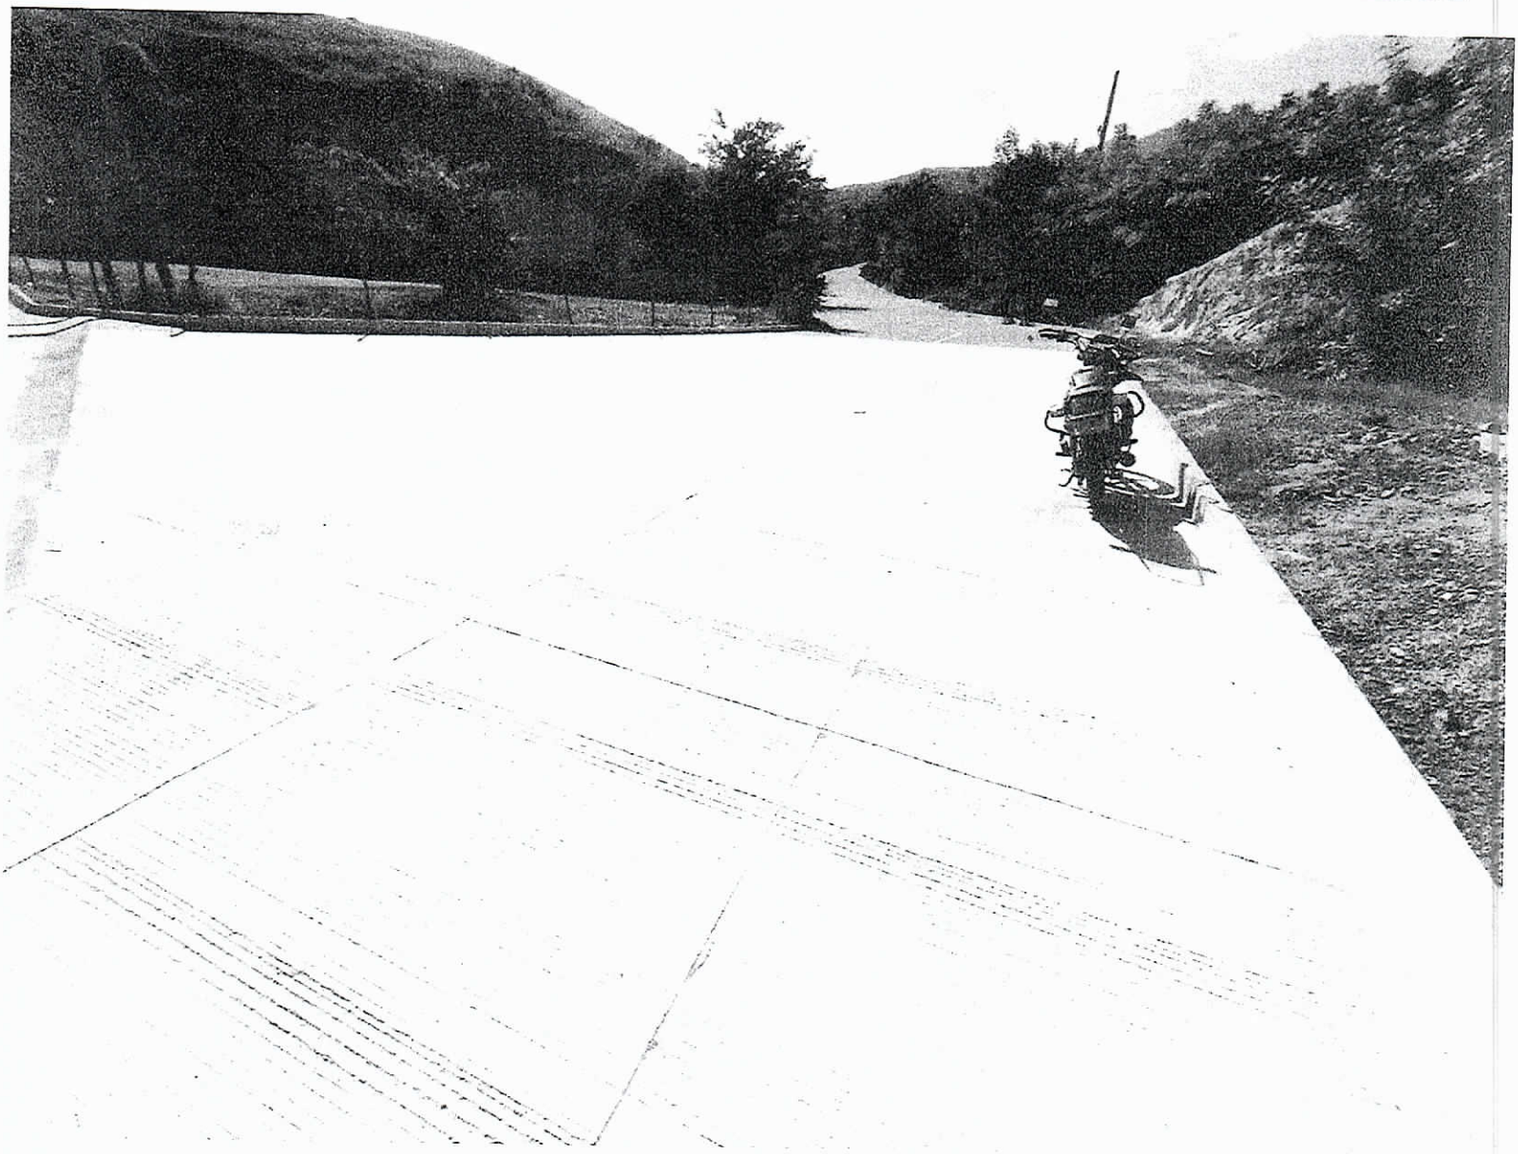

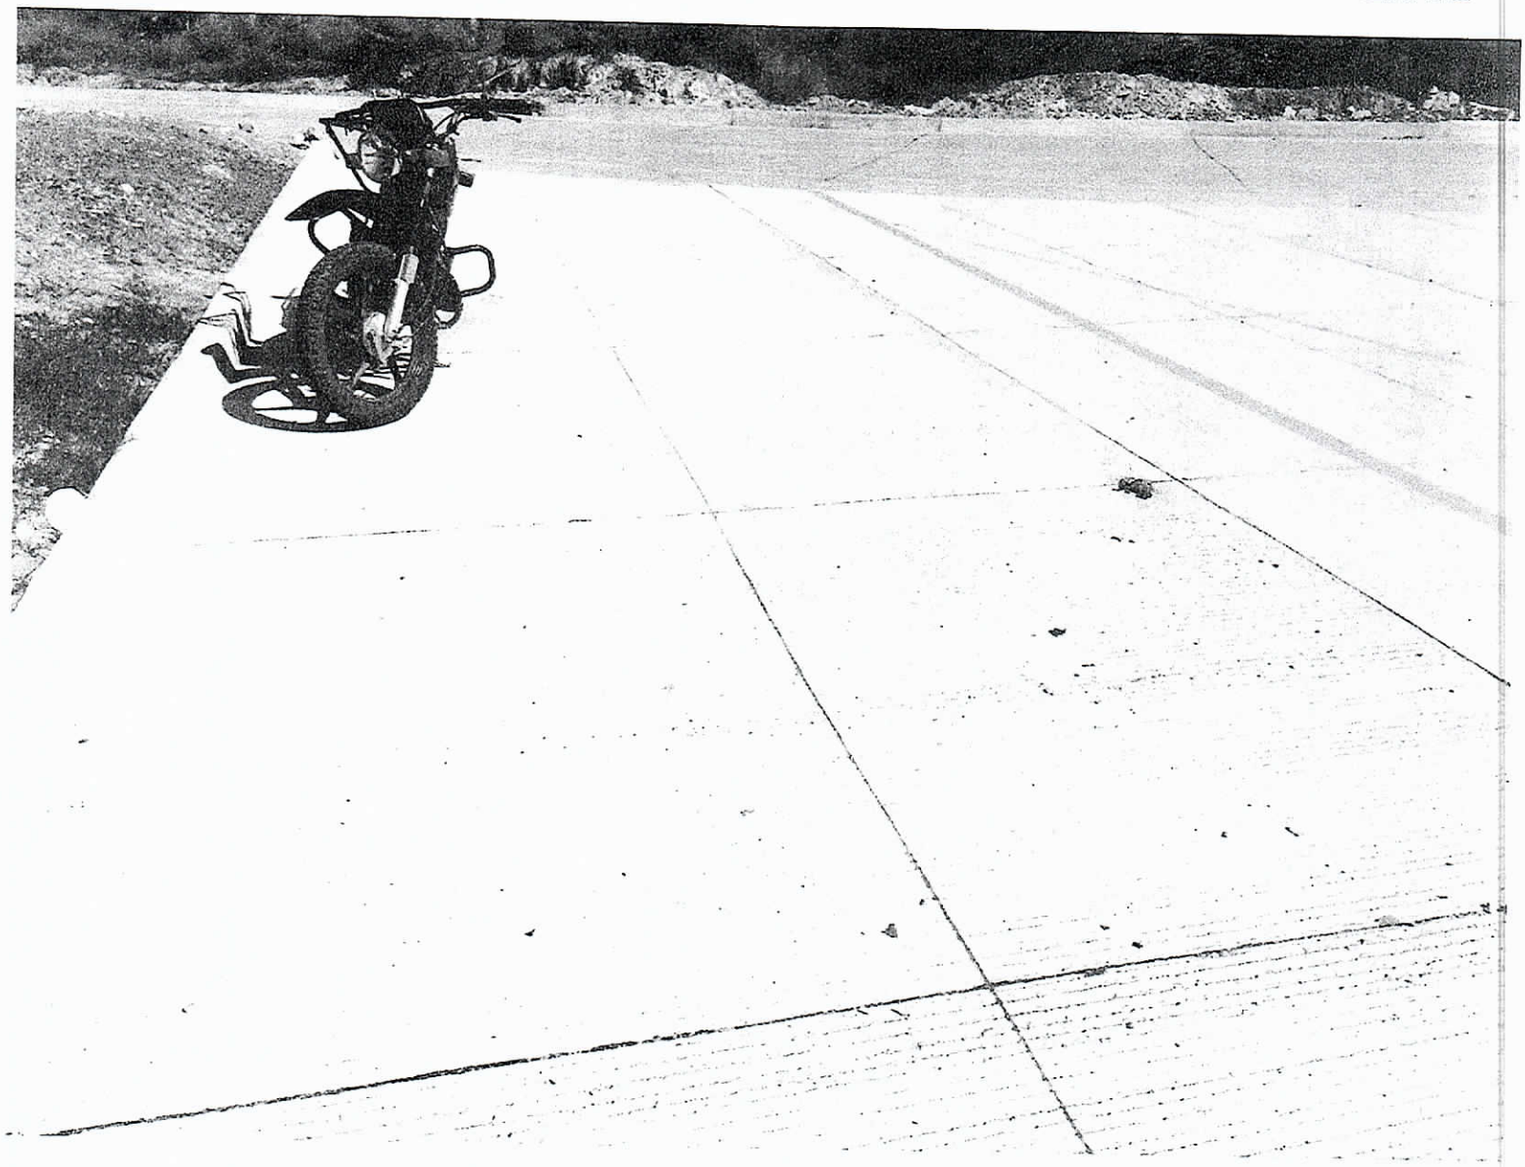

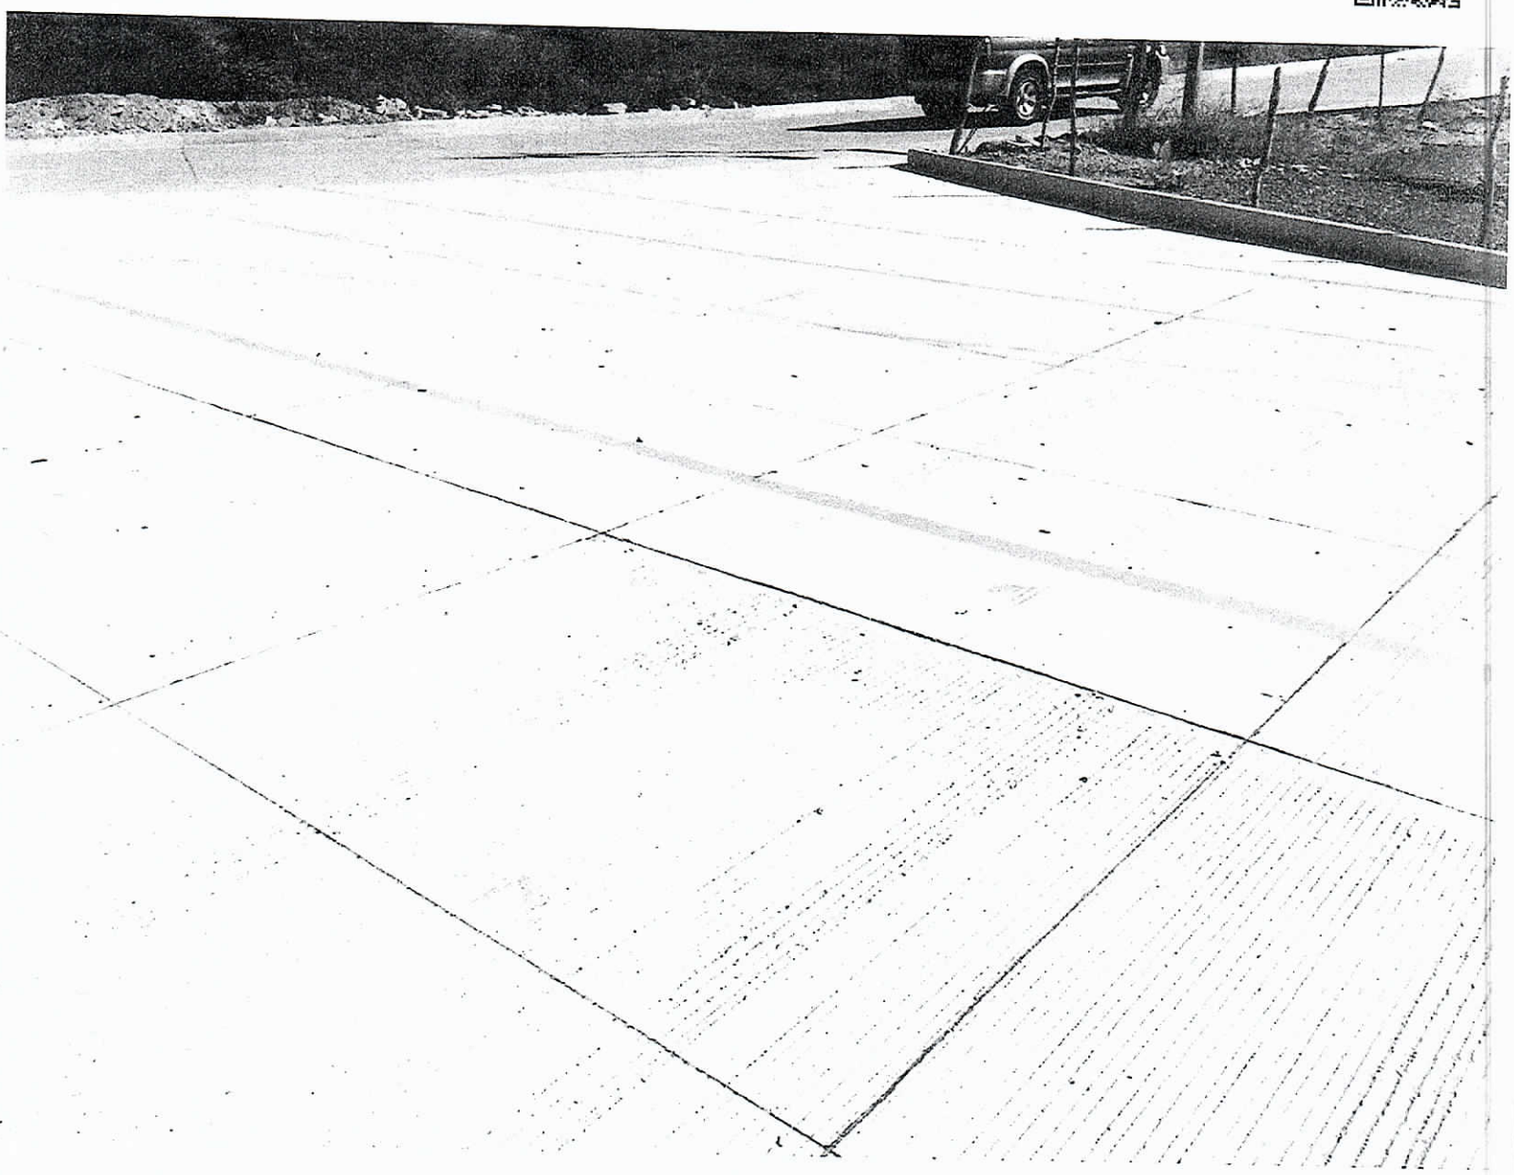

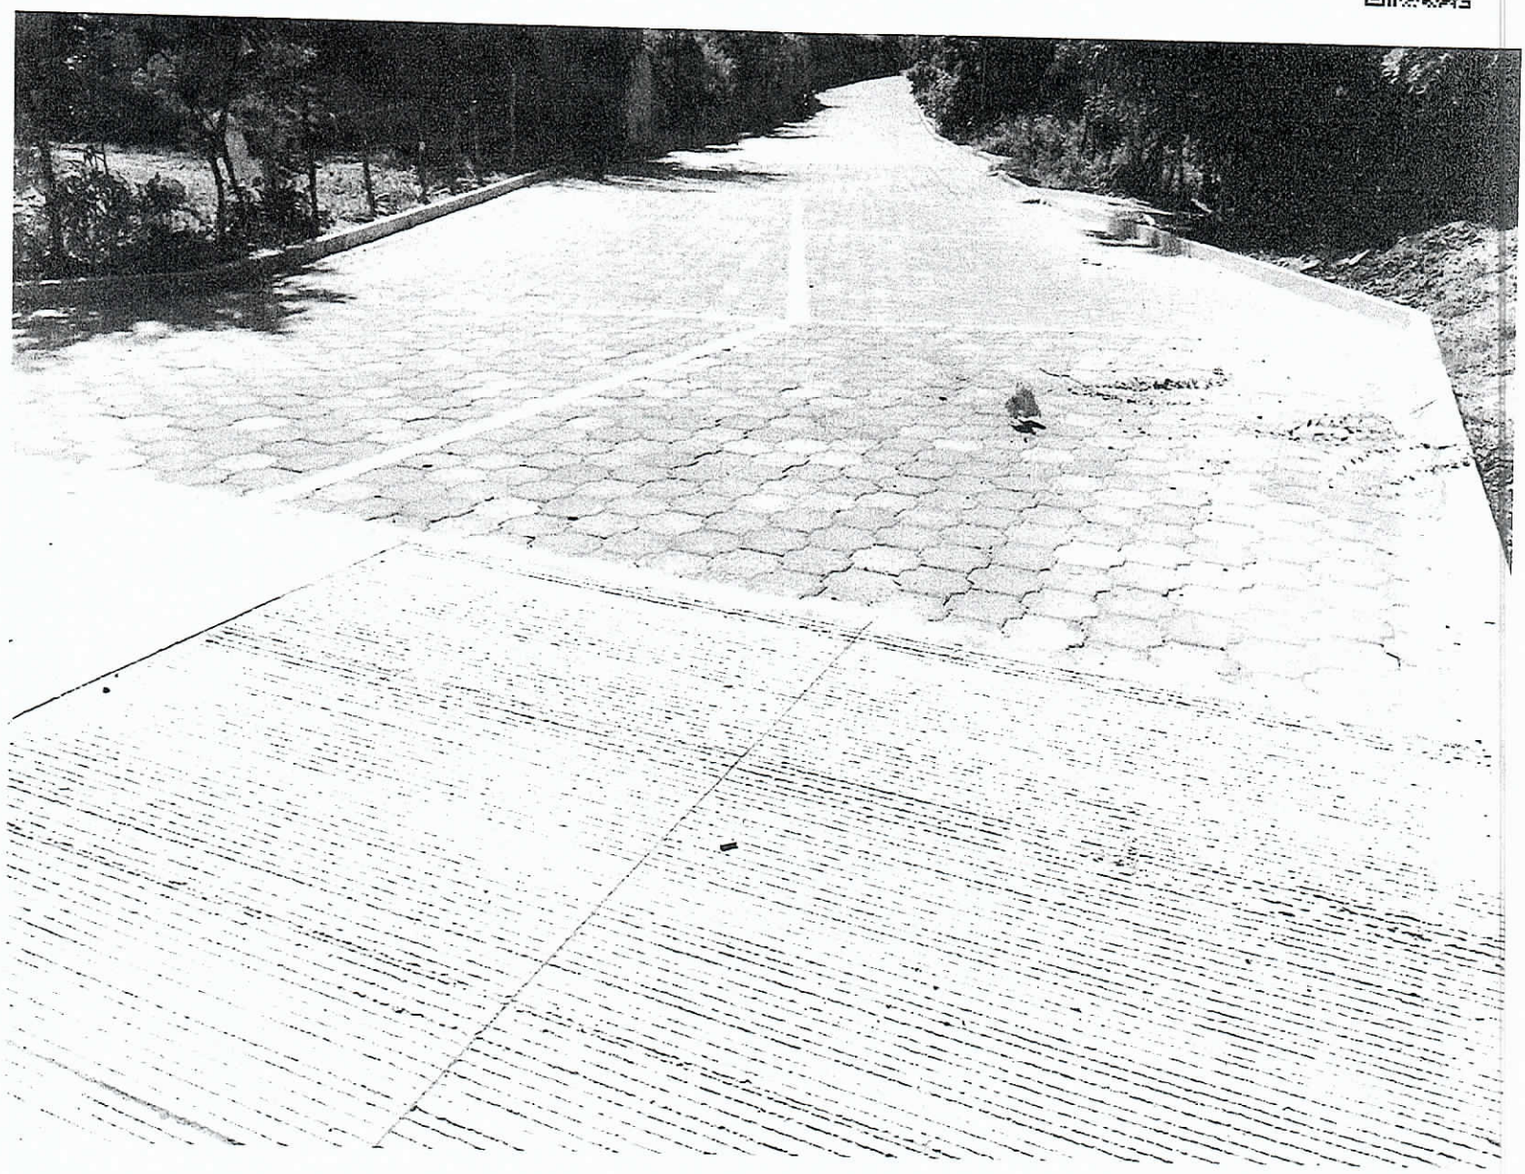

BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 3005/06/2025

CONTRATO No. 09-2025


NOMBRE: MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS BORDOS, ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

REGISTRO No.	11
FECHA	10/11/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	El proyecto se encuentra en fase de terminación
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA





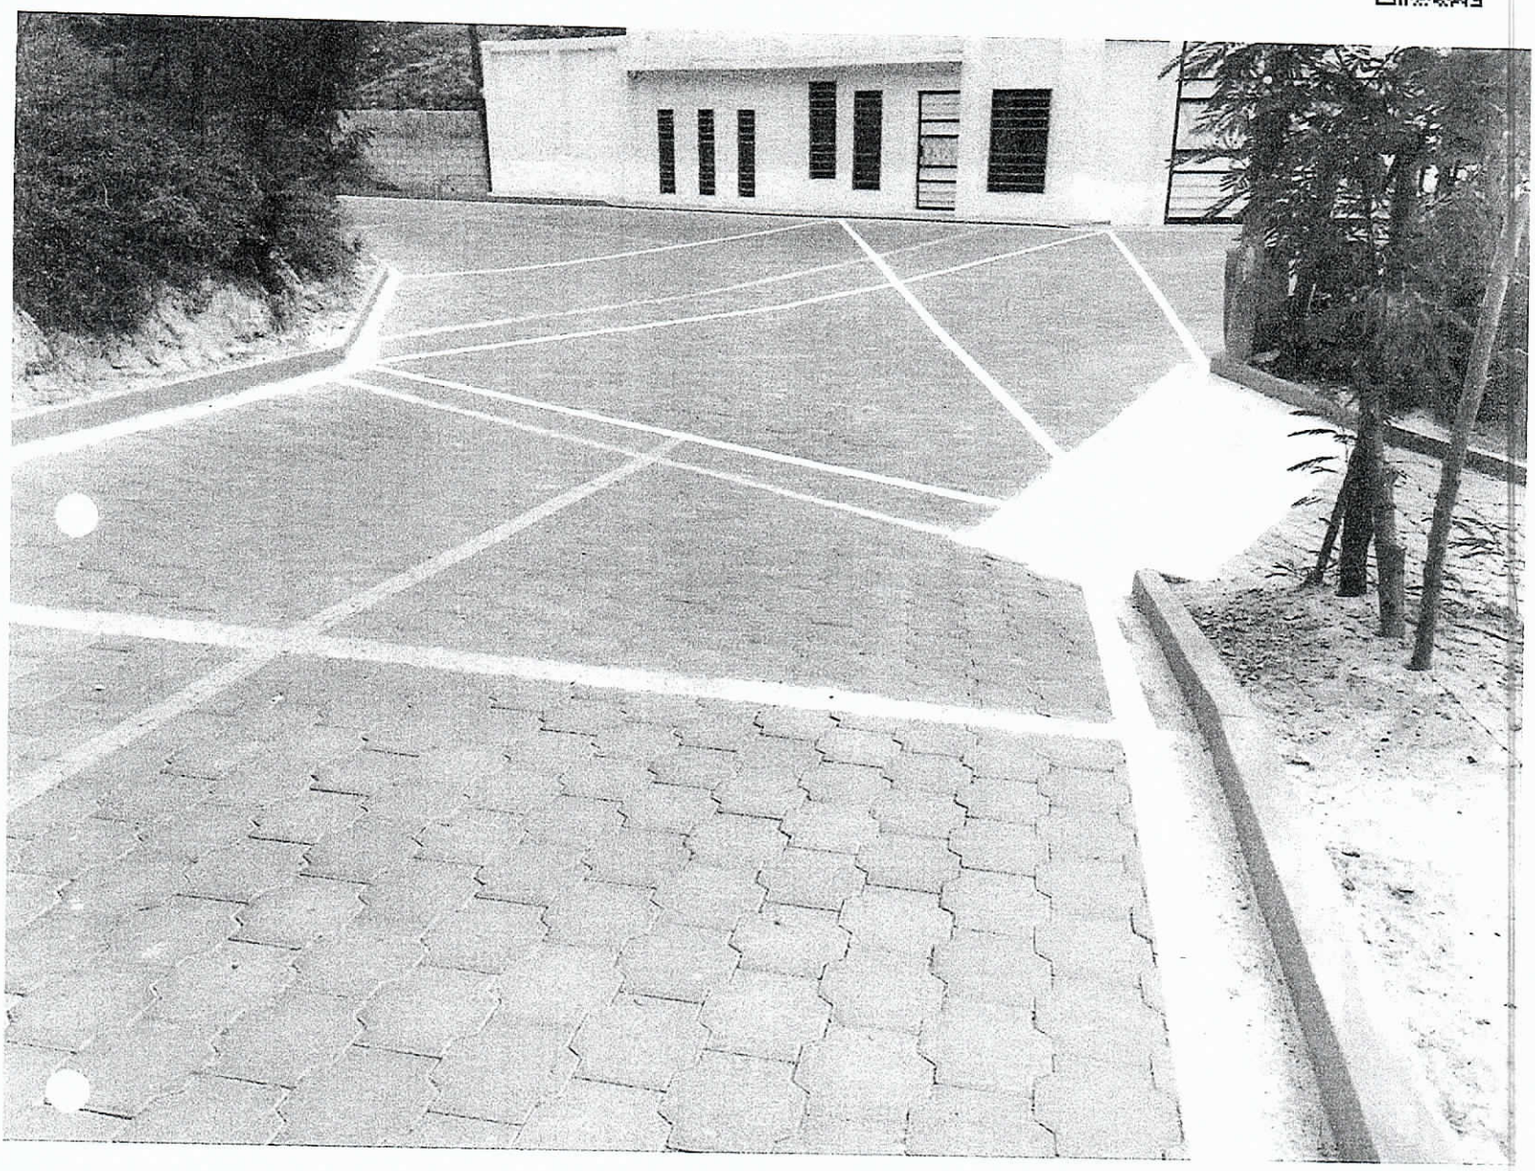


¡Sirvie



BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 3005/06/2025

CONTRATO No. 09-2025

NOMBRE: MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS BORDOS, ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

REGISTRO No.	12
FECHA	01/12/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	El proyecto se encuentra en fase de terminación
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA



Aldea Tierra Blanca.
Guastatoya, El Progreso 10 de diciembre 2025.

Señora Gobernadora
Dra. Karol Elyana Paredes Zacarías
Gobernador Departamental y presidente
COCODE El Progreso

Estimada Dra. Paredes:

Reciba un cordial saludo del Consejo Comunitario de Desarrollo urbano y Rural COCODE de la Aldea Tierra Blanca del municipio de Guastatoya del Departamento de El Progreso.

En cumplimiento al Numeral IV, Articulo 45 BIS Ley Orgánica del Presupuesto, me permito en m calidad de presidente del COCODE de la Aldea Tierra Blanca del municipio de Guastatoya departamento de El Progreso, para emitir **Opinión Favorable** sobre la finalización a un 100% de la totalidad de los renglones establecidos del proyecto: **"MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS BORDOS, ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO"**, con código se SINIP: 331020 que fue ejecutado con fondos provenientes del Consejo Departamental De Desarrollo.

Y para los usos legales que el interesado convenga, emito Opinión Favorable, en una hoja de papel bond en su anverso, misma que firmo y sello.

Atentamente,

CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO
ALDEA TIERRA BLANCA
COCODE
GUASTATOYA, EL PROGRESO.

Juan José Orellana Orellana
PRESIDENTE COCODE
Aldea Tierra Blanca

MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!

5980-0535 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
BARRIO EL CALVARIO, **GUASTATOYA EL PROGRESO**

LA INFRASCRITA SECRETARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO,

CERTIFICA:

Que para su cumplimiento y efectos consiguientes se transcribe la **AUTENTICIDAD** del punto **TERCERO** del acta **90-2025** de fecha ocho de diciembre de dos mil veinticinco del libro número 3,609 de sesiones ordinarias del Concejo Municipal, debidamente autorizado por la Contraloría General de Cuentas, el que copiado literalmente dice:

TERCERO: La Secretaria Municipal informa al Concejo Municipal que, Licenciado Alexis Geovanny Marroquín Orellana, Director de Planificación, presenta oficio Ref.agmo/DMP/462-2025, de fecha 08 de diciembre de 2025, el cual en su parte conducente expone: "El motivo de la presente es para informarle que el proyecto **MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS BORDOS, ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO**. Contrato administrativo número 09-2025 de fecha 04 de junio de 2025, ejecutado por la empresa **CONSTRUCTORA Y ELÉCTRICOS M. Y WALRUD**, presentó informe del 100% de avance físico y se solicita nombrar a la comisión de recepción y liquidación para levantar el Acta de Recepción. Por lo tanto, solicito que apruebe el pago del 100% de avance físico del proyecto antes mencionado y nombrar a la junta de recepción para su respectiva revisión". El Concejo Municipal. **CONSIDERANDO:** Que la municipalidad de Guastatoya, El Progreso y la empresa mercantil denominada: **CONSTRUCTORA Y ELÉCTRICOS M. Y WALRUD,** suscribieron contrato administrativo número 09-2025, para la ejecución del proyecto: **MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS BORDOS, ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO**. **CONSIDERANDO:** Que a la presente fecha el Director Municipal de Planificación, hace del conocimiento al Concejo Municipal sobre el avance físico del 100% del proyecto: **MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS BORDOS, ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO**, siendo necesario emitir la disposición legal correspondiente. **CONSIDERANDO:** Que la Ley de Contrataciones del Estado Decreto 57-92 del Congreso de la República de Guatemala en el Artículo 55 establece: "Inspección y recepción final…*el supervisor rendirá informe pormenorizado a la autoridad administrativa superior de la entidad correspondiente, la que dentro de los cinco (5) días siguientes nombrará la Comisión Receptora y Liquidadora de la obra, integrada con tres miembros, con la que colaborarán el supervisor o su equivalente y el representante del contratista*…" **CONSIDERANDO:** Que la Ley de Contrataciones del Estado Decreto 57-92 del Congreso de la República de Guatemala en el Artículo 59 establece: *"Estimaciones para pago. La entidad contratante podrá hacer pagos parciales al contratista contra estimaciones periódicas de trabajo ejecutado y aceptado, las que podrán efectuarse mensualmente de acuerdo con las estipulaciones pactadas."* **CONSIDERANDO:** Que El Código Municipal y sus reformas Decreto 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala en el Artículo 35 literal a) establece: "*Atribuciones generales del Concejo Municipal. Son atribuciones del Concejo Municipal: a) La iniciativa, deliberación y decisión de los asuntos municipales…*" **POR TANTO:** El Concejo Municipal fundamentado en lo considerado y con las facultades que le confiere el Código Municipal y sus reformas y por **UNANIMIDAD DE VOTOS. ACUERDA: I)** Se tiene por recibido el oficio presentado, agregándose al expediente de mérito. **II)** Se ordena notificar a la Comisión de Recepción y Liquidación de Obras a efecto de verificar el avance físico del proyecto: **MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS BORDOS, ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO**, el cual se ejecuta con el contrato 09-2025. **III)** Luego de la

SECRETARIA
MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!

recepción del acta de la Comisión de Recepción y Liquidación de Obras que el Director de la Dirección de Administración Integrada Financiera Municipal proceda a realizar el pago equivalente al avance físico del 100.00% a favor de:TOMAS REYES PICON; propietario de la empresa mercantil denominada **CONSTRUCTORA Y ELÉCTRICOS M. Y WALRUD . IV)** Notifíquese.

(Fs) Ilegibles José Elías Herrera Guerra, Alcalde Municipal, Ing. Byron Fernando Calderón Ferrera y Eduardo Ortega Loaiza, Síndicos Primero y Segundo respectivamente, Heman Archila Morales, Erasmo Beltetón Contreras, Nery Rolando Archila Orellana, Julio Mauricio Marroquín González, Fryda Aimée Estrada Ortiz, Concejales Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto, respectivamente y Licda. Evelyn Yaneth Oajaca Marroquín, Secretaria Municipal.

DADO EN EL PALACIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE GUASTATOYA, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, A NUEVE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO.

SECRETARIA

MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA

LICDA. EVELYN YANETH OAJACA MARROQUIN
SECRETARIA MUNICIPAL
