MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!

5980-0535 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
BARRIO EL CALVARIO, **GUASTATOYA EL PROGRESO**

REPORTE DE PAGO DE PROYECTOS POR CONTRATO 2025

EXPEDIENTE No. **302** NOG: **27000761** CONTRATO No. **13-2025**

PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE URBANA LOTIFICACION EL CARMEN, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

APORTES	% DE AVANCE	ESTIMACION	AMORTIZACION	LIQUIDO A RECIBIR
Aporte CODEDE	**100.00%**			
Q. 499,500.00		**Q. 124,500.00**	**Q. 24,900.00**	**Q. 99,600.00**
32 00 001 000 023 331 31-0101-0004				
TOTALES		**Q. 124,500.00**	**Q. 24,900.00**	**Q. 99,600.00**

Se cuenta con Informe de supervisión por parte de la empresa, informe de supervisión por el Supervisor de Obras Municipales, Acuerdo de aprobación de avance, Copia de bitácora, Certificados de calidad, Pruebas de laboratorio, Fianzas de Conservación de obras y Saldos deudores, Acta de Recepción de obras.

Lic. Alexis Geovanny Marroquín Orellana
Director Municipal de Planificación

Factura

CARLOS ALBERTO , AMADO ORELLANA
Nit Emisor: 20115989
CONSTRUCTORA M&A
ALDEA SANTA RITA BARRIO SAN JUAN, GUASTATOYA, EL PROGRESO
NIT Receptor: 6206107
Nombre Receptor: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
F87B8337-959D-4C46-8E57-C51421196583
Serie: F87B8337 Número de DTE: 2510113862
Numero Acceso:

Fecha y hora de emision: 15-dic-2025 11:21:41
Fecha y hora de certificación: 15-dic-2025 11:21:41
Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Otros Descuentos(Q)	Total (Q)	Impuestos	
1	Servicio	1	PAGO DEL 100.00% DE AVANCE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE URBANA LOTIFICACION EL CARMEN, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO. CONTRATO NÚMERO 13-2025. EXPEDIENTE No. 302, NOG 27000761. ESTIMACIÓN Q. 124,500.00 MENOS AMORTIZACIÓN Q. 24,900.00 IGUAL LÍQUIDO A RECIBIR Q. 99,600.00. APROBADO Y AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTES.	124,500.00	0.00	0.00	124,500.00	IVA	13,339.285714
			TOTALES:		0.00	0.00	124,500.00	IVA	13,339.285714

* Sujeto a pagos trimestrales ISR

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

Contribuyendo *juntos por Guatemala*

GUATECOMPRAS.gt
Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO - DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION

Cerrar Sesion

CONCURSO: Adición de anexos al concurso en la Fase de Liquidación

Mensaje de confirmación	
15/dic./2025 10:42:28	
Documentos asociados:	
1	27000761@INFORME DE SUPERVISION 100 AVANCE FISICO CALLE LOTIFICACION EL C.pdf(2965 KB)
Si desea imprimir este mensaje, oprima el siguiente botón	

RECIBO DE LA MUNICIPALIDAD

DE GUASTATOYA,

DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO

FORMA 7-B INGRESOS VARIOS

SERIE B **No. 670202**

FECHA: DIA 10 | MES 12 | AÑO 2025

Noventa y nueve mil quinientos quetzales con 00/100

POR: _____

CODIGO JURISDICCIONAL: D-4 5201

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: Consejo Departamental de Desarrollo

DIRECCION: El Progreso

ARBITRIOS	ORNATO Q.4.00 ☐ 10.00 ☐ 15.00 ☐ 50.00 ☐ 75.00 ☐ 100.00 ☐ 150.00 ☐ ☐ ☐	Q.	
TASAS	VARIOS		
	LICENCIAS		
	ESTACIONAMIENTOS		
	CERTIFICACIONES		
	CEDULAS		
	MERCADOS		
	SERVICIOS VARIOS		
	SERVICIOS AGUA		
CONTRIBUCIONES	SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA		
MULTAS	CONCEPTO		
	CONCEPTO		
OTROS	VARIOS Pago del 100.00% tercer y ultimo desembolso del proyecto mejoramiento calle urbana lotificacion el carmen, barrio Minerva, Guastatoya, El Progreso. SNIP 353145, convenio No. 19-2025, fuente 12	Q99,500.00	
		TOTAL Q.	Q99,500.00

LECTURA DE CONTADOR: ACTUAL _____ ANTERIOR _____

OBSERVACIONES: _____

FIRMA DEL RECEPTOR MUNICIPAL | CUENTA

SUB-CUENTA

VALIDO UNICAMENTE POR EL IMPORTE IMPRESO POR LA CAJA REGISTRADORA MUNICIPAL Y/O NOMBRE FIRMA Y SELLO DEL RECEPTOR MUNICIPAL

ORIGINAL-ENTERANTE

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA ¡Sirviendo!

AUTORIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS RES. BJ/5975 Clas.: 920-12-8-1-4-97 DEL 26-06-97.

4035611 T-0340 2045310 87

FORMULARIOS STANDARD, S.A. PBX: 2421-8800 NIT: 1659221-7 25,000 - 110034 DEL No. 650001 AL No. 725000. SERIE B. EMPO MUNICIPAL No. 45348 DEL 07/11/2024 NUMERO CORRELATIVO 0-416-3002 DEL 07/11/2024 No. DE CUENTA: 2022-220-201-22-001 OFICIO S/N DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2024 LIBRO 0035755 FOLIO 7.

www.standard-s.com

RECIBO DE LA MUNICIPALIDAD

DE GUASTATOYA,

DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO

FORMA 7-B INGRESOS VARIOS

SERIE B **No. 670202**

FECHA: DIA 10 | MES 12 | AÑO 2025

Noventa y nueve mil quinientos quetzales con 00/100

POR: _____

CODIGO JURISDICCIONAL: D-4 5201

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: Consejo Departamental de Desarrollo

DIRECCION: El Progreso

ARBITRIOS	ORNATO Q.4.00 ☐ 10.00 ☐ 15.00 ☐ 50.00 ☐ 75.00 ☐ 100.00 ☐ 150.00 ☐ ☐ ☐	Q.	
	VARIOS		
TASAS	LICENCIAS		
	ESTACIONAMIENTOS		
	CERTIFICACIONES		
	CEDULAS		
	MERCADOS		
	SERVICIOS VARIOS		
	SERVICIOS AGUA		
CONTRIBUCIONES	SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA		
MULTAS	CONCEPTO		
OTROS	CONCEPTO		
	VARIOS Pago del 100.00% tercer y ultimo desembolso del proyecto mejoramiento calle urbana lotificacion el carmen, barrio Minerva, Guastatoya, El Progreso. SNIP 353145, convenio No. 19-2025, fuente 12		Q99,500.00
	TOTAL	Q.	Q99,500.00

LECTURA DE CONTADOR: ACTUAL _____ ANTERIOR _____

OBSERVACIONES: _____

FIRMA DEL RECEPTOR MUNICIPAL

CUENTA

SUB-CUENTA

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA ¡Sirviendo!

VALIDO UNICAMENTE POR EL IMPORTE IMPRESO POR LA CAJA REGISTRADORA MUNICIPAL Y/O NOMBRE FIRMA Y SELLO DEL RECEPTOR MUNICIPAL.

ORIGINAL-ENTERANTE

4035611 T-0340 2045310 87

AUTORIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS RES. BJ./5875 Clas.: 920-12-8-1-4-97 DEL 26-06-97.

FORMULARIOS STANDARD, S.A. PBX: 2423-8800 - NIT: 1532227-7 - 75,000 - 11/05/24 DEL No. 650,001 AL No. 725,000. SERIE B. ENVIO MUNICIPAL No. 45848 DEL 07/11/2024 NUMERO CORRELATIVO D-4-16-2024 DEL 07/11/2024 No. DE CUENTA: 2022-000-301-12-001 OFICIO S/N DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2024 LIBRO 05/15/1 FOLIO 7.

www.standard4.com

CONSTRUCTORA
M & A

Guastatoya, El Progreso, 29 de OCTUBRE de 2025

Señores
Municipalidad de Guastatoya, El Progreso
Departamento de El Progreso

De la manera más atenta nos dirigimos a ustedes esperando que el desarrollo de sus actividades sea de la mejor manera.

El motivo de la presente es para solicitar pago de la segunda estimación del 100.00% de la oferta para el evento **MEJORAMIENTO CALLE URBANA LOTIFICACION EL CARMEN, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO.** Según contrato administrativo número 13-2025 de fecha treinta y uno de julio del año 2025, para cual adjunto el cuadro de estimación del 100.00% de dicho proyecto.

No teniendo más que manifestarles, me suscribo quedando atento y a sus respetables órdenes.

Atentamente,

CONSTRUCTORA M&A
Barrio San Juan, Aldea San
Guas
El Prog
,989

CARLOS ALBERTO AMADO ORELLANA
CONSTRUCTORA M&A

SEGUNDA ESTIMACION

MEJORAMIENTO CALLE URBANA LOTIFICACION EL CARMEN, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

RESUMEN DE RENGLONES

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES DE TRABAJO				CANTIDADES EJECUTADAS PRIMERA ESTIMACION		ACUMULADO A LA FECHA		CANTIDADES EJECUTADAS PRIMERA ESTIMACION		ACUMULADO A LA FECHA		PORCENTAJE
		CANTIDAD	UNIDAD	P UNITARIO	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	TOTAL
	TRABAJOS PRELIMINARES													
1	LIMPIEZA, TRAZO Y CHAPEO	667.00	M2	Q 17.45	Q 11,639.15	667.00	Q 11,639.15	667.00	Q 11,639.15	-	Q -	667.00	Q 11,639.15	2.33%
2	CORTE Y NIVELACION	634.00	M2	Q 52.05	Q 32,999.70	634.00	Q 32,999.70	634.00	Q 32,999.70	-	Q -	634.00	Q 32,999.70	6.61%
											Q -	-	Q -	
3	BASE DE MATERIAL GRANULAR T=0.15M	634.00	M2	Q 149.35	Q 94,687.90	634.00	Q 94,687.90	634.00	Q 94,687.90	-	Q -	634.00	Q 94,687.90	18.96%
4	BORDILLO PREFABRICADO	188.00	M	Q 390.05	Q 73,329.40	188.00	Q 73,329.40	188.00	Q 73,329.40	-	Q -	188.00	Q 73,329.40	14.68%
5	FUNDICION DE PAVIMENTO DE 0.15M	634.00	M2	Q 418.80	Q 265,519.20	625.28	Q 261,868.85	625.28	Q 261,868.85	8.72	Q 3,650.35	634.00	Q 265,519.20	53.16%
											Q -	-	Q -	
6	SEÑALIZACION	1.00	UNIDAD	Q 21,324.65	Q 21,324.65	-	Q -	-	Q -	1.00	Q 21,324.65	1.00	Q 21,324.65	4.27%
	COSTO TOTAL DEL PROYECTO				Q 499,500.00		Q 474,525.00		Q 474,525.00		Q 24,975.00		Q 499,500.00	100.00%

VALOR DE ESTIMACION No. 1	Q	24,975.00
AMORTIZACION DEL ANTICIPO (20%)	Q	4,995.00
PENDIENTE DE AMORTIZAR	Q	-
LIQUIDO A RECIBIR	Q	19,980.00

CONSTRUCTORA M&A
San Juan, Aldea
Joya El Progreso
20115985

CARLOS ALBERTO AMADO ORELLANA
CONSTRUCTORA M&A

JOEL AMADO ORELLANA
INGENIERO CIVIL
CON ENFASIS EN CONSTRUCCIONES RURALES
COLEGIADO No. 18,357

JOEL AMADO ORELLANA
INGENIERO RESIDENTE

CONSTRUCTORA M&A

CONSTRUCTORA
M & A

MEJORAMIENTO CALLE URBANA LOTIFICACION EL CARMEN,
BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO








CONSTRUCTORA
M & A

MEJORAMIENTO CALLE URBANA LOTIFICACION EL CARMEN,
BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

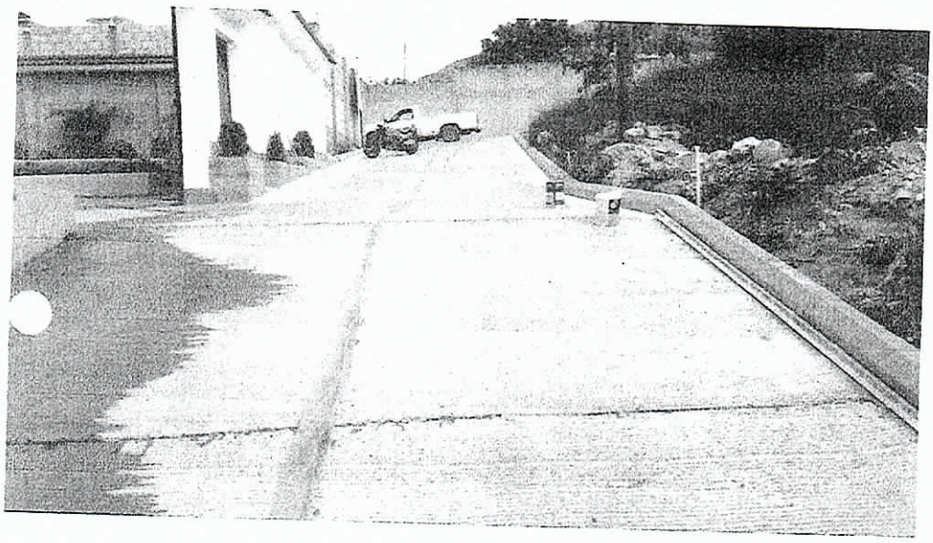



MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!

5980-0535 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
BARRIO EL CALVARIO, **GUASTATOYA EL PROGRESO**

INFORME DE SUPERVISION

Guastatoya, 30 de Noviembre de 2025

SEÑOR: JOSE ELIAS HERRERA GUERRA Y CONSEJO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
EL PROGRESO

De la manera más atenta me dirijo a usted deseándole toda clase de éxitos en sus labores diarias.

El motivo de la presente es para hacerle saber lo siguiente:

En visita de supervisión realizada al proyecto denominado **MEJORAMIENTO CALLE URBANA LOTIFICACION EL CARMEN, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO,** con número de contrato **13-2025** de fecha 31 de Julio de 2025, ejecutado por la empresa **CONSTRUCTORA M&A**, financiado por la Municipalidad de Guastatoya, se tiene a la vista el oficio de Noviembre de 2025 en el cual se hace la solicitud de la estimación del proyecto para un avance del **100.00%**, para lo cual se adjunta el informe de supervisión y el informe de parte de la empresa.

Agradeciendo su atención y en espera de darle seguimiento a este asunto me suscribo de ustedes.

Atentamente

José F. Alexander Aguilar Mejia
Ingeniero Civil
Colegiado No 9,366

ING. JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA
SUPERVISOR MUNICIPAL, GUASTATOYA
EL PROGRESO

D.M.P.

SUPERVISION DE OBRAS

Dirección Municipal de Planificación

Comunidad.	**Contrato Municipal.**
Lotificacion el Carmen, Guastatoya, El Progreso	13-2025

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del proyecto.	**Ubicación del proyecto.**
MEJORAMIENTO CALLE URBANA LOTIFICACION EL CARMEN, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Lotificacion el Carmen, Guastatoya, El Progreso
Contratista. CONSTRUCTORA M&A **Monto Contratado.** Q 499,500.00	**Ubicación del proyecto.** Lotificacion el Carmen, Guastatoya, El Progreso **Avance Físico.** 100.00%
Informe de Supervisión No. 2	**Fecha.** 30 de Noviembre de 2025

2. AVANCE DE EJECUCION DEL PROYECTO

No.	Descripcion del Renglón	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Total a la Fecha	Avance Físico %
	TRABAJOS PRELIMINARES						
1	LIMPIEZA, TRAZO Y CHAPEO	-	M2	Q 17.45	Q -	Q 11,639.15	100%
2	CORTE Y NIVELACION	-	M2	Q 52.05	Q -	Q 32,999.70	100%
3	BASE DE MATERIAL GRANULAR T=0.15M	-	M2	Q 149.35	Q -	Q 94,687.90	100%
4	BORDILLO PREFABRICADO	-	M	Q 390.05	Q -	Q 73,329.40	100%
5	FUNDICION DE PAVIMENTO DE 0.15M	8.72	M2	Q 418.80	Q 3,650.35	Q 265,519.20	100%
6	SEÑALIZACION	1.00	UNIDAD	Q 21,324.65	Q 21,324.65	Q 21,324.65	100%

D.M.P.	SUPERVISION DE OBRAS	Dirección Municipal de Planificación


1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del proyecto.	Ubicación del proyecto.
MEJORAMIENTO CALLE URBANA LOTIFICACION EL CARMEN, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Lotificacion el Carmen, Guastatoya, El Progreso

2. INFORME FOTOGRAFICO.





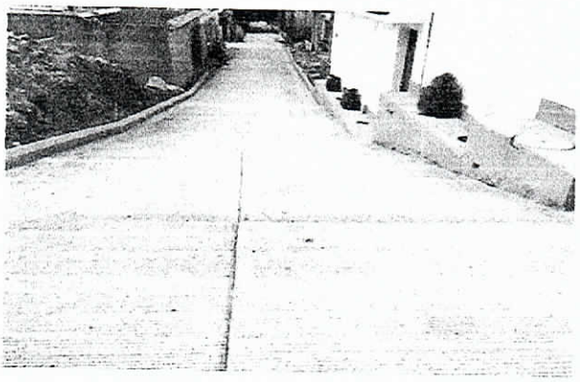





ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA ¡Sirviendo!

SUPERVISOR DE PROYECTOS MUNICIPALES

Jose F. Alexander Aguilar Ingeniero Civil Colegiado No. 9,366

ING. JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA
SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES

JOSE ELIAS HERRERA GUERRA
ALCALDE MUNICIPAL DE GUASTATOYA

REPORTE DE AVANCE FISICO No. 2

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO CALLE URBANA LOTIFICACION EL CARMEN, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	
Municipio: GUASTATOYA	Departamento: EL PROGRESO
Comunidad: CABECERA MUNICIPAL	Fecha de Contrato: 31/07/2025
Fecha de Inicio: 11/08/2025	Fecha de Supervision: 30/10/2025
Fecha de Finalizacion: 10/12/2025	Unidad Ejecutora: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
Contrato No.: 13-2025	Valor del Proyecto: Q.499,500.00
Modificaciones:	Valor Original: Q.499,500.00
Constructora: CONSTRUCTORA M&A	Telefono:
Representante legal: CARLOS ALBERTO AMADO ORELLANA	

RESUMEN DE RENGLONES

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES DE TRABAJO				ORDEN DE CAMBIO	ORDEN DE TRABAJO SUPLEMENTARIO	ORDEN DE TRABAJO EXTRA	RENGLON MODIFICADO	CANTIDADES EJECUTADAS SEGUNDA ESTIMACION		ACUMULADO A LA FECHA		PORCENTAJE
		CANTIDAD	UNIDAD	P UNITARIO	TOTAL	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	TOTAL
	TRABAJOS PRELIMINARES													
1	LIMPIEZA, TRAZO Y CHAPEO	667.00	M2	Q 17.45	Q 11,639.15					-	Q -	667.00	Q 11,639.15	2.33%
2	CORTE Y NIVELACION	634.00	M2	Q 52.05	Q 32,999.70						Q	634.00	Q 32,999.70	6.61%
3	BASE DE MATERIAL GRANULAR T=0.15M	634.00	M2	Q 149.35	Q 94,687.90					-	Q	634.00	Q 94,687.90	18.95%
4	BORDILLO PREFABRICADO	188.00	M	Q 390.05	Q 73,329.40					-	Q	188.00	Q 73,329.40	14.68%
5	FUNDICION DE PAVIMENTO DE 0.15M	634.00	M2	Q 418.80	Q 265,519.20					8.72	Q 3,650.35	634.00	Q 265,519.20	53.16%
6	SEÑALIZACION	1.00	UNIDAD	Q 21,324.65	Q 21,324.65					1.00	Q 21,324.65	1.00	Q 21,324.65	4.27%
	COSTO TOTAL DEL PROYECTO				Q 499,500.00						Q 24,975.00		Q 499,500.00	100.00%

VALOR DE ESTIMACION No. 2	Q	24,975.00
AMORTIZACION DEL ANTICIPO (20%)	Q	4,995.00
PENDIENTE DE AMORTIZAR	Q	-
LIQUIDO A RECIBIR	Q	19,980.00

José Fulgencio Alexander Aguilar Mejía
Ingeniero Civil
Colegiado No. 9,300

JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES

ALCALDE

JOSE ELIAS HERRERA GUERRA
ALCALDE MUNICIPAL GUASTATOYA

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
¡Sirviendo

BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 4163/08/2025

CONTRATO No.	13-2025
NOMBRE:	MEJORAMIENTO CALLE URBANA LOTIFICACION EL CARMEN, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO
ENTIDAD:	MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

REGISTRO No.	4
FECHA	30/09/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	Se tiene colocado el pavimento, se cuenta con personal y materiales suficientes para el avance del proyecto
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA


Gobierno de la Republica de Guatemala 2024-2028
MEJORAMIENTO CALLE URBANA LOTIFICACIÓN
EL CARMEN, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO
LOTIFICACIÓN EL CARMEN, GUASTATOYA, EL PROGRESO
CODIGO SNIP: 353145
NOG: 27000761
Consejo Departamental de Desarrollo
EL PROGRESO
Unidad Ejecutora Responsable
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
EL PROGRESO
Tiempo Estimado de Ejecucion
4 MESES
Contratista: CONSTRUCTORA M&A
NIT: 20115989
Beneficiarios: 190 personas
Meta a Ejecutar: 634.00 metros cuadrados
Aporte IVA PAZ: Q.499,500.00
Año Fiscal
Costo del Proyecto
1504




BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 4163/08/2025

CONTRATO No.	13-2025
NOMBRE:	MEJORAMIENTO CALLE URBANA LOTIFICACION EL CARMEN, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO
ENTIDAD:	MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

REGISTRO No.	5
FECHA	06/10/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	Se continua con la colocación de bordillo prefabricado, se cuenta con personal y materiales suficientes para el avance del proyecto
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA



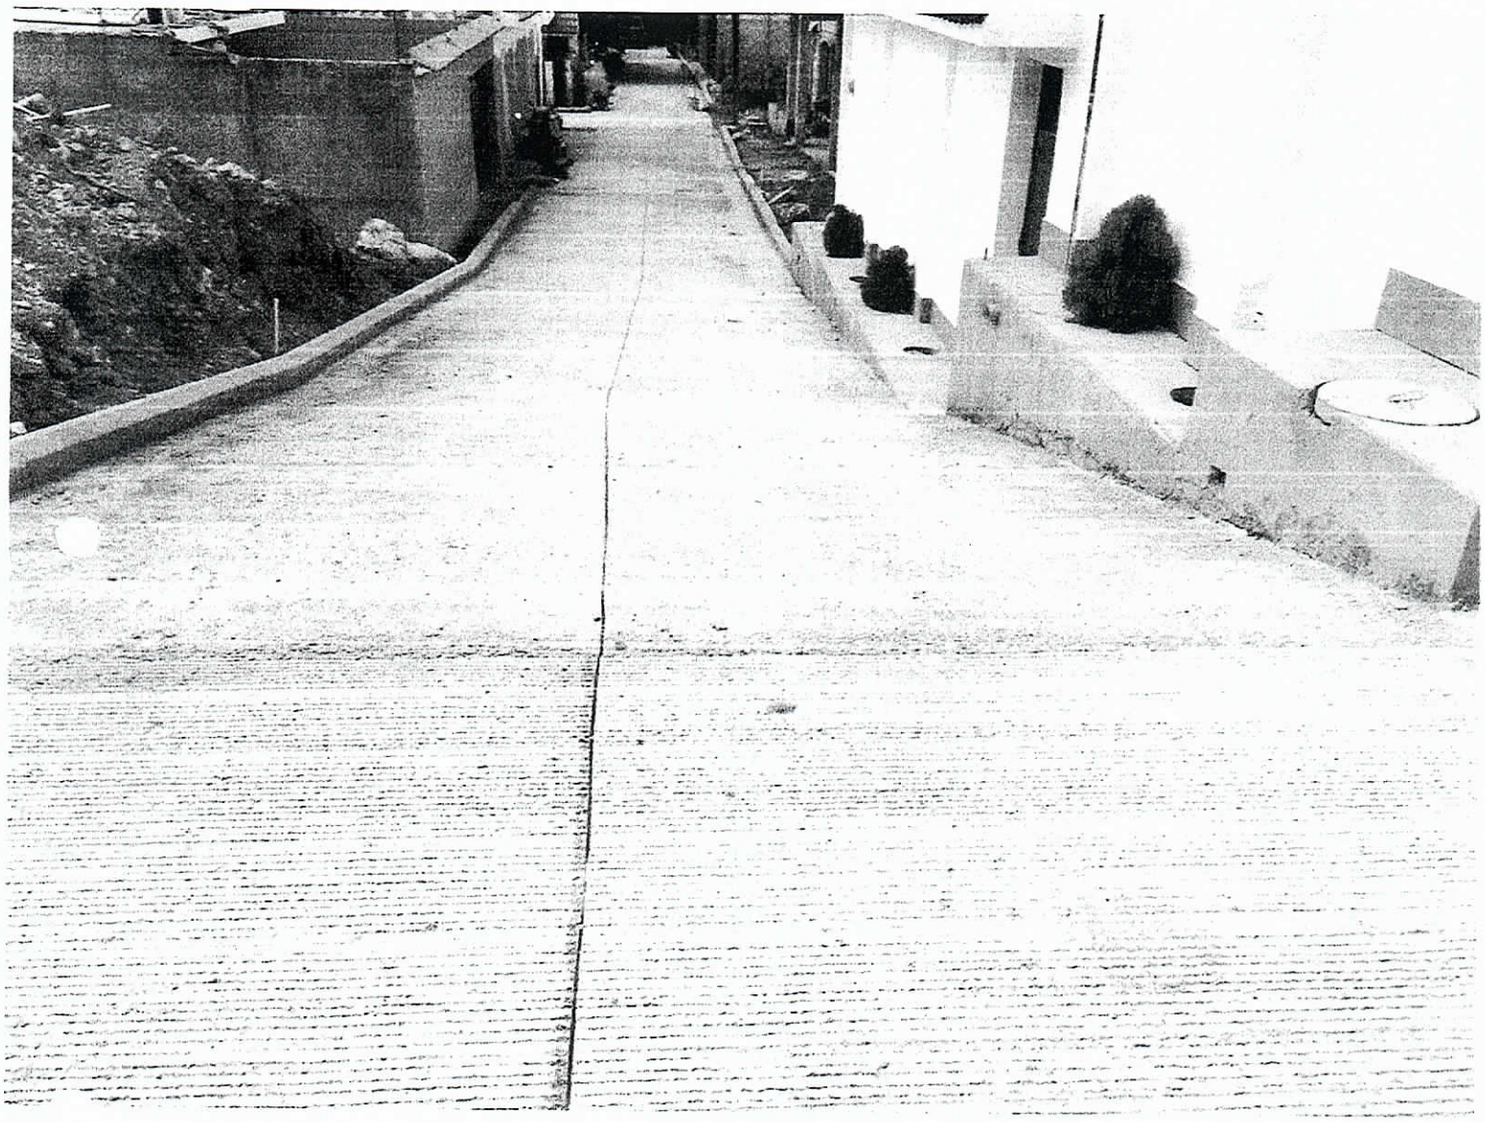


Gobierno de la República de Guatemala 2024-2028
MEJORAMIENTO CALLE URBANA LOTIFICACIÓN
EL CARMEN, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO
LOTIFICACIÓN EL CARMEN, GUASTATOYA, EL PROGRESO
CODIGO SNIP: 353145
NOG: 27000761
Unidad Ejecutora Responsable
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO
Tiempo Estimado de Ejecución
4 MESES
Contratista: CONSTRUCTORA M&A
NIT: 20115989
Beneficiarios: 190 personas
Meta a Ejecutar: 634.00 metros cuadrados
Aporte IVA PAZ: Q.499,500.00
Año Fiscal 2025
Costo del Proyecto
Aporte de Consejo Departamental de Desarrollo Q 499,500.00
Aporte Municipal Q 0.00
Aporte de la Comunidad Q 0.00
Otras Fuentes Q 0.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO Q 499,500.00
Consejo Departamental de Desarrollo
EL PROGRESO
Para más información sobre este proyecto escanea el siguiente codigo QR
0201
Sistema de Consejos de Desarrollo
1504



BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 4163/08/2025


CONTRATO No.	13-2025
NOMBRE:	MEJORAMIENTO CALLE URBANA LOTIFICACION EL CARMEN, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO
ENTIDAD:	MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

REGISTRO No.	3
FECHA	22/09/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	Se continua con la colocación de base para la fundición del pavimento y se realiza fundición de pavimento
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA







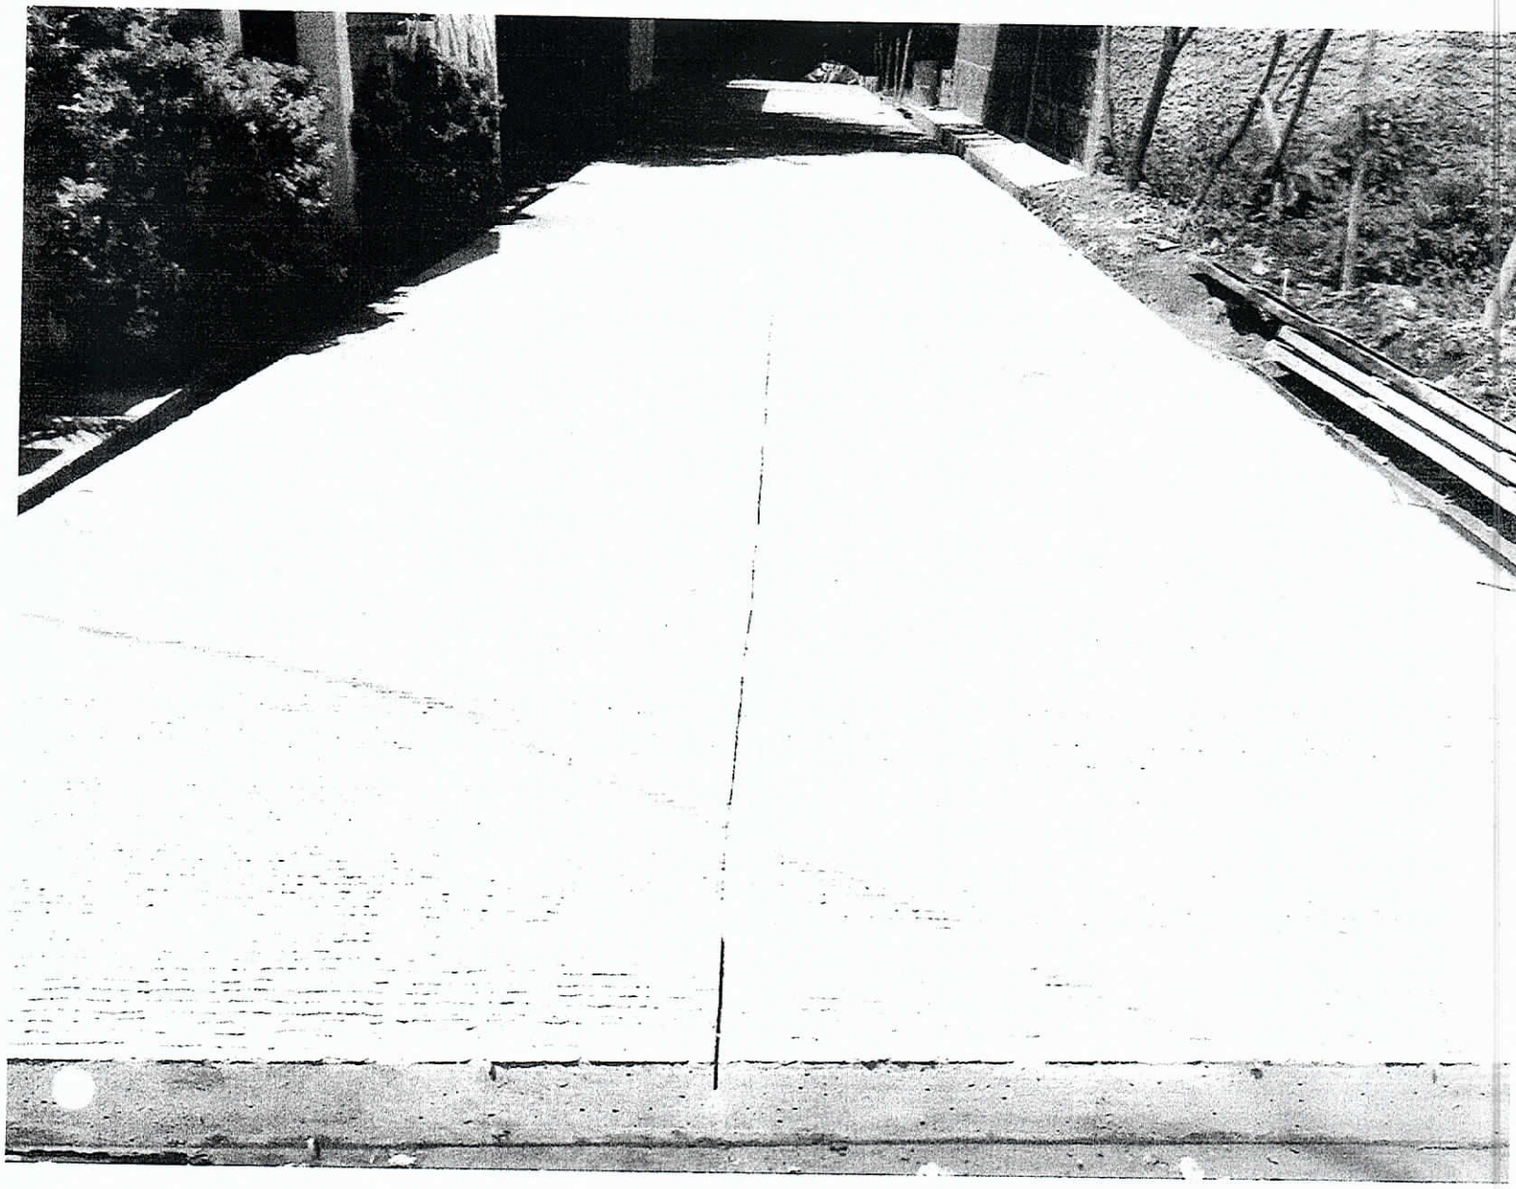



BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 4163/08/2025

CONTRATO No.	13-2025
NOMBRE:	MEJORAMIENTO CALLE URBANA LOTIFICACION EL CARMEN, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO
ENTIDAD:	MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

REGISTRO No.	4
FECHA	30/09/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	Se tiene colocado el pavimento, se cuenta con personal y materiales suficientes para el avance del proyecto
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA


Gobierno de la Republica de Guatemala 2024-2028
MEJORAMIENTO CALLE URBANA LOTIFICACIÓN
EL CARMEN, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO
LOTIFICACION EL CARMEN, GUASTATOYA, EL PROGRESO
CODIGO SNIP: 353145
NOG: 27000761
Unidad Ejecutora Responsable
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO
Tiempo Estimado de Ejecucion
4 MESES
Contratista: CONSTRUCTORA M&A
NIT: 20115989
Beneficiarios: 190 personas
Meta a Ejecutar: 634.00 metros cuadrados
Aporte IVA PAZ: Q.499,500.00
Año Fiscal
Costo del Proyecto
Consejo Departamental de Desarrollo
EL PROGRESO
1504



BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 4163/08/2025

CONTRATO No.	13-2025
NOMBRE:	MEJORAMIENTO CALLE URBANA LOTIFICACION EL CARMEN, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO
ENTIDAD:	MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

REGISTRO No.	5
FECHA	06/10/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	Se continua con la colocación de bordillo prefabricado, se cuenta con personal y materiales suficientes para el avance del proyecto
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA






Gobierno de la República de Guatemala 2024-2028
MEJORAMIENTO CALLE URBANA LOTIFICACIÓN
EL CARMEN, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO
LOTIFICACIÓN EL CARMEN, GUASTATOYA, EL PROGRESO
CODIGO SNIP: 353145
NOG: 27000761
Unidad Ejecutora Responsable
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO
Tiempo Estimado de Ejecución
4 MESES
Contratista: CONSTRUCTORA M&A
NIT: 20115989
Beneficiarios: 190 personas
Meta a Ejecutar: 634.00 metros cuadrados
Aporte IVA PAZ: Q.499,500.00
Año Fiscal 2025
Costo del Proyecto
Aporte del Consejo Departamental de Desarrollo Q 499,500.00
Aporte Municipal Q 0.00
Aporte de la Comunidad Q 0.00
Otros Aportes Q 0.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO Q 499,500.00
Consejo Departamental de Desarrollo
EL PROGRESO
Para más información sobre este proyecto escanea el siguiente código QR
0201
Sistema de Consejos de Desarrollo
1504



CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA Y GESTIÓN AMBIENTAL

UNIDAD DE BITÁCORAS – DATOS DE LA BITÁCORA ELECTRÓNICA –

BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 4163/08/2025

No. CONTRATO	13-2025
FECHA CONTRATO	31/07/2025
MONTO CONTRACTUAL	499,500.00
NOG	27000761
NOMBRE DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO CALLE URBANA LOTIFICACION EL CARMEN, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO
UBICACIÓN DEL PROYECTO	Guastatoya, EL PROGRESO
ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JOEL AMADO ORELLANA
EMPRESA EJECUTORA	CARLOS ALBERTO AMADO ORELLANA
REPRESENTANTE LEGAL O CONTRATISTA	CARLOS ALBERTO AMADO ORELLANA
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA
SUPERVISOR EMPRESA SUPERVISORA	

FECHA DE AUTORIZACIÓN 07/08/2025



Municipalidad de Guastatoya, Departamento de El Progreso

DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION

LIBRO DE ACTAS DE INICIO DE OBRAS Nº 0199

ACTA DE INICIO NO. 19-2025

PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE URBANA LOTIFICACION EL CARMEN, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO. IDENTIFICADO CON NOG. 27000761, EN GUATECOMPRAS. ----------

En el Municipio de Guastatoya, Departamento El Progreso, siendo las ocho horas en punto del día lunes once de agosto de dos mil veinticinco, reunidos en el área donde se va a ejecutar el Proyecto, **MEJORAMIENTO CALLE URBANA LOTIFICACION EL CARMEN, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO.** Los señores: José Elías Herrera Guerra, Alcalde Municipal; Ing. José Fulgencio Alexander Aguilar Mejía, Supervisor de Obras Municipales; Carlos Alberto Amado Orellana, Representante Legal de la Empresa Constructora; Ing. Joel Amado Orellana, Supervisor Residente del Proyecto; Lic. Alexis Geovanny Marroquín Orellana, Director de la Dirección Municipal de Planificación; con el objeto de dejar constancia de lo siguiente. **PRIMERO:** Se faciona la presente acta para dejar constancia de Inicio del Proyecto: **MEJORAMIENTO CALLE URBANA LOTIFICACION EL CARMEN, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO.** El cual será ejecutado con fondos extraordinarios provenientes del Consejo Departamental de Desarrollo para el ejercicio fiscal 2,025; por un Valor de Cuatrocientos Noventa y Nueve Mil Quinientos Quetzales Exactos (Q. 499,500.00), con un plazo de cuatro meses calendario el cual, por adjudicación en los procesos y requisitos de GUATECOMPRAS, lo ejecutará la empresa **CONSTRUCTORA M&A,** Habiendo sido publicado en el Sistema de Guatecompras la adjudicación bajo el NOG- 27000761, Según Contrato Administrativo No. 13-2025 de fecha treinta y uno de julio del dos mil veinticinco. **SEGUNDO:** Los señores anteriormente mencionados declaran iniciados los trabajos, los cuales se realizarán con base a planos y especificaciones elaboradas para el presente proyecto y de acuerdo al contrato respectivo. **TERCERO:** El Señor Alcalde Municipal recomienda al representante de la empresa constructora, al supervisor residente de la empresa y supervisor de obras municipales que los trabajos sean ejecutados en base al diseño y especificaciones propias de este proyecto y presentar los avances del mismo para el pago respectivo con la documentación de soporte. **CUARTO:** No habiendo más que agregar se da por terminada la presente en el mismo lugar y fecha media hora después de su inicio. Leída se acepta, ratifica y firma por los que en ella intervenimos Damos fe. ----------

José Elías Herrera Guerra
Alcalde Municipal

Lic Alexis Geovanny Marroquín Orellana
Director
Dirección Municipal de Planificación

CONSTRUCTORA M&A
Barrio San Juan, Aldea Santa Rita
Guastatoya El Progreso
Nit. 20115989

Carlos Alberto Amado Orellana
Representante de la empresa

Ing. Joel Amado Orellana
Supervisor Residente

Ing. José Fulgencio Alexander Aguilar Mejía
Supervisor de Obras Municipales

BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 4163/08/2025

CONTRATO No.	13-2025
NOMBRE:	MEJORAMIENTO CALLE URBANA LOTIFICACION EL CARMEN, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO
ENTIDAD:	MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

REGISTRO No.	2
FECHA	08/09/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	Se realiza la colocación de la base, se cuenta con personal y materiales suficientes para el avance del proyecto
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA









BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 4163/08/2025


CONTRATO No.	13-2025
NOMBRE:	MEJORAMIENTO CALLE URBANA LOTIFICACION EL CARMEN, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO
ENTIDAD:	MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

REGISTRO No.	3
FECHA	22/09/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	Se continua con la colocación de base para la fundición del pavimento y se realiza fundición de pavimento
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA







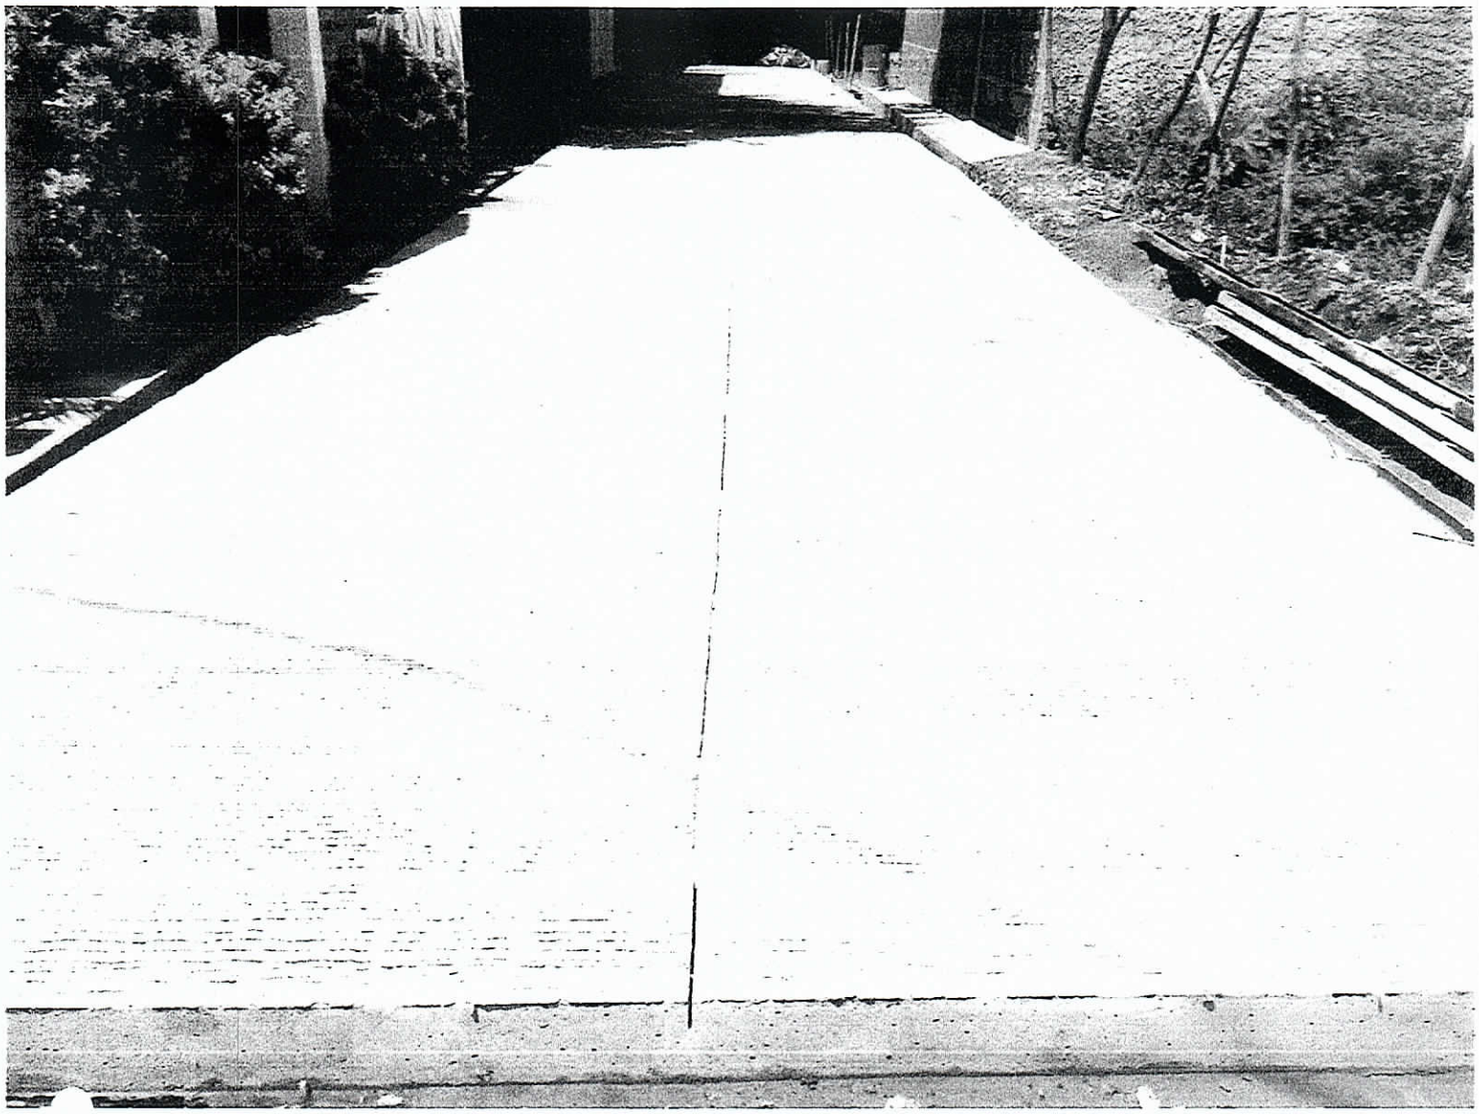



MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!

5980-0535 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

BARRIO EL CALVARIO, **GUASTATOYA EL PROGRESO**

LA INFRASCRITA SECRETARIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO

CERTIFICA

Que para su cumplimiento y efectos consiguientes se transcribe EL ACUERDO MUNICIPAL No. 106-2025 de fecha treinta y uno de octubre de dos mil veinticinco del libro número 3,211 de la Alcaldía Municipal, Libro de Acuerdos, debidamente autorizado por la Contraloría General de Cuentas, el que copiado literalmente dice:

ACUERDO MUNICIPAL 106-2025

Guastatoya, 31 de Octubre de 2,025

DESPACHO DEL ALCALDE MUNICIPAL

La Autoridad Administrativa Superior

Se tiene a la vista la solicitud presentada por CARLOS ALBERTO AMADO ORELLANA propietario de la empresa CONSTRUCTORAS M&A, en la cual manifiesta que el proyecto denominado **"MEJORAMIENTO CALLE URBANA LOTIFICACION EL CARMEN, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO"**, el que se ejecuta por la modalidad de Contrato Administrativo de Obra, número 13-2025, de fecha treinta y uno de julio de dos mil veinticinco; y que el proyecto en referencia se encuentra en un avance físico del 100%, en consecuencia solicitan el pago por dicha estimación, de conformidad con la cláusula cuarta numeral 2) del contrato en referencia.

Consecuentemente se encuentra el informe del Ingeniero Jose Fulgencio Alexander Aguilar Mejía, Supervisor de Obras Municipales, en el cual hace constar la confirmación del avance del proyecto en referencia, por un total de 100.00% de avance físico, adjunta para el efecto la estimación.

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el artículo 59 de la Ley de Contrataciones del Estado, *"La entidad contratante podrá hacer pagos parciales al contratista contra estimaciones periódicas de trabajo ejecutado y aceptado, las que podrán efectuarse mensualmente de acuerdo con las estipulaciones pactadas"*.

POR TANTO:

Con fundamento en los antecedentes y lo considerado, este Despacho Municipal.

RESUELVE:

I) **APROBAR**, el avance físico del proyecto por la cantidad de 100.00%, del proyecto **"MEJORAMIENTO CALLE URBANA LOTIFICACION EL CARMEN, BARRIO MINERVA, GUASTATOYA, EL PROGRESO"**, el que se ejecuta por la modalidad de Contrato Administrativo de Obra, número 13-2025, de fecha treinta y uno de julio de dos mil veinticinco, suscrito por el Alcalde Municipal y CARLOS ALBERTO AMADO ORELLANA, en su calidad de propietario de la empresa mercantil denominada **"CONSTRUCTORA M&A"**.

II) Se nombra a la Junta Receptora y Liquidadora de Obras, para que comparezca en el lugar de la ejecución del proyecto en referencia, a realizar la recepción que en derecho corresponde.

III) **SE ORDENA**, al Director de la Administración Financiera Municipal, posterior al acta de recepción de la Junta Receptora, hacer el pago correspondiente al 100.00% de avance físico, adjunta para el efecto la estimación.

IV) Cúmplase. -

DADO EN EL PALACIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE GUASTATOYA, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, A TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO.

SECRETARIA

LICDA. EVELYN YANETH OAJACA MARROQUIN
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA ¡Sirviendo!
