MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!

5980-0535 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
BARRIO EL CALVARIO, **GUASTATOYA EL PROGRESO**

REPORTE DE PAGO DE PROYECTOS POR CONTRATO 2024

EXPEDIENTE No. **282** NOG: **24417289** CONTRATO No. **28-2024**

PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS CHORRITOS, ALDEA SANTA LUCIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

APORTES	% DE AVANCE	ESTIMACION	AMORTIZACION	LIQUIDO A RECIBIR
Aporte CODEDE	**90.00%**			
Q. 1,199,500.00		**Q. 1,080,000.00**	**Q. 216,000.00**	**Q. 864,000.00**
32 00 002 000 009 331 31-0101-0004				
TOTALES		**Q. 1,080,000.00**	**Q. 216,000.00**	**Q. 864,000.00**

Se cuenta con Informe de supervisión por parte de la empresa, informe de supervisión por el Supervisor de Obras Municipales, Punto de Concejo de aprobación de avance, Copia de bitácora.

Lic. Alexis Geovanny Marroquín Orellana
Director Municipal de Planificación

DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA ¡Sirviendo!



BANRURAL
El amigo que te ayuda a crecer

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
Capital de la amistad

CUENTA UNICA DEL TESORO
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA C.U.T.
CUENTA No. **3-005-09207-3**
GUATEMALA, C.A.

CHEQUE No. 79971

No. 19806021

LUGAR Y FECHA: GUASTATOYA, 16 de MAYO del 2025

Q. ***861,000.00***

PAGO A LA ORDEN DE: ***PAREDO, ORELLANA, CARLOS ALBERTO***

SUMA DE: ***OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL ***

QUETZALES.

GT86 BRRL 0101 0000 0030 0509 2073

FIRMA

FIRMA

NO NEGOCIABLE

FORMULARIOS STANDARD S. A. PBX 2423 8600

DESCRIPCION DEL PAGO
POR CONCEPTO: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 90% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS CHORRITOS, ALDEA SANTA LUCIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

79971

CUENTA No.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	NUMERO DE CHEQUE: 79971 CON NUMERO DE EXPEDIENTE: 282 TRANSACCION No: 61677424 NIT BENEFICIARIO: 20115989 DELMI.ORELLANA1652025 16 de MAYO del 2025		

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	RECIBI CONFORME	DIA	MES	AÑO
				19	05	25

4037407 T0340 - 3048407 87

BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 4428/12/2024

CONTRATO No. 28-2024

NOMBRE: MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS CHORRITOS, ALDEA SANTA LUCIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

REGISTRO No.	5
FECHA	04/02/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	En este dia se observa la colocación de adoquin y bordillo prefabricado, además de la base para la fundición de pavimento
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA

Factura

CARLOS ALBERTO, AMADO ORELLANA
Nit Emisor: 20115989
CONSTRUCTORA M&A
ALDEA SANTA RITA BARRIO SAN JUAN, Guastatoya, EL PROGRESO
NIT Receptor: 6206107
Nombre Receptor: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
DCB3FE23-A465-4262-8610-274633FA1593
Serie: DCB3FE23 Número de DTE: 2758099554
Numero Acceso:
Fecha y hora de emision: 16-may-2025 12:19:59
Fecha y hora de certificación: 16-may-2025 12:19:59
Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Otros Descuentos(Q)	Total (Q)	Impuestos	
1	Servicio	1	PAGO DEL 90.00 % DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE RURAL, SECTOR LOS CHORRITOS, ALDEA SANTA LUCIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO. CONTRATO No. 28-2024, EXPEDIENTE No. 282, NOG 24417289. MONTO DE ESTIMACIÓN: Q. 1,080,000.00 (–) AMORTIZACIÓN: Q. 216,000.00 (=) LÍQUIDO A RECIBIR: Q. 864,000.00. APROBADO Y AUTORIZADO.	1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00	IVA	115,714.285714
				TOTALES:	0.00	0.00	1,080,000.00	IVA	115,714.285714

* Sujeto a pagos trimestrales ISR

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

"Contribuyendo por el país que todos queremos"




GUATECOMPRAS

CONCURSO: Adición de anexos al concurso en la Fase de Ejecución

Mensaje de confirmación	
13.may..2025 11:36:47	
Documentos asociados:	
1	24417289@INFORME DE SUPERVISON 90 AVANCE FISICO CALLE LOS CHORRITOS.pdf(1861 KB)
Si desea imprimir este mensaje, oprima el siguiente botón	

Términos y Condiciones de Uso

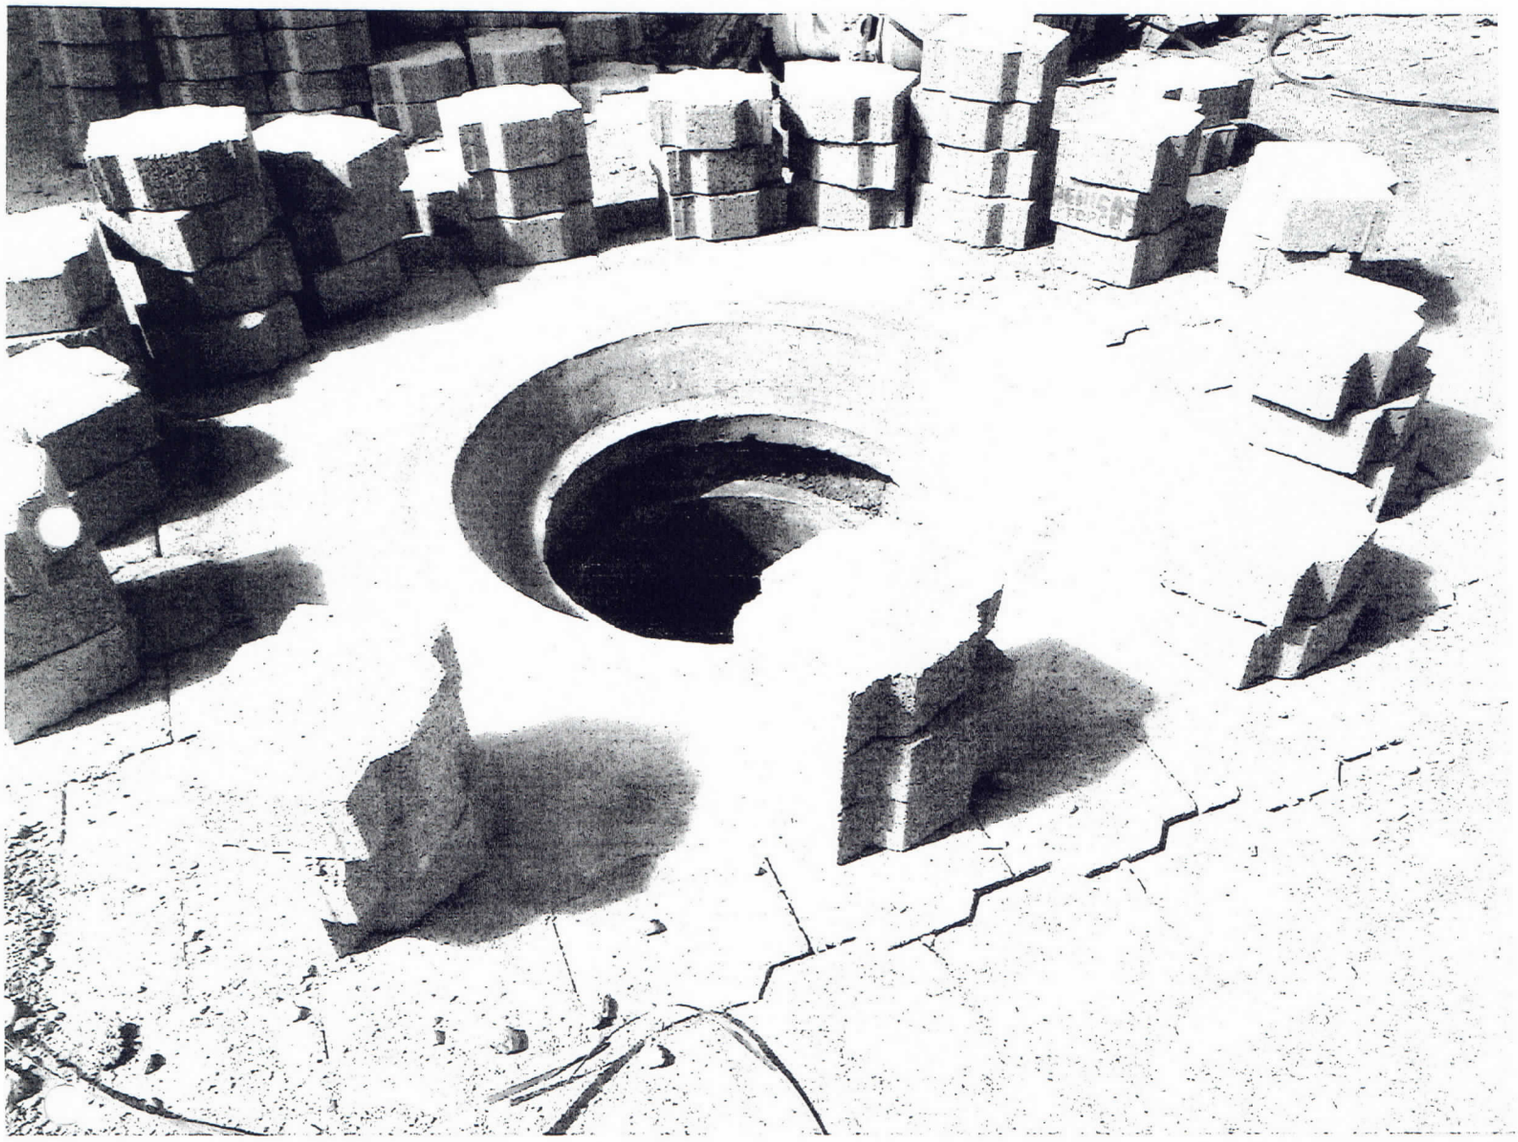

FORMA 7-B INGRESOS VARIOS

RECIBO DE LA MUNICIPALIDAD
DE GUASTATOYA, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO

SERIE B No. 636304

FECHA: DIA 8 | MES 5 | AÑO 2025

Ochocientos sesenta y cuatro mil con 00/100

POR: quetzales — CODIGO JURISDICCIONAL: D-4 5201

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: Consejo Departamental de Desarrollo

DIRECCION: El Progreso

ARBITRIOS	ORNATO (Q.4.00 10.00 15.00 50.00 75.00 100.00 150.00)	Q.	
TASAS	VARIOS		
	LICENCIAS		
	ESTACIONAMIENTOS		
	CERTIFICACIONES		
	CEDULAS		
	MERCADOS		
	SERVICIOS VARIOS		
	SERVICIOS AGUA		
	SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA		
CONTRIBUCIONES	CONCEPTO: Pago del 90.00 % segundo desembolso del		
MULTAS	CONCEPTO: proyecto mejoramiento calle rural sector los		Q864,000.00
OTROS	VARIOS: chorritos, aldea Santa Lucia, Guastatoya, El Progreso, SNIP 334525, convenio No. 085-2024, fuente 12, subprograma 7		

LECTURA DE CONTADOR: ACTUAL 0 ANTERIOR

OBSERVACIONES

FIRMA DEL RECEPTOR MUNICIPAL — CUENTA — SUB-CUENTA

TOTAL Q. Q864,000.00

VALIDO UNICAMENTE POR EL IMPORTE IMPRESO POR LA CAJA REGISTRADORA MUNICIPAL Y/O NOMBRE FIRMA Y SELLO DEL RECEPTOR MUNICIPAL.

ORIGINAL-ENTERANTE

FIRMA ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA ¡Sirviendo!

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA ¡Sirviendo!

AUTORIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS S/RES. No. BJ/5875 Clas.: 920-12-8-1-4-97 DEL 26-06-97.

2045310 T-0340 1019911 87

FORMULARIOS STANDARD, S.A. PBX: 2420-9900 - NIT: 193222-7 - 150,000 - 10/2022 DEL No. 500,001 AL No. 650,000. SERIE B. ENVIO MUNICIPAL No. 48310 DE FECHA 13/10/2022 NUMERO CORRELATIVO D-4-110-2022 DE FECHA 13/10/2022 No. DE CUENTA: 13-2-1 OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 10/10/2022 LIBRO 65735 FOLIO 7.

www.standard-sa.com



CONSTRUCTORA
M & A

Guastatoya El Progreso, 07 de MARZO de 2025

Señores
Municipalidad de Guastatoya, E Progreso
Departamento de El Progreso

De la manera más atenta nos dirigimos a ustedes esperando que el desarrollo de sus actividades sea de la mejor manera.

El motivo de la presente es para solicitar pago de la primera estimación del 90.00% de la oferta para el evento **MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS CHORRITOS, ALDEA SANTA LUCIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO.** según contrato administrativo número 28-2024 de fecha cuatro de diciembre del año 2024, para cual adjunto el cuadro de estimación del 90.00% de dicho proyecto.

No teniendo más que manifestarles, me suscribo quedando atento y a sus respetables órdenes.

Atentamente,

CONSTRUCTORA M&A
Barrio San Juan, Aldea Santa Rita
Guastatoya El Progreso
11589

CARLOS ALBERTO AMADO ORTIZ ANA
CONSTRUCTORA M&A



PRIMERA ESTIMACION

MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS CHORRITOS, ALDEA SANTA LUCIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

RESUMEN DE RENGLONES

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES DE TRABAJO				ORDEN DE CAMBIO	ORDEN DE TRABAJO SUPLEMENTARIO	ORDEN DE TRABAJO EXTRA	RENGLON MODIFICADO	CANTIDADES EJECUTADAS PRIMERA ESTIMACION		ACUMULADO A LA FECHA		PORCENTAJE
		CANTIDAD	UNIDAD	P UNITARIO	TOTAL	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	TOTAL
1	TRABAJOS PRELIMINARES	1,904.00	m2	Q 10.20	Q 19,420.80	-			1,904.00	1,904.00	Q 19,420.80	1,904.00	Q 19,420.80	1.62%
2	LEVANTADO Y TRASLADO DE ADOQUIN EXISTENTE	1,904.00	M2	Q 78.95	Q 150,320.80	-			1,904.00	1,904.00	Q 150,320.80	1,904.00	Q 150,320.80	12.53%
3	CORTE DE CAJUELA +CONFORMACION Y NIVELACION DE SUBRASANTE 0.20 m.	1,904.00	M2	Q 65.55	Q 124,807.20	-			1,904.00	1,904.00	Q 124,807.20	1,904.00	Q 124,807.20	10.40%
4	BASE DE MATERIAL SELECTO COMPACTADO E=0.10M	1,904.00	M2	Q 89.85	Q 171,074.40	-			1,904.00	1,904.00	Q 171,074.40	1,904.00	Q 171,074.40	14.26%
5	ADOQUINADO (ADOQUIN CLASE A TRAFICO PESADO)	1,821.00	m2	Q 320.35	Q 583,357.35	532.00			1,289.00	985.85	Q 315,815.80	985.85	Q 315,815.80	26.33%
6	LLAVES DE CONFINAMIENTO 0.10X0.20 4000 PSI	189.00	ML	Q 62.30	Q 11,774.70	28.00			161.00	100.00	Q 6,230.00	100.00	Q 6,230.00	0.52%
7	BORDILLO PREFABRICADO DE 0.15*0.30m*0.50 F'c=280KG/CM2	805.00	ML	Q 149.75	Q 120,548.75	375.00			430.00	300.00	Q 44,925.00	300.00	Q 44,925.00	3.75%
8	READECUACION BROCALES DE POZOS EXISTENTES	5.00	UNIDAD	Q 3,639.20	Q 18,196.00				5.00	5.00	Q 18,196.00	5.00	Q 18,196.00	1.52%
	TRABAJOS EXTRAS													
9	FUNDICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO DE 0.15 M DE ESPESOR	532.00	M2	Q 430.00	Q 228,760.00			532.00	532.00	532.00	Q 228,760.00	532.00	Q 228,760.00	19.07%
	COSTO TOTAL DEL PROYECTO				Q 1,199,500.00						Q 1,079,550.00		Q 1,079,550.00	90.00%

VALOR DE ESTIMACION No. 1	Q	1,079,550.00
AMORTIZACION DEL ANTICIPO (20%)	Q	215,910.00
PENDIENTE DE AMORTIZAR	Q	23,990.00
LIQUIDO A RECIBIR	Q	863,640.00

GUASTATOYA 07 DE MARZO 2025


CONSTRUCTORA M&A
Barrio San Juan, Aldea Santa Rita
Guastatoya El Progreso
20115989

CARLOS ALBERTO AMADO ORELLANA
CONSTRUCTORA M&A

JOEL AMADO ORELLANA
INGENIERO CIVIL
CON ENFASIS EN CONSTRUCCIONES RURALES
COLEGIADO No. 18,357

ING. JOEL AMADO ORELLANA
INGENIERO RESIDENTE

CONSTRUCTORA M & A

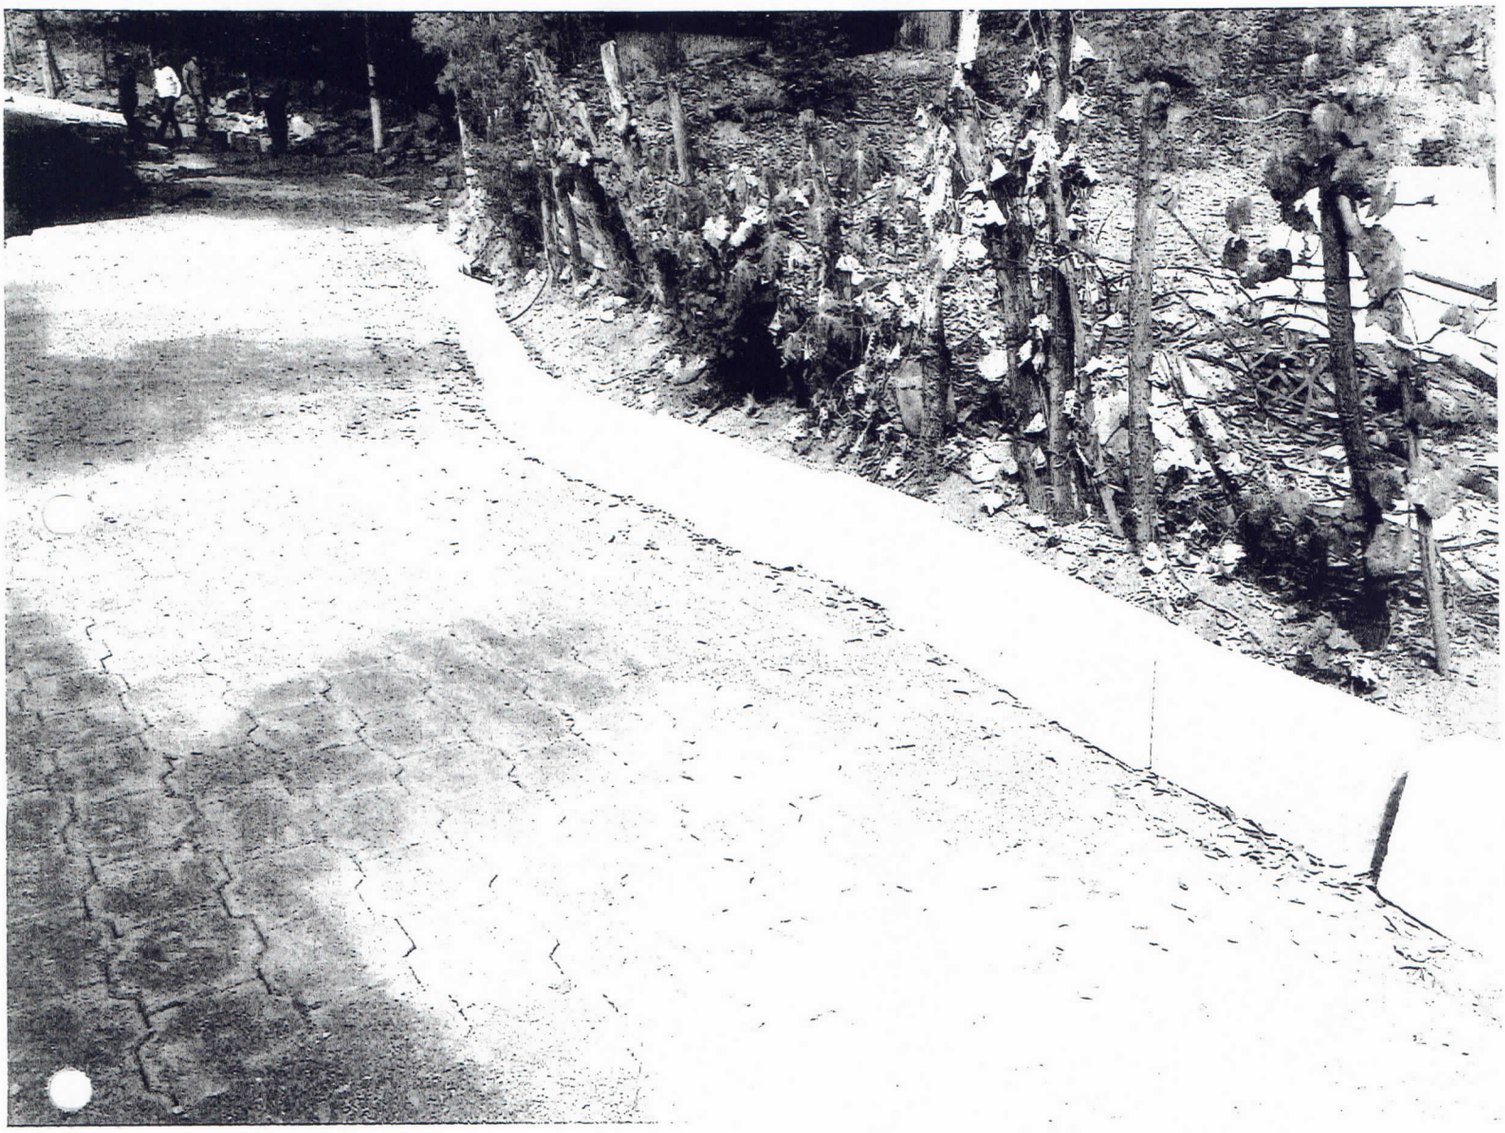

CONSTRUCTORA
M & A

Guastatoya El Progreso, 07 de MARZO de 2025

Señores
Municipalidad de Guastatoya, E Progreso
Departamento de El Progreso

De la manera más atenta nos dirigimos a ustedes esperando que el desarrollo de sus actividades sea de la mejor manera.

El motivo de la presente es para solicitar pago de la primera estimación del 90.00% de la oferta para el evento **MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS CHORRITOS, ALDEA SANTA LUCIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO.** según contrato administrativo número 28-2024 de fecha cuatro de diciembre del año 2024, para cual adjunto el cuadro de estimación del 90.00% de dicho proyecto.

No teniendo más que manifestarles, me suscribo quedando atento y a sus respetables órdenes.

Atentamente,

CONSTRUCTORA M&
Barrio San Juan Aldea Santa Rita
Guastatoya El Progreso
NIT: 3[illegible]15989

CARLOS ALBERTO AMADO ORELLANA
CONSTRUCTORA M&A



PRIMERA ESTIMACION

MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS CHORRITOS, ALDEA SANTA LUCIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

RESUMEN DE RENGLONES

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES DE TRABAJO				ORDEN DE CAMBIO	ORDEN DE TRABAJO SUPLEMENTARIO	ORDEN DE TRABAJO EXTRA	RENGLON MODIFICADO	CANTIDADES EJECUTADAS PRIMERA ESTIMACION		ACUMULADO A LA FECHA		PORCENTAJE
		CANTIDAD	UNIDAD	P UNITARIO	TOTAL	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	TOTAL
1	TRABAJOS PRELIMINARES	1,904.00	m2	Q 10.20	Q 19,420.80	-			1,904.00	1,904.00	Q 19,420.80	1,904.00	Q 19,420.80	1.62%
2	LEVANTADO Y TRASLADO DE ADOQUIN EXISTENTE	1,904.00	M2	Q 78.95	Q 150,320.80	-			1,904.00	1,904.00	Q 150,320.80	1,904.00	Q 150,320.80	12.53%
3	CORTE DE CAJUELA +CONFORMACION Y NIVELACION DE SUBRASANTE 0.20 m.	1,904.00	M2	Q 65.55	Q 124,807.20	-			1,904.00	1,904.00	Q 124,807.20	1,904.00	Q 124,807.20	10.40%
4	BASE DE MATERIAL SELECTO COMPACTADO E=0.10M	1,904.00	M2	Q 89.85	Q 171,074.40	-			1,904.00	1,904.00	Q 171,074.40	1,904.00	Q 171,074.40	14.26%
5	ADOQUINADO (ADOQUIN CLASE A TRAFICO PESADO)	1,821.00	m2	Q 320.35	Q 583,357.35	532.00			1,289.00	985.85	Q 315,815.80	985.85	Q 315,815.80	26.33%
6	LLAVES DE CONFINAMIENTO 0.10X0.20 4000 PSI	189.00	ML	Q 62.30	Q 11,774.70	28.00			161.00	100.00	Q 6,230.00	100.00	Q 6,230.00	0.52%
7	BORDILLO PREFABRICADO DE 0.15*0.30m*0.50 F'c=280KG/CM2	805.00	ML	Q 149.75	Q 120,548.75	375.00			430.00	300.00	Q 44,925.00	300.00	Q 44,925.00	3.75%
8	READECUACION BROCALES DE POZOS EXISTENTES	5.00	UNIDAD	Q 3,639.20	Q 18,196.00				5.00	5.00	Q 18,196.00	5.00	Q 18,196.00	1.52%
	TRABAJOS EXTRAS													
9	FUNDICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO DE 0.15 M DE ESPESOR	532.00	M2	Q 430.00	Q 228,760.00			532.00	532.00	532.00	Q 228,760.00	532.00	Q 228,760.00	19.07%
	COSTO TOTAL DEL PROYECTO				**Q 1,199,500.00**						**Q 1,079,550.00**		**Q 1,079,550.00**	**90.00%**

VALOR DE ESTIMACION No. 1	Q	1,079,550.00
AMORTIZACION DEL ANTICIPO (20%)	Q	215,910.00
PENDIENTE DE AMORTIZAR	Q	23,990.00
LIQUIDO A RECIBIR	**Q**	**863,640.00**

GUASTATOYA 07 DE MARZO 2025

CONSTRUCTORA M&A
Barrio San Juan, Aldea Santa Rita
Guastatoya El Progreso
NIT 7015989

CARLOS ALBERTO AMADO ORELLANA
CONSTRUCTORA M&A

JOEL AMADO ORELLANA
INGENIERO CIVIL
CON ENFASIS EN CONSTRUCCIONES RURALES
COLEGIADO No. 18,357

ING. JOEL AMADO ORELLANA
INGENIERO RESIDENTE

CONSTRUCTORA M & A

BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 4428/12/2024

CONTRATO No. 28-2024

NOMBRE: MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS CHORRITOS, ALDEA SANTA LUCIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

REGISTRO No.	4
FECHA	27/01/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	Se continua con los trabajos de adoquinado y colocación de bordillo prefabricado, ademas de preparación de base para pavilento, se cuenta con personal y materiales suficientes para el avance del proyecto
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA


CONSTRUCTORA
M & A

MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS CHORRITOS, ALDEA SANTA LUCIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO







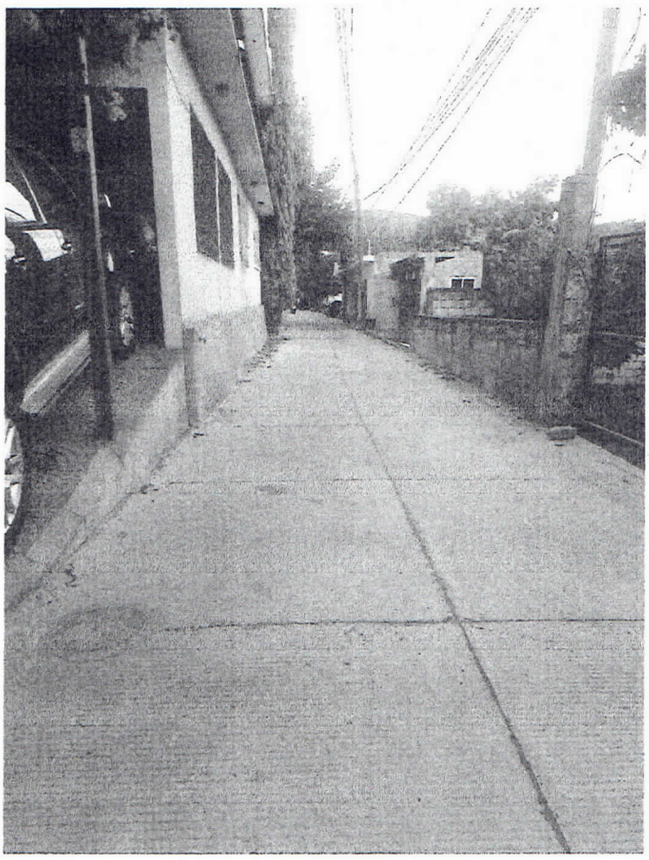



CONSTRUCTORA
M & A

MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS CHORRITOS, ALDEA SANTA LUCIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO









MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!

5980-0535 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
BARRIO EL CALVARIO, **GUASTATOYA EL PROGRESO**

INFORME DE SUPERVISION

Guastatoya, 10 de Marzo de 2025

SEÑOR: JOSE ELIAS HERRERA GUERRA Y CONSEJO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
EL PROGRESO

De la manera más atenta me dirijo a usted deseándole toda clase de éxitos en sus labores diarias.

El motivo de la presente es para hacerle saber lo siguiente:

En visita de supervisión realizada al proyecto denominado **MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS CHORRITOS, ALDEA SANTA LUCIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO,** con número de contrato **28-2024** de fecha 04 de Diciembre de 2024, ejecutado por la empresa **CONSTRUCTORA M&A**, financiado por la Municipalidad de Guastatoya, se tiene a la vista el oficio de Marzo de 2025 en el cual se hace la solicitud de la estimación del proyecto para un avance del **90.00%**, para lo cual se adjunta el informe de supervisión y el informe de parte de la empresa.

Agradeciendo su atención y en espera de darle seguimiento a este asunto me suscribo de ustedes.

Atentamente

ING. JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA
SUPERVISOR MUNICIPAL, GUASTATOYA
EL PROGRESO



D.M.P.	SUPERVISION DE OBRAS	*Dirección Municipal de* Planificación

Comunidad.	**Contrato Municipal.**
Aldea Santa Lucia, Guastatoya, El Progreso	28-2024

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del proyecto.	**Ubicación del proyecto.**
MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS CHORRITOS, ALDEA SANTA LUCIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Aldea Santa Lucia, Guastatoya, El Progreso
Contratista.	**Ubicación del proyecto.**
CONSTRUCTORA M&A	Aldea Santa Lucia, Guastatoya, El Progreso
Monto Contratado. Q 1,199,500.00	**Avance Físico.** 90.00%
Informe de Supervisión No. 1	**Fecha.** 10 de Marzo de 2025

2. AVANCE DE EJECUCION DEL PROYECTO

No.	Descripcion del Renglón	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Total a la Fecha	Avance Físico %
1	TRABAJOS PRELIMINARES	1,904.00	m2	Q 10.20	Q 19,420.80	Q 19,420.80	100%
2	LEVANTADO Y TRASLADO DE ADOQUIN EXISTENTE	1,904.00	M2	Q 78.95	Q 150,320.80	Q 150,320.80	100%
3	CORTE DE CAJUELA +CONFORMACION Y NIVELACION DE SUBRASANTE 0.20 m.	1,904.00	M2	Q 65.55	Q 124,807.20	Q 124,807.20	100%
4	BASE DE MATERIAL SELECTO COMPACTADO E=0.10M	1,904.00	M2	Q 89.85	Q 171,074.40	Q 171,074.40	100%
5	ADOQUINADO (ADOQUIN CLASE A TRAFICO PESADO)	985.85	m2	Q 320.35	Q 315,815.80	Q 315,815.80	54%
6	LLAVES DE CONFINAMIENTO 0.10X0.20 4000 PSI	100.00	ML	Q 62.30	Q 6,230.00	Q 6,230.00	53%
7	BORDILLO PREFABRICADO DE 0.15*0.30m*0.50 F'c=280KG/CM2	300.00	ML	Q 149.75	Q 44,925.00	Q 44,925.00	37%
8	READECUACION BROCALES DE POZOS EXISTENTES	5.00	UNIDAD	Q 3,639.20	Q 18,196.00	Q 18,196.00	100%
	TRABAJOS EXTRAS						
9	FUNDICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO DE 0.15 M DE ESPESOR	532.00	M2	Q 430.00	Q 228,760.00	Q 228,760.00	100%
					Q 1,079,550.00	**Q 1,079,550.00**	**90.00%**

Estos renglones de trabajo dan como resultado un avance físico del **90.00%** **por lo cual se aprueba realizar el pago correspondiente**

3. DESCRIPCION DEL PROYECTO.

Este proyecto consiste en el mejoramiento de la calle del sector los chorritos, en aldea santa lucia, se realiza una parte de adoquinado y otra parte de pavimento de concreto, lo cual va a beneficiar a la comunidad

4. RECOMENDACIONES.

Chequear los trabajos realizados para garantizar la durabilidad de los mismos, y terminar los trabajos faltantes, los que no se encuentran al 100 % y los que no se han iniciado aun

SUPERVISOR DE PROYECTOS MUNICIPALES.

ING. JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA
SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES





D.M.P.	SUPERVISION DE OBRAS	Dirección Municipal de Planificación

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del proyecto.	**Ubicación del proyecto.**
MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS CHORRITOS, ALDEA SANTA LUCIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Aldea Santa Lucia, Guastatoya, El Progreso

2. INFORME FOTOGRAFICO.

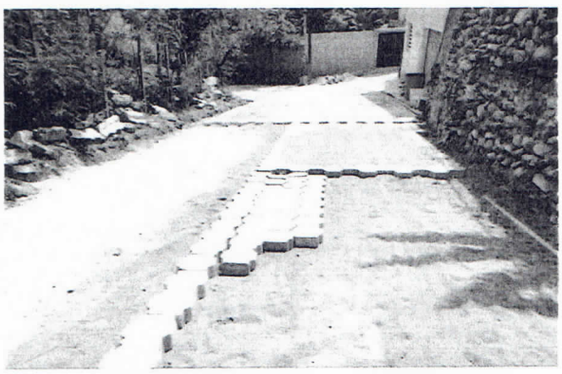

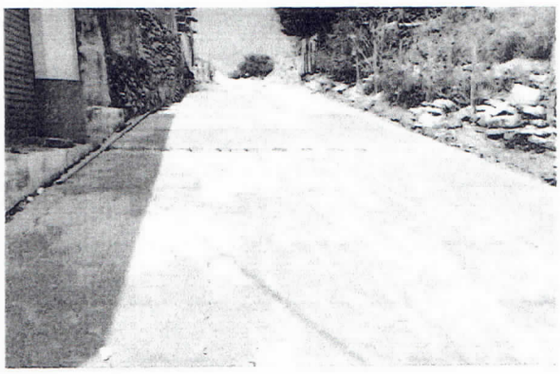







SUPERVISOR DE PROYECTOS MUNICIPALES.

ING. JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA
SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES

BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 4428/12/2024

CONTRATO No. 28-2024

NOMBRE: MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS CHORRITOS, ALDEA SANTA LUCIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

REGISTRO No.	3
FECHA	20/01/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	Se realizan trabajos de corte de cajuela y base
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA


REPORTE DE AVANCE FISICO No. 1

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS CHORRITOS, ALDEA SANTA LUCIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	
Municipio: GUASTATOYA	**Departamento: EL PROGRESO**
Comunidad: ALDEA SANTA LUCIA	**Fecha de Contrato: 04/12/2024**
Fecha de Inicio: 17/12/2024	**Fecha de Supervision:10/03/2025**
Fecha de Finalizacion: 16/06/2025	**Unidad Ejecutora: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA**
Contrato No.: 28-2024	**Valor del Proyecto: Q.1,199,500.00**
Modificaciones:	**Valor Original: Q.1,199,500.00**
Constructora: CONSTRUCTORA M&A	**Telefono:**
Representante legal: CARLOS ALBERTO AMADO ORELLANA	

RESUMEN DE RENGLONES

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES DE TRABAJO				ORDEN DE CAMBIO	ORDEN DE TRABAJO SUPLEMENTARIO	ORDEN DE TRABAJO EXTRA	RENGLON MODIFICADO	CANTIDADES EJECUTADAS PRIMERA ESTIMACION		ACUMULADO A LA FECHA		PORCENTAJE
		CANTIDAD	UNIDAD	P UNITARIO	TOTAL	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	TOTAL
1	TRABAJOS PRELIMINARES	1,904.00	m2	Q 10.20	Q 19,420.80	-			1,904.00	1,904.00	Q 19,420.80	1,904.00	Q 19,420.80	1.62%
2	LEVANTADO Y TRASLADO DE ADOQUIN EXISTENTE	1,904.00	M2	Q 78.95	Q 150,320.80	-			1,904.00	1,904.00	Q 150,320.80	1,904.00	Q 150,320.80	12.53%
3	CORTE DE CAJUELA +CONFORMACION Y NIVELACION DE SUBRASANTE 0.20 m.	1,904.00	M2	Q 65.55	Q 124,807.20	-			1,904.00	1,904.00	Q 124,807.20	1,904.00	Q 124,807.20	10.40%
4	BASE DE MATERIAL SELECTO COMPACTADO E=0.10M	1,904.00	M2	Q 89.85	Q 171,074.40	-			1,904.00	1,904.00	Q 171,074.40	1,904.00	Q 171,074.40	14.26%
5	ADOQUINADO (ADOQUIN CLASE A TRAFICO PESADO)	1,821.00	m2	Q 320.35	Q 583,357.35	532.00			1,289.00	985.85	Q 315,815.80	985.85	Q 315,815.80	26.33%
6	LLAVES DE CONFINAMIENTO 0.10X0.20 4000 PSI	189.00	ML	Q 62.30	Q 11,774.70	28.00			161.00	100.00	Q 6,230.00	100.00	Q 6,230.00	0.52%
7	BORDILLO PREFABRICADO DE 0.15*0.30m*0.50 F'c=280KG/CM2	805.00	ML	Q 149.75	Q 120,548.75	375.00			430.00	300.00	Q 44,925.00	300.00	Q 44,925.00	3.75%
8	READECUACION BROCALES DE POZOS EXISTENTES	5.00	UNIDAD	Q 3,639.20	Q 18,196.00				5.00	5.00	Q 18,196.00	5.00	Q 18,196.00	1.52%
	TRABAJOS EXTRAS													
9	FUNDICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO DE 0.15 M DE ESPESOR	532.00	M2	Q 430.00	Q 228,760.00			532.00	532.00	532.00	Q 228,760.00	532.00	Q 228,760.00	19.07%
	COSTO TOTAL DEL PROYECTO				**Q 1,199,500.00**						**Q 1,079,550.00**		**Q 1,079,550.00**	**90.00%**

VALOR DE ESTIMACION No. 1	Q 1,079,550.00
AMORTIZACION DEL ANTICIPO (20%)	Q 215,910.00
PENDIENTE DE AMORTIZAR	Q 23,990.00
LIQUIDO A RECIBIR	**Q 863,640.00**



JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES



Contraloría General de Cuentas
GUATEMALA, C.A.

Bitácora Electrónica

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA Y GESTIÓN AMBIENTAL

UNIDAD DE BITÁCORAS – DATOS DE LA BITÁCORA ELECTRÓNICA –

BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 4428/12/2024

No. CONTRATO	28-2024
FECHA CONTRATO	04/12/2024
MONTO CONTRACTUAL	1,199,500.00
NOG	24417289
NOMBRE DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS CHORRITOS, ALDEA SANTA LUCIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO
UBICACIÓN DEL PROYECTO	Guastatoya, EL PROGRESO
ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JOEL AMADO ORELLANA
EMPRESA EJECUTORA	CARLOS ALBERTO AMADO ORELLANA
REPRESENTANTE LEGAL O CONTRATISTA	CARLOS ALBERTO AMADO ORELLANA
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA
SUPERVISOR EMPRESA SUPERVISORA	

FECHA DE AUTORIZACIÓN 09/12/2024



BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 4428/12/2024


CONTRATO No. 28-2024

NOMBRE: MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS CHORRITOS, ALDEA SANTA LUCIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

REGISTRO No.	1
FECHA	04/01/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	El dia de hoy se procede a realizar visita de campo, se observan los trabajos de nivelación de base, se cuenta con personal capacitado y equipo suficiente
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA



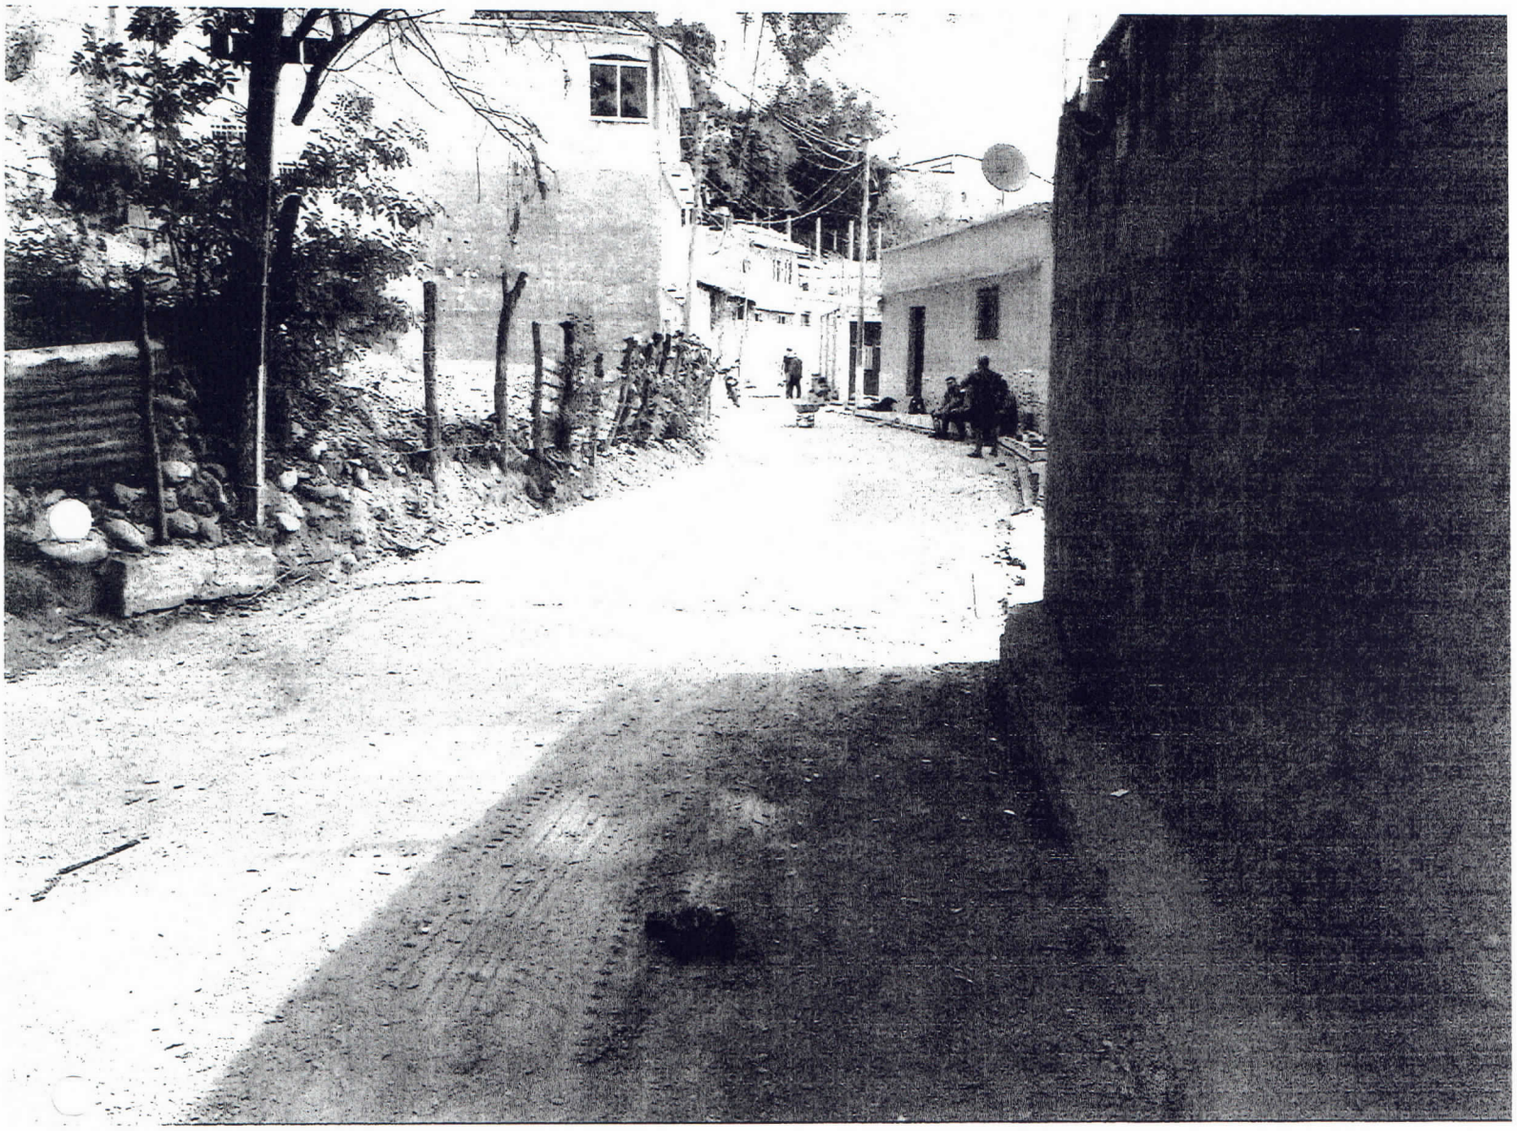










VALOR



BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 4428/12/2024

CONTRATO No. 28-2024

NOMBRE: MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS CHORRITOS, ALDEA SANTA LUCIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

REGISTRO No.	2
FECHA	15/01/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	En este dia se observa la colocación de adoquin y la fundicion de llaves de confinamiento, se tiene personal suficiente y materiales de buena calidad
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA











BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 4428/12/2024

CONTRATO No. 28-2024

NOMBRE: MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS CHORRITOS, ALDEA SANTA LUCIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

REGISTRO No.	6
FECHA	12/02/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	Se observa fundición de pavimento y continuación de adoquinado, ademas de base para fundición, se tiene personal suficiente y materiales adecuados y de calidad para el avance del proyecto
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA












Crush

BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 4428/12/2024

CONTRATO No. 28-2024


NOMBRE: MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS CHORRITOS, ALDEA SANTA LUCIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO


ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

REGISTRO No.	7
FECHA	01/03/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	Se observa la continuación de preparación de base para la colocación de adoquin y se observa el trabajo de pavimento terminado, se cuenta con personal y materiales suficientes para el avance del proyecto
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA





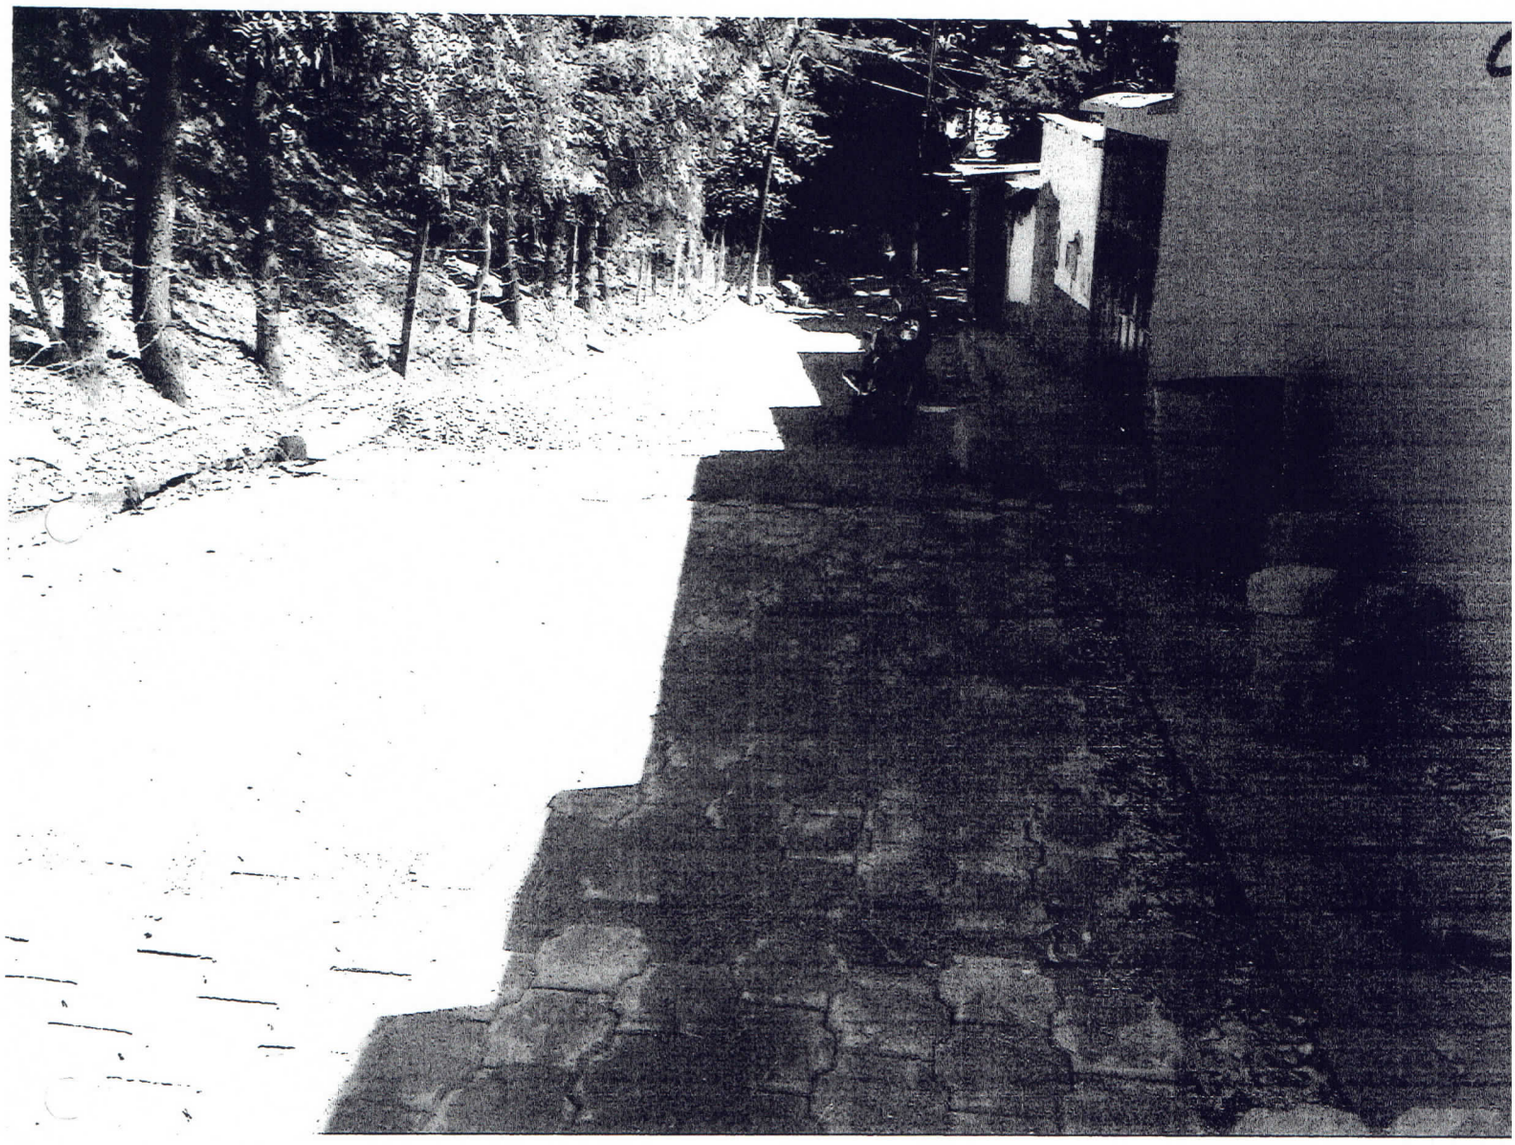

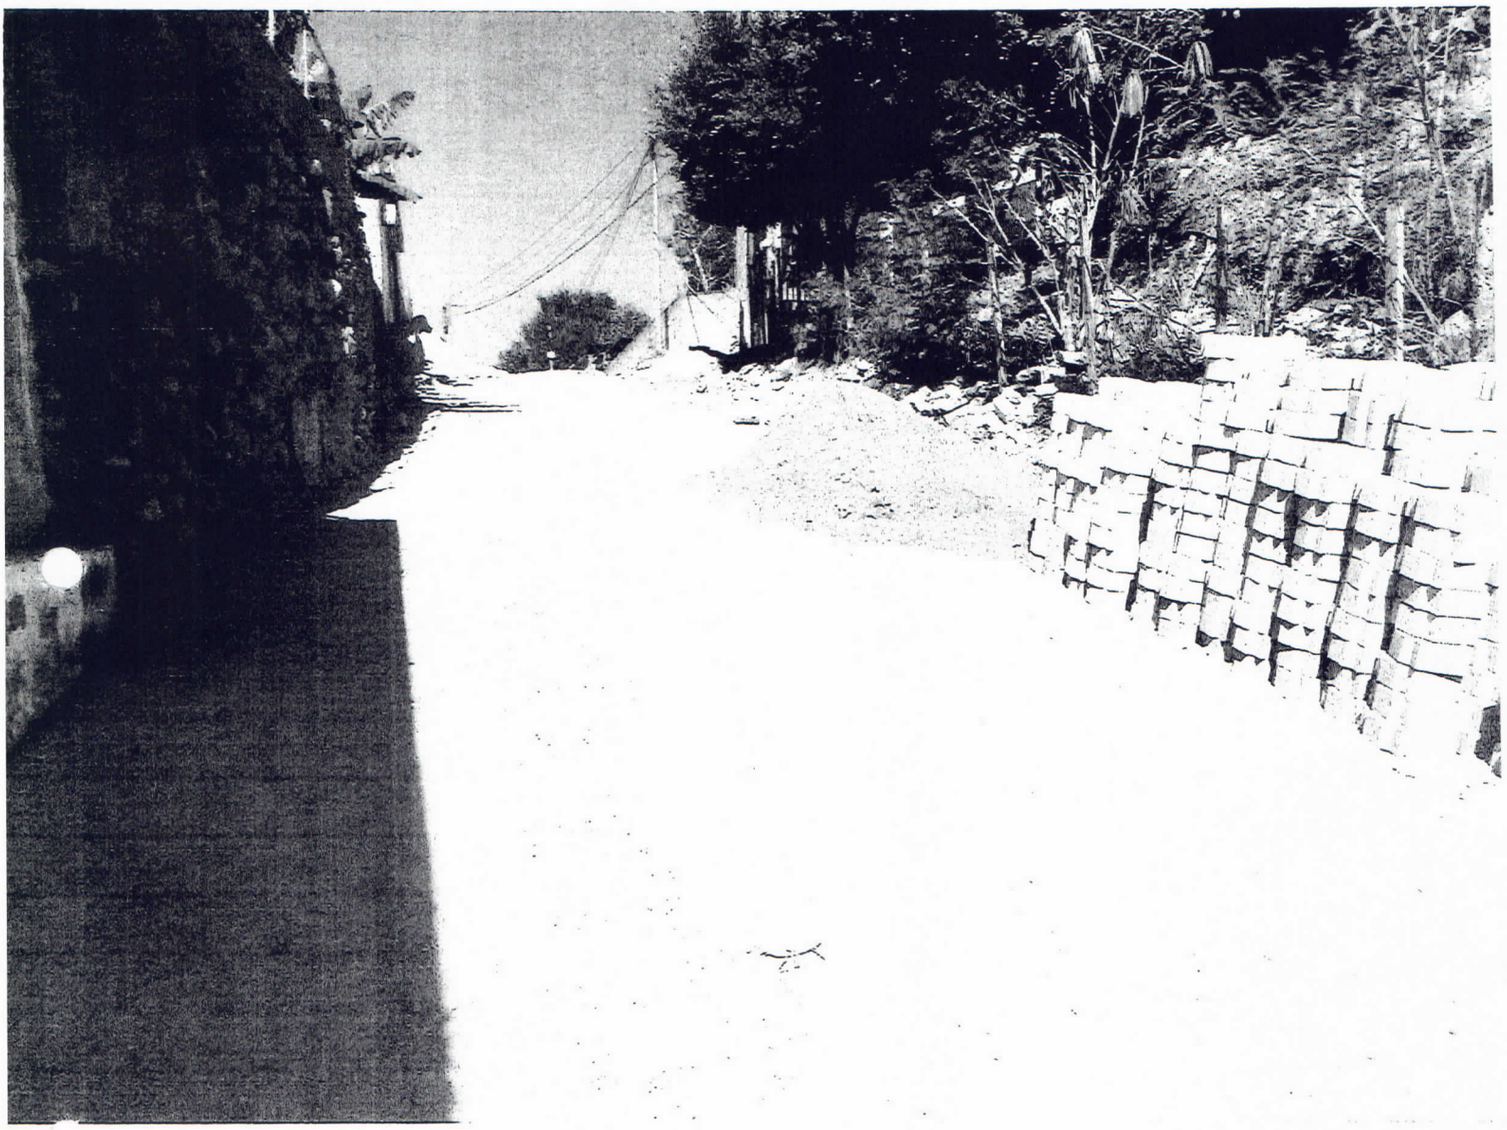




BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 4428/12/2024

CONTRATO No. 28-2024


NOMBRE: MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS CHORRITOS, ALDEA SANTA LUCIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO


ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

REGISTRO No.	8
FECHA	10/03/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	Se continua con la colocación de adoquin y bordillo prefabricado, se cuenta con personal y materiales suficientes para el avance del proyecto
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA

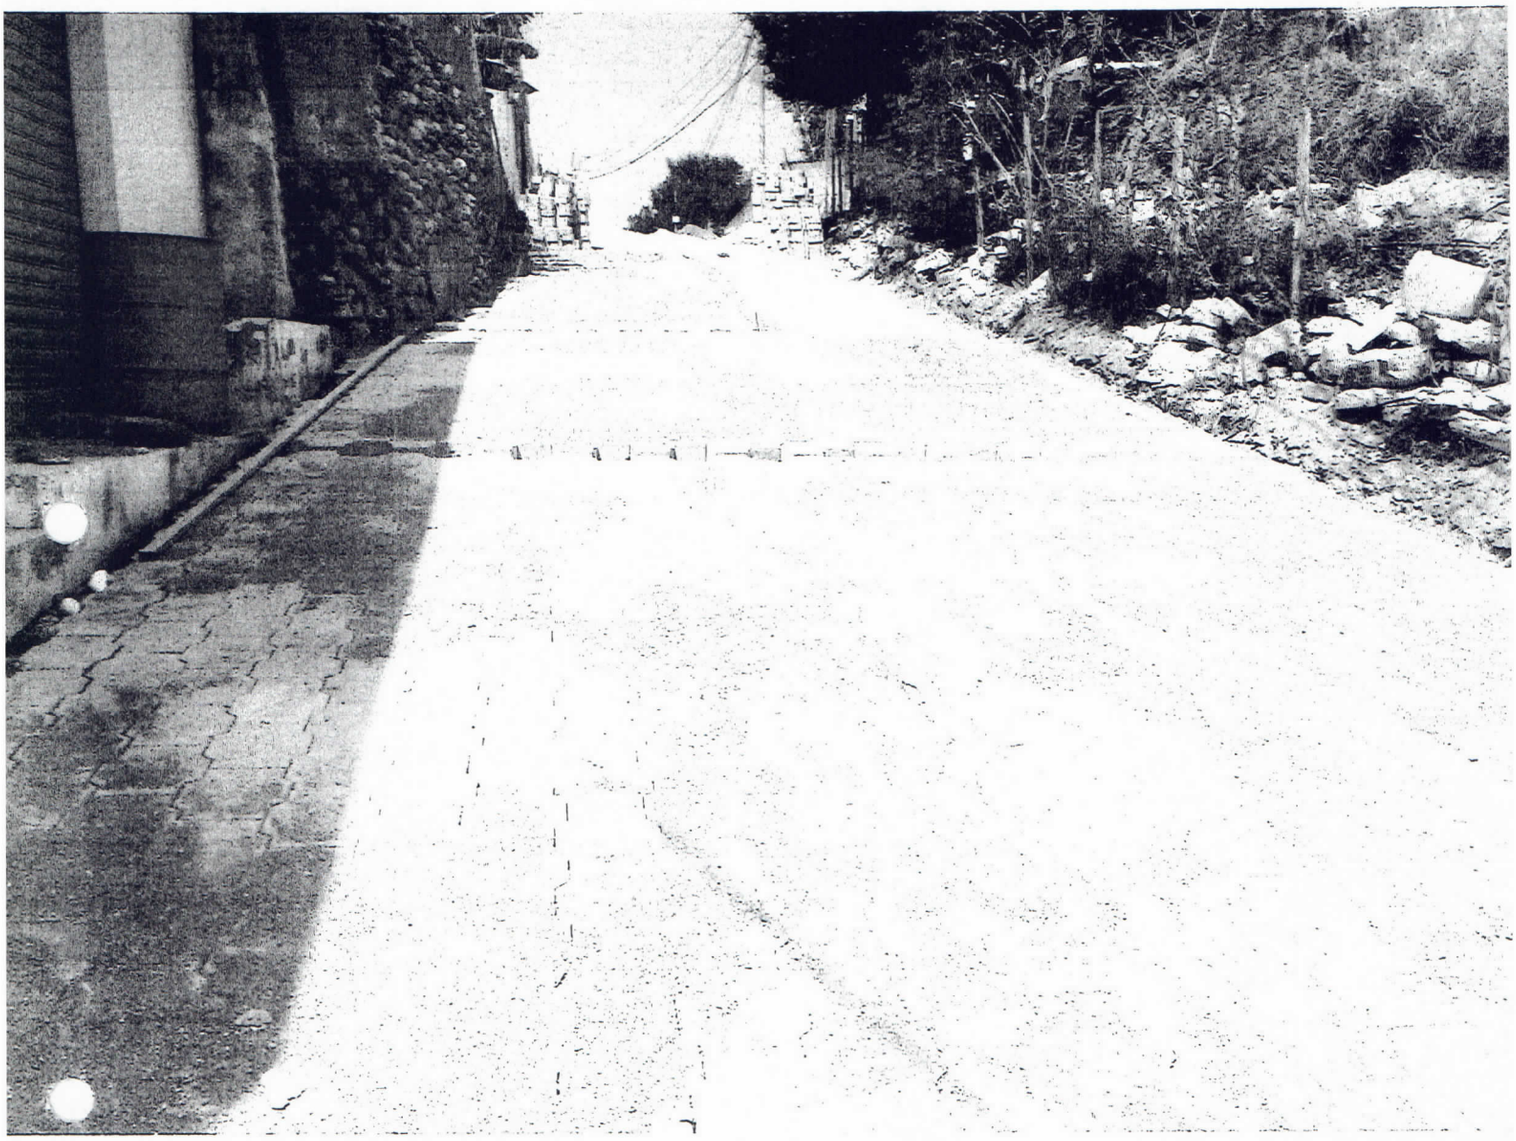



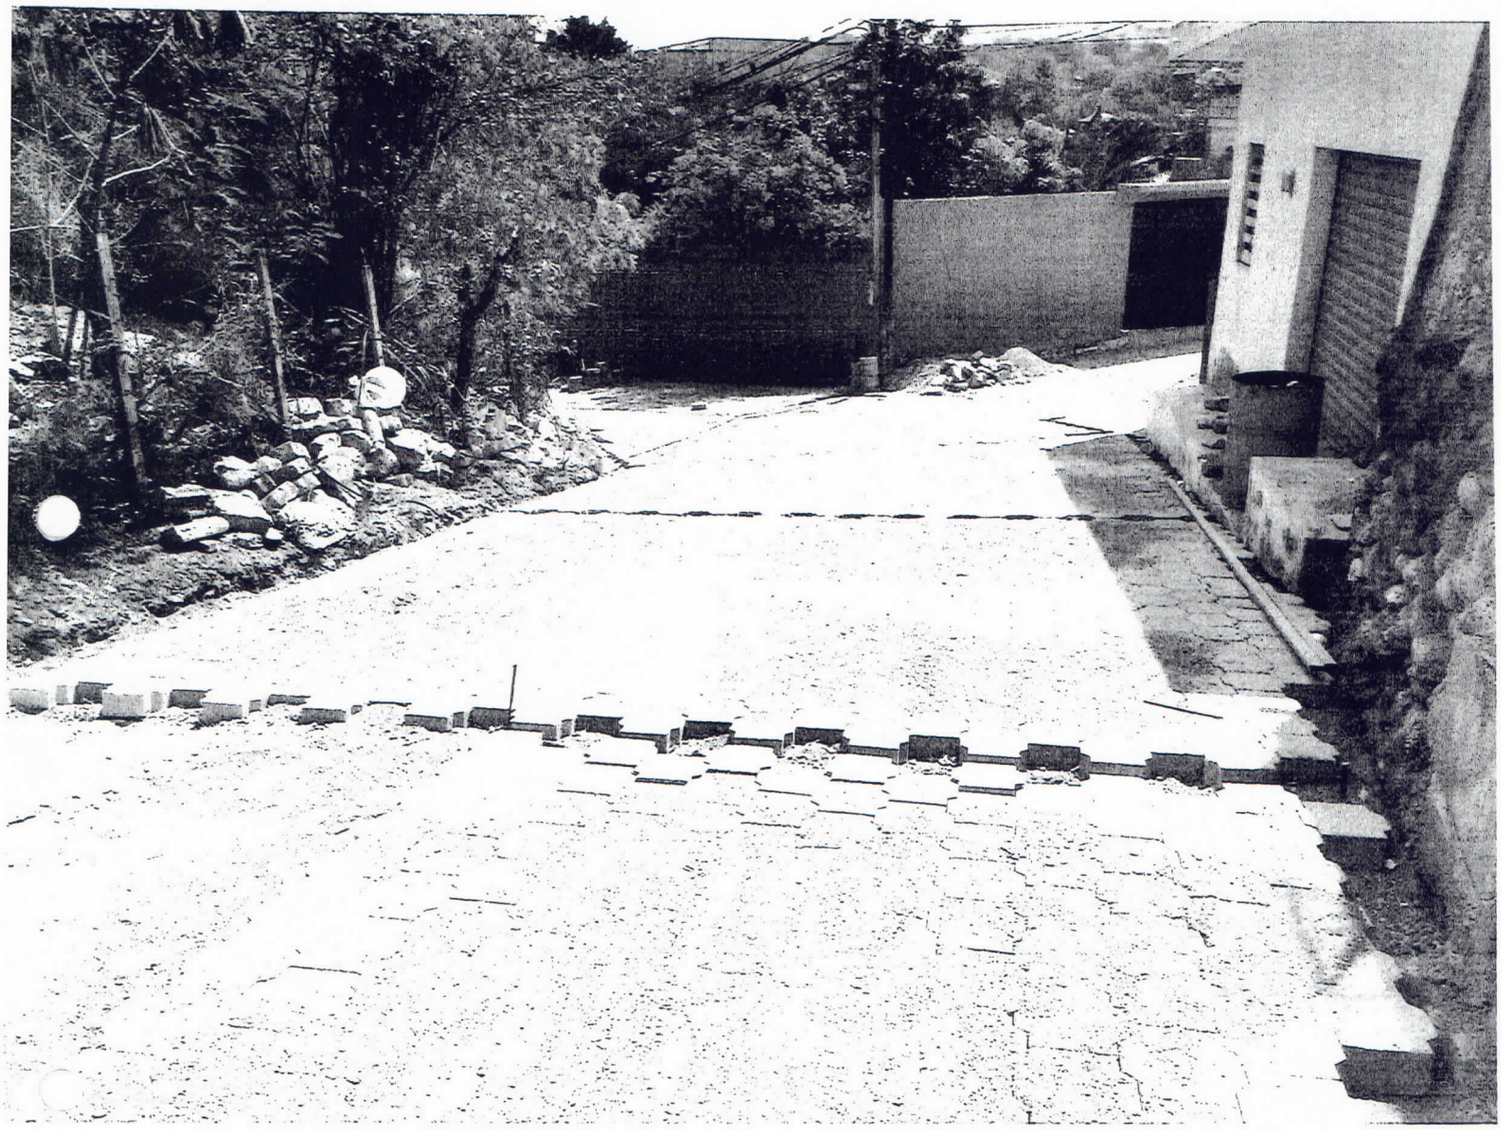

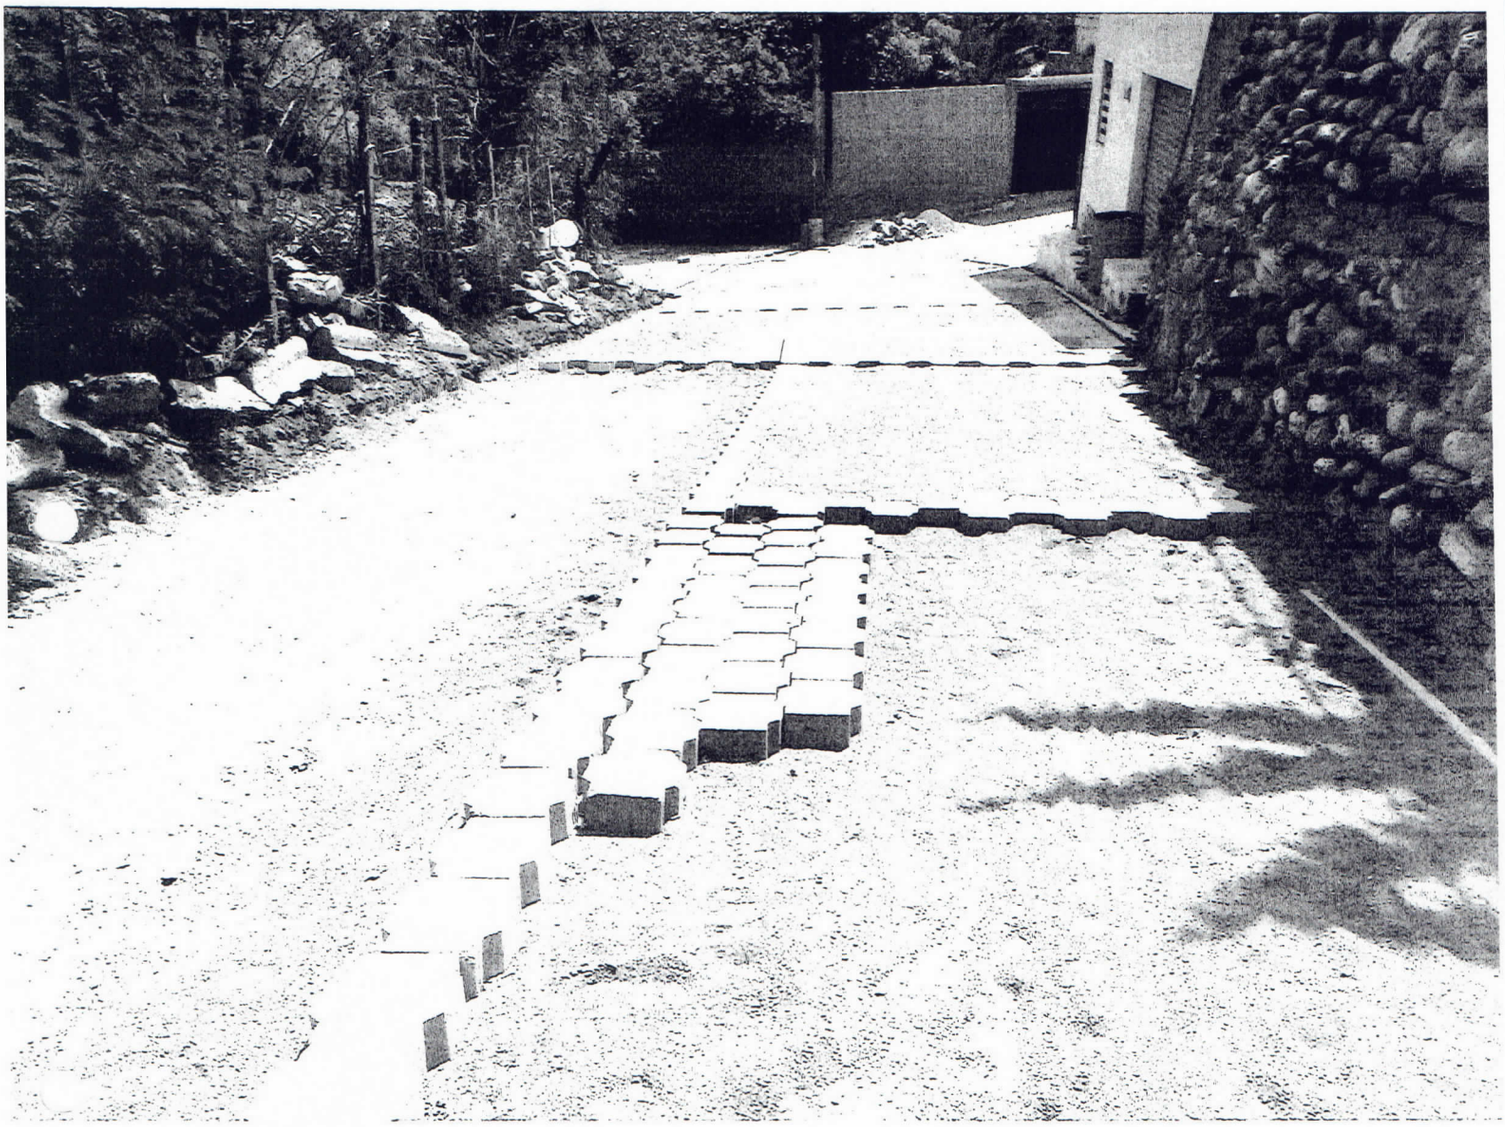

MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!

5980-0535 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
BARRIO EL CALVARIO, GUASTATOYA EL PROGRESO

06/05/2025
15:47

LA INFRASCRITA SECRETARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO,

CERTIFICA:

Que para su cumplimiento y efectos consiguientes se transcribe la **AUTENTICIDAD** del punto **OCTAVO** del acta **31-2025** de fecha veinticinco de abril de dos mil veinticinco del libro número 3,539 de sesiones ordinarias del Concejo Municipal, debidamente autorizado por la Contraloría General de Cuentas, el que copiado literalmente dice:

OCTAVO: La Secretaria Municipal hace del conocimiento del Honorable Concejo Municipal, sobre el oficio Ref.agmo/DMP/165-2025 presentado por el Licenciado Alexis Geovanny Marroquín Orellana, Director de la Dirección Municipal de Planificación, en el cual informa que el proyecto **MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS CHORRITOS, ALDEA SANTA LUCIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO,** Contrato administrativo número **28-2024** de fecha 04 de diciembre de 2024, ejecutado por la empresa **CONSTRUCTORA M&A** siendo su propietario CARLOS AMADO ORELLANA, presentó informe del **90%** de avance físico. Por lo tanto solicita que se apruebe el pago del 90% de avance físico del proyecto antes mencionado a la empresa **CONSTRUCTORA M&A...** Consiguientemente y en cumplimiento al numeral 2) de la Cláusula Cuarta del contrato en referencia, presenta el informe de supervisión signado por el Ingeniero JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA, Supervisor de Obras Municipales, por medio del cual informa de la estimación, del avance físico del referido proyecto, indicando que se encuentra en un avance físico del 90.00%, anexa el detalle que contiene los renglones de trabajo para la presente estimación. **CONSIDERANDO:** Que la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, en el artículo 59 establece: "Estimaciones para pago. La entidad contratante podrá hacer pagos parciales al contratista contra estimaciones periódicas de trabajo ejecutado y aceptado, las que podrán efectuarse mensualmente de acuerdo con las estipulaciones pactadas." **CONSIDERANDO:** Que el Código Municipal y sus reformas, del Decreto 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala, en el Artículo 35 literal a) establece: Atribuciones Generales del Concejo Municipal "son atribuciones del Concejo Municipal: a) La iniciativa, deliberación y decisión de los asuntos municipales...". **POR TANTO:** El Concejo Municipal, con fundamento en los considerandos y las facultades que le confiere el Código Municipal y sus reformas, del Decreto 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala, y por **UNANIMIDAD DE VOTOS**, **RESUELVE**: **I)** Se tiene por recibido el oficio presentado, agregándose al expediente respectivo. **II) APROBAR**, el pago equivalente al avance físico del 90%, a favor de la empresa mercantil **CONSTRUCTORA M&A** siendo su propietario CARLOS AMADO ORELLANA, de conformidad con el monto de estimación de avance físico, anexa el detalle que contiene los renglones de trabajo para la presente estimación, presentados por el Supervisor de Obras Municipales del proyecto **"MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS CHORRITOS, ALDEA SANTA LUCIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO"**, el que se ejecuta con el Contrato Administrativo 28-2024. **III)** Se le ordena al Director de Administración Financiera Integrada Municipal, hacer las operaciones contables correspondientes y proceder al pago de conformidad con lo aprobado en el numeral romano II) del presente punto resolutivo. **IV)** Notifíquese.

(Fs) Ilegibles José Elías Herrera Guerra, Alcalde Municipal, Ing. Byron Fernando Calderón Ferrera y Eduardo Ortega Loaiza, Síndicos Primero y Segundo respectivamente, Hernan Archila Morales, Erasmo Beltetón Contreras, Nery Rolando Archila Orellana, Julio Mauricio Marroquín González, Fryda Aimée Estrada Ortiz, Concejales Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto, respectivamente y Licda. Evelyn Yaneth Oajaca Marroquín, Secretaria Municipal.

DADO EN EL PALACIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE GUASTATOYA, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, A VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICINCO.

SECRETARIA

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA ¡Sirviendo!

LICDA. EVELYN YANETH OAJACA MARROQUÍN
SECRETARIA MUNICIPAL
