MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
sirviendo!

5980-0535 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
BARRIO EL CALVARIO, **GUASTATOYA EL PROGRESO**

REPORTE DE PAGO DE PROYECTOS POR CONTRATO 2024

EXPEDIENTE No. **282** NOG: **24417289** CONTRATO No. **28-2024**

PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS CHORRITOS, ALDEA SANTA LUCIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

APORTES	% DE AVANCE	ESTIMACION	AMORTIZACION	LIQUIDO A RECIBIR
Aporte CODEDE	**100.00%**			
Q. 1,199,500.00		**Q. 119,500.00**	**Q. 23,900.00**	**Q. 95,600.00**
32 00 002 000 009 331 31-0101-0004				
TOTALES		**Q. 119,500.00**	**Q. 23,900.00**	**Q. 95,600.00**

Se cuenta con Informe de supervisión por parte de la empresa, informe de supervisión por el Supervisor de Obras Municipales, Acuerdo de aprobación de avance, Copia de bitácora, Certificados de calidad, Pruebas de laboratorio, Fianzas de Conservación de obras y Saldos deudores, Acta de Recepción de obras.

Lic. Alexis Geovanny Marroquín Orellana
Director Municipal de Planificación

10:25 19/06/2025

Factura

CARLOS ALBERTO , AMADO ORELLANA
Nit Emisor: 20115989
CONSTRUCTORA M&A
ALDEA SANTA RITA BARRIO SAN JUAN, GUASTATOYA, EL PROGRESO
NIT Receptor: 6206107
Nombre Receptor: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
D04E3315-7BB3-4918-B583-C57B4E509069
Serie: D04E3315 Número de DTE: 2075347224
Numero Acceso:

Fecha y hora de emision: 19-jun-2025 16:01:46
Fecha y hora de certificación: 19-jun-2025 16:01:46
Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Otros Descuentos(Q)	Total (Q)	Impuestos	
1	Servicio	1	PAGO DEL 100% DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS CHORRITOS, ALDEA SANTA LUCIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO. CONTRATO No. 28-2024, EXPEDIENTE No. 282, NOG 24417289. MONTO DE ESTIMACIÓN: Q119,500.00 (-) AMORTIZACIÓN: Q23,900.00 (=) LÍQUIDO A RECIBIR: Q95,600.00 APROBADO Y AUTORIZADO.	119,500.00	0.00	0.00	119,500.00	IVA	12,803.571429
			TOTALES:		0.00	0.00	119,500.00	IVA	12,803.571429

* Sujeto a pagos trimestrales ISR

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

"Contribuyendo por el país que todos queremos"

FORMA 7-B INGRESOS VARIOS

RECIBO DE LA MUNICIPALIDAD

DE GUASTATOYA,
DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO

SERIE B **No. 642507**

FECHA: DIA 9 | MES 8 | AÑO 2025

Noventa y cinco mil quinientos con 00/100

POR: queizales

CODIGO JURISDICCIONAL: D-4 5201

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: Consejo Departamental de Desarrollo

DIRECCION: El Progreso

		Q.4.00	10.00	15.00	50.00	75.00	100.00	150.00			Q.
ARBITRIOS	ORNATO	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
TASAS	VARIOS										
	LICENCIAS										
	ESTACIONAMIENTOS										
	CERTIFICACIONES										
	CEDULAS										
	MERCADOS										
	SERVICIOS VARIOS										
	SERVICIOS AGUA										
	SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA										
CONTRIBUCIONES	CONCEPTO										
MULTAS	CONCEPTO										
OTROS	VARIOS	Pago del 100.00% tercer y ultimo desembolso del proyecto mejoramiento calle rural sector los chorritos, Aldea Santa Lucia, Guastatoya, El Progreso. SNIP 334525, convenio No. 085-2024, fuente 12									Q95,500.00

LECTURA DE CONTADOR | ACTUAL | ANTERIOR

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL RECEPTOR MUNICIPAL | CUENTA

SUB-CUENTA

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA ¡Sirviendo!

TOTAL Q. Q95,500.00

VALIDO UNICAMENTE POR EL IMPORTE IMPRESO POR LA CAJA REGISTRADORA MUNICIPAL Y/O NOMBRE FIRMA Y SELLO DEL RECEPTOR MUNICIPAL.

ORIGINAL-ENTERANTE

AUTORIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS S/RES. No. 6)-/5875 Clas.: 920-12-8-4-87 DEL 28-06-87.
2045310 T-0340 1019911 87
FORMULARIOS STANDARD, S.A. PBX: 2424-8900 - NIT: 1552217 - 1-50,001 - 100,000 DEL No. 500,001 AL No. 850,000, SERIE B, EN VOLANTE CENTRAL No. 45310 DE FECHA 13/10/2022 NUMERO CORRELATIVO D-4-10-2022 DE FECHA 13/10/2022 No. DE CUENTA: 13-2-1 OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 13/10/2022 LIBRO 0 (0578 FOLIO 7.
www.standard-sa.com

Publicar el listado de Facturas de un concurso

Mensaje de confirmación	
23.jun..2025 12:14:09	
Datos del Concurso	
Entidad	MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO
Unidad compradora	DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
NOG	24417289
Descripción	MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS CHORRITOS, ALDEA SANTA LUCIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO
Modalidad	Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Tipo	Público
Fecha límite para ofertar	27.nov..2024
Fecha publicación	17.oct..2024
Beneficiario Institucional	MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
Estatus actual	Adjudicado
Proveedor	
1	(20115989) AMADO,ORELLANA,,CARLOS,ALBERTO
Listado de facturas incluidas:	
#1	SERIE:DCB3FE23 NO_FACTURA:2758099554 MONTO:1080000
Proveedor	
1	(20115989) AMADO,ORELLANA,,CARLOS,ALBERTO
Listado de facturas incluidas:	
#1	SERIE:D04E3315 NO_FACTURA:2075347224 MONTO:119500
Si desea imprimir este mensaje, oprima el siguiente botón	

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO - DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION

Cerrar Sesión

CONCURSO: Adición de anexos al concurso en la Fase de Liquidación

Mensaje de confirmación	
13.may..2025 12:41:03	
Documentos asociados:	
1	24417289@INFORME DE SUPERVISION 100 AVANCE FISICO CALLE LOS CHORRITOS.pdf(1996 KB)
Si desea imprimir este mensaje, oprima el siguiente botón	

CONSTRUCTORA
M & A

Guastatoya, El Progreso, 06 de MAYO de 2025

Señores
Municipalidad de Guastatoya, El Progreso
Departamento de El Progreso

De la manera más atenta nos dirigimos a ustedes esperando que el desarrollo de sus actividades sea de la mejor manera.

El motivo de la presente es para solicitar pago de la segunda estimación del 100.04% de la oferta para el evento **MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS CHORRITOS, ALDEA SANTA LUCIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO.** Según contrato administrativo número 28-2024 de fecha cuatro de diciembre del año 2024, para cual adjunto el cuadro de estimación del 100.04% de dicho proyecto.

No teniendo más que manifestarles, me suscribo quedando atento y a sus respetables órdenes.

Atentamente,

CONSTRUCTORA M&A
Barrio San Juan, Aldea San...
Guastatoya El Progre...
20115985

CARLOS ALBERTO AMADO ORELLANA
CONSTRUCTORA M&A

2da Estimacion

MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS CHORRITOS, ALDEA SANTA LUCIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

RESUMEN DE RENGLONES

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES DE TRABAJO				ORDEN DE CAMBIO	ORDEN DE TRABAJO SUPLEMENTARIO	ORDEN DE TRABAJO EXTRA	RENGLON MODIFICADO	CANTIDADES EJECUTADAS SEGUNDA ESTIMACION		ACUMULADO A LA FECHA		PORCENTAJE
		CANTIDAD	UNIDAD	P UNITARIO	TOTAL	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	TOTAL
1	TRABAJOS PRELIMINARES	1,904.00	m2	Q 10.20	Q 19,420.80	-			1,904.00	-	Q -	1,904.00	Q 19,420.80	1.62%
2	LEVANTADO Y TRASLADO DE ADOQUIN EXISTENTE	1,904.00	M2	Q 78.95	Q 150,320.80	-			1,904.00	-	Q -	1,904.00	Q 150,320.80	12.53%
3	CORTE DE CAJUELA +CONFORMACION Y NIVELACION DE SUBRASANTE 0.20 m.	1,904.00	M2	Q 65.55	Q 124,807.20	-			1,904.00	-	Q -	1,904.00	Q 124,807.20	10.40%
4	BASE DE MATERIAL SELECTO COMPACTADO E=0.10M	1,904.00	M2	Q 89.85	Q 171,074.40	-			1,904.00	-	Q -	1,904.00	Q 171,074.40	14.26%
5	ADOQUINADO (ADOQUIN CLASE A TRAFICO PESADO)	1,821.00	m2	Q 320.35	Q 583,357.35	532.00			1,289.00	303.15	Q 97,115.35	1,289.00	Q 412,931.15	34.43%
6	LLAVES DE CONFINAMIENTO 0.10X0.20 4000 PSI	189.00	ML	Q 62.30	Q 11,774.70	28.00			161.00	61.00	Q 3,800.30	161.00	Q 10,030.30	0.84%
7	BORDILLO PREFABRICADO DE 0.15*0.30m*0.50 F'c=280KG/CM2	805.00	ML	Q 149.75	Q 120,548.75	375.00			430.00	130.00	Q 19,467.50	430.00	Q 64,392.50	5.37%
8	READECUACION BROCALES DE POZOS EXISTENTES	5.00	UNIDAD	Q 3,639.20	Q 18,196.00				5.00	-	Q -	5.00	Q 18,196.00	1.52%
	TRABAJOS EXTRAS													
9	FUNDICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO DE 0.18 M DE ESPESOR	532.00	M2	Q 430.00	Q 228,760.00			532.00	532.00	-	Q -	532.00	Q 228,760.00	19.07%
	COSTO TOTAL DEL PROYECTO				Q 1,199,500.00						Q 120,383.15		Q 1,199,933.15	100.04%

VALOR DE ESTIMACION No. 2	Q	120,383.15
AMORTIZACION DEL ANTICIPO (20%)	Q	24,076.63
PENDIENTE DE AMORTIZAR	Q	-
LIQUIDO A RECIBIR	Q	96,306.52

CONSTRUCTORA M&A

CARLOS ALBERTO AMADO ORELLANA
CONSTRUCTORA M&A

JOEL AMADO ORELLANA
INGENIERO CIVIL
CON ENFASIS EN CONSTRUCCIONES RURALES
COLEGIADO No. 18,357

JOEL AMADO ORELLANA
INGENIERO RESIDENTE

CONSTRUCTORA
M & A

MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS CHORRITOS, ALDEA SANTA LUCIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO









CONSTRUCTORA
M & A

Guastatoya, El Progreso, 06 de MAYO de 2025

Señores
Municipalidad de Guastatoya, El Progreso
Departamento de El Progreso

De la manera más atenta nos dirigimos a ustedes esperando que el desarrollo de sus actividades sea de la mejor manera.

El motivo de la presente es para solicitar pago de la segunda estimación del 100.04% de la oferta para el evento **MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS CHORRITOS, ALDEA SANTA LUCIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO.** Según contrato administrativo número 28-2024 de fecha cuatro de diciembre del año 2024, para cual adjunto el cuadro de estimación del 100.04% de dicho proyecto.

No teniendo más que manifestarles, me suscribo quedando atento y a sus respetables órdenes.

Atentamente,

CONSTRUCTORA M&A
Barrio San Juan, Aldea Santa Rita
Guastatoya El Progreso
Nit. 20115989

CARLOS ALBERTO AMADO ORELLANA
CONSTRUCTORA M&A

2da Estimacion

MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS CHORRITOS, ALDEA SANTA LUCIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

RESUMEN DE RENGLONES

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES DE TRABAJO				ORDEN DE CAMBIO	ORDEN DE TRABAJO SUPLEMENTARIO	ORDEN DE TRABAJO EXTRA	RENGLON MODIFICADO	CANTIDADES EJECUTADAS SEGUNDA ESTIMACION		ACUMULADO A LA FECHA		PORCENTAJE
		CANTIDAD	UNIDAD	P UNITARIO	TOTAL	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	TOTAL
1	TRABAJOS PRELIMINARES	1,904.00	m2	Q 10.20	Q 19,420.80	-			1,904.00	-	Q -	1,904.00	Q 19,420.80	1.62%
2	LEVANTADO Y TRASLADO DE ADOQUIN EXISTENTE	1,904.00	M2	Q 78.95	Q 150,320.80	-			1,904.00	-	Q -	1,904.00	Q 150,320.80	12.53%
3	CORTE DE CAJUELA +CONFORMACION Y NIVELACION DE SUBRASANTE 0.20 m.	1,904.00	M2	Q 65.55	Q 124,807.20	-			1,904.00	-	Q -	1,904.00	Q 124,807.20	10.40%
4	BASE DE MATERIAL SELECTO COMPACTADO E=0.10M	1,904.00	M2	Q 89.85	Q 171,074.40	-			1,904.00	-	Q -	1,904.00	Q 171,074.40	14.26%
5	ADOQUINADO (ADOQUIN CLASE A TRAFICO PESADO)	1,821.00	m2	Q 320.35	Q 583,357.35	532.00			1,289.00	303.15	Q 97,115.35	1,289.00	Q 412,931.15	34.43%
6	LLAVES DE CONFINAMIENTO 0.10X0.20 4000 PSI	189.00	ML	Q 62.30	Q 11,774.70	28.00			161.00	61.00	Q 3,800.30	161.00	Q 10,030.30	0.84%
7	BORDILLO PREFABRICADO DE 0.15*0.30m*0.50 F'c=280KG/CM2	805.00	ML	Q 149.75	Q 120,548.75	375.00			430.00	130.00	Q 19,467.50	430.00	Q 64,392.50	5.37%
8	READECUACION BROCALES DE POZOS EXISTENTES	5.00	UNIDAD	Q 3,639.20	Q 18,196.00				5.00	-	Q -	5.00	Q 18,196.00	1.52%
	TRABAJOS EXTRAS													
9	FUNDICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO DE 0.18 M DE ESPESOR	532.00	M2	Q 430.00	Q 228,760.00			532.00	532.00	-	Q -	532.00	Q 228,760.00	19.07%
	COSTO TOTAL DEL PROYECTO				Q 1,199,500.00						Q 120,383.15		Q 1,199,933.15	100.04%

VALOR DE ESTIMACION No. 2	Q	120,383.15
AMORTIZACION DEL ANTICIPO (20%)	Q	24,076.63
PENDIENTE DE AMORTIZAR	Q	-
LIQUIDO A RECIBIR	Q	96,306.52

CONSTRUCTORA M&A

CONSTRUCTORA M&A, UNA EMPRESA DE CALIDAD

CARLOS ALBERTO AMADO ORELLANA
CONSTRUCTORA M&A


JOEL AMADO ORELLANA
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO No. 18,357

JOEL AMADO ORELLANA
INGENIERO RESIDENTE

CONSTRUCTORA
M & A

MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS CHORRITOS, ALDEA SANTA LUCIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO



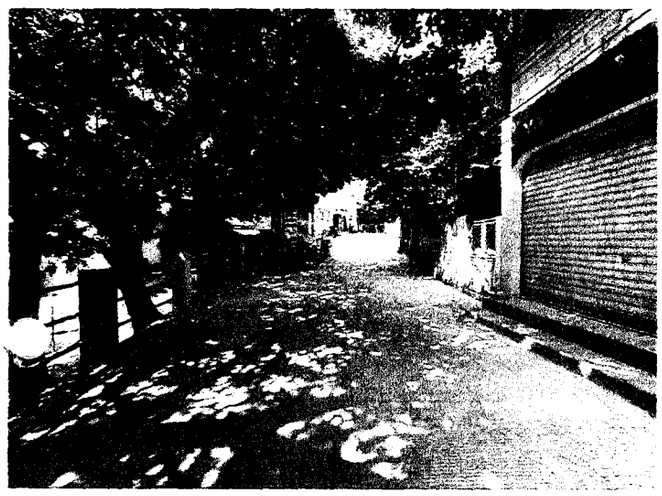





MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!

5980-0535 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
BARRIO EL CALVARIO, GUASTATOYA EL PROGRESO

INFORME DE SUPERVISION

Guastatoya, 06 de Mayo de 2025

SEÑOR: JOSE ELIAS HERRERA GUERRA Y CONSEJO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
EL PROGRESO

De la manera más atenta me dirijo a usted deseándole toda clase de éxitos en sus labores diarias.

El motivo de la presente es para hacerle saber lo siguiente:

En visita de supervisión realizada al proyecto denominado **MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS CHORRITOS, ALDEA SANTA LUCIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO,** con número de contrato **28-2024** de fecha 04 de Diciembre de 2024, ejecutado por la empresa **CONSTRUCTORA M&A**, financiado por la Municipalidad de Guastatoya, se tiene a la vista el oficio de Mayo de 2025 en el cual se hace la solicitud de la estimación del proyecto para un avance del **100.00%**, para lo cual se adjunta el informe de supervisión y el informe de parte de la empresa.

Agradeciendo su atención y en espera de darle seguimiento a este asunto me suscribo de ustedes.

Atentamente

José F. Alexander Aguilar Mejia
Ingeniero Civil
Colegiado No 9,366

ING. JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA
SUPERVISOR MUNICIPAL, GUASTATOYA
EL PROGRESO

D.M.P.	SUPERVISION DE OBRAS	Dirección Municipal de Planificación

Comunidad.	Contrato Municipal.
Aldea Santa Lucia, Guastatoya, El Progreso	28-2024

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del proyecto.	Ubicación del proyecto.
MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS CHORRITOS, ALDEA SANTA LUCIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Aldea Santa Lucia, Guastatoya, El Progreso
Contratista.	**Ubicación del proyecto.**
CONSTRUCTORA M&A	Aldea Santa Lucia, Guastatoya, El Progreso
Monto Contratado. Q 1,199,500.00	**Avance Físico.** 100.00%
Informe de Supervisión No. 2	**Fecha.** 06 de Mayo de 2025

2. AVANCE DE EJECUCION DEL PROYECTO

No.	Descripcion del Renglón	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Total a la Fecha	Avance Físico %
1	TRABAJOS PRELIMINARES	-	m2	Q 10.20	Q -	Q 19,420.80	100%
2	LEVANTADO Y TRASLADO DE ADOQUIN EXISTENTE	-	M2	Q 78.95	Q -	Q 150,320.80	100%
3	CORTE DE CAJUELA +CONFORMACION Y NIVELACION DE SUBRASANTE 0.20 m.	-	M2	Q 65.55	Q -	Q 124,807.20	100%
4	BASE DE MATERIAL SELECTO COMPACTADO E=0.10M	-	M2	Q 89.85	Q -	Q 171,074.40	100%
5	ADOQUINADO (ADOQUIN CLASE A TRAFICO PESADO)	303.15	m2	Q 320.35	Q 97,115.35	Q 412,931.15	100%
6	LLAVES DE CONFINAMIENTO 0.10X0.20 4000 PSI	61.00	ML	Q 62.30	Q 3,800.30	Q 10,030.30	100%
7	BORDILLO PREFABRICADO DE 0.15*0.30m*0.50 F'c=280KG/CM2	130.00	ML	Q 149.75	Q 19,467.50	Q 64,392.50	100%
8	READECUACION BROCALES DE POZOS EXISTENTES	-	UNIDAD	Q 3,639.20	Q -	Q 18,196.00	100%
	TRABAJOS EXTRAS						
9	FUNDICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO DE 0.15 M DE ESPESOR	-	M2	Q 430.00	Q -	Q 228,760.00	100%
					Q 120,383.15	**Q 1,199,933.15**	**100.00%**

Estos renglones de trabajo dan como resultado un avance físico del **100.00%** **por lo cual se aprueba realizar el pago correspondiente**

3. DESCRIPCION DEL PROYECTO.

Este proyecto consiste en el mejoramiento de la calle del sector los chorritos, en aldea santa lucia, se realiza una parte de adoquinado y otra parte de pavimento de concreto, lo cual va a beneficiar a la comunidad

4. RECOMENDACIONES.

Chequear los trabajos realizados para garantizar la durabilidad de los mismos, y terminar los trabajos faltantes, los que no se encuentran al 100 % y los que no se han iniciado aun

SUPERVISOR DE PROYECTOS MUNICIPALES.

José F. Alexander Aguilar Mena
Ingeniero Civil
Colegiado No.

ING. JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA
SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES

JOSE ELIAS HERRERA GUERRA
ALCALDE MUNICIPAL DE GUASTATOYA

D.M.P.	SUPERVISION DE OBRAS	Dirección Municipal de Planificación

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del proyecto.	**Ubicación del proyecto.**
MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS CHORRITOS, ALDEA SANTA LUCIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Aldea Santa Lucia, Guastatoya, El Progreso


2. INFORME FOTOGRAFICO.









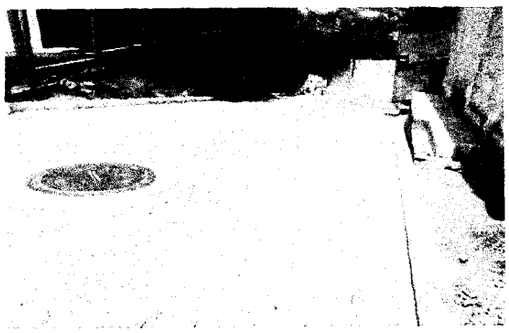

SUPERVISOR DE PROYECTOS MUNICIPALES.

José F. Alexander Aguilar Mejia
Ingeniero Civil
Colegiado No 9,366

ING. JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA
SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES

JOSE ELIAS HERRERA GUERRA
ALCALDE MUNICIPAL DE GUASTATOYA

REPORTE DE AVANCE FISICO No. 2

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS CHORRITOS, ALDEA SANTA LUCIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	
Municipio: GUASTATOYA	**Departamento: EL PROGRESO**
Comunidad: ALDEA SANTA LUCIA	**Fecha de Contrato: 04/12/2024**
Fecha de Inicio: 17/12/2024	**Fecha de Supervision: 06/05/2025**
Fecha de Finalizacion: 16/06/2025	**Unidad Ejecutora: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA**
Contrato No.: 28-2024	**Valor del Proyecto: Q.1,199,500.00**
Modificaciones:	**Valor Original: Q.1,199,500.00**
Constructora: CONSTRUCTORA M&A	**Telefono:**
Representante legal: CARLOS ALBERTO AMADO ORELLANA	

RESUMEN DE RENGLONES

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES DE TRABAJO				ORDEN DE CAMBIO	ORDEN DE TRABAJO SUPLEMENTARIO	ORDEN DE TRABAJO EXTRA	RENGLON MODIFICADO	CANTIDADES EJECUTADAS SEGUNDA ESTIMACION		ACUMULADO A LA FECHA		PORCENTAJE
		CANTIDAD	UNIDAD	P UNITARIO	TOTAL	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	TOTAL
1	TRABAJOS PRELIMINARES	1,904.00	m2	Q 10.20	Q 19,420.80	-			1,904.00	-	Q -	1,904.00	Q 19,420.80	1.62%
2	LEVANTADO Y TRASLADO DE ADOQUIN EXISTENTE	1,904.00	M2	Q 78.95	Q 150,320.80	-			1,904.00	-	Q -	1,904.00	Q 150,320.80	12.53%
3	CORTE DE CAJUELA +CONFORMACION Y NIVELACION DE SUBRASANTE 0.20 m.	1,904.00	M2	Q 65.55	Q 124,807.20	-			1,904.00	-	Q -	1,904.00	Q 124,807.20	10.40%
4	BASE DE MATERIAL SELECTO COMPACTADO E=0.10M	1,904.00	M2	Q 89.85	Q 171,074.40	-			1,904.00	-	Q -	1,904.00	Q 171,074.40	14.26%
5	ADOQUINADO (ADOQUIN CLASE A TRAFICO PESADO)	1,821.00	m2	Q 320.35	Q 583,357.35	532.00			1,289.00	303.15	Q 97,115.35	1,289.00	Q 412,931.15	34.43%
6	LLAVES DE CONFINAMIENTO 0.10X0.20 4000 PSI	189.00	ML	Q 62.30	Q 11,774.70	28.00			161.00	61.00	Q 3,800.30	161.00	Q 10,030.30	0.84%
7	BORDILLO PREFABRICADO DE 0.15*0.30m*0.50 F'c=280KG/CM2	805.00	ML	Q 149.75	Q 120,548.75	375.00			430.00	130.00	Q 19,467.50	430.00	Q 64,392.50	5.37%
8	READECUACION BROCALES DE POZOS EXISTENTES	5.00	UNIDAD	Q 3,639.20	Q 18,196.00				5.00	-	Q -	5.00	Q 18,196.00	1.52%
	TRABAJOS EXTRAS													
9	FUNDICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO DE 0.15 M DE ESPESOR	532.00	M2	Q 430.00	Q 228,760.00			532.00	532.00	-	Q -	532.00	Q 228,760.00	19.07%
	COSTO TOTAL DEL PROYECTO				**Q 1,199,500.00**						**Q 120,383.15**		**Q 1,199,933.15**	**100.04%**

VALOR DE ESTIMACION No. 2	Q 120,383.15
AMORTIZACION DEL ANTICIPO (20%)	Q 24,076.63
PENDIENTE DE AMORTIZAR	Q -
LIQUIDO A RECIBIR	Q 96,306.52

José F. Alexander Aguilar Mejia
Ingeniero Civil
Colegiado No. 7,398

JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES

JOSE ELIAS HERRERA GUERRA
ALCALDE MUNICIPAL GUASTATOYA

MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!

5980-0535 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
BARRIO EL CALVARIO, GUASTATOYA EL PROGRESO

LA INFRASCRITA SECRETARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO,

CERTIFICA:

Que para su cumplimiento y efectos consiguientes se transcribe la **AUTENTICIDAD** del punto **TERCERO** del acta **34-2025** de fecha nueve de mayo de dos mil veinticinco del libro número 3,539 de sesiones ordinarias del Concejo Municipal, debidamente autorizado por la Contraloría General de Cuentas, el que copiado literalmente dice:

TERCERO: La Secretaria Municipal informa al Concejo Municipal que, Licenciado Alexis Geovanny Marroquín Orellana, Director de Planificación, presenta oficio Ref.agmo/DMP/173-2025, de fecha 09 de mayo de 2025, el cual en su parte conducente expone: "El motivo de la presente es para informarle que el proyecto **MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS CHORRITOS, ALDEA SANTA LUCIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO.** Contrato administrativo número 28-2024 de fecha 04 de diciembre de 2024, ejecutado por la empresa **CONSTRUCTORA M&A,** presentó informe del 100% de avance físico y se solicita nombrar a la comisión de recepción y liquidación para levantar el Acta de Recepción. Por lo tanto, solicito que apruebe el pago del 100% de avance físico del proyecto antes mencionado y nombrar a la junta de recepción para su respectiva revisión". El Concejo Municipal. **CONSIDERANDO:** Que la municipalidad de Guastatoya, El Progreso y la empresa mercantil denominada: **CONSTRUCTORA M&A,** suscribieron contrato administrativo número 28-2024, para la ejecución del proyecto: **MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS CHORRITOS, ALDEA SANTA LUCIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO. CONSIDERANDO:** Que a la presente fecha el Director Municipal de Planificación, hace del conocimiento al Concejo Municipal sobre el avance físico del 100% del proyecto: **MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS CHORRITOS, ALDEA SANTA LUCIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO,** siendo necesario emitir la disposición legal correspondiente. **CONSIDERANDO:** Que la Ley de Contrataciones del Estado Decreto 57-92 del Congreso de la República de Guatemala en el Artículo 55 establece: "Inspección y recepción final...*el supervisor rendirá informe pormenorizado a la autoridad administrativa superior de la entidad correspondiente, la que dentro de los cinco (5) días siguientes nombrará la Comisión Receptora y Liquidadora de la obra, integrada con tres miembros, con la que colaborarán el supervisor o su equivalente y el representante del contratista...*" **CONSIDERANDO:** Que la Ley de Contrataciones del Estado Decreto 57-92 del Congreso de la República de Guatemala en el Artículo 59 establece: *"Estimaciones para pago. La entidad contratante podrá hacer pagos parciales al contratista contra estimaciones periódicas de trabajo ejecutado y aceptado, las que podrán efectuarse mensualmente de acuerdo con las estipulaciones pactadas."* **CONSIDERANDO:** Que El Código Municipal y sus reformas Decreto 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala en el Artículo 35 literal a) establece: "*Atribuciones generales del Concejo Municipal. Son atribuciones del Concejo Municipal: a) La iniciativa, deliberación y decisión de los asuntos municipales...*" **POR TANTO:** El Concejo Municipal fundamentado en lo considerado y con las facultades que le confiere el Código Municipal y sus reformas y por **UNANIMIDAD DE VOTOS. ACUERDA: I)** Se tiene por recibido el oficio presentado, agregándose al expediente de mérito. **II)** Se ordena notificar a la Comisión de Recepción y Liquidación de Obras a efecto de verificar el avance físico del proyecto: **MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS CHORRITOS, ALDEA SANTA LUCIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO,** el cual se ejecuta con el contrato 28-2024. **III)** Luego de la recepción del acta de la Comisión de Recepción y Liquidación de Obras que el Director de la Dirección de Administración Integrada Financiera Municipal proceda a realizar el pago equivalente al avance físico del 100.00% a favor de: **CARLOS AMADO ORELLANA**; propietario de la empresa mercantil denominada, **CONSTRUCTORA M&A. IV)** Notifíquese.

(Fs) **Ilegibles** José Elías Herrera Guerra, Alcalde Municipal, Ing. Byron Fernando Calderón Ferrera y Eduardo Ortega Loaiza, Síndicos Primero y Segundo respectivamente, Hernan Archila Morales, Erasmo Belteton Contreras, Nery Rolando Archila Orellana, Julio Mauricio Marroquín González, Fryda Aimée Estrada Ortiz, Concejales Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto, respectivamente y Licda. Evelyn Yaneth Oajaca Marroquin, Secretaria Municipal.

DADO EN EL PALACIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE GUASTATOYA, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, A DOCE DÍAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL VEINTICINCO.

SECRETARIA

LICDA. EVELYN YANETH OAJACA MARROQUIN
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE

Prevención
Confianza

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA Y GESTIÓN AMBIENTAL

UNIDAD DE BITÁCORAS – DATOS DE LA BITÁCORA ELECTRÓNICA –

BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 4428/12/2024

No. CONTRATO	28-2024
FECHA CONTRATO	04/12/2024
MONTO CONTRACTUAL	1,199,500.00
NOG	24417289
NOMBRE DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS CHORRITOS, ALDEA SANTA LUCIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO
UBICACIÓN DEL PROYECTO	Guastatoya, EL PROGRESO
ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JOEL AMADO ORELLANA
EMPRESA EJECUTORA	CARLOS ALBERTO AMADO ORELLANA
REPRESENTANTE LEGAL O CONTRATISTA	CARLOS ALBERTO AMADO ORELLANA
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO	EULOGIO ALEXANDER AGUILAR MEJÍA
SUPERVISOR EMPRESA SUPERVISORA	

FECHA DE AUTORIZACIÓN 09/12/2024

BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 4428/12/2024

CONTRATO No. 28-2024

NOMBRE: MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS CHORRITOS, ALDEA SANTA LUCIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA


REGISTRO No. 1

FECHA 04/01/2025


TIPO AVANCE


DESCRIPCIÓN El dia de hoy se procede a realizar visita de campo, se observan los trabajos de nivelación de base, se cuenta con personal capacitado y equipo suficiente

CREADO POR FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA

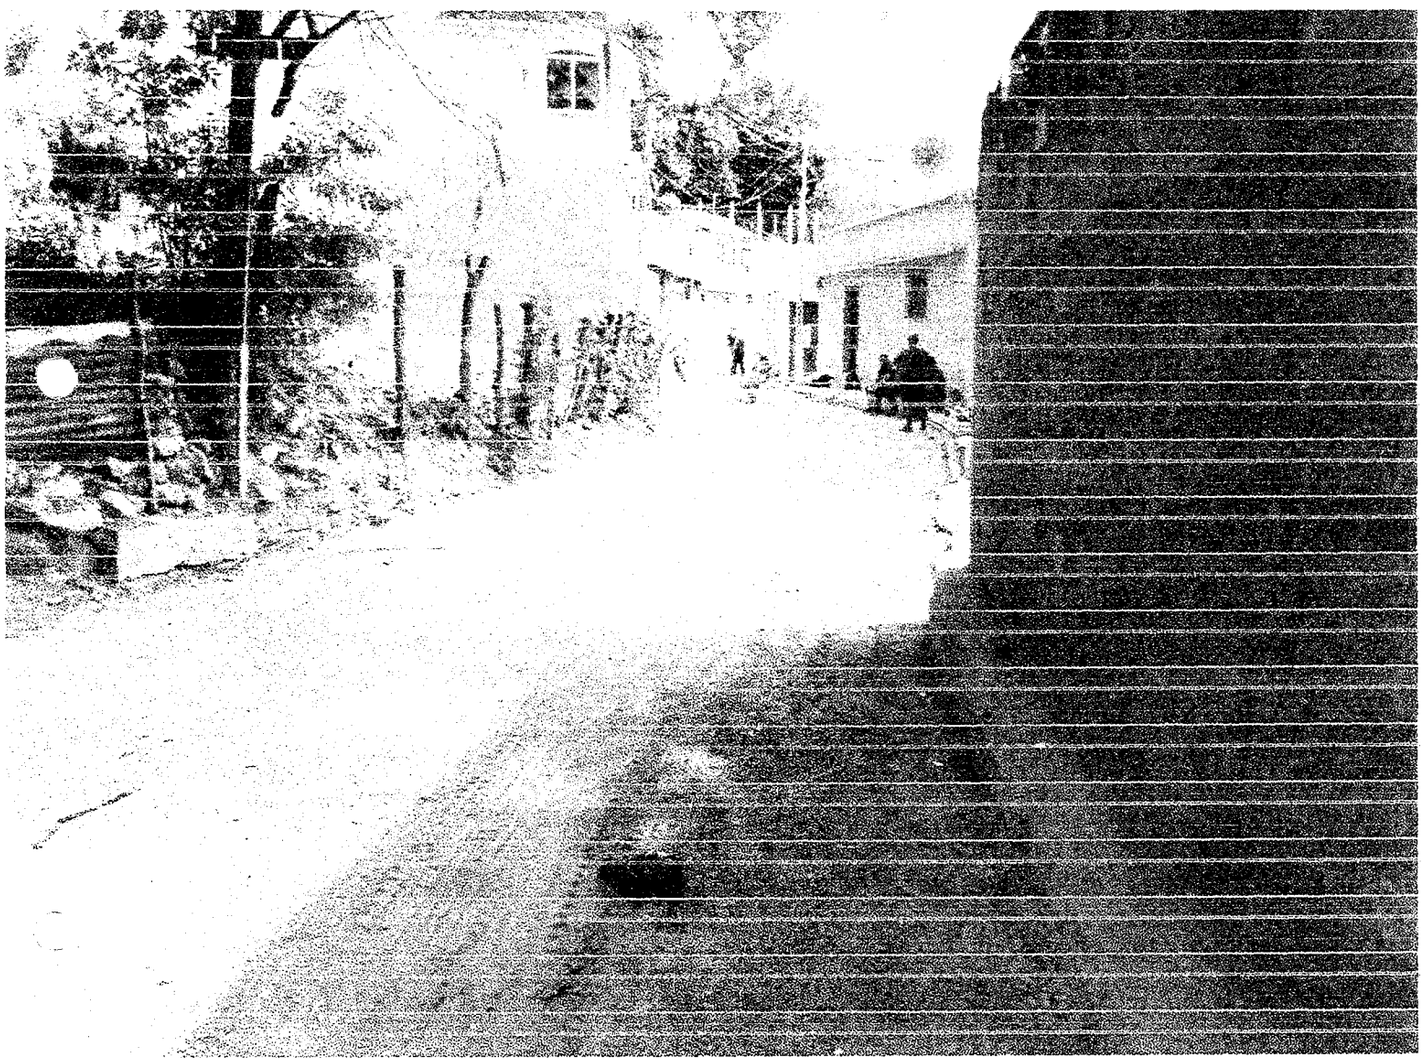



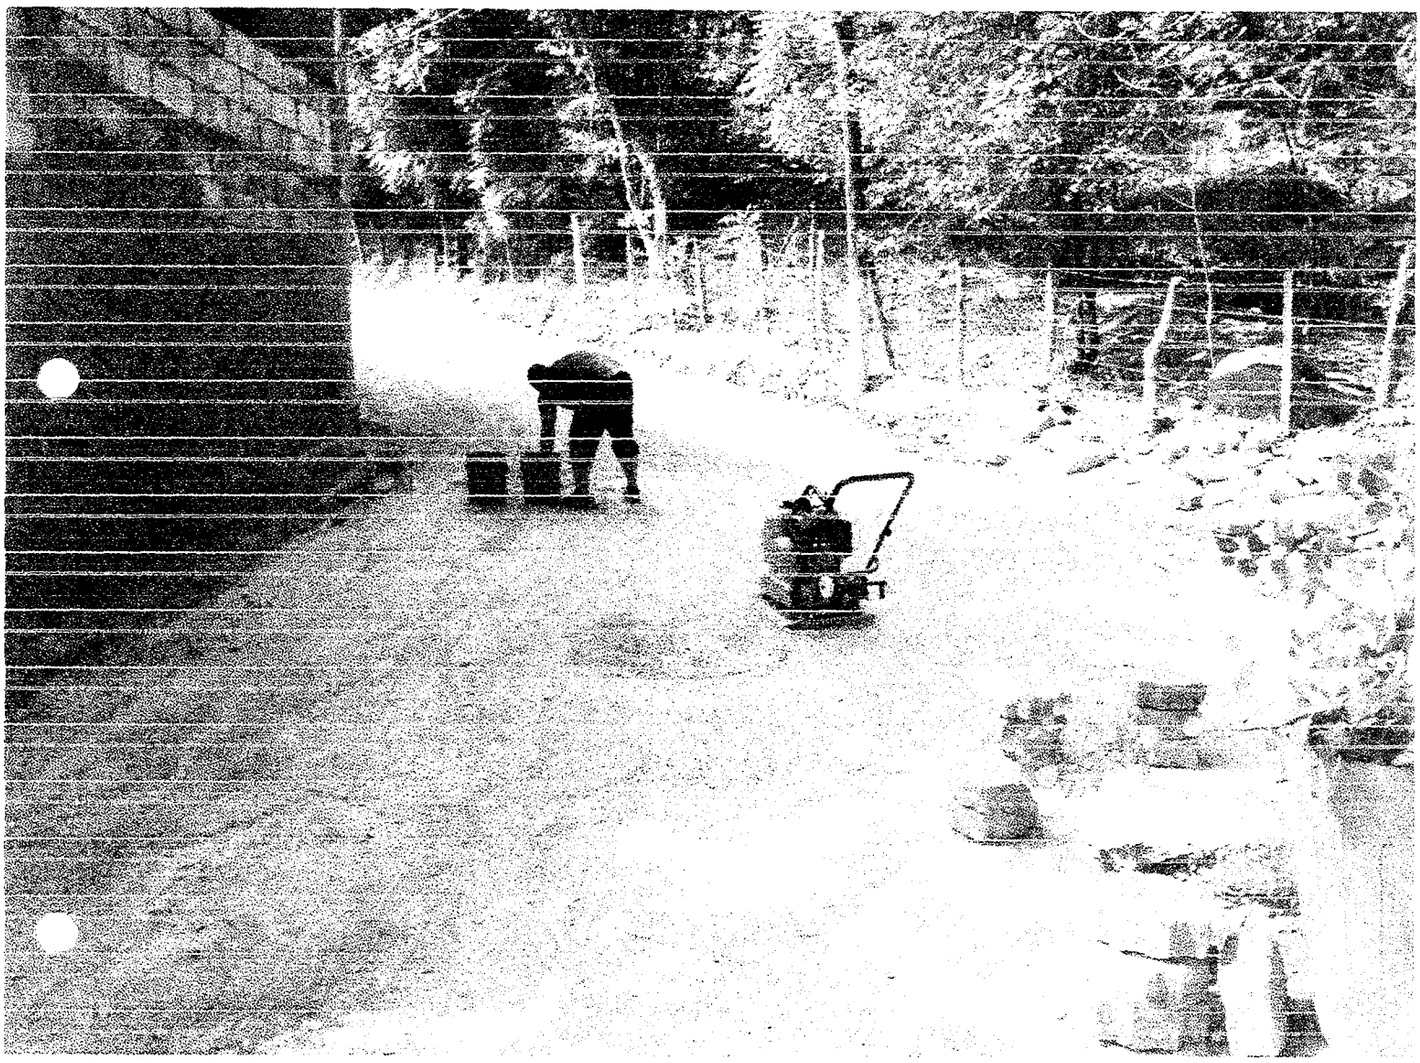

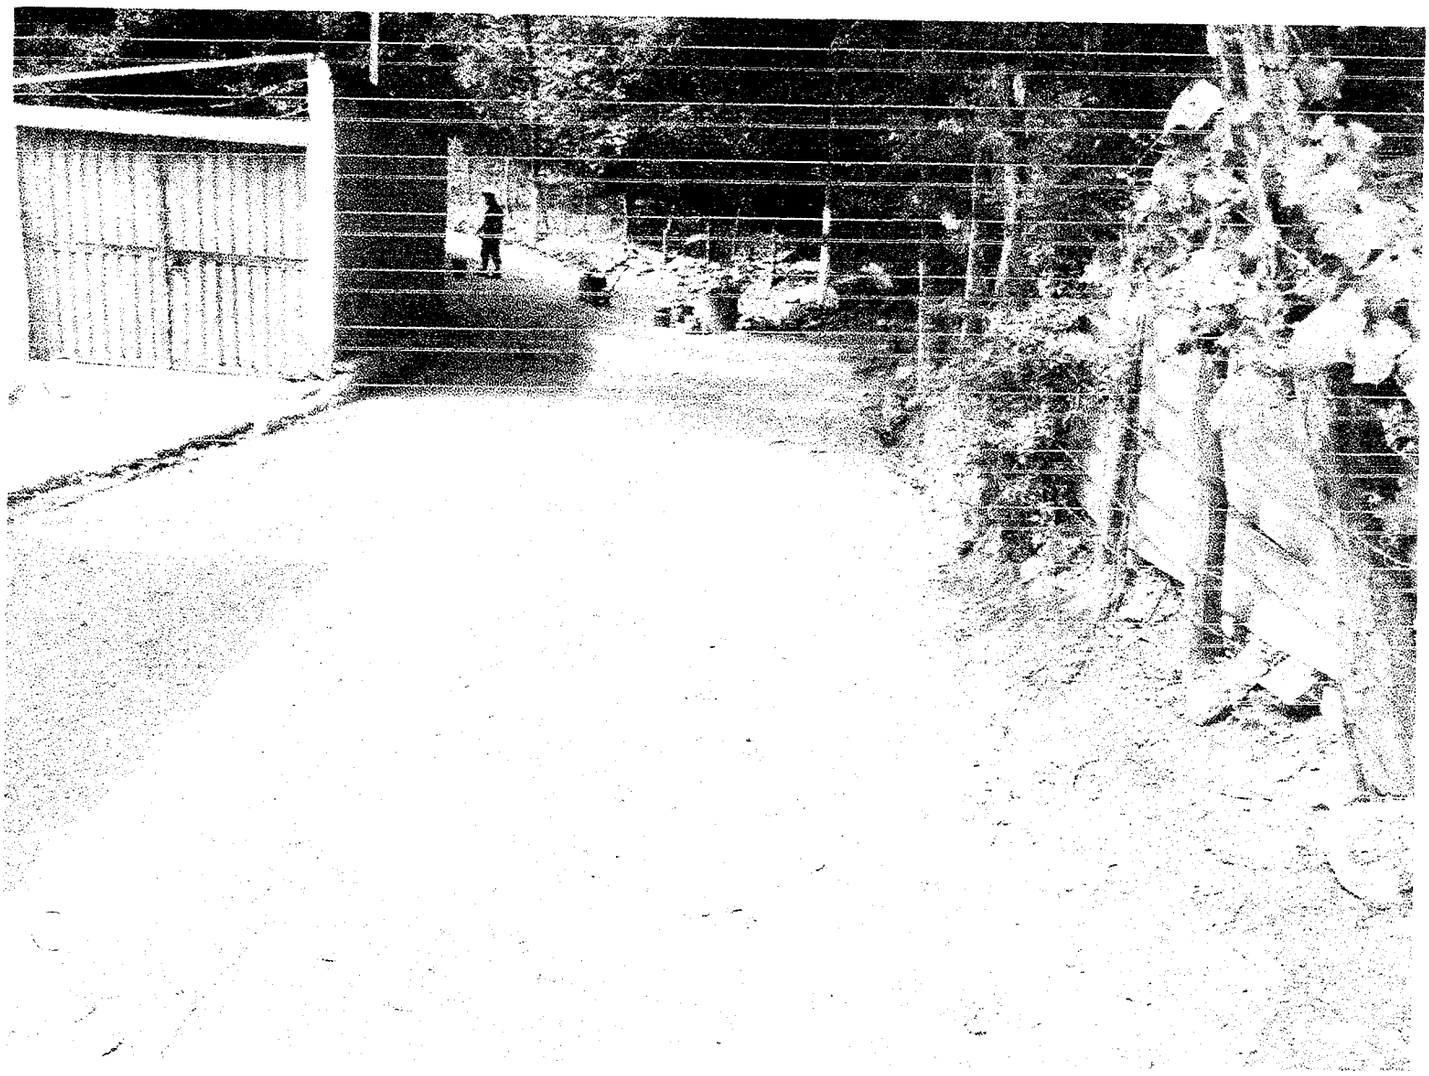



BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 4428/12/2024

CONTRATO No. 28-2024

NOMBRE: MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS CHORRITOS, ALDEA SANTA LUCIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

REGISTRO No. 2

FECHA 15/01/2025

TIPO AVANCE

DESCRIPCIÓN En este dia se observa la colocación de adoquin y la fundicion de llaves de confinamiento, se tiene personal suficiente y materiales de buena calidad


CREADO POR FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA









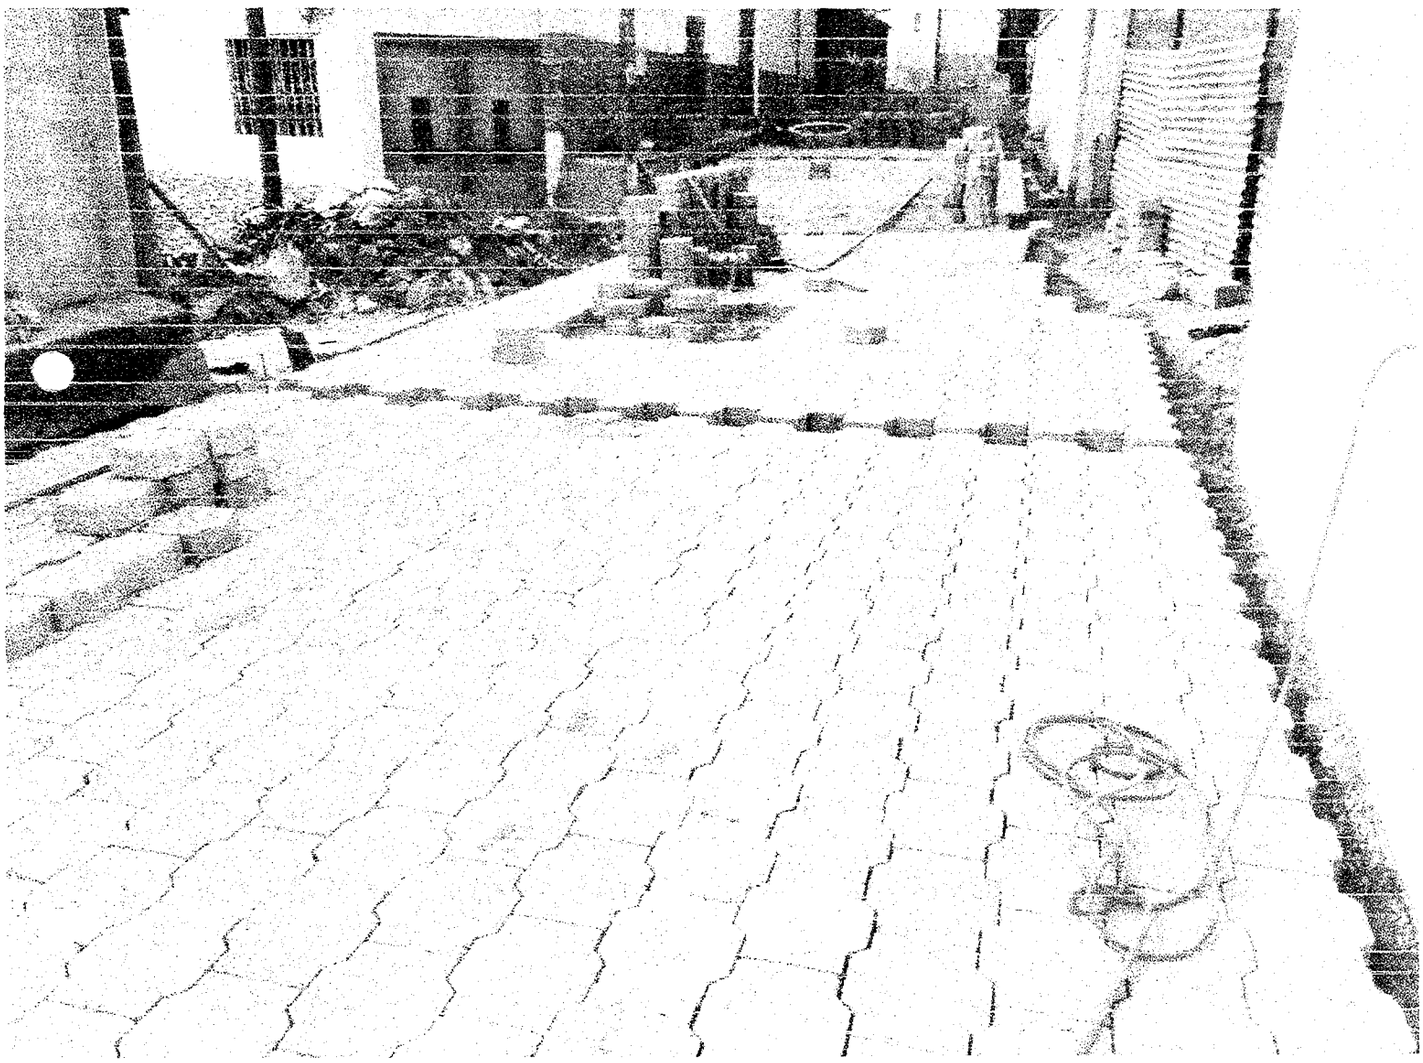




BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 4428/12/2024

CONTRATO No.	28-2024
NOMBRE:	MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS CHORRITOS, ALDEA SANTA LUCIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO
ENTIDAD:	MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

REGISTRO No.	3
FECHA	20/01/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	Se realizan trabajos de corte de cajuela y base
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA



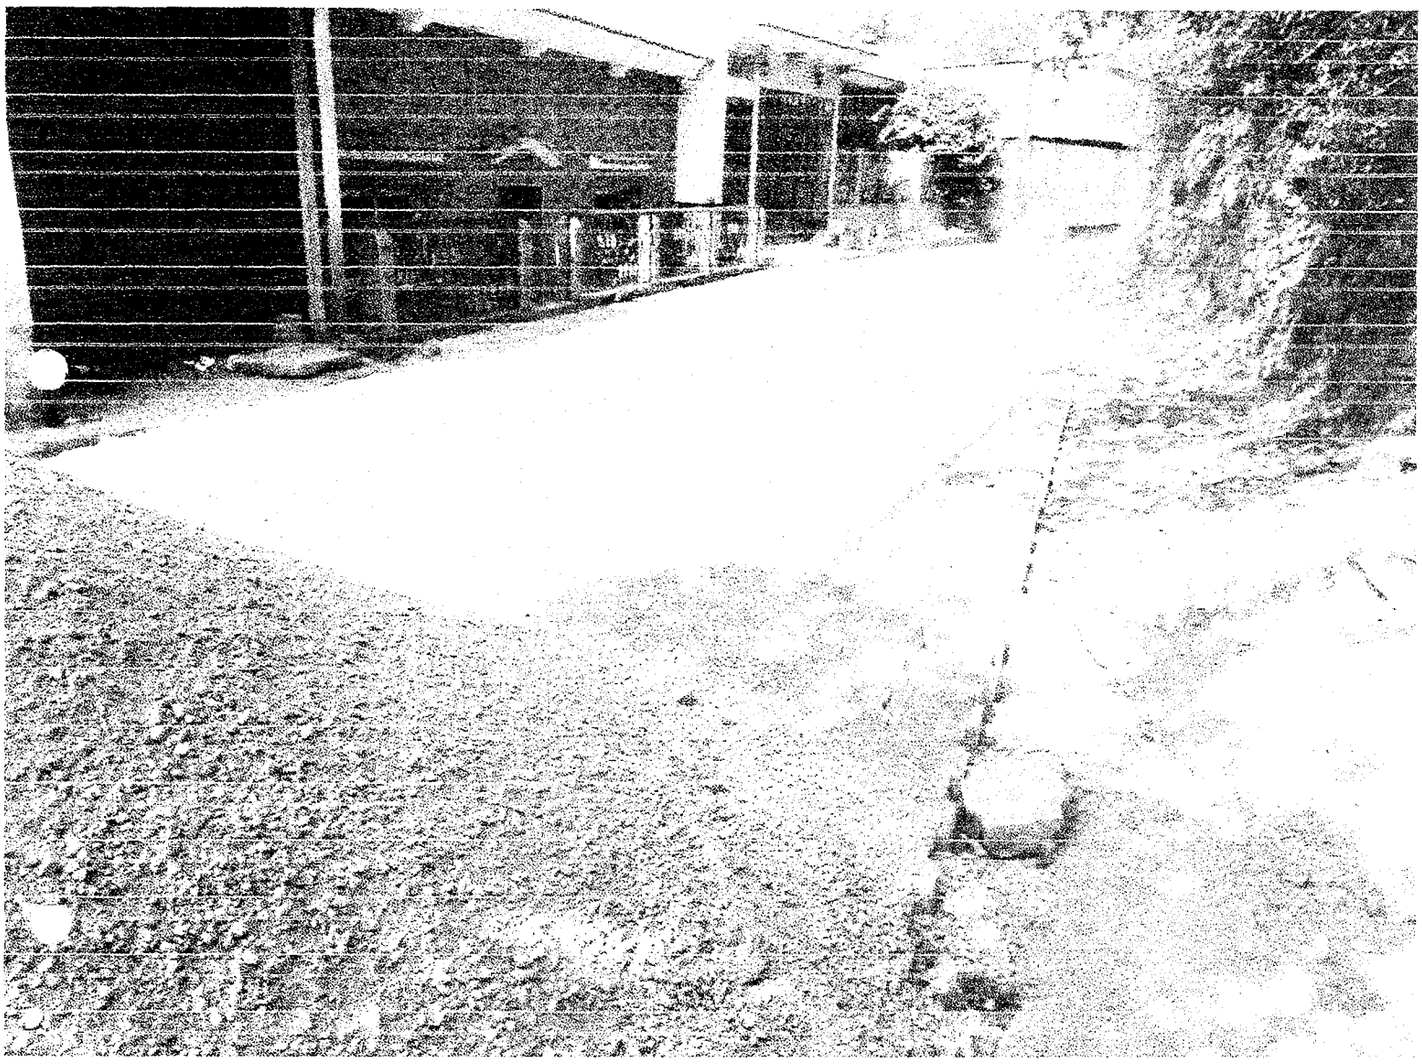







BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 4428/12/2024

CONTRATO No.	28-2024
NOMBRE:	MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS CHORRITOS, ALDEA SANTA LUCIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO
ENTIDAD:	MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA


REGISTRO No.	4
FECHA	27/01/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	Se continua con los trabajos de adoquinado y colocación de bordillo prefabricado, ademas de preparación de base para pavilento, se cuenta con personal y materiales suficientes para el avance del proyecto
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA

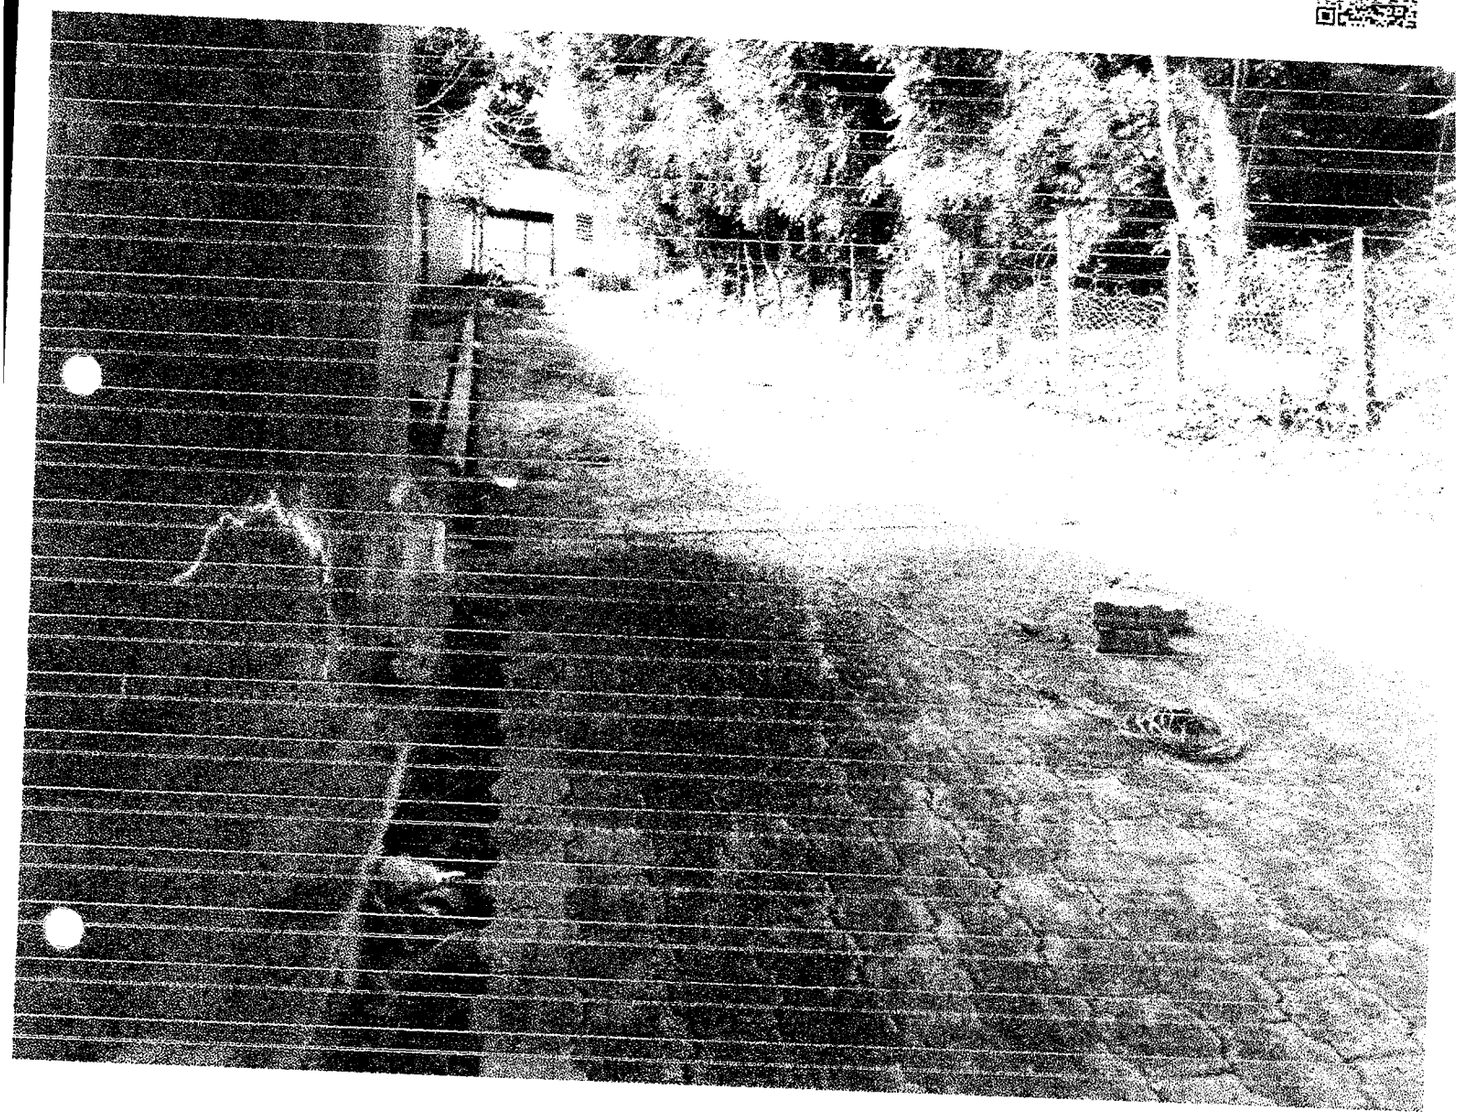



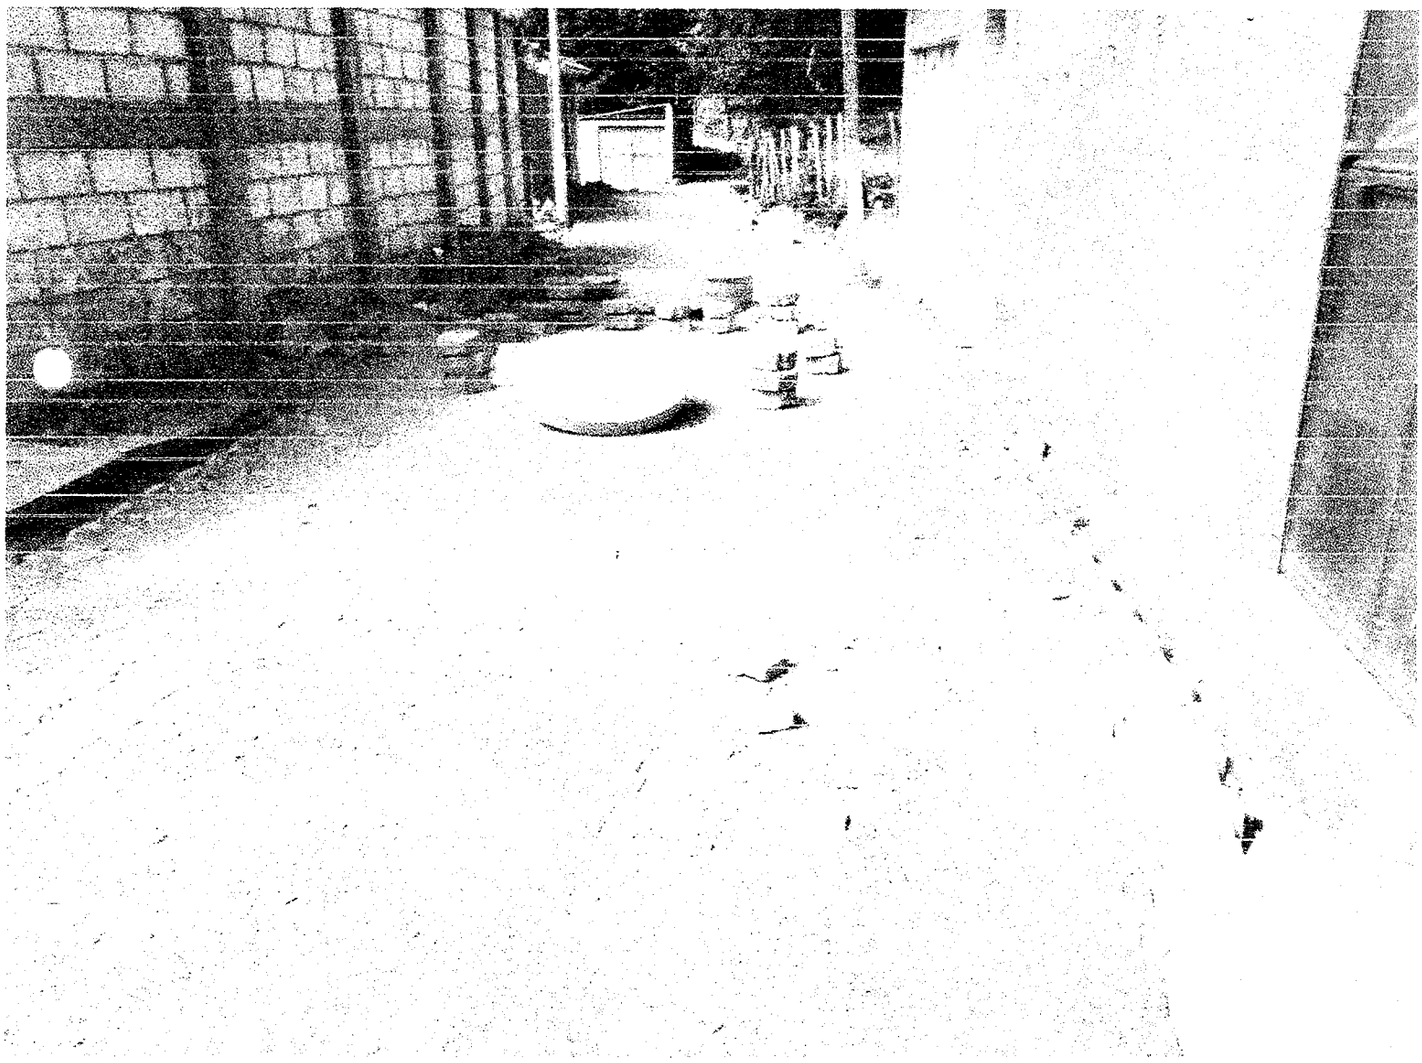



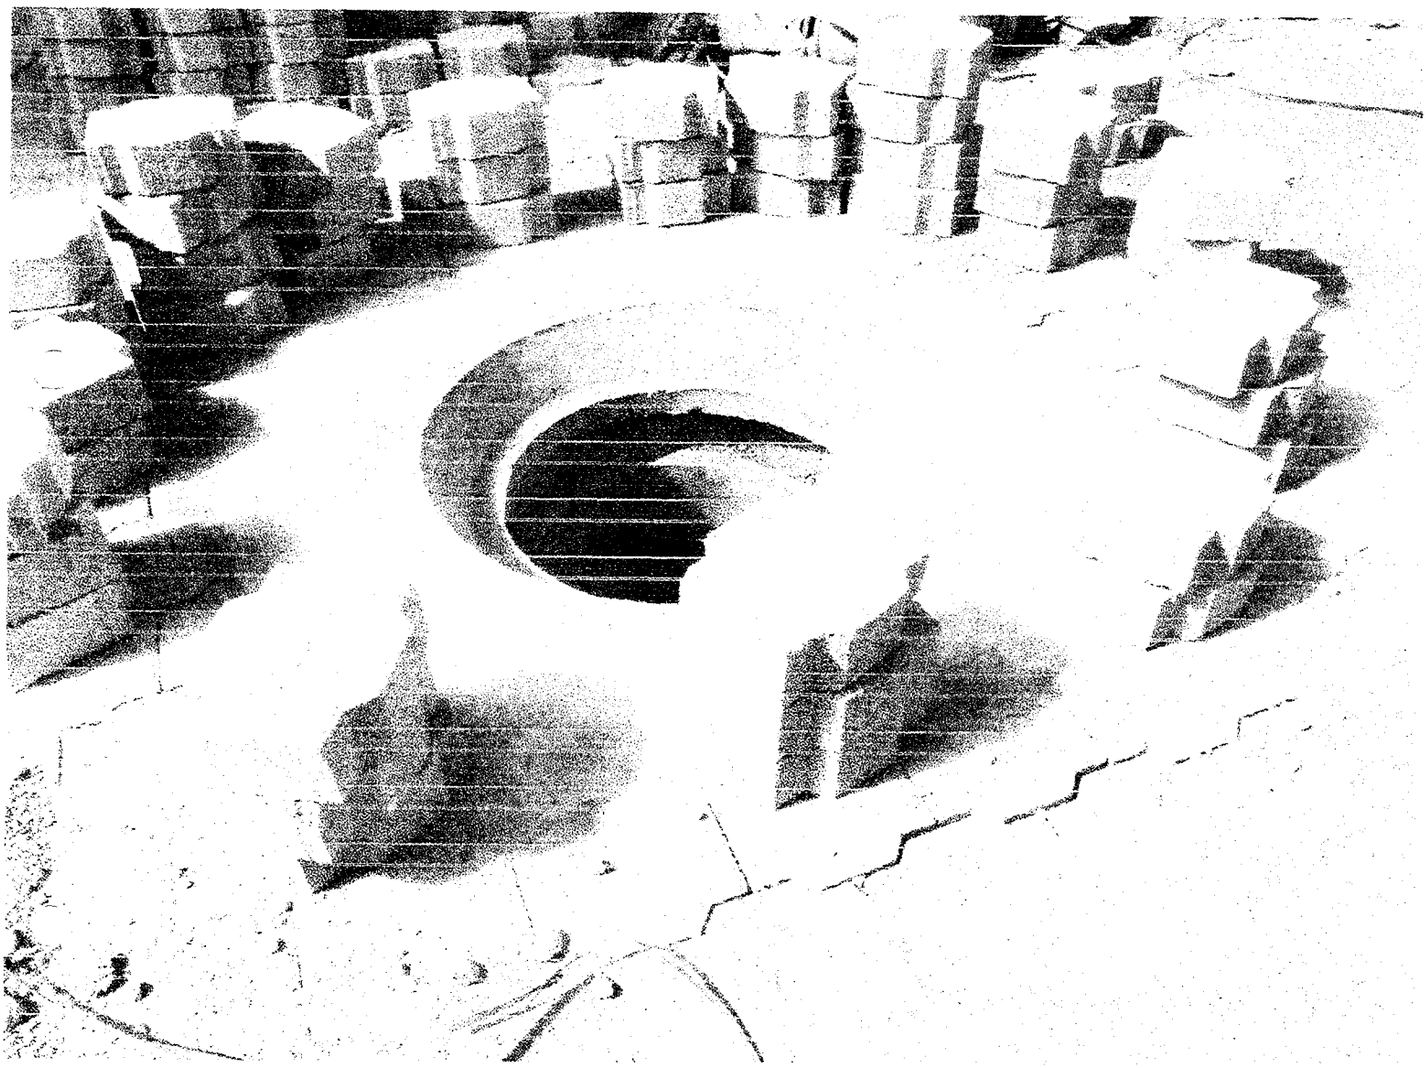



BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 4428/12/2024

CONTRATO No. 28-2024

NOMBRE: MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS CHORRITOS, ALDEA SANTA LUCIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA


REGISTRO No. 5

FECHA 04/02/2025

TIPO AVANCE

DESCRIPCIÓN En este dia se observa la colocación de adoquin y bordillo prefabricado, además de la base para la fundición de pavimento

CREADO POR FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA

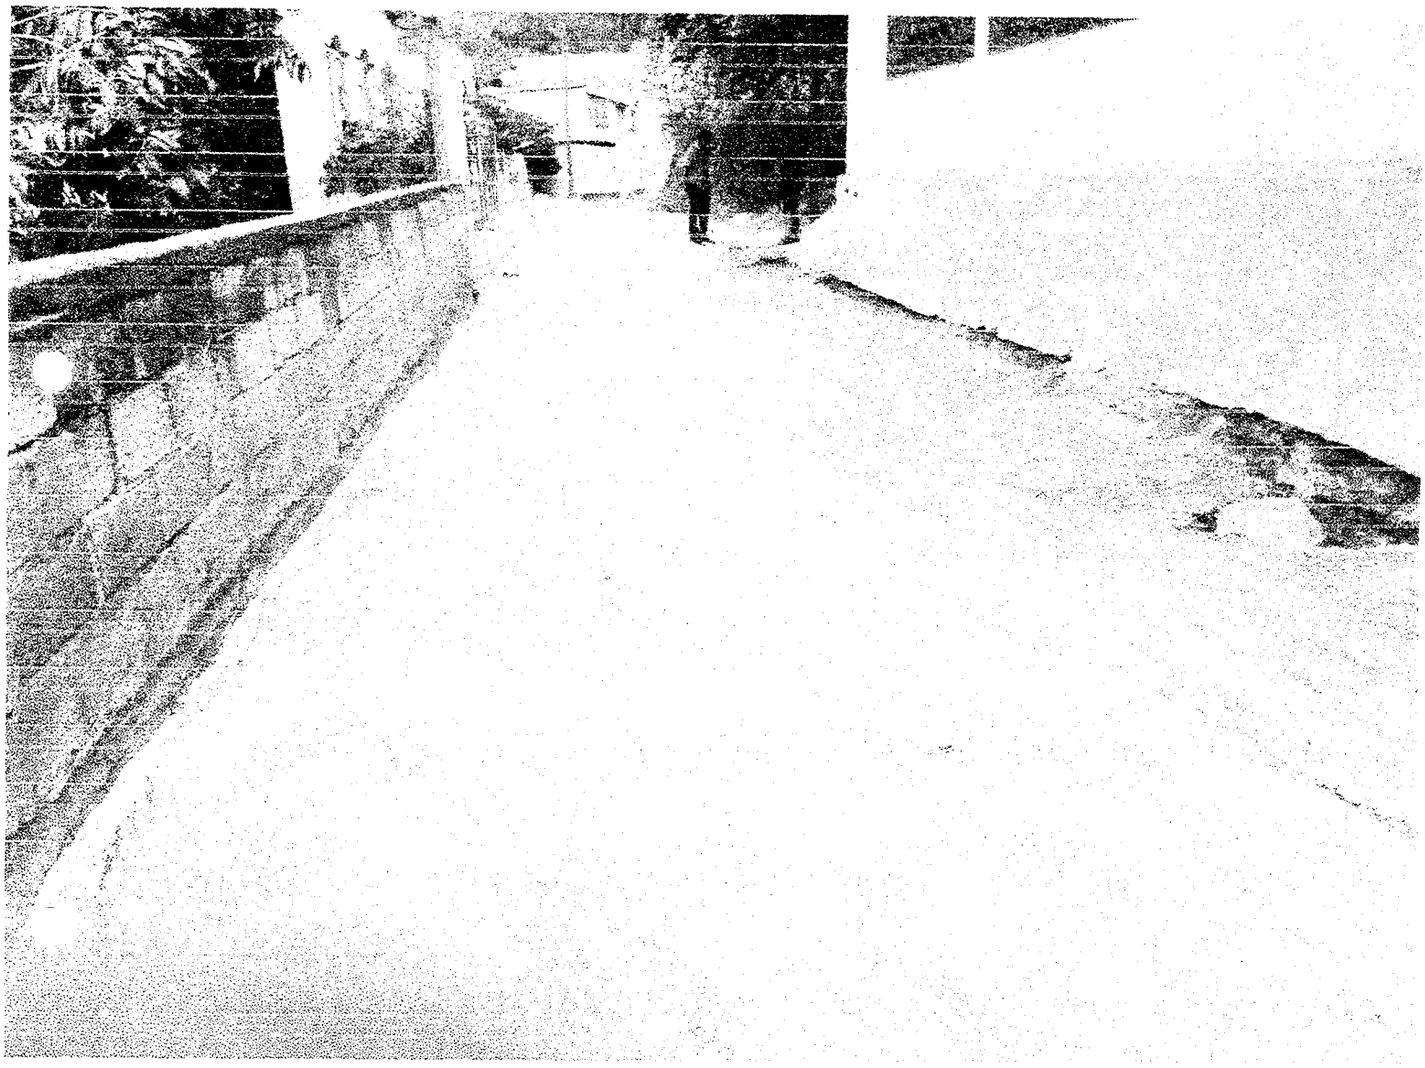









BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 4428/12/2024

CONTRATO No. 28-2024

NOMBRE: MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS CHORRITOS, ALDEA SANTA LUCIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA


REGISTRO No. 6

FECHA 12/02/2025

TIPO AVANCE

DESCRIPCIÓN Se observa fundición de pavimento y continuación de adoquinado, ademas de base para fundición, se tiene personal suficiente y materiales adecuados y de calidad para el avance del proyecto


CREADO POR FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA

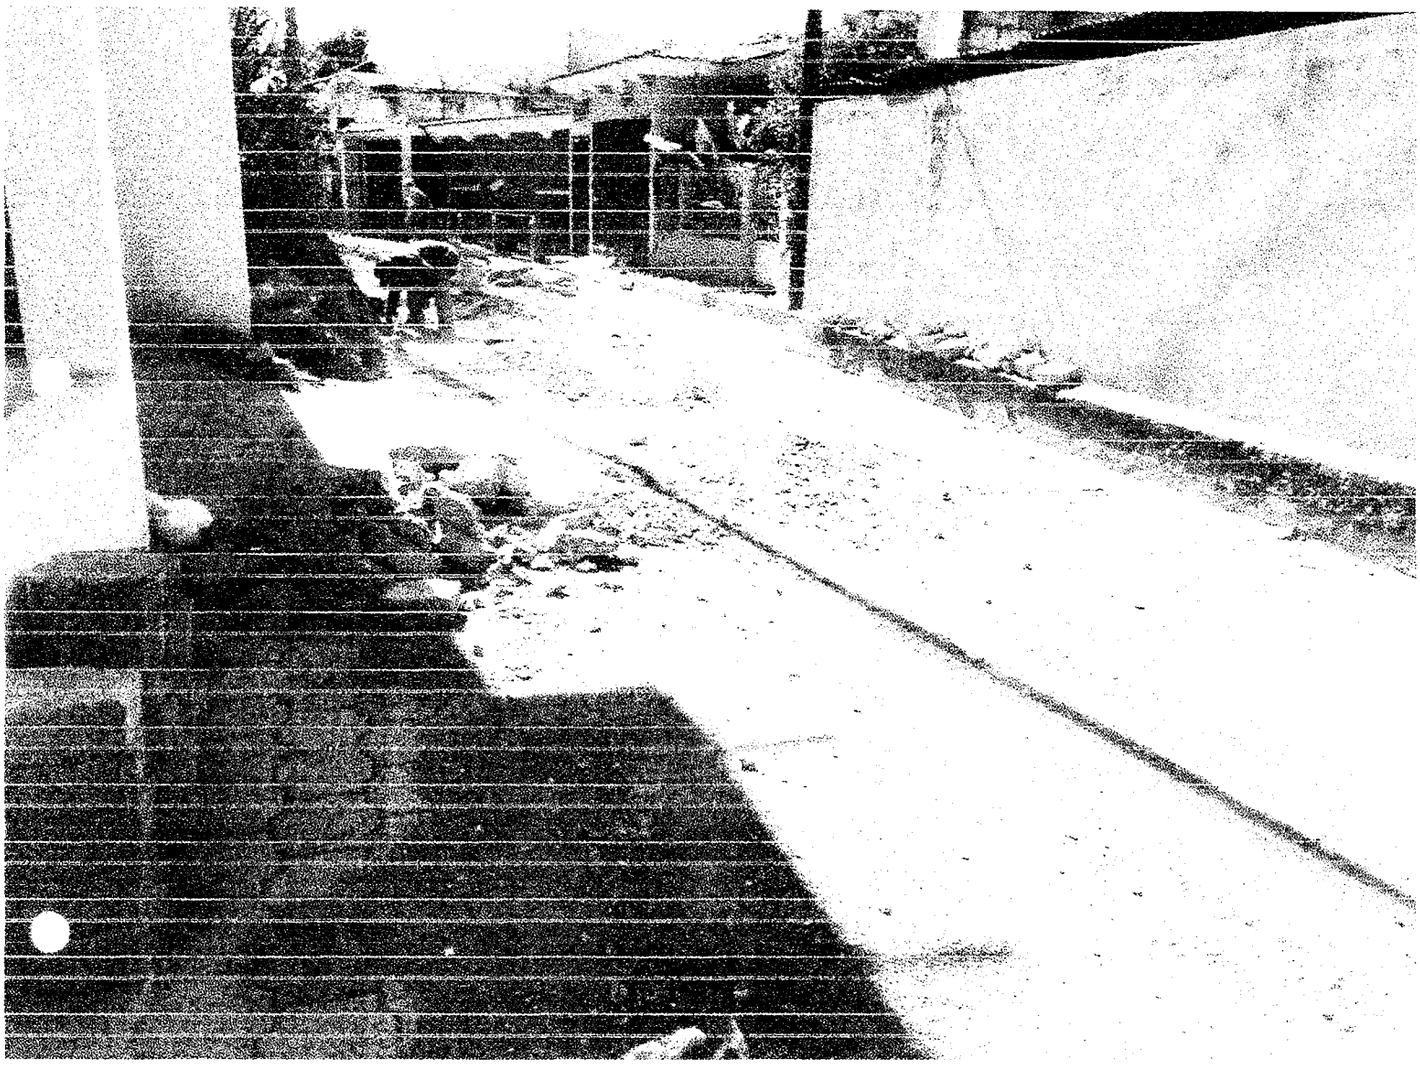







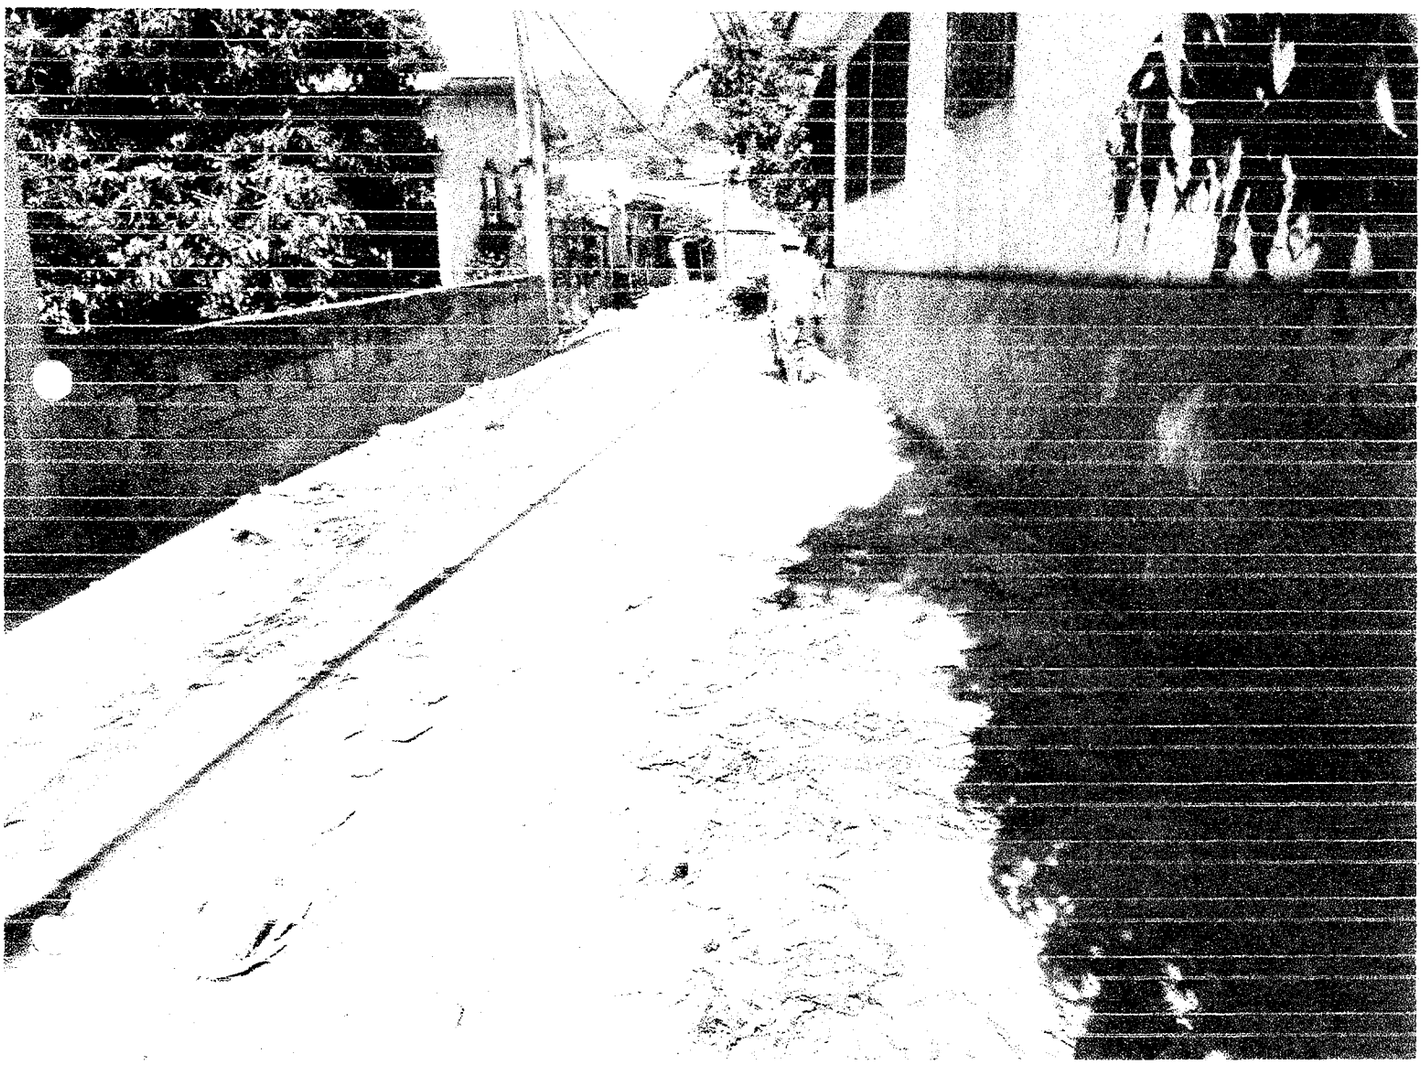



BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 4428/12/2024

CONTRATO No. 28-2024

NOMBRE: MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS CHORRITOS, ALDEA SANTA LUCIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

REGISTRO No. 7

FECHA 01/03/2025


TIPO AVANCE

DESCRIPCIÓN Se observa la continuación de preparación de base para la colocación de adoquin y se observa el trabajo de pavimento terminado, se cuenta con personal y materiales suficientes para el avance del proyecto


CREADO POR FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA





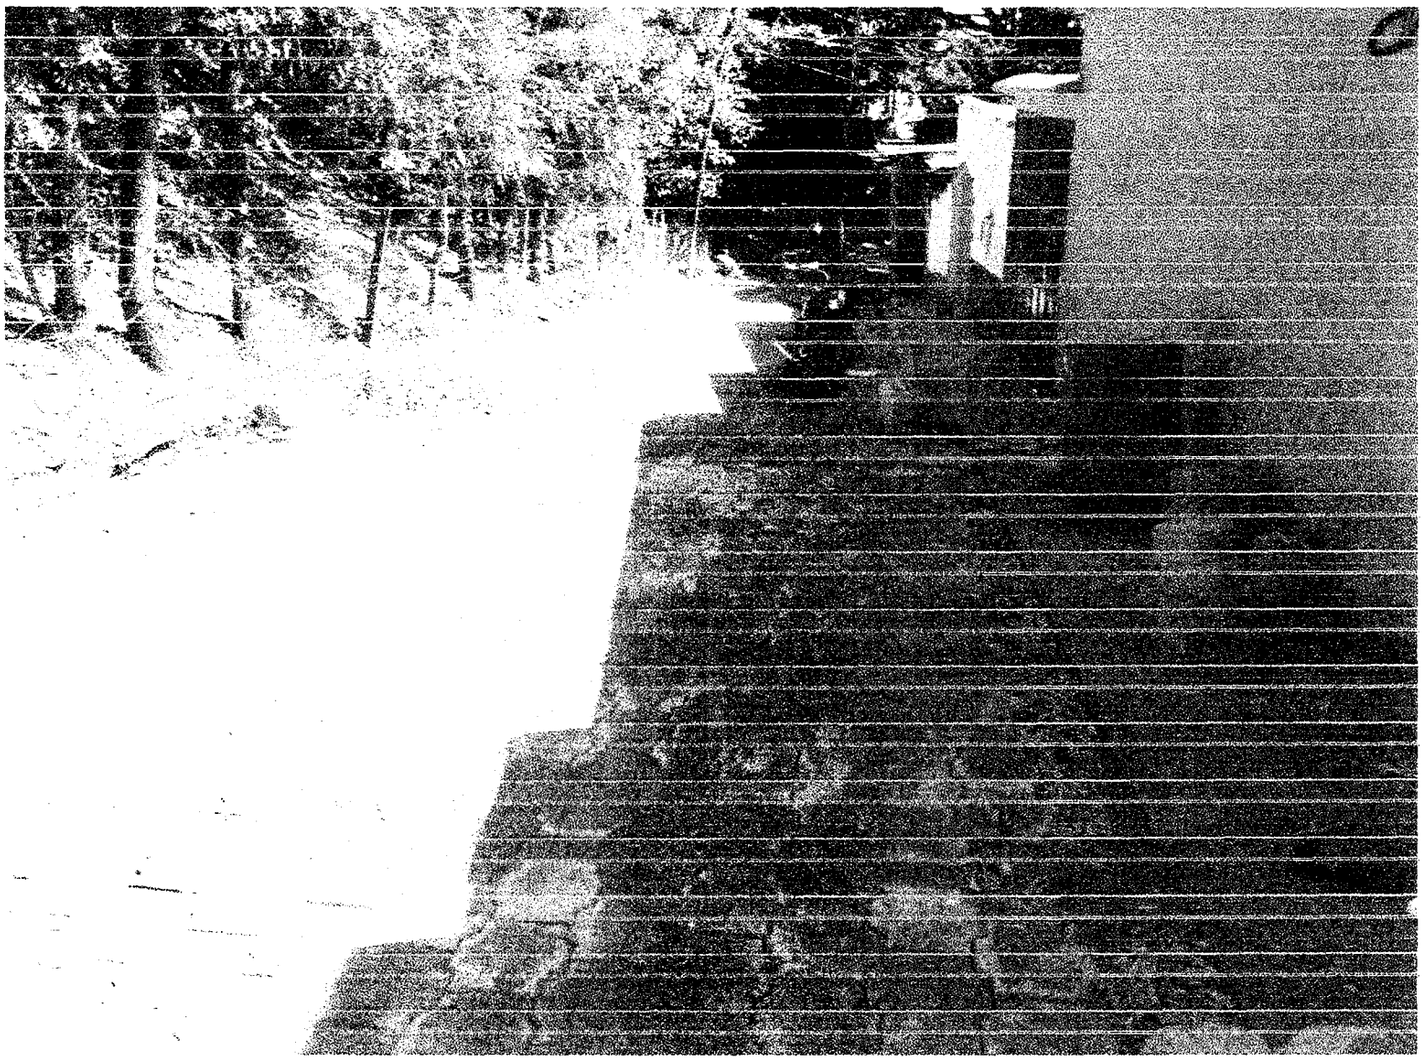




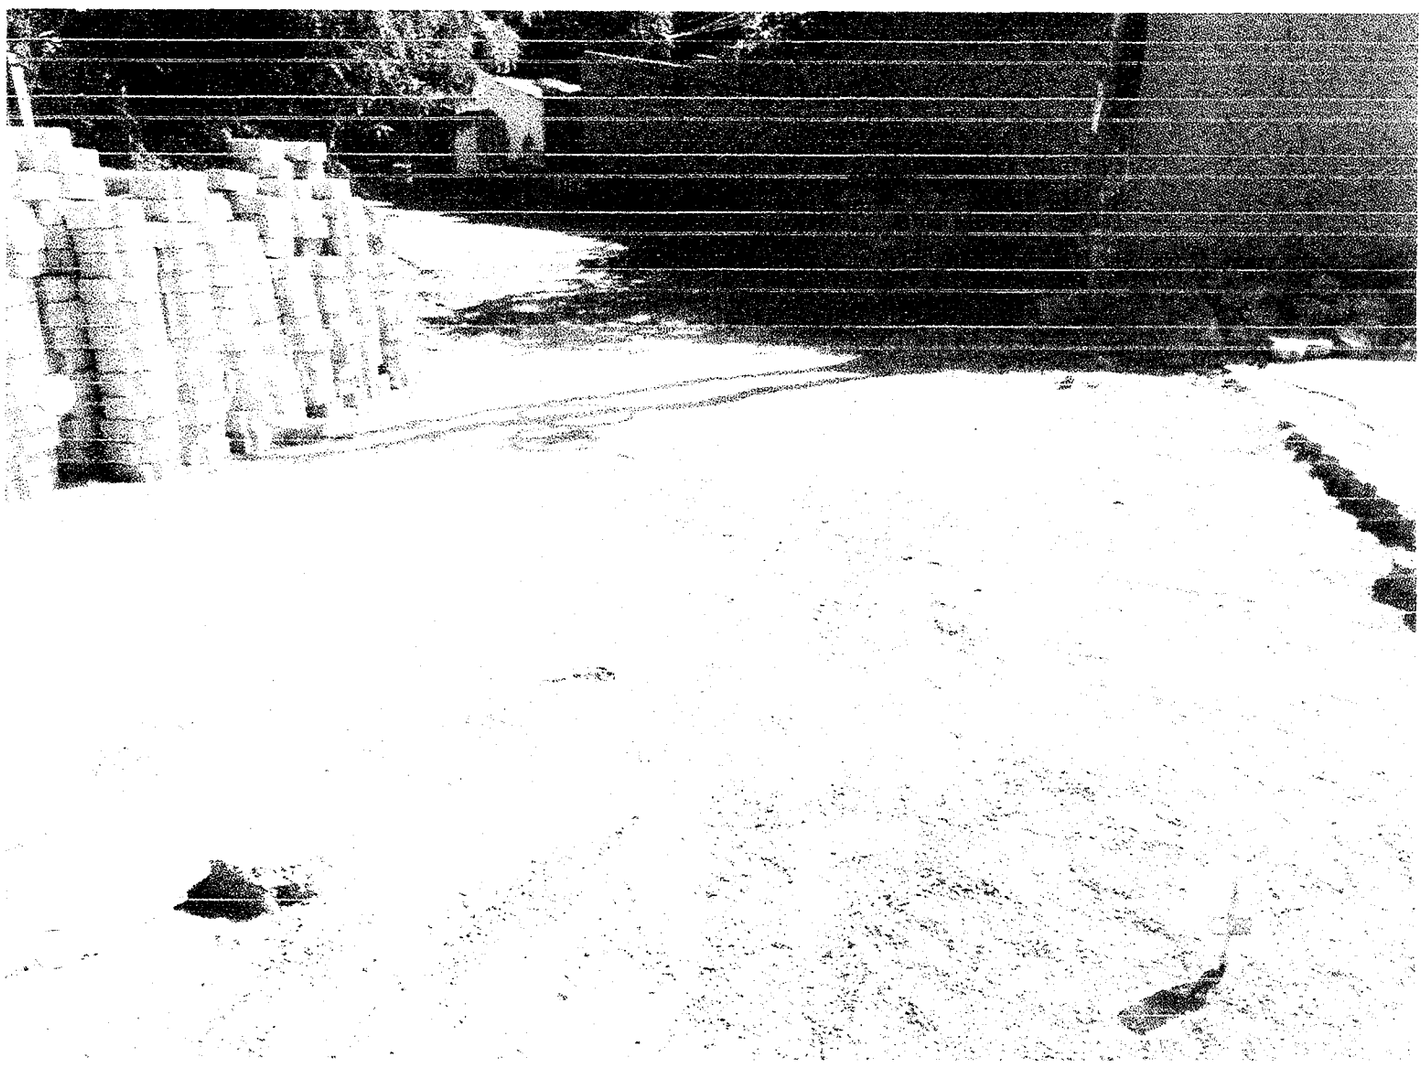


BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 4428/12/2024


CONTRATO No.	28-2024
NOMBRE:	MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS CHORRITOS, ALDEA SANTA LUCIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO
ENTIDAD:	MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

REGISTRO No.	8
FECHA	10/03/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	Se continua con la colocación de adoquin y bordillo prefabricado, se cuenta con personal y materiales suficientes para el avance del proyecto
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA

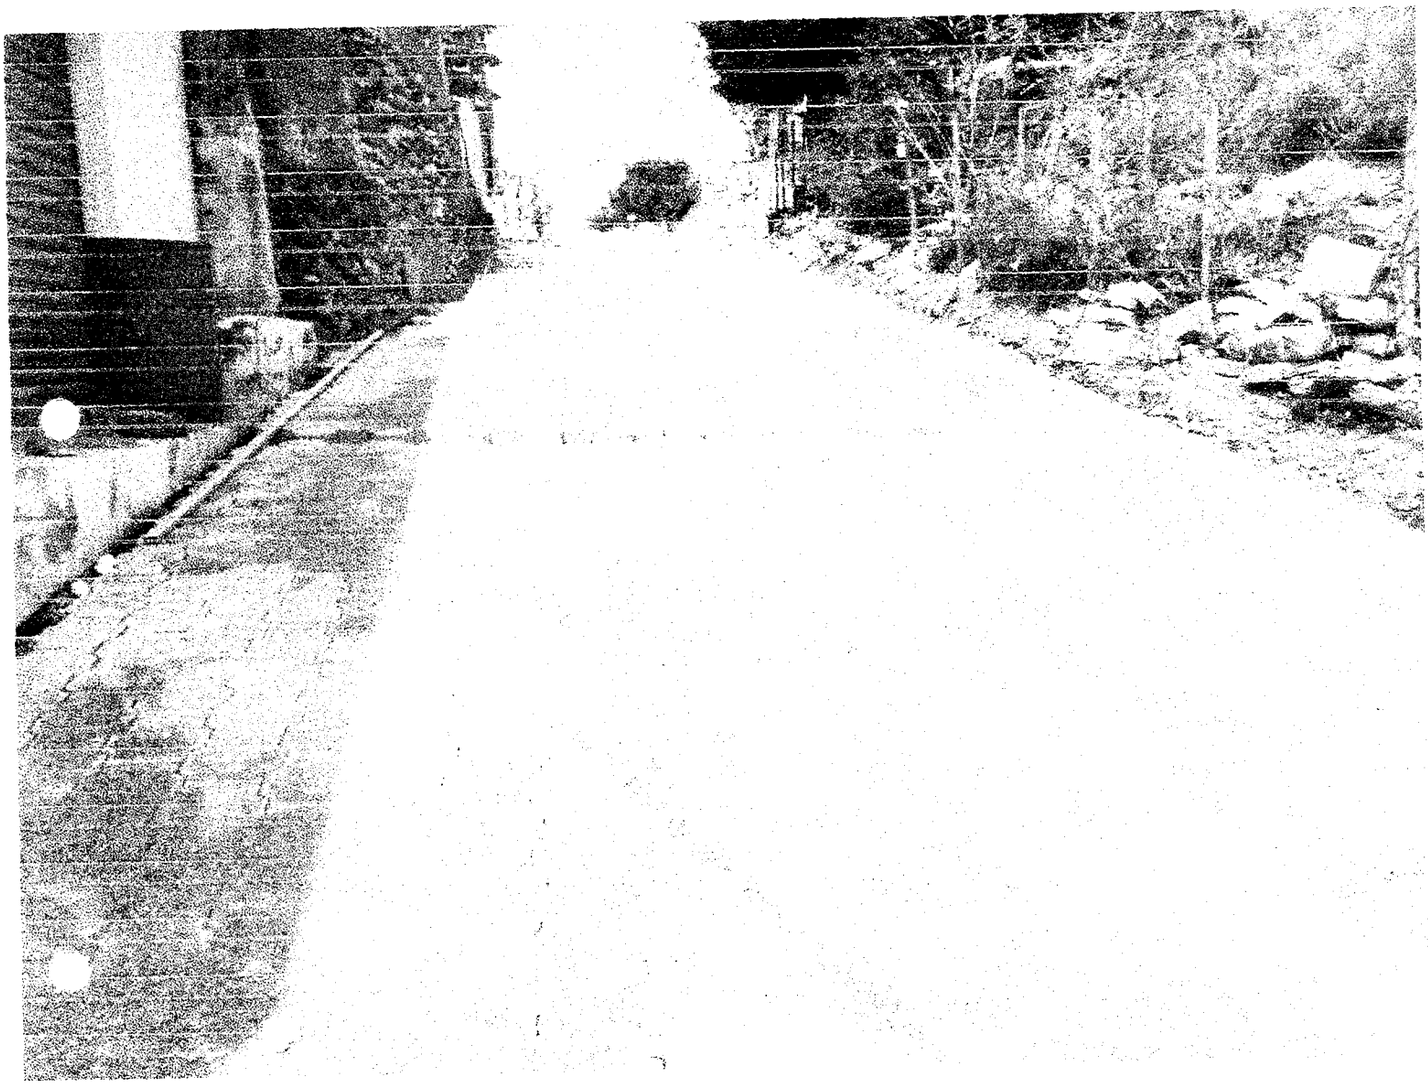



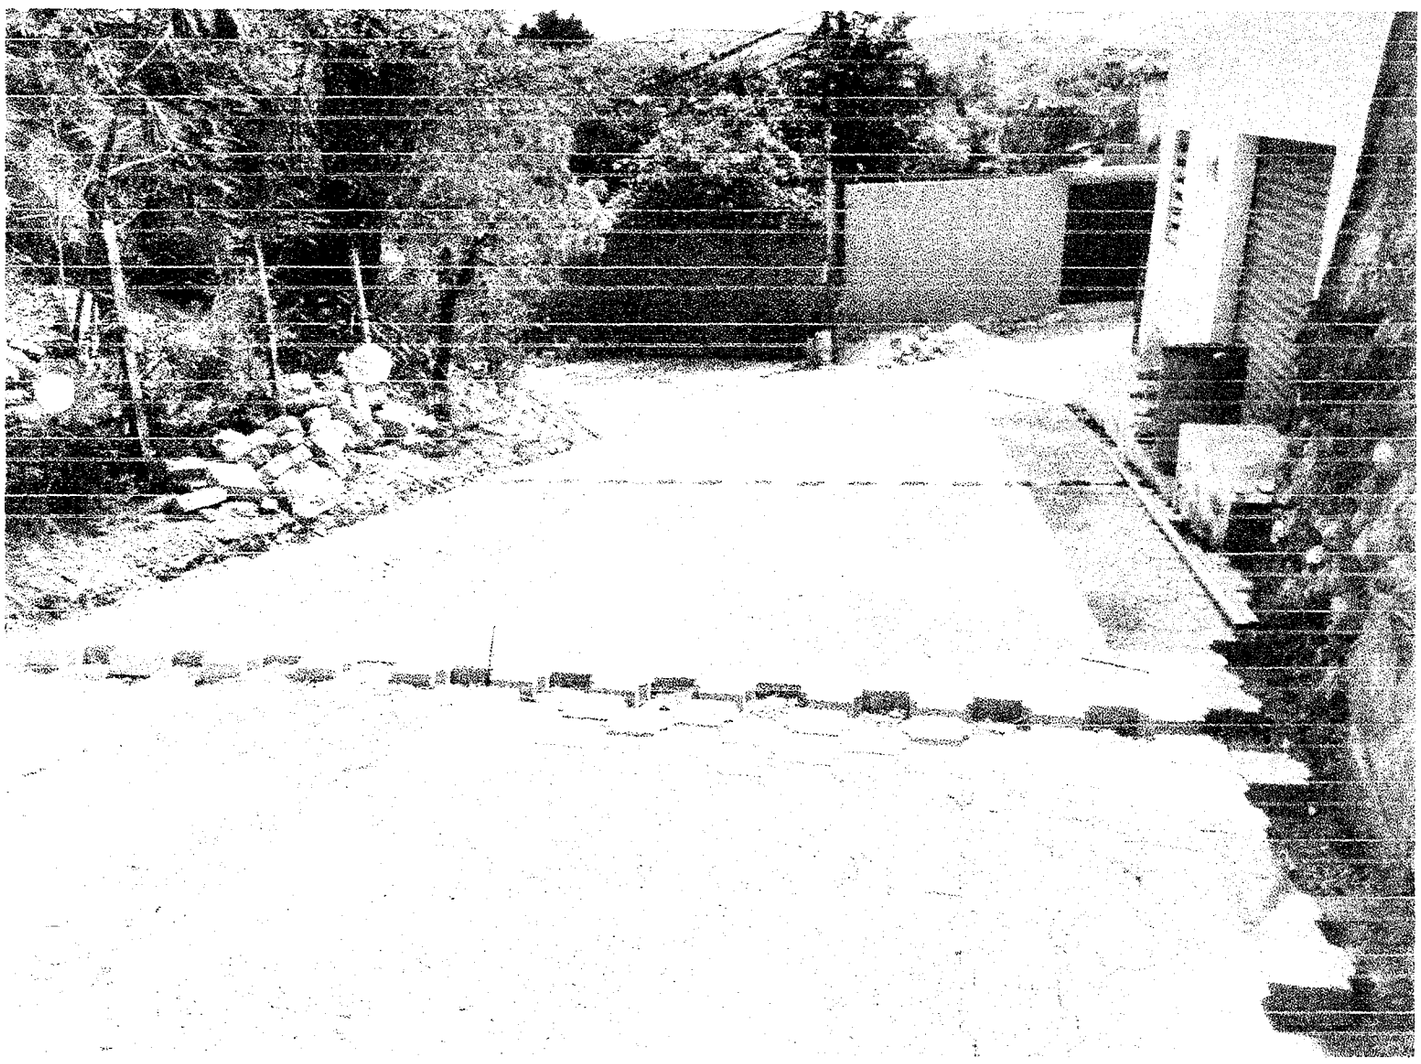

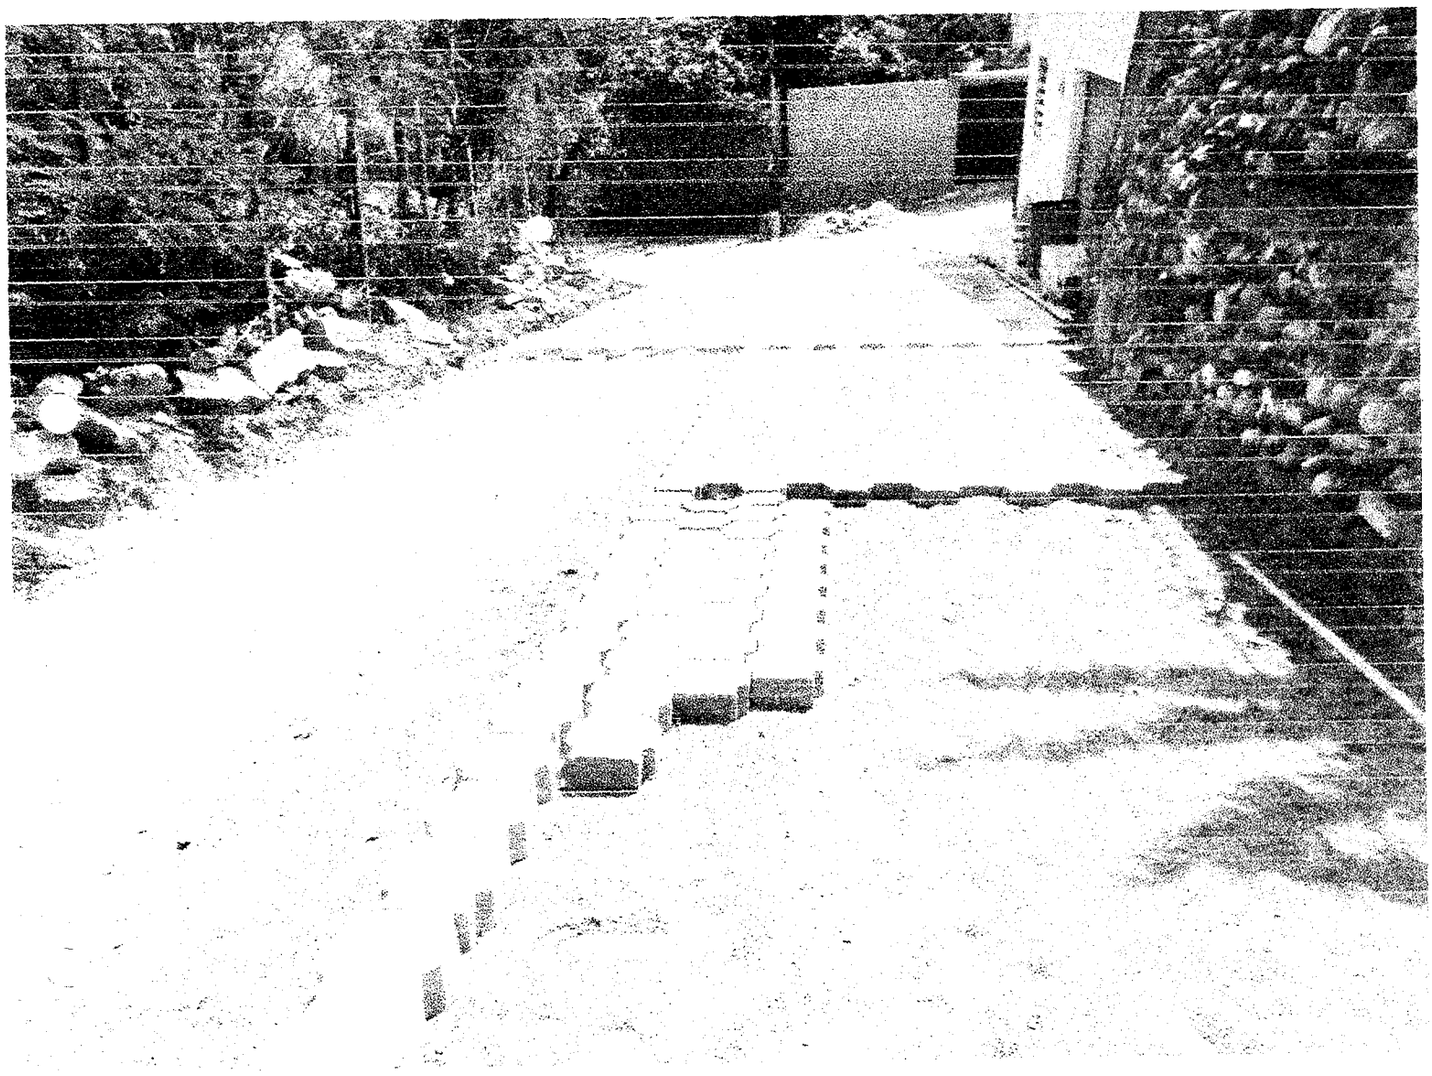


BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 4428/12/2024

CONTRATO No.	28-2024
NOMBRE:	MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS CHORRITOS, ALDEA SANTA LUCIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO
ENTIDAD:	MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

REGISTRO No.	9
FECHA	22/03/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	Se observa la colocación de adoquin y bordillo prefabricado. se cuenta con personal y materiales suficientes para el avance del proyecto
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA



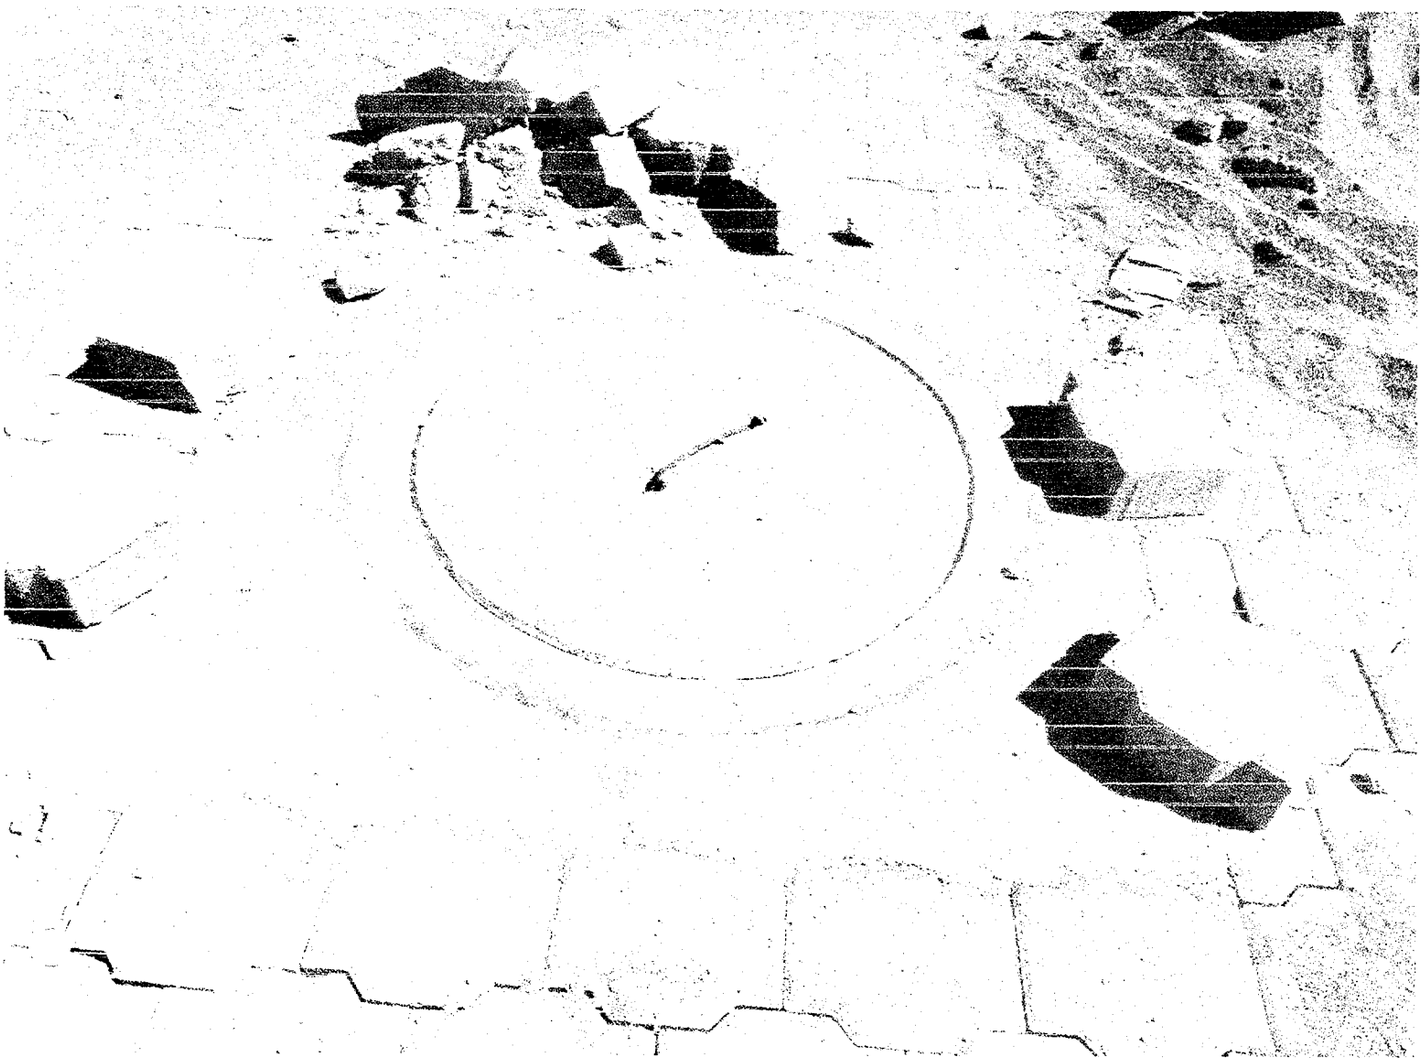






BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 4428/12/2024

CONTRATO No.	28-2024
NOMBRE:	MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS CHORRITOS, ALDEA SANTA LUCIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO
ENTIDAD:	MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

REGISTRO No.	10
FECHA	29/03/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	Se realiza colocacion de adoquin. se cuenta con personal y materiales suficientes para el avance del proyecto
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA



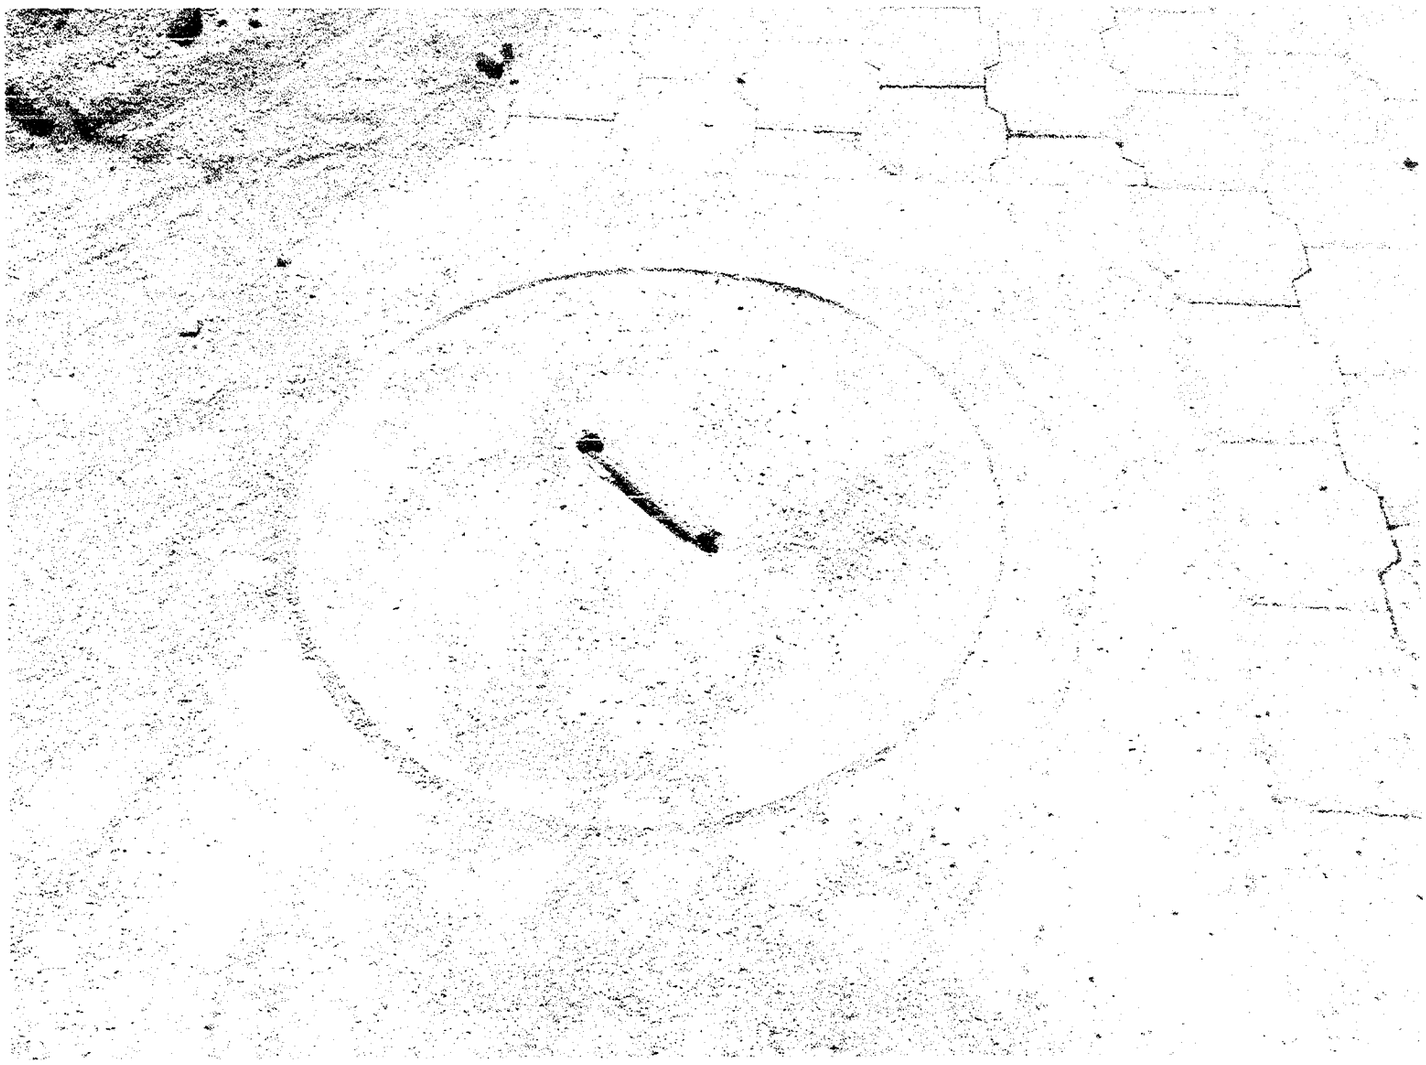







BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 4428/12/2024

CONTRATO No. 28-2024

NOMBRE: MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS CHORRITOS, ALDEA SANTA LUCIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA


REGISTRO No. 11

FECHA 05/04/2025


TIPO AVANCE

DESCRIPCIÓN Se observa la colocación de bordillo prefabricado, se cuenta con personal y materiales suficientes para el avance del proyecto


CREADO POR FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA

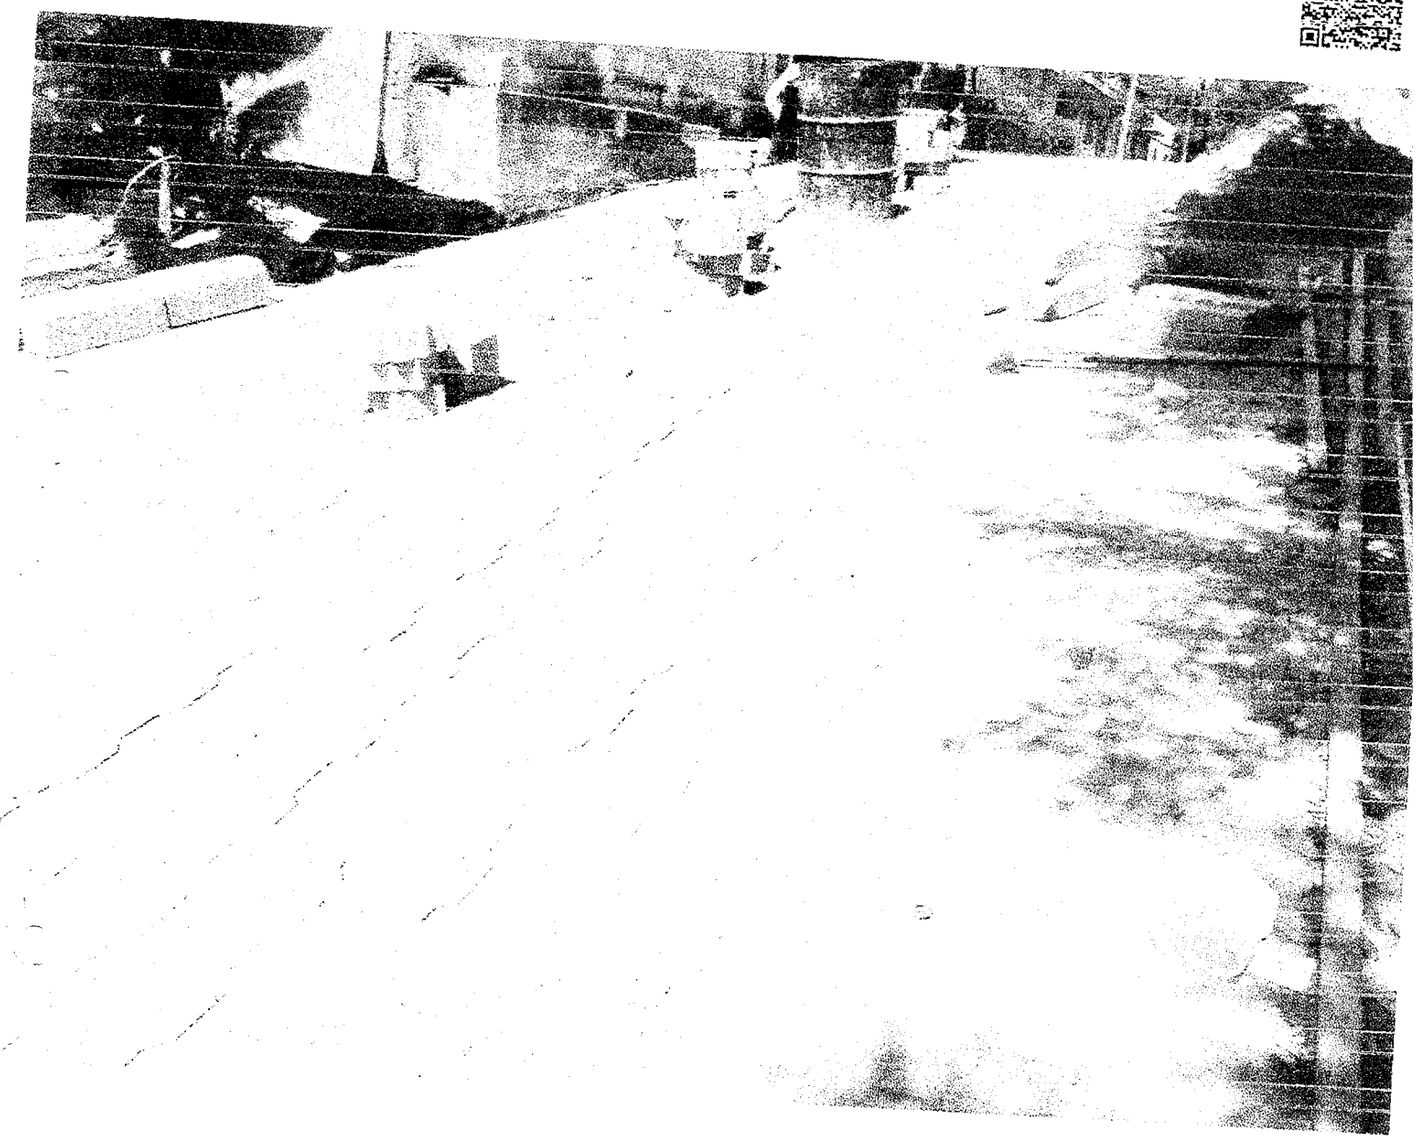



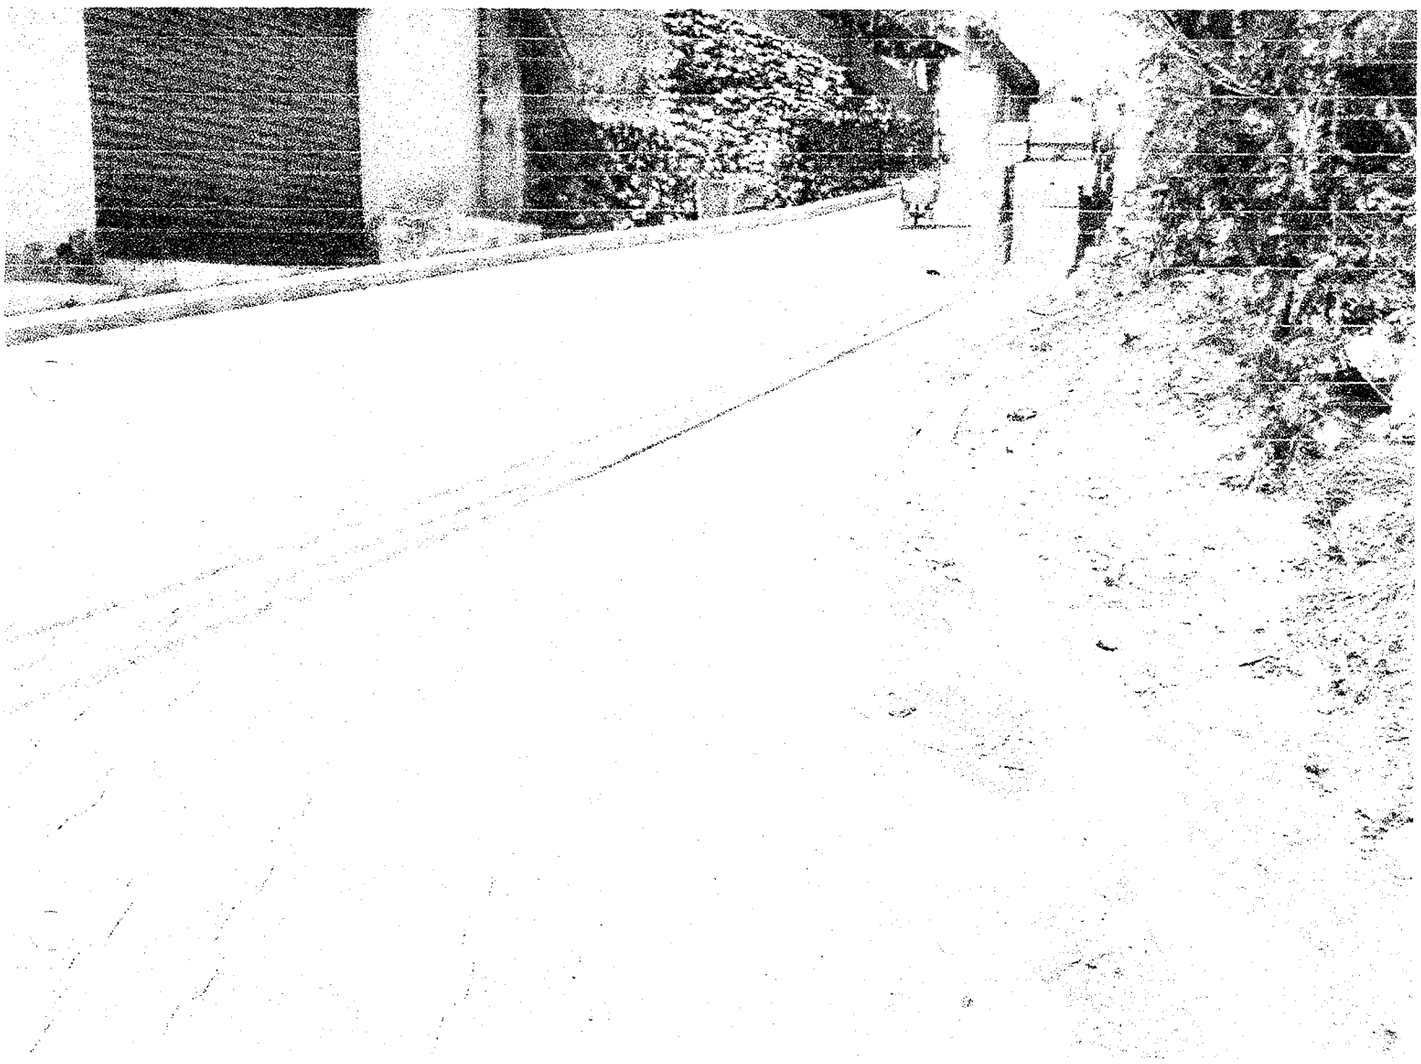



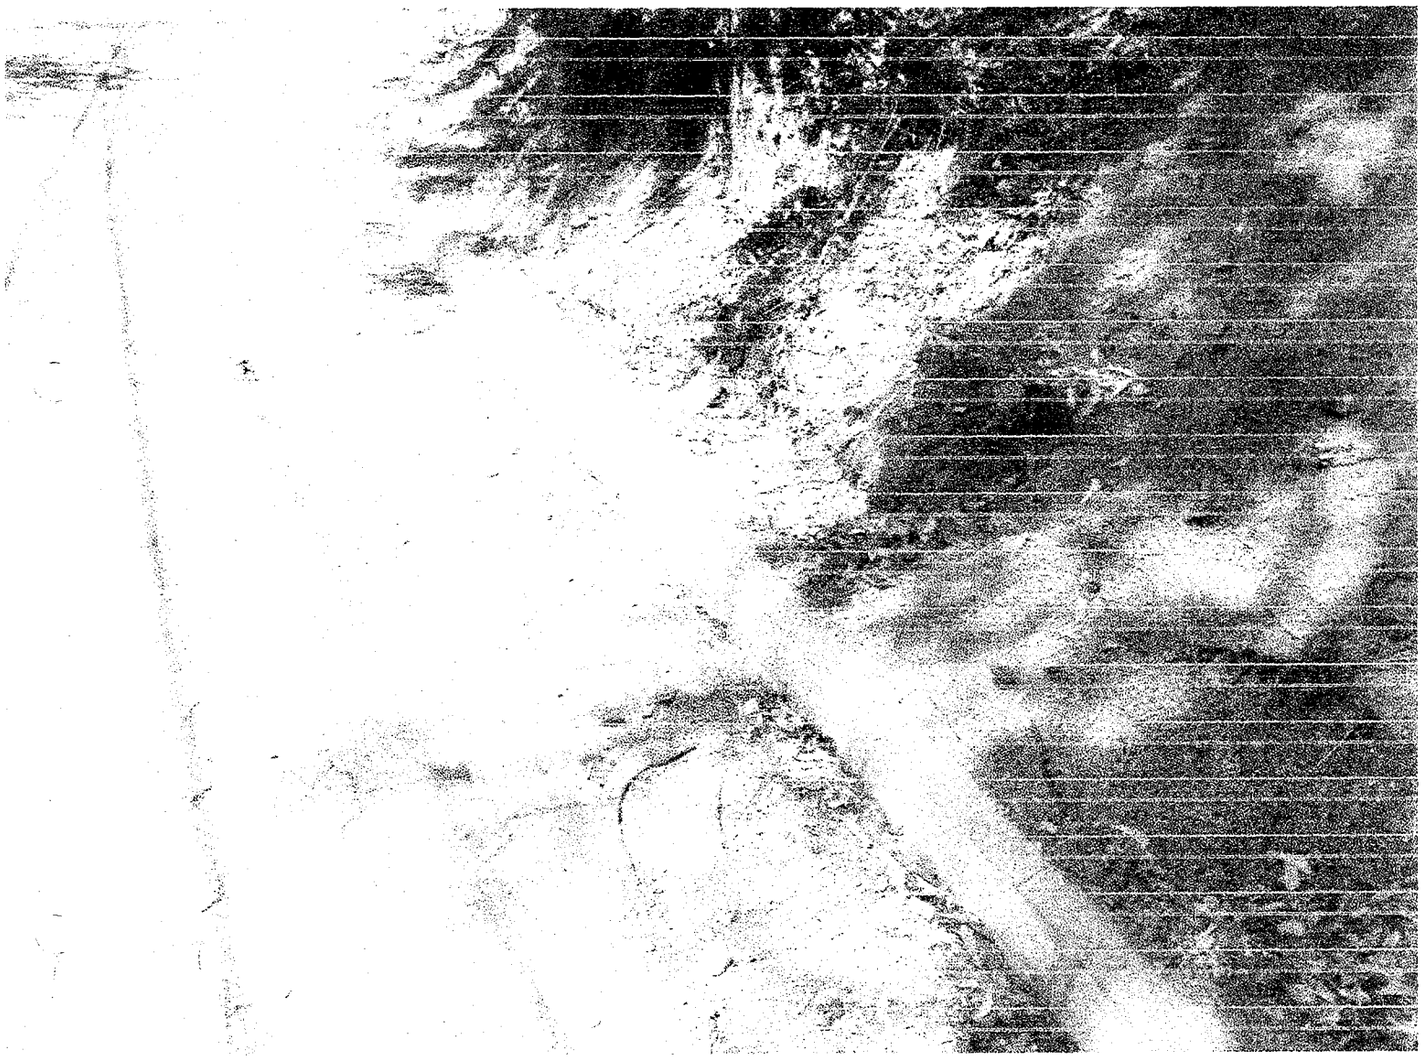

BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 4428/12/2024

CONTRATO No. 28-2024

NOMBRE: MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS CHORRITOS, ALDEA SANTA LUCIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

REGISTRO No. 12

FECHA 08/04/2025

TIPO AVANCE

DESCRIPCIÓN Se realiza la colocación de bordillo y terminación de adoquinado

CREADO POR FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA







BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 4428/12/2024

CONTRATO No. 28-2024

NOMBRE: MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS CHORRITOS, ALDEA SANTA LUCIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA


REGISTRO No. 13


FECHA 28/04/2025

TIPO AVANCE

DESCRIPCIÓN Se termina la colocación de bordillo prefabricado, se cuenta con personal y materiales suficientes para el avance del proyecto

CREADO POR FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA

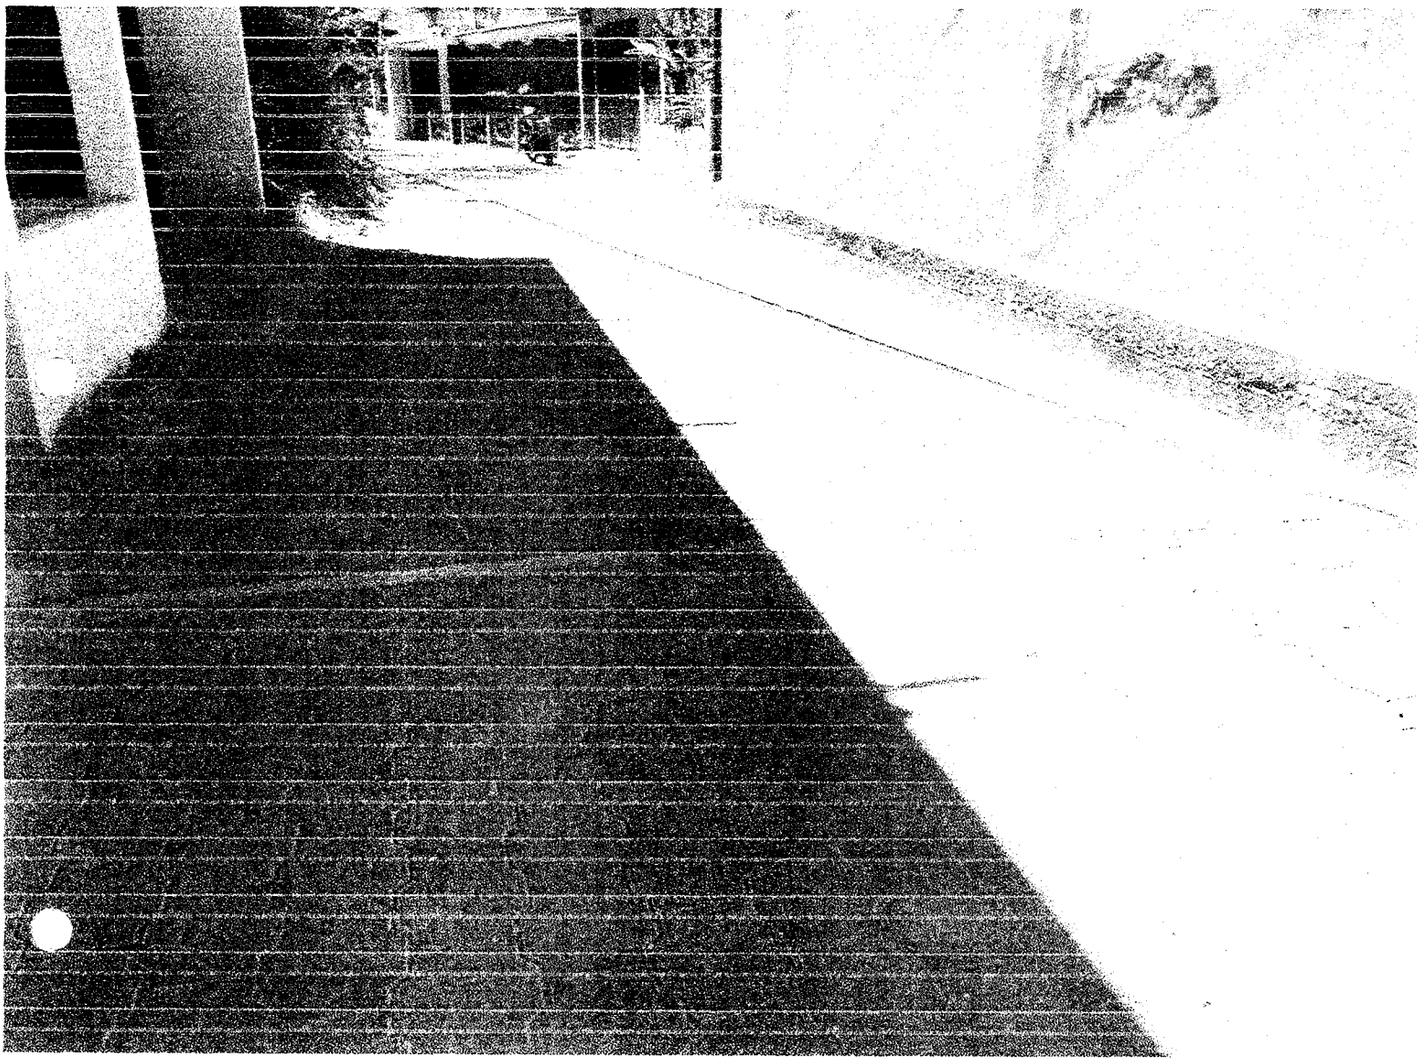

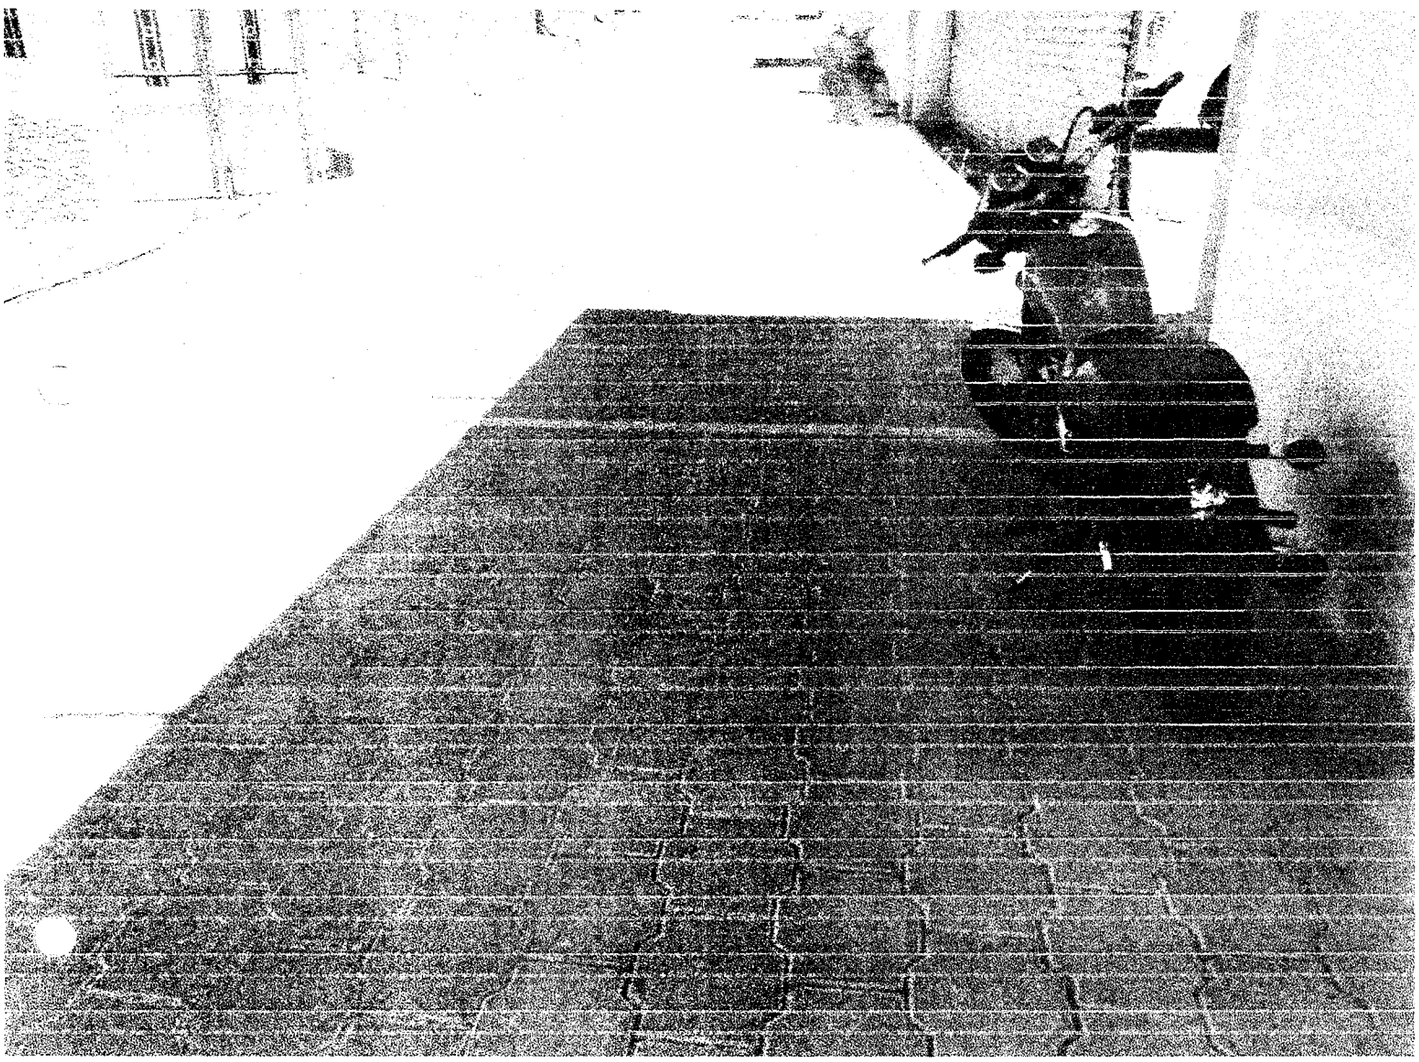





BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 4428/12/2024

CONTRATO No.	28-2024
NOMBRE:	MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS CHORRITOS, ALDEA SANTA LUCIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO
ENTIDAD:	MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

REGISTRO No.	14
FECHA	06/05/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	El proyecto se encuentra en fase de finalizacion
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA



MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!

5980-0535 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
BARRIO EL CALVARIO, GUASTATOYA EL PROGRESO

LA INFRASCRITA SECRETARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO,

CERTIFICA:

Que para su cumplimiento y efectos consiguientes se transcribe la **AUTENTICIDAD** del punto **SEXTO** del acta **46-2025** de fecha veinte de junio de dos mil veinticinco del libro número 3,539 de sesiones ordinarias del Concejo Municipal, debidamente autorizado por la Contraloría General de Cuentas, el que copiado literalmente dice:

SEXTO: La Secretaria Municipal, hace del conocimiento del Honorable Concejo Municipal, que se tiene a la vista el oficio Ref.agmo/DMP/261-2025 presentado por el Licenciado Alexis Geovanny Marroquín Orellana, donde informa que el proyecto **MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS CHORRITOS, ALDEA SANTA LUCIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO**, según contrato administrativo 28-2024 ya se encuentra finalizado, recepcionado y liquidado con el monto del contrato, la Comisión de Recepción y Liquidación, procedió a suscribir el acta de Liquidación 12-2025, determinando que no se le adeuda ningún saldo a la empresa **CONSTRUCTORA M&A**, por lo que se solicita se apruebe el Acta de liquidación 12-2025. **CONSIDERANDO:** Que la Ley de Contrataciones del Estado Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, en su artículo 57 establece: "Aprobación de la liquidación. La Comisión deberá practicar la liquidación, dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha del acta de recepción definitiva de la obra. Si transcurrido dicho plazo la Comisión no ha suscrito el acta correspondiente, el contratista puede presentar a la autoridad administrativa de la entidad interesada un proyecto de liquidación. Esta autoridad deberá aprobar o improbar la liquidación o el proyecto presentado por el contratista dentro del mes siguiente de recibida la respectiva documentación. Si vencido este plazo no se produce ninguna resolución, con la petición de aprobación presentada por el contratista se tendrá por resuelta favorablemente.". **CONSIDERANDO:** Que Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Acuerdo Gubernativo No. 122-2016, en su artículo 47 establece: "El saldo que existiera a favor del contratista en la liquidación, se le pagará dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que la autoridad administrativa superior de la entidad o dependencia interesada apruebe la liquidación del contrato, o treinta (30) días después de que haya transcurrido el plazo de un mes que se indica en el artículo 57 de la Ley, sin que se emita resolución con relación al proyecto de liquidación presentado por el contratista.". **CONSIDERANDO**: Que el Código Municipal y sus reformas, Decreto 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala en su Artículo 35 establece: "Atribuciones Generales del Concejo Municipal: son atribuciones del Concejo Municipal: a) La iniciativa, deliberación y decisión de los asuntos municipales...". **POR TANTO**. Este Concejo Municipal, con fundamento en lo considerado y las facultades que le confiere el Código Municipal y sus reformas, Decreto número 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala, por **UNANIMIDAD DE VOTOS, RESUELVE: I).** Se tiene por recibido el oficio remitido por el Director municipal de planificación Licenciado Alexis Geovanny Marroquín Orellana, que contiene el Acta de Liquidación de Obras, de la Junta Receptora y Liquidadora de Obras. **II). SE APRUEBA**, lo actuado por la Comisión de Recepción y Liquidación de Obras en el Acta de Liquidación de Obras número 12-2025 la que hace referencia al proyecto denominado **MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS CHORRITOS, ALDEA SANTA LUCIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO,** siendo la siguiente:

SECRETARIA
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA ¡Sirviendo!

CONCURSO: Adición de anexos al concurso en la Fase de Liquidación

Mensaje de confirmación	
23.jun..2025 12:16:47	
Documentos asociados:	
1	24417289@ACTA DE LIQUIDACION CALLE LOS CHORRITOS.pdf(370 KB)
Si desea imprimir este mensaje, oprima el siguiente botón	

Municipalidad de Guastatoya, Departamento de El Progreso

JUNTA RECEPTORA Y LIQUIDADORA DE OBRAS

LIBRO DE ACTAS DE LIQUIDACION DE OBRAS Nº 0179

ACTA DE LIQUIDACION NUMERO 12-2025

NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS CHORRITOS, ALDEA SANTA LUCIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO. NOG 24417289 ----------

En el municipio de Guastatoya, del departamento de El Progreso siendo las diez horas en punto el día viernes veinte de junio del año dos mil veinticinco; constituidos en el área que ocupa la Dirección Municipal de Planificación de la Municipalidad de Guastatoya, la COMISION DE RECEPCION Y LIQUIDACION; integrada por Melvin Mauricio Morales Rodas, Auxiliar de la Dirección Municipal de Planificación; Beverly Mishell Cruz Orellana, Secretaria de la Dirección Municipal de Planificación y Rudy Danilo Orellana Orellana, Encargado de Mantenimiento y Convoy Municipal; para dejar constancia de lo siguiente **PRIMERO:** la Comisión de Recepción y Liquidación de obras, nombrados por el Concejo Municipal, contenido en el punto QUINTO del acta de sesiones ordinarias número (01-2025), de fecha uno de enero del año dos mil veinticuatro, se constituyen para Liquidar el proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS CHORRITOS, ALDEA SANTA LUCIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO.". SEGUNDO:** Se deja constancia que la obra ya fue recepcionada de conformidad con el acta de recepción número **DIEZ GUION DOS MIL VEINTICINCO (10-2025)** de fecha **DOCE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO (12/05/2025). TERCERO:** por encontrarse el proyecto **"MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS CHORRITOS, ALDEA SANTA LUCIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO.",** entregado en un cien por ciento según informe del supervisor de esta municipalidad, esta Comisión procede a Liquidar el contrato número **VEINTIOCHO GUION DOS MIL VEINTICUATRO (28-2024),** suscrito de fecha **CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO (04/12/2024)**, por un monto de **UN MILLON CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q. 1,199,500.00)**. **CUARTO:** de conformidad con el informe financiero de liquidación presentado por el director financiero, se procede a detallar lo siguiente: ----------

RESUMEN DE LIQUIDACION

Contrato No. 28-2024 **Monto Q. 1,199,500.00**

Cheque No. 80913; Fecha: 19 de junio del 2025; Pago de liquidación del proyecto.	Total	Q.	95,600.00

Por lo descrito en el cuadro que antecede, la comisión receptora y liquidadora de obras de la Municipalidad de Guastatoya, El Progreso, hace constar que no existe ningún adeudo a la empresa mercantil, conforme al aporte y partida correspondiente, considerando que todo lo manifestado en el presente acto la Comisión Liquidadora de Obras municipales aprueba la liquidación del contrato administrativo 28-2024 del proyecto: **"MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS CHORRITOS, ALDEA SANTA LUCIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO.** de fecha cuatro de diciembre de dos mil veinticuatro, con la entidad mercantil denominada **"CONSTRUCTORA M&A"** a través del propietario de la Empresa **Carlos Alberto Amado Orellana. QUINTO:** Se eleva a la autoridad administrativa superior el acta correspondiente para su aprobación según Artículo 47 del Acuerdo Gubernativo 122-2016 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y Artículo 57 de la Ley de Contrataciones del Estado. **SEXTO:** No habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la presente, en el mismo lugar y fecha, media hora después de su inicio, la que previa lectura es ratificada y firmada de conformidad. ----------

Melvin Mauricio Morales Rodas
Comisión de Recepción y Liquidación

Beverly Mishell Cruz Orellana
Comisión de Recepción y Liquidación

COMISIÓN DE RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA ¡Sirviendo!

Rudy Danilo Orellana Orellana
Comisión de Recepción y Liquidación
