MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!

5980-0535 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
BARRIO EL CALVARIO, GUASTATOYA EL PROGRESO

# REPORTE DE PAGO DE PROYECTOS POR CONTRATO 2025

EXPEDIENTE No. **298** NOG: **26002485** CONTRATO No. **09-2025**

## PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS BORDOS, ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

| APORTES | % DE AVANCE | ESTIMACION | AMORTIZACION | LIQUIDO A RECIBIR |
|---|---|---|---|---|
| **Aporte CODEDE** | **80.00%** | | | |
| **Q. 1,000,000.00** | | **Q. 500,000.00** | **Q. 100,000.00** | **Q. 400,000.00** |
| **31-0101-0004-1054-1-2** | | | | |
| **Aporte MUNICIPALIDAD** | | | | |
| **Q. 400.00** | | **Q. 200.00** | **Q. 40.00** | **Q. 160.00** |
| **22-0101-0001-0-0-2** | | | | |
| **Aporte COMUNIDAD** | | | | |
| **Q. 400.00** | | **Q. 200.00** | **Q. 40.00** | **Q. 160.00** |
| **31-3101-0002-0-0-2** | | | | |
| **TOTALES** | | **Q. 500,400.00** | **Q. 100,080.00** | **Q. 400,320.00** |

21/10/2025

Se cuenta con Informe de supervisión por parte de la empresa, informe de supervisión por el Supervisor de Obras Municipales, Punto del Concejo Municipal de aprobación de avance, Copia de bitácora, recibo 7-b, factura.

**Lic. Alexis Geovanny Marroquín Orellana**
Director Municipal de Planificación

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA ¡Sirviendo!

# Factura

TOMAS , REYES PICON
Nit Emisor: 2841347
CONSTRUCTORA Y ELECTRICOS M. Y WALRUD
ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO
NIT Receptor: 6206107
Nombre Receptor: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
Dirección comprador: GUASTATOYA, EL PROGRESO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
71703086-F5BD-4710-A3CD-7477824CBBAF
Serie: 71703086 Número de DTE: 4122822416
Numero Acceso:
Fecha y hora de emision: 21-oct-2025 11:01:09
Fecha y hora de certificación: 21-oct-2025 11:01:09
Moneda: GTQ

| #No | B/S | Cantidad | Descripcion | P. Unitario con IVA (Q) | Descuentos (Q) | Otros Descuentos(Q) | Total (Q) | Impuestos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Servicio | 1 | POR AVANCE DEL 80% DE LA SEGUNDA ESTIMACION DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CALLE RURAL, SECTOR LOS BORDOS, ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO. TOTAL DE ESTA ESTIMACION: Q.500,400.00 (-) AMORTIZACION Q.100,080.00. LIQUIDO A RECIBIR Q.400,320.00 SEGUN CONTRATO (09-2025) | 500,400.00 | 0.00 | 0.00 | 500,400.00 | IVA | 53.614.28571 4 |
| | | | TOTALES: | | 0.00 | 0.00 | 500,400.00 | IVA | 53.614.28571 4 |

* Sujeto a pagos trimestrales ISR

| Datos del certificador |
|---|
| Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 |

*"Contribuyendo por el país que todos queremos"*

FORMA 7-B INGRESOS VARIOS

# RECIBO DE LA MUNICIPALIDAD
## DE GUASTATOYA,
## DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO

SERIE B **No. 660603**

FECHA: DIA 10 | MES 10 | AÑO 2025

POR: Cuatrocientos mil quetzales con 00/100 — CODIGO JURISDICCIONAL: D-4 5201

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: Consejo Departamental de Desarrollo

DIRECCION: El Progreso

| | | |
|---|---|---|
| ARBITRIOS | ORNATO Q.4.00 ☐ 10.00 ☐ 15.00 ☐ 50.00 ☐ 75.00 ☐ 100.00 ☐ 150.00 ☐ ☐ ☐ | Q. |
| TASAS | VARIOS | |
| | LICENCIAS | |
| | ESTACIONAMIENTOS | |
| | CERTIFICACIONES | |
| | CEDULAS | |
| | MERCADOS | |
| | SERVICIOS VARIOS | |
| | SERVICIOS AGUA | |
| | SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA | |
| CONTRIBUCIONES | CONCEPTO | |
| MULTAS | CONCEPTO | |
| OTROS | VARIOS Pago del 80.00% tercer desembolso del proyecto mejoramiento calle rural sector los Bordos, aldea Tierra Blanca, Guastatoya, El Progreso. SNIP No. 331020, convenio 07-2025, fuente 21 | Q400,000.00 |

LECTURA DE CONTADOR — ACTUAL | ANTERIOR

OBSERVACIONES:

**TOTAL** Q. Q400,000.00

VALIDO UNICAMENTE POR EL IMPORTE IMPRESO POR LA CAJA REGISTRADORA MUNICIPAL Y/O NOMBRE FIRMA Y SELLO DEL RECEPTOR MUNICIPAL.

FIRMA DEL RECEPTOR MUNICIPAL

CUENTA

SUB-CUENTA

DUPLICADO-PARA RENDIR CUENTAS


AUTORIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS RES. BJ/5975 Cías.: 920-12-61-4-97 DEL 26-06-97.

T-0340 2045310 87

4035611

FORMULARIOS STANDARD, S.A. PBX: 2423-9900 - NIT: 1532237 - 75,000 - 1 UNIDAD DEL No. 660001 AL No. 735000, SERIE B, BENITO MUNICIPAL No. 4348 DEL 07/11/2024 NUMERO CORRELATIVO D-416-2024 DEL 07/11/2024 No. DE CUENTA: 2022-2023-2301-22-001 OFICIO SAT DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2024 LIBRO 1537/55 FOLIO 7.

www.standard.co.com

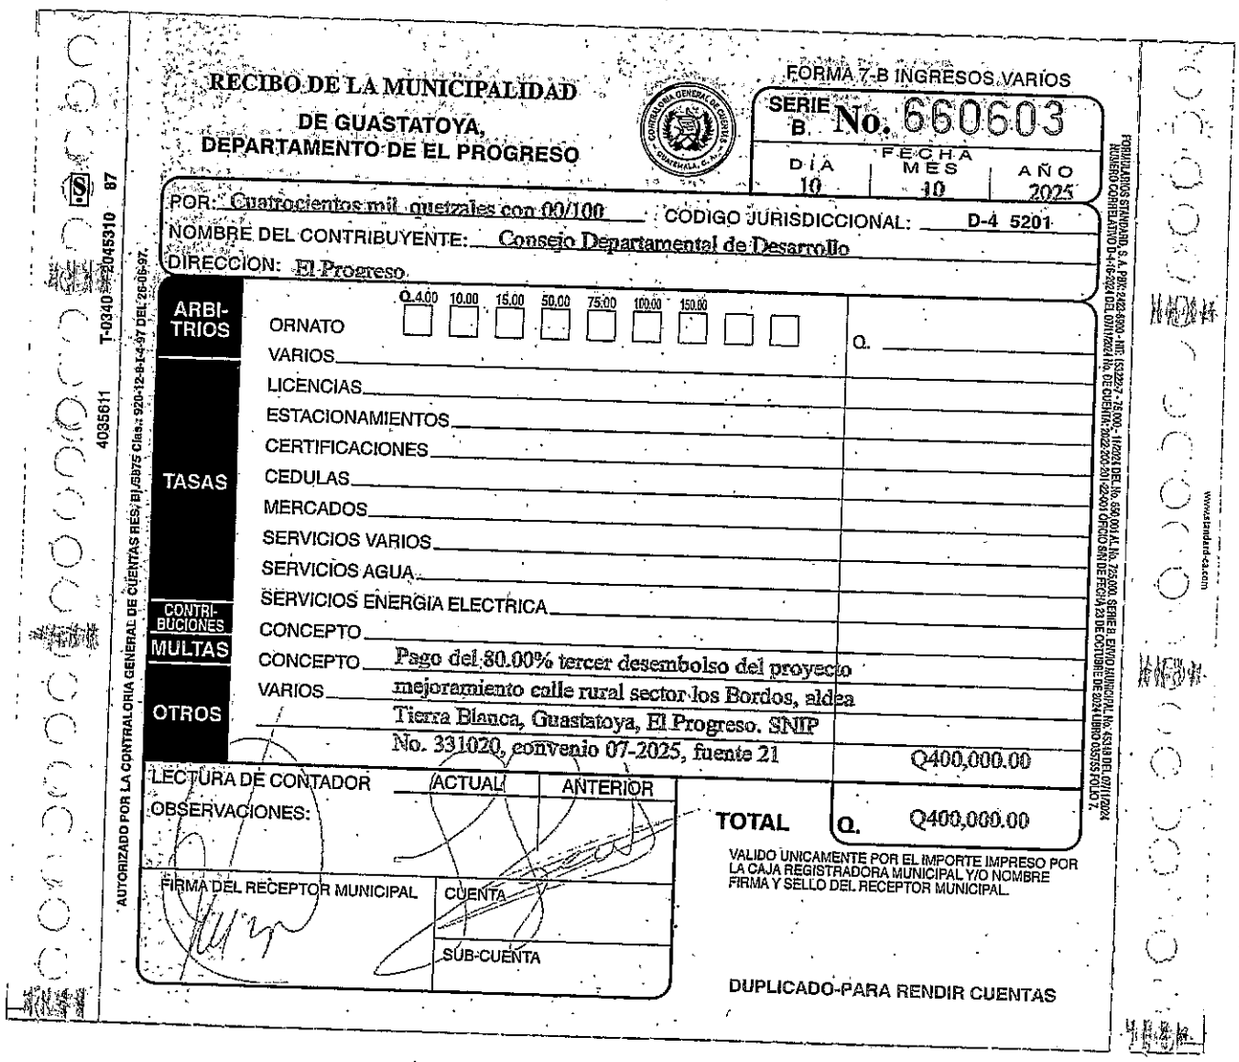

AUTORIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS RES. EI-GB75 Clase: 920-12-8-1-4-97 DEL 05-06-97.
4035611 T-0340-2045310 87

# RECIBO DE LA MUNICIPALIDAD
## DE GUASTATOYA, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO

FORMA 7-B INGRESOS VARIOS

SERIE B. No. 660603

FECHA: DIA 10 | MES 10 | AÑO 2025

POR: Cuatrocientos mil quetzales con 00/100 — CODIGO JURISDICCIONAL: D-4 5201

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: Consejo Departamental de Desarrollo

DIRECCION: El Progreso

| | | | |
|---|---|---|---|
| ARBITRIOS | ORNATO Q.4.00 ☐ 10.00 ☐ 15.00 ☐ 50.00 ☐ 75.00 ☐ 100.00 ☐ 150.00 ☐ ☐ ☐ | Q. | |
| TASAS | VARIOS | | |
| | LICENCIAS | | |
| | ESTACIONAMIENTOS | | |
| | CERTIFICACIONES | | |
| | CEDULAS | | |
| | MERCADOS | | |
| | SERVICIOS VARIOS | | |
| | SERVICIOS AGUA | | |
| CONTRIBUCIONES | SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA | | |
| MULTAS | CONCEPTO | | |
| OTROS | CONCEPTO Pago del 80.00% tercer desembolso del proyecto | | |
| | VARIOS mejoramiento calle rural sector los Bordos, aldea Tierra Blanca, Guastatoya, El Progreso. SNIP No. 331020, convenio 07-2025, fuente 21 | | Q400,000.00 |

LECTURA DE CONTADOR — ACTUAL | ANTERIOR

OBSERVACIONES:

TOTAL Q. Q400,000.00

VALIDO UNICAMENTE POR EL IMPORTE IMPRESO POR LA CAJA REGISTRADORA MUNICIPAL Y/O NOMBRE FIRMA Y SELLO DEL RECEPTOR MUNICIPAL

FIRMA DEL RECEPTOR MUNICIPAL

CUENTA

SUB-CUENTA

DUPLICADO-PARA RENDIR CUENTAS

FORMULARIOS STANDARD, S.A. PBX: 2483-4000 NIT: 1512257-7 TELEFAX: 2483-4001 AUT. No. 75/2000 - 1/2021 DEL No. 500,001 AL No. 750,000 SERIE B. ENVIO MUNICIPAL No. 45/AUTORIZACION 01/2024 NUMERO CORRELATIVO D-4-16-2024 DEL 001 AL 250,000 DE CUENTA: 2022-230-301-22401 OFICIO 684 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2024 LIBRO 0557 FOLIO 7.

www.standard-sa.com

## CONCURSO: Adición de anexos al concurso en la Fase de Ejecución

| Mensaje de confirmación | |
|---|---|
| 01-oct-2025 11:03:04 | |
| Documentos asociados: | |
| 1 | 26002485@INFORME DE SUPERVISION 80 AVANCE FISCO CALLE LOS BORDOS.pdf(3124 KB) |
| | |
| Si desea imprimir este mensaje, oprima el siguiente botón | |
| | |

MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!

5980-0535 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
BARRIO EL CALVARIO, GUASTATOYA EL PROGRESO

# INFORME DE SUPERVISION

Guastatoya, 05 de Septiembre de 2025

**SEÑOR: JOSE ELIAS HERRERA GUERRA Y CONSEJO MUNICIPAL**
**MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA**
**EL PROGRESO**

De la manera más atenta me dirijo a usted deseándole toda clase de éxitos en sus labores diarias.

El motivo de la presente es para hacerle saber lo siguiente:

En visita de supervisión realizada al proyecto denominado **MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS BORDOS, ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO,** con número de contrato **09-2025** de fecha 04 de Junio de 2025, ejecutado por la empresa **CONSTRUCTORA Y ELECTRICOS M. Y WALRUD**, financiado por la Municipalidad de Guastatoya, se tiene a la vista el oficio de Septiembre de 2025 en el cual se hace la solicitud de la estimación del proyecto para un avance del **80.00%**, para lo cual se adjunta el informe de supervisión y el informe de parte de la empresa.

Agradeciendo su atención y en espera de darle seguimiento a este asunto me suscribo de ustedes.

Atentamente

José F. Alexander Aguilar Mejia
Ingeniero Civil
Colegiado No. 9,366

**ING. JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA**
**SUPERVISOR MUNICIPAL, GUASTATOYA**
**EL PROGRESO**

| D.M.P. | SUPERVISION DE OBRAS | Dirección Municipal de Planificación |
|---|---|---|

| Comunidad. | Contrato Municipal. |
|---|---|
| Aldea Tierra Blanca, Guastatoya, El Progreso | 07-2025 |

**1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO**

| Nombre del proyecto. | Ubicación del proyecto. |
|---|---|
| MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS BORDOS, ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO | Aldea Tierra Blanca, Guastatoya, El Progreso |
| **Contratista.** CONSTRUCTORA Y ELECTRICOS M. Y WALRUD<br>**Monto Contratado.** Q 1,000,800.00 | **Ubicación del proyecto.** Aldea Tierra Blanca, Guastatoya, El Progreso<br>**Avance Físico.** 80.00% |
| **Informe de Supervisión** No. 2 | **Fecha.** 05 de Septiembre de 2025 |

**2. AVANCE DE EJECUCION DEL PROYECTO**

| No. | Descripcion del Renglón | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | Total | Total a la Fecha | Avance Físico % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRABAJOS PRELIMINARES | - | M2 | Q 10.50 | Q - | Q 16,075.50 | 100% |
| 2 | CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO A NIVEL DE RASANTE EXISTENTE | - | M2 | Q 130.23 | Q - | Q 199,382.13 | 100% |
| 3 | COLOCACION + COMPACTACION DE BASE GRANULAR DE ESPESOR DE 0.10 MTS | 900.00 | M2 | Q 145.40 | Q 130,860.00 | Q 189,020.00 | 85% |
| 4 | CAMA DE ASIENTO DE ARENA | 800.00 | M2 | Q 31.83 | Q 25,464.00 | Q 36,286.20 | 81% |
| 5 | COLOCACION DE ADOQUIN TRAFICO PESADO RESISTENCIA 280 KG/CM2 | 677.86 | M2 | Q 261.57 | Q 177,308.50 | Q 262,651.18 | 72% |
| 6 | LLAVES DE CONFINAMIENTO LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES DE 0.10 X 0.25 MTS RESISTENCIA 280 KG/CM2 | 350.00 | ML | Q 112.25 | Q 39,287.50 | Q 56,125.00 | 79% |
| 7 | BORDILLO FUNDIDO DE 0.10 X 0.30 MTS RESISTENCIA 280 KG/CM2 | 200.00 | ML | Q 137.00 | Q 27,400.00 | Q 41,100.00 | 67% |
| 8 | RAMPA DE INGRESO E=0.15 MTS RESISTENCIA 280 KG/CM2 | - | M2 | Q 567.00 | Q - | Q - | 0% |
| 9 | PINTURA PARA TRAFICO PESADO EN LINEA CENTRAL | - | UNIDAD | Q 7,090.12 | Q - | Q - | 0% |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | Q 400,320.00 | Q 800,640.01 | 80.00% |

Estos renglones de trabajo dan como resultado un avance físico del **80.00%** **por lo cual se aprueba realizar el pago correspondiente**

**3. DESCRIPCION DEL PROYECTO.**

Este proyecto consiste en el mejoramiento de la calle que sirve de ingreso hacia la aldea tierra blanca, en el sector los bordos, de guastatoya, el progreso, la cual se encuentra de terraceria y se va a mejorar utilizando pavimento y bordillos fundidos

**4. RECOMENDACIONES.**

Chequear los trabajos realizados para garantizar la durabilidad de los mismos, y terminar los trabajos faltantes, los que no se encuentran al 100 % y los que no se han iniciado aun

**SUPERVISOR DE PROYECTOS MUNICIPALES.**

José F. Alexander Aguilar Mejia
Ingeniero Civil
Colegiado No. 9,366

**ING. JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA**
**SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES**

ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
(SIN VISTA)

**JOSE ELIAS HERRERA GUERRA**
**ALCALDE MUNICIPAL DE GUASTATOYA**





| D.M.P. | SUPERVISION DE OBRAS | Dirección Municipal de Planificación |
|---|---|---|

**1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO**

| Nombre del proyecto. | Ubicación del proyecto. |
|---|---|
| MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS BORDOS, ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO | Aldea Tierra Blanca, Guastatoya, El Progreso |

**2. INFORME FOTOGRAFICO.**

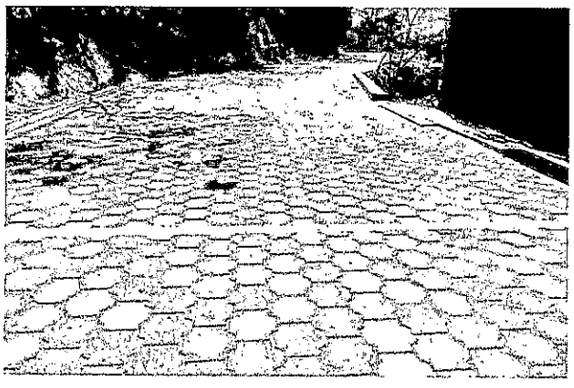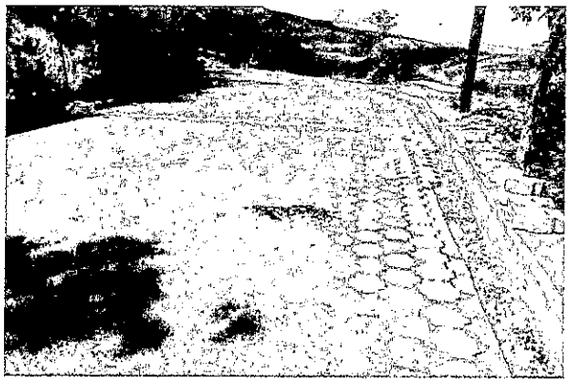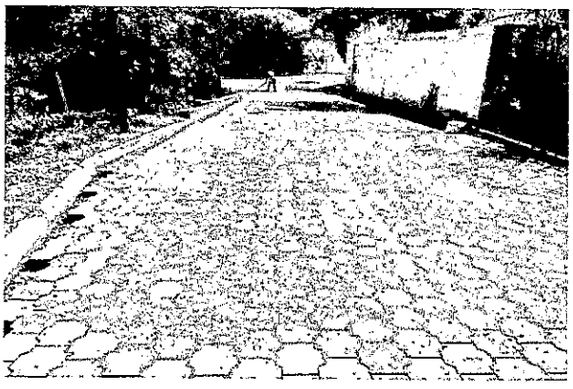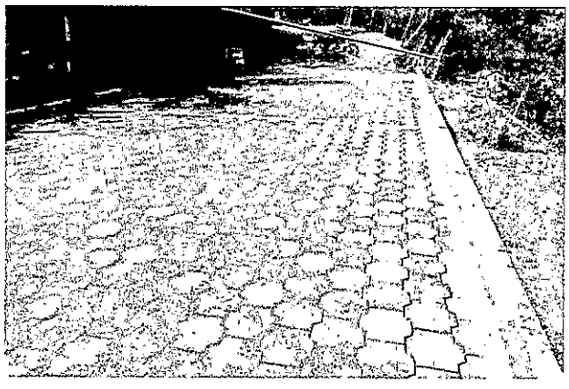

**SUPERVISOR DE PROYECTOS MUNICIPALES.**

José F. Alexander Aguilar Mejia
Ingeniero Civil
Colegiado No. 9366

**ING. JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA**
**SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES**

ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
¡Sirviendo!

**JOSE ELIAS HERRERA GUERRA**
**ALCALDE MUNICIPAL DE GUASTATOYA**

## REPORTE DE AVANCE FISICO No. 2

| | |
|---|---|
| Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS BORDOS, ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO | |
| Municipio: GUASTATOYA | Departamento: EL PROGRESO |
| Comunidad: ALDEA TIERRA BLANCA | Fecha de Contrato: 04/06/2025 |
| Fecha de Inicio: 12/06/2025 | Fecha de Supervision: 05/09/2025 |
| Fecha de Finalizacion: 11/10/2025 | Unidad Ejecutora: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA |
| Contrato No.: 09-2025 | Valor del Proyecto: Q.1,000,800.00 |
| Modificaciones: | Valor Original: Q.1,000,800.00 |
| Constructora: CONSTRUCTORA Y ELECTRICOS M. Y WALRUD | Telefono: |
| Representante legal: TOMAS REYES PICON | |

### RESUMEN DE RENGLONES

| No. | DESCRIPCIÓN | CANTIDADES DE TRABAJO | | | | ORDEN DE CAMBIO | ORDEN DE TRABAJO SUPLEMENTARIO | ORDEN DE TRABAJO EXTRA | RENGLON MODIFICADO | CANTIDADES EJECUTADAS SEGUNDA ESTIMACION | | ACUMULADO A LA FECHA | | PORCENTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANTIDAD | UNIDAD | P UNITARIO | TOTAL | CANTIDAD | CANTIDAD | CANTIDAD | CANTIDAD | CANTIDAD | TOTAL | CANTIDAD | TOTAL | TOTAL |
| 1 | TRABAJOS PRELIMINARES | 1,531.00 | M2 | Q 10.50 | Q 16,075.50 | | | | | - | Q - | 1,531.00 | Q 16,075.50 | 1.61% |
| 2 | CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO A NIVEL DE RASANTE EXISTENTE | 1,531.00 | M2 | Q 130.23 | Q 199,382.13 | | | | | - | Q - | 1,531.00 | Q 199,382.13 | 19.92% |
| 3 | COLOCACION + COMPACTACION DE BASE GRANULAR DE ESPESOR DE 0.10 MTS | 1,531.00 | M2 | Q 145.40 | Q 222,607.40 | | | | | 900.00 | Q 130,860.00 | 1,300.00 | Q 189,020.00 | 18.89% |
| 4 | CAMA DE ASIENTO DE ARENA | 1,399.00 | M2 | Q 31.83 | Q 44,530.17 | | | | | 800.00 | Q 25,464.00 | 1,140.00 | Q 36,286.20 | 3.63% |
| 5 | COLOCACION DE ADOQUIN TRAFICO PESADO RESISTENCIA 280 KG/CM2 | 1,399.00 | M2 | Q 261.57 | Q 365,936.43 | | | | | 677.86 | Q 177,308.50 | 1,004.13 | Q 262,651.18 | 26.24% |
| 6 | LLAVES DE CONFINAMIENTO LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES DE 0.10 X 0.25 MTS RESISTENCIA 280 KG/CM2 | 633.00 | ML | Q 112.25 | Q 71,054.25 | | | | | 350.00 | Q 39,287.50 | 500.00 | Q 56,125.00 | 5.61% |
| 7 | BORDILLO FUNDIDO DE 0.10 X 0.30 MTS RESISTENCIA 280 KG/CM2 | 450.00 | ML | Q 137.00 | Q 61,650.00 | | | | | 200.00 | Q 27,400.00 | 300.00 | Q 41,100.00 | 4.11% |
| 8 | RAMPA DE INGRESO E=0.15 MTS RESISTENCIA 280 KG/CM2 | 22.00 | M2 | Q 567.00 | Q 12,474.00 | | | | | - | Q - | - | Q - | 0.00% |
| 9 | PINTURA PARA TRAFICO PESADO EN LINEA CENTRAL | 1.00 | UNIDAD | Q 7,090.12 | Q 7,090.12 | | | | | - | Q - | - | Q - | 0.00% |
| | COSTO TOTAL DEL PROYECTO | | | | Q 1,000,800.00 | | | | | | Q 400,320.00 | | Q 800,640.01 | 80.00% |

| | |
|---|---|
| VALOR DE ESTIMACION No. 2 | Q 400,320.00 |
| AMORTIZACION DEL ANTICIPO (20%) | Q 80,064.00 |
| PENDIENTE DE AMORTIZAR | Q 40,032.00 |
| LIQUIDO A RECIBIR | Q 320,256.00 |

Jose F. Alexander Aguilar Mejia
Ingeniero Civil
Colegiado No. 9,366

JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES

ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

JOSE ELIAS HERRERA GUERRA
ALCALDE MUNICIPAL GUASTATOYA

Constructora y eléctricos M y WalRud.
Aldea Casas Viejas, Guastatoya, El Progreso
Cel. 59894109
tcons53walrud@gmail.com

Guastatoya 03 de septiembre del 2025

.*

Señor:
JOSE ELIAS HERRERA GUERRA
ALCALDE MUNICIPAL
Municipalidad de Guastatoya el Progreso
Presente:

Deseando que sus actividades se realicen con éxito me permito enviarle un caluroso saludo.

El motivo de la presente es para **SOLICITARLE** el pago del 80% de la segunda estimación del proyecto denominado: **MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR BORDOS, ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO.** Contrato numero 09-2025 el cual esta hasta la fecha:

Por lo anteriormente descrito Solicitamos de sus buenos oficios para su conocimiento, análisis y aprobación respectiva del mismo.

Atentamente,

TOMAS REYES PICON
Propietario

CONSTRUCTORA Y ELECTRICOS
M Y WALRUD
NIT. 284134-7 / PROP. TOMAS REYES PICON
ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA EL PROGRESO

Constructora y eléctricos M y WalRud.
Aldea Casas Viejas, Guastatoya, El Progreso
Cel. 5989-4109
tcons53walrud@gmail.com

**PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS BORDOS, ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA EL PROGRESO**

| RENGLON | RENGLONES DE TRABAJO/CANTIDADES | CANTIDAD CONTRATO | | | | CANTIDAD EJECUTADA | | | | CANTIDAD PENDIENTE DE EJECUTAR | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL | ESTE | ACUMULADO | Q. | % | ESTE | Q. | % |
| 1 | Trabajos Preliminares | M2 | 1531 | Q10.50 | Q16,075.50 | 1531 | | Q16,075.50 | 100.00% | 0 | Q0.00 | 0.00% |
| 2 | Corte y Nivelacion del Terreno a nivel de Rasante Existente | M2 | 1531 | Q130.23 | Q199,382.13 | 1531 | | Q199,382.13 | 100.00% | 0 | Q0.00 | 0.00% |
| 3 | Colocacion - Compactacion de base granular de espesor de 0.10Mts. | M2 | 1531 | Q145.40 | Q222,607.40 | 1531 | | Q222,607.40 | 100.00% | 0 | Q0.00 | 0.00% |
| 4 | Cama de asiento de arena | M2 | 1399 | Q31.83 | Q44,530.17 | 1399 | | Q44,530.17 | 100.00% | 0 | Q0.00 | 0.00% |
| 5 | Colocacion de Adoquin Trafico pesado, resistencia 280 KG/Cm2 | M2 | 1399 | Q261.57 | Q365,936.43 | 1096 | | Q286,680.72 | 78.34% | 303 | Q79,255.71 | 21.66% |
| 6 | Llaves de confinamiento langitudinales y transversales de 0.10 X 0.25 mts. Resistencia 280 KG/ Cm2 | ML | 633 | Q112.25 | Q71,054.25 | 465 | | Q52,196.25 | 73.46% | 168 | Q18,858.00 | 26.54% |
| 7 | Bordillo fundido de 0.10 X 030 mts. Resistencia 280 KG/Cm2 | ML | 450 | Q137.00 | Q61,650.00 | 450 | | Q61,650.00 | 100.00% | 0 | Q0.00 | 0.00% |
| 8 | Rampa de ingreso E=0.15 Mts. Resistencia 280 KG/Cm2 | M2 | 22 | Q567.00 | Q12,474.00 | 15 | | Q8,505.00 | 68.18% | 7 | Q3,969.00 | 31.82% |
| 9 | Pintura para trafico pesado en linea central | UNIDAD | 1 | Q7,090.12 | Q7,090.12 | 0 | | Q0.00 | 0.00% | 1 | Q7,090.12 | 100.00% |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Total cantidad contratada | | | | Q1,000,800.00 | Cantidad Ejecutada | | Q800,621.33 | 80.00% | | Q200,178.67 | 20.00% |

| | |
|---|---|
| Monto bruto de esta Estimacion | Q800,621.33 |
| Amortizacion de anticipo 20% | Q200,160.00 |
| Monto neto de primera estimacion | Q244,640.00 |
| monto neto de esta Estimacion | Q355,821.33 |
| | |
| Liquido a Recibir | Q355,821.33 |

CONSTRUCTORA Y ELECTRICOS M Y WALRUD NIT: 284134-7 / PROP. TOMAS REYES PICON ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA EL PROGRESO

TOMAS REYES PICON
CONSTRUCTORA Y ELECTRICOS M& WALRUD

ALCALDE

Vo.Bo. JOSE ELIAS HERRERA GUERRA
ALCALDE MUNICIPAL


MUNICIPALIDAD GUASTATOYA


LUIS LEONEL ORIZAR MUÑOZ
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO No. 4,001

Guastatoya, 03 de septiembre de 2025





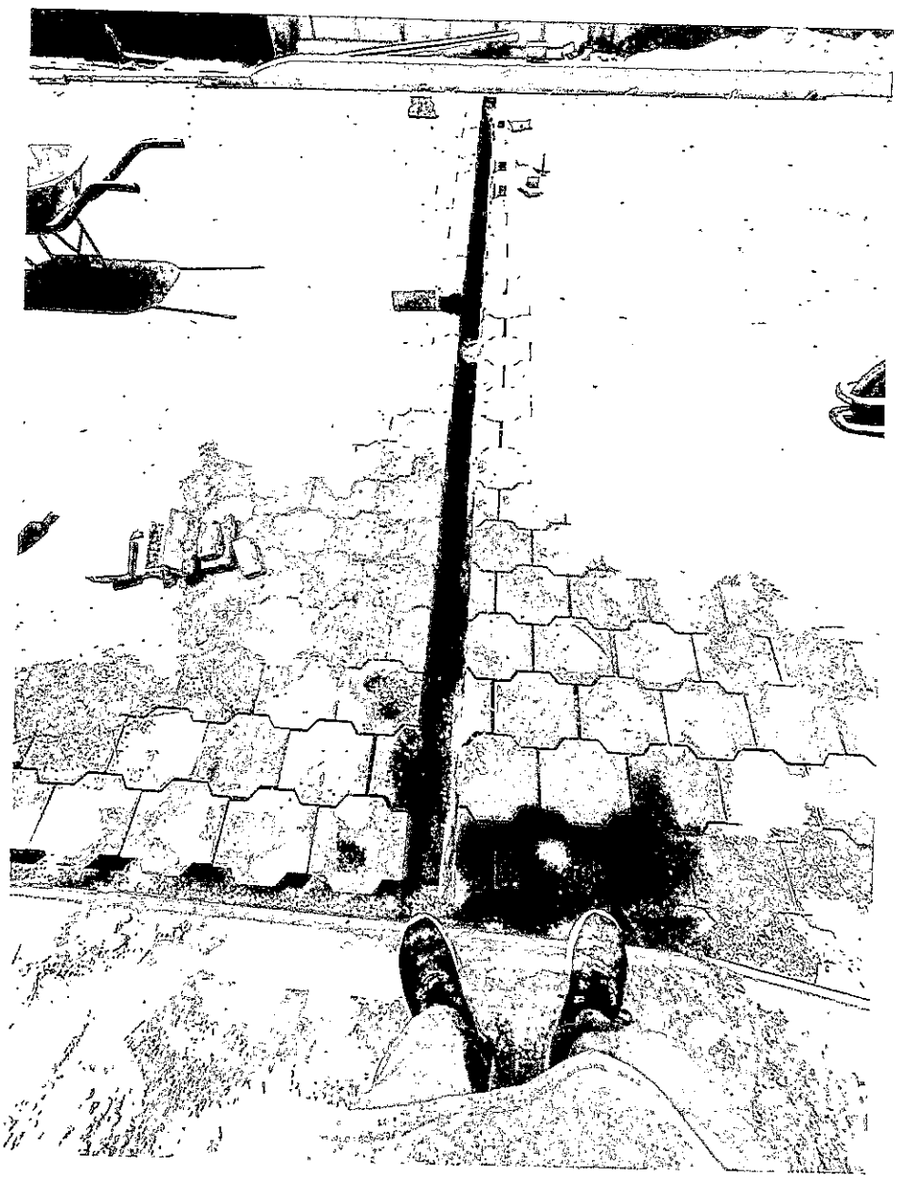

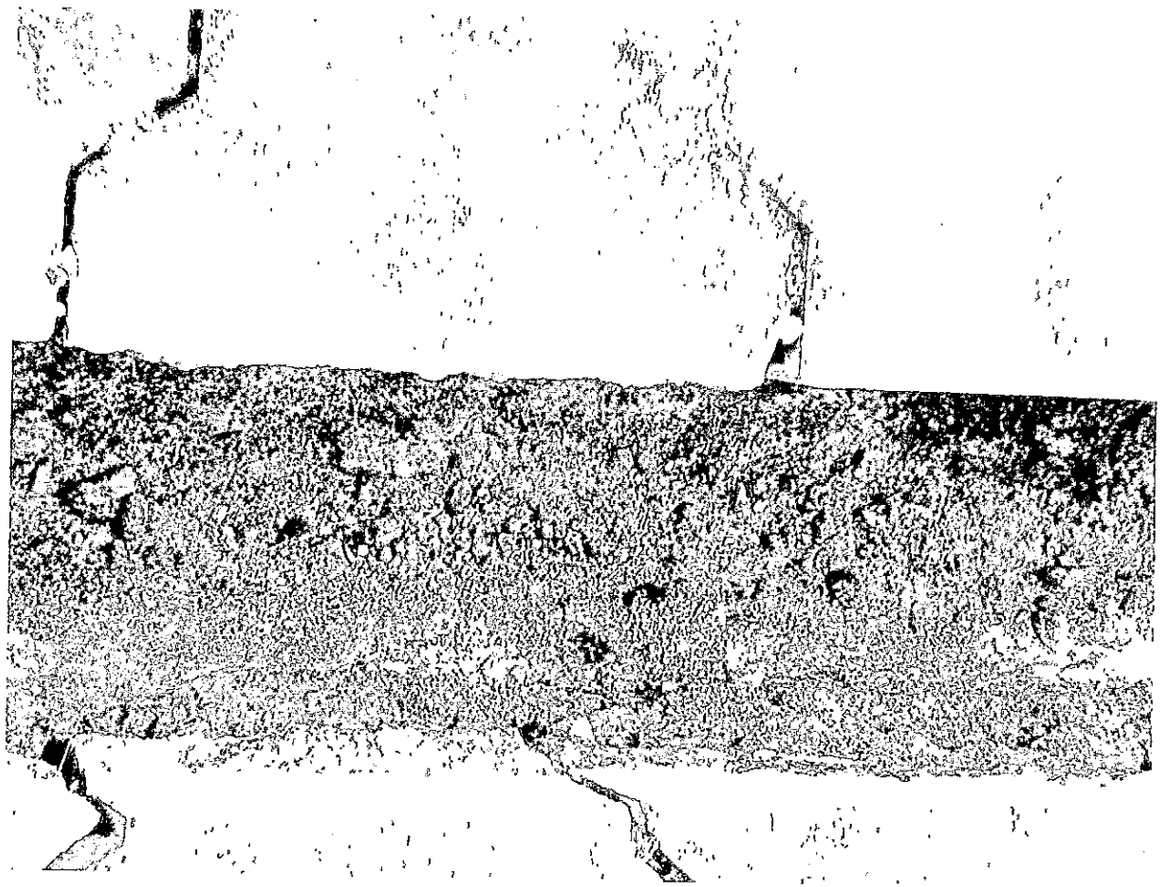





Contraloría General de Cuentas
GUATEMALA, C.A.

Bitácora Electrónica

# CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS

## DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA Y GESTIÓN AMBIENTAL

## UNIDAD DE BITÁCORAS – DATOS DE LA BITÁCORA ELECTRÓNICA –

**BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 3005/06/2025**

| | |
|---|---|
| **No. CONTRATO** | 09-2025 |
| **FECHA CONTRATO** | 04/06/2025 |
| **MONTO CONTRACTUAL** | 1,008,800.00 |
| **NOG** | 26002485 |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS BORDOS, ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO |
| **UBICACIÓN DEL PROYECTO** | Guastatoya, EL PROGRESO |
| **ENTIDAD CONTRATANTE** | MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA |
| **NOMBRE DEL SUPERVISOR** | LUIS LEONEL URIZAR MUÑOZ |
| **EMPRESA EJECUTORA** | TOMAS REYES PICON |
| **REPRESENTANTE LEGAL O CONTRATISTA** | TOMAS REYES PICON |
| **NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO** | FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA |
| **SUPERVISOR EMPRESA SUPERVISORA** | |

**FECHA DE AUTORIZACIÓN** 10/06/2025

**BITÁCORA ELECTRÓNICA No.** 3005/06/2025

**CONTRATO No.** 09-2025

**NOMBRE:** MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS BORDOS, ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

**ENTIDAD:** MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

| | |
|---|---|
| **REGISTRO No.** | 1 |
| **FECHA** | 24/06/2025 |
| **TIPO** | AVANCE |
| **DESCRIPCIÓN** | BITACORA DE INICIO DE PROYECTO se adjunta acta de inicio para hacer constar el inicio de los trabajos a realizar en el proyecto MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS BORDOS, ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO |
| **CREADO POR** | FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA |

# DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION

## LIBRO DE ACTAS DE INICIO DE OBRAS Nº 0195

**ACTA DE INICIO NO. 15-2025**

**PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS BORDOS, ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO. IDENTIFICADO CON NOG. 26002485, EN GUATECOMPRAS.** ----------

En el Municipio de Guastatoya, Departamento El Progreso, siendo las ocho horas en punto del día jueves doce de junio de dos mil veinticinco, reunidos en el área donde se va a ejecutar el Proyecto, **MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS BORDOS, ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO.** Los señores: José Elías Herrera Guerra, Alcalde Municipal; Ing. José Fulgencio Alexander Aguilar Mejía, Supervisor de Obras Municipales; Tomas Reyes Picón, Representante Legal de la Empresa Constructora; Ing. Luis Leonel Urizar Muñoz, Supervisor Residente del Proyecto; Lic. Alexis Geovanny Marroquín Orellana, Director de la Dirección Municipal de Planificación; con el objeto de dejar constancia de lo siguiente. **PRIMERO:** Se faciona la presente acta para dejar constancia de Inicio del Proyecto: **MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS BORDOS, ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO.** El cual será ejecutado con fondos provenientes del aporte constitucional para la inversión del ejercicio fiscal 2,025 de forma tripartita (Consejo Departamental de Desarrollo, Municipalidad, Consejo Comunitario de Desarrollo); por un Valor de Un Millón Ochocientos Quetzales Exactos (Q. 1,000,800.00), con un plazo de cuatro meses calendario el cual, por adjudicación en los procesos y requisitos de GUATECOMPRAS, lo ejecutará la empresa **CONSTRUCTORA Y ELECTRICOS M. Y WALRUD,** Habiendo sido publicado en el Sistema de Guatecompras la adjudicación bajo el NOG- 26002485, Según Contrato Administrativo No. 09-2025 de fecha cuatro de junio del dos mil veinticinco. **SEGUNDO:** Los señores anteriormente mencionados declaran iniciados los trabajos, los cuales se realizarán con base a planos y especificaciones elaboradas para el presente proyecto y de acuerdo al contrato respectivo. **TERCERO:** El Señor Alcalde Municipal recomienda al representante de la empresa constructora, al supervisor residente de la empresa y supervisor de obras municipales que los trabajos sean ejecutados en base al diseño y especificaciones propias de este proyecto y presentar los avances del mismo para el pago respectivo con la documentación de soporte. **CUARTO:** No habiendo más que agregar se da por terminada la presente en el mismo lugar y fecha media hora después de su inicio. Leída se acepta, ratifica y firma por los que en ella intervenimos Damos fe. ------

ALCALDE

**José Elías Herrera Guerra**
**Alcalde Municipal**

GUASTATOYA

**Lic Alexis Geovanny Marroquín Orellana**
**Director**
**Dirección Municipal de Planificación**

**Tomas Reyes Picón**
**Representante de la empresa**

CONSTRUCTORA Y ELECTRICOS M Y WALRUD
NIT. 284134-7 ; PROP. TOMAS REYES PICON
ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA EL PROGRESO

**Ing. Luis Leonel Urizar Muñoz**
**Supervisor Residente**

José Fulgencio Alexander Aguilar Mejía
Ingeniero Civil
Colegiado No. 9,366

**Ing. José Fulgencio Alexander Aguilar Mejía**
**Supervisor de Obras Municipales**

**BITÁCORA ELECTRÓNICA No.** 3005/06/2025


**CONTRATO No.** 09-2025

**NOMBRE:** MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS BORDOS, ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

**ENTIDAD:** MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

| | |
|---|---|
| **REGISTRO No.** | 2 |
| **FECHA** | 15/07/2025 |
| **TIPO** | AVANCE |
| **DESCRIPCIÓN** | Se construyen muros de contención previo a la colocación de pavimento, se cuenta con personal y materiales suficientes para el avance del proyecto |
| **CREADO POR** | FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA |



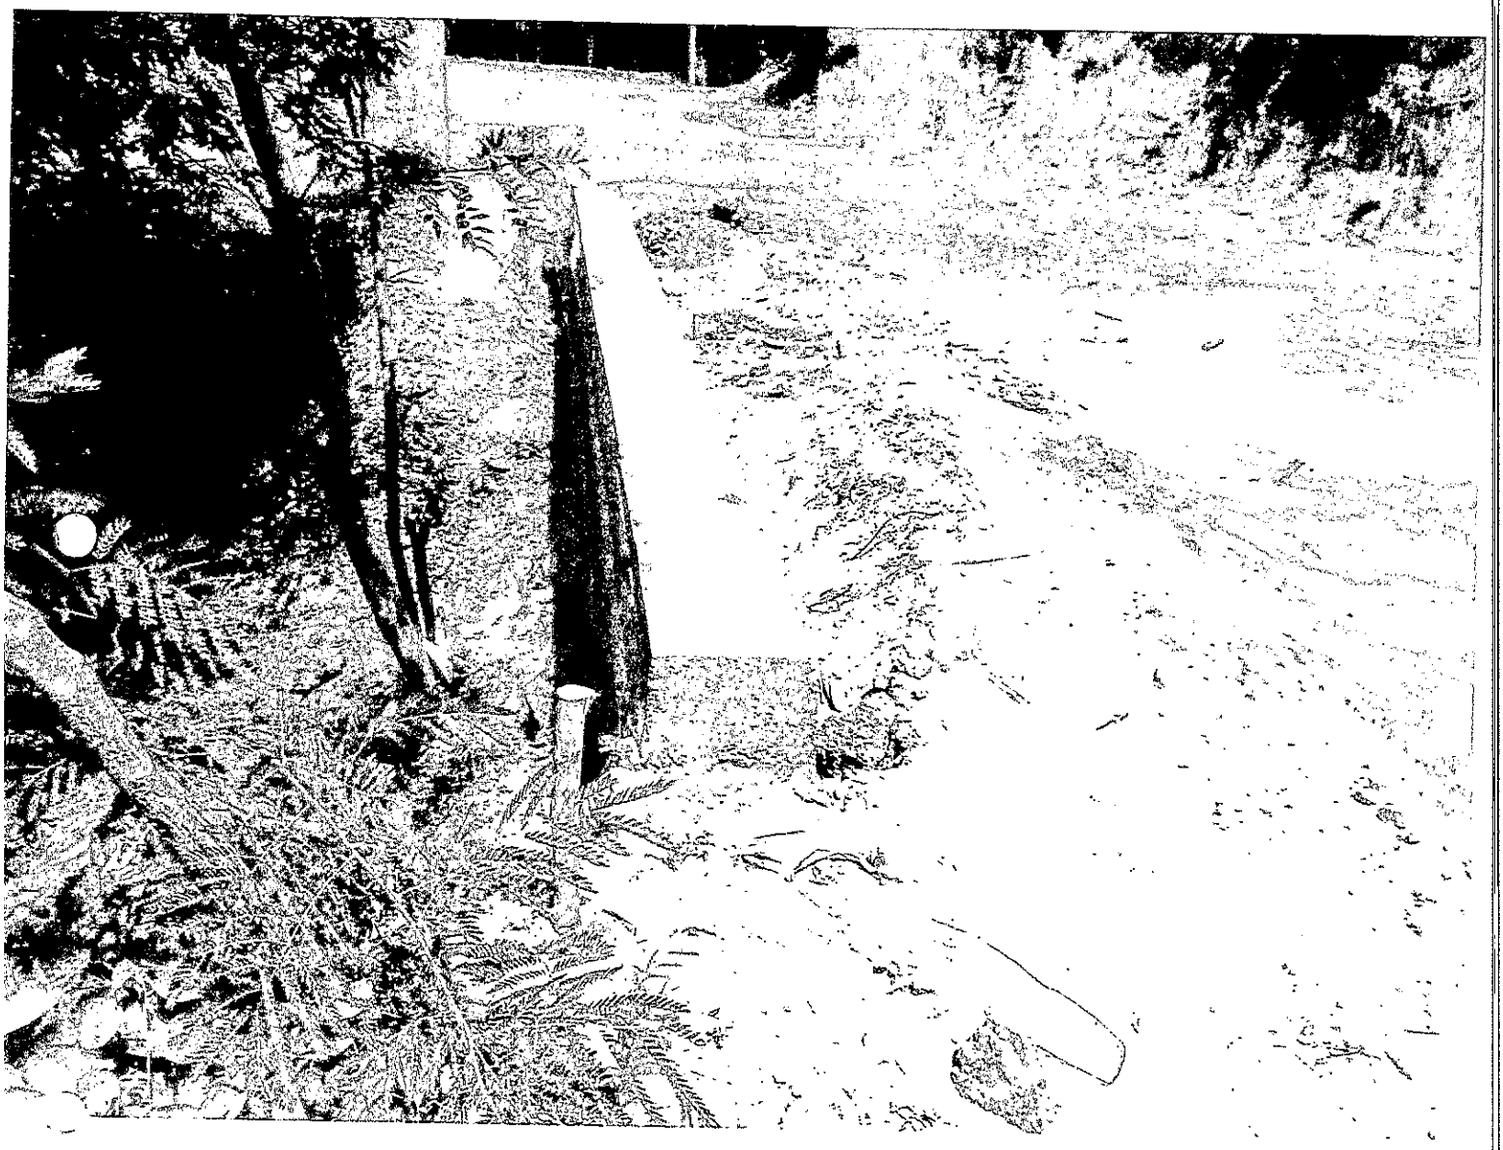





**BITÁCORA ELECTRÓNICA No.** 3005/06/2025


**CONTRATO No.** 09-2025

**NOMBRE:** MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS BORDOS, ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

**ENTIDAD:** MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA


| | |
|---|---|
| **REGISTRO No.** | 3 |
| **FECHA** | 22/07/2025 |
| **TIPO** | AVANCE |
| **DESCRIPCIÓN** | Se realiza la fundicion de bordillos y la colocación de base, se cuenta con personal y materiales suficientes para el avance del proyecto p |
| **CREADO POR** | FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA |



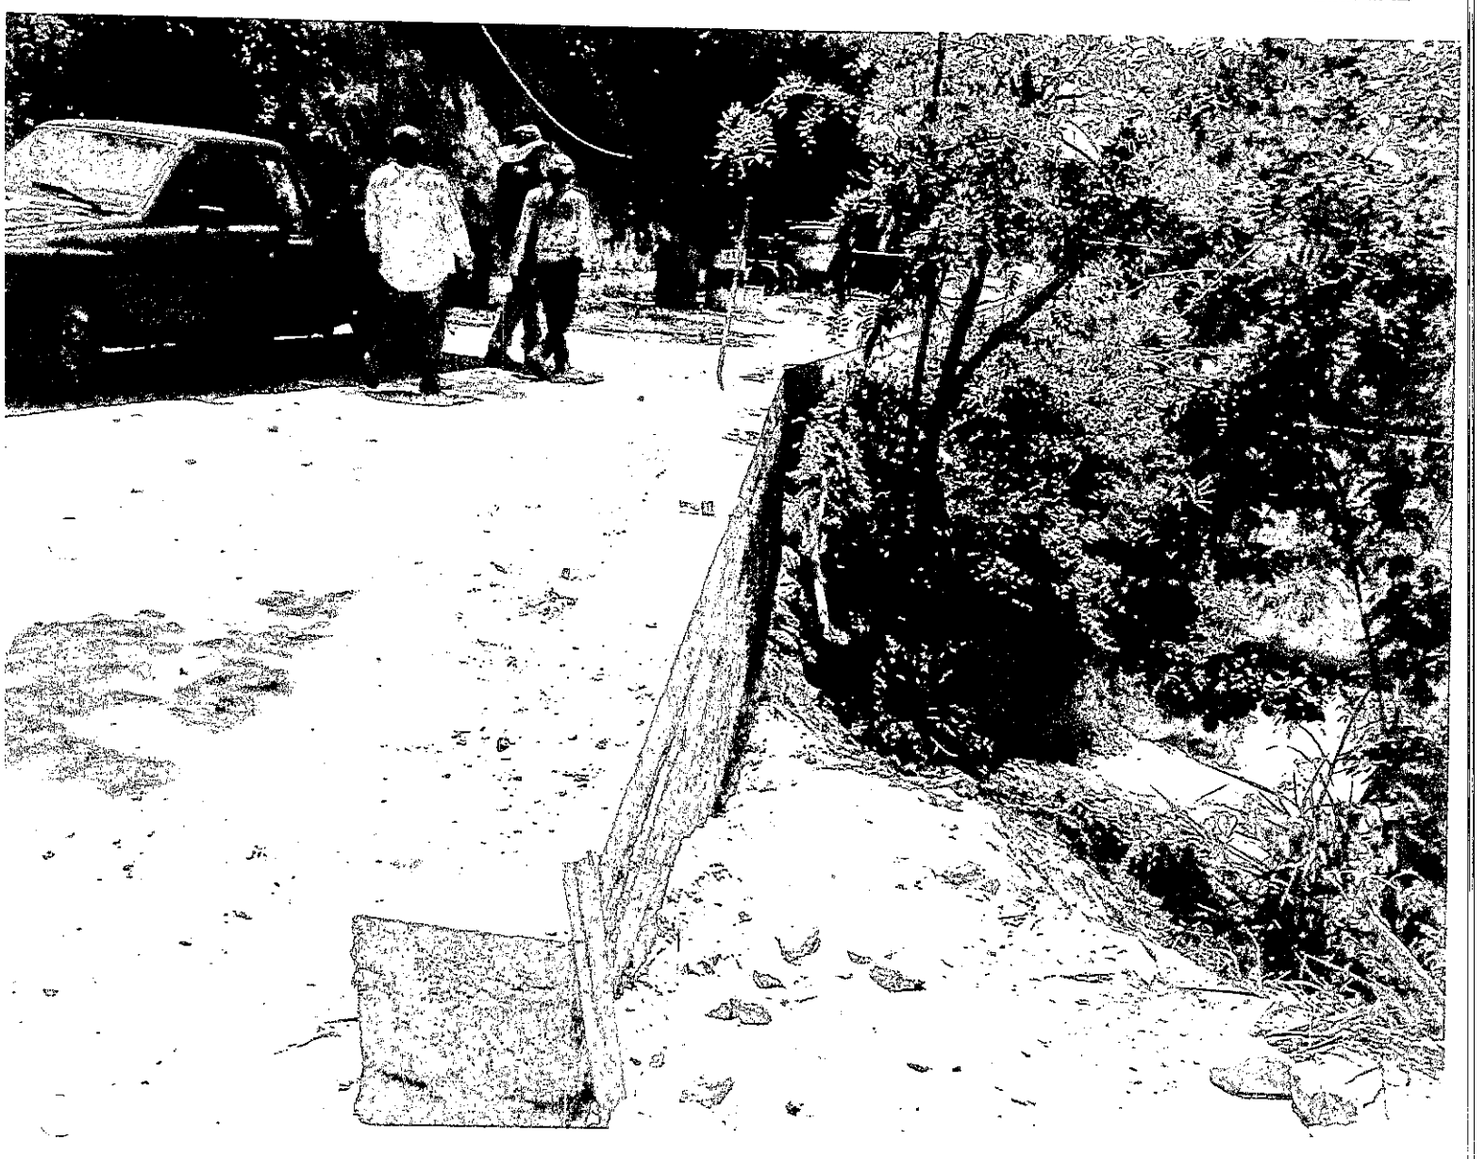





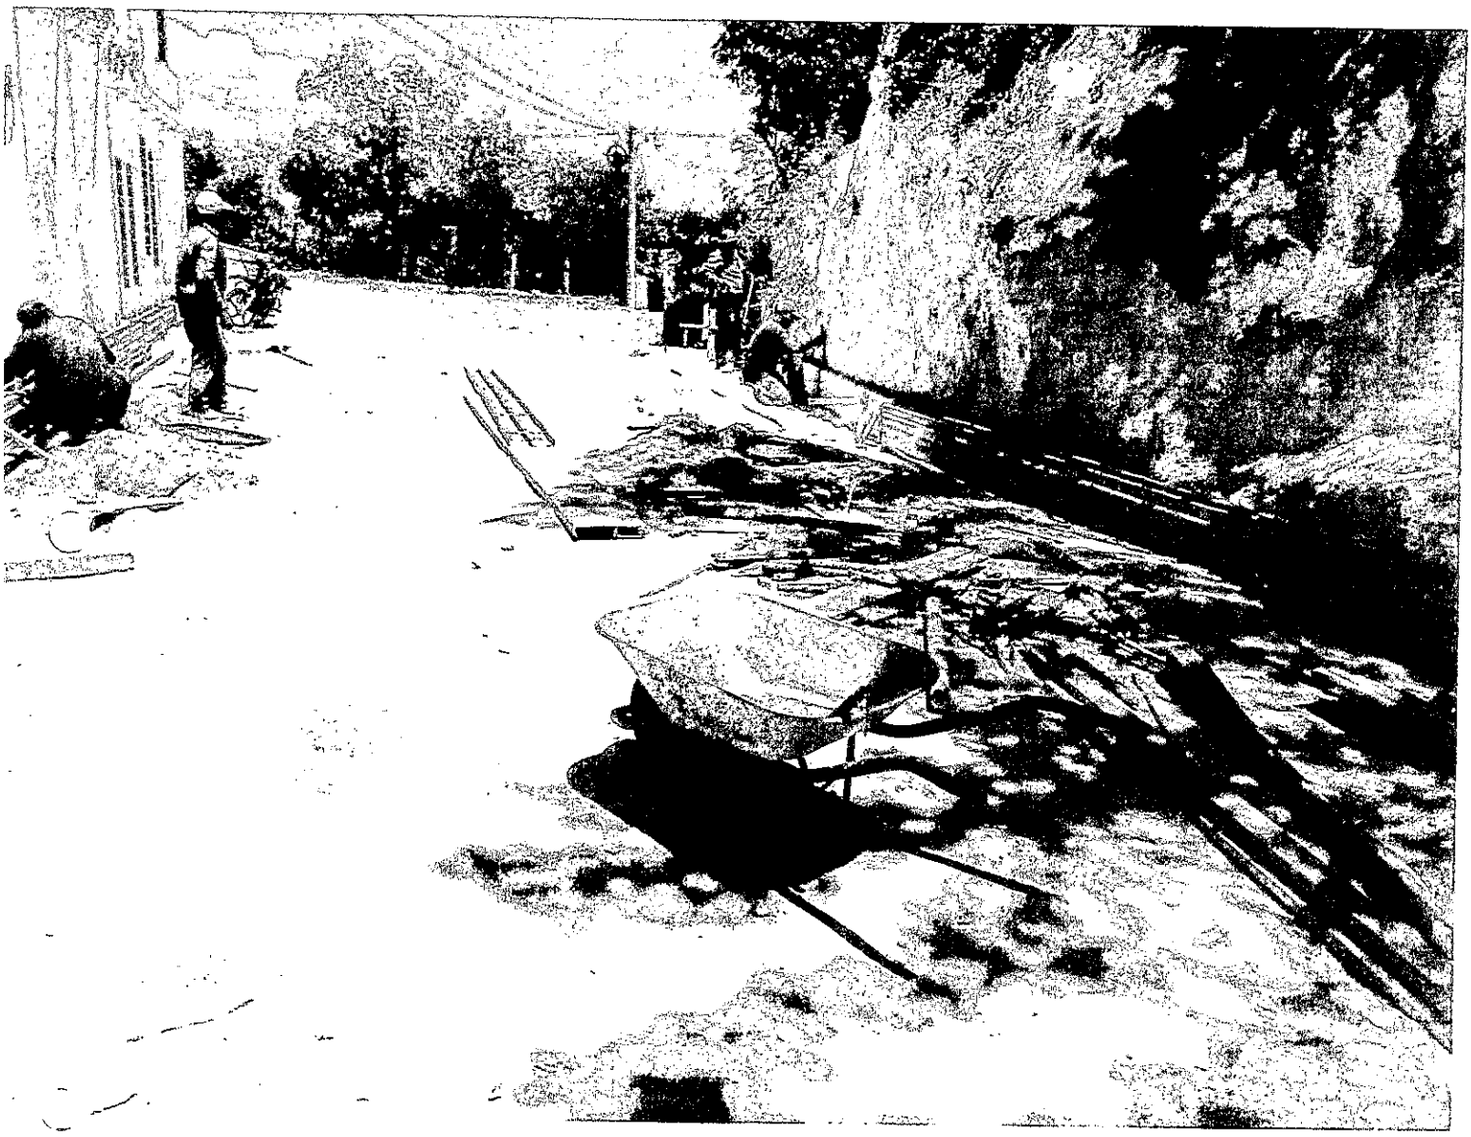




**BITÁCORA ELECTRÓNICA No.** 3005/06/2025

**CONTRATO No.** 09-2025

**NOMBRE:** MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS BORDOS, ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO


**ENTIDAD:** MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

| | |
|---|---|
| **REGISTRO No.** | 4 |
| **FECHA** | 09/08/2025 |
| **TIPO** | AVANCE |
| **DESCRIPCIÓN** | Se tiene lista la base para la colocación de adoquin y el bordillo ya se encuentra fundido |
| **CREADO POR** | FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA |

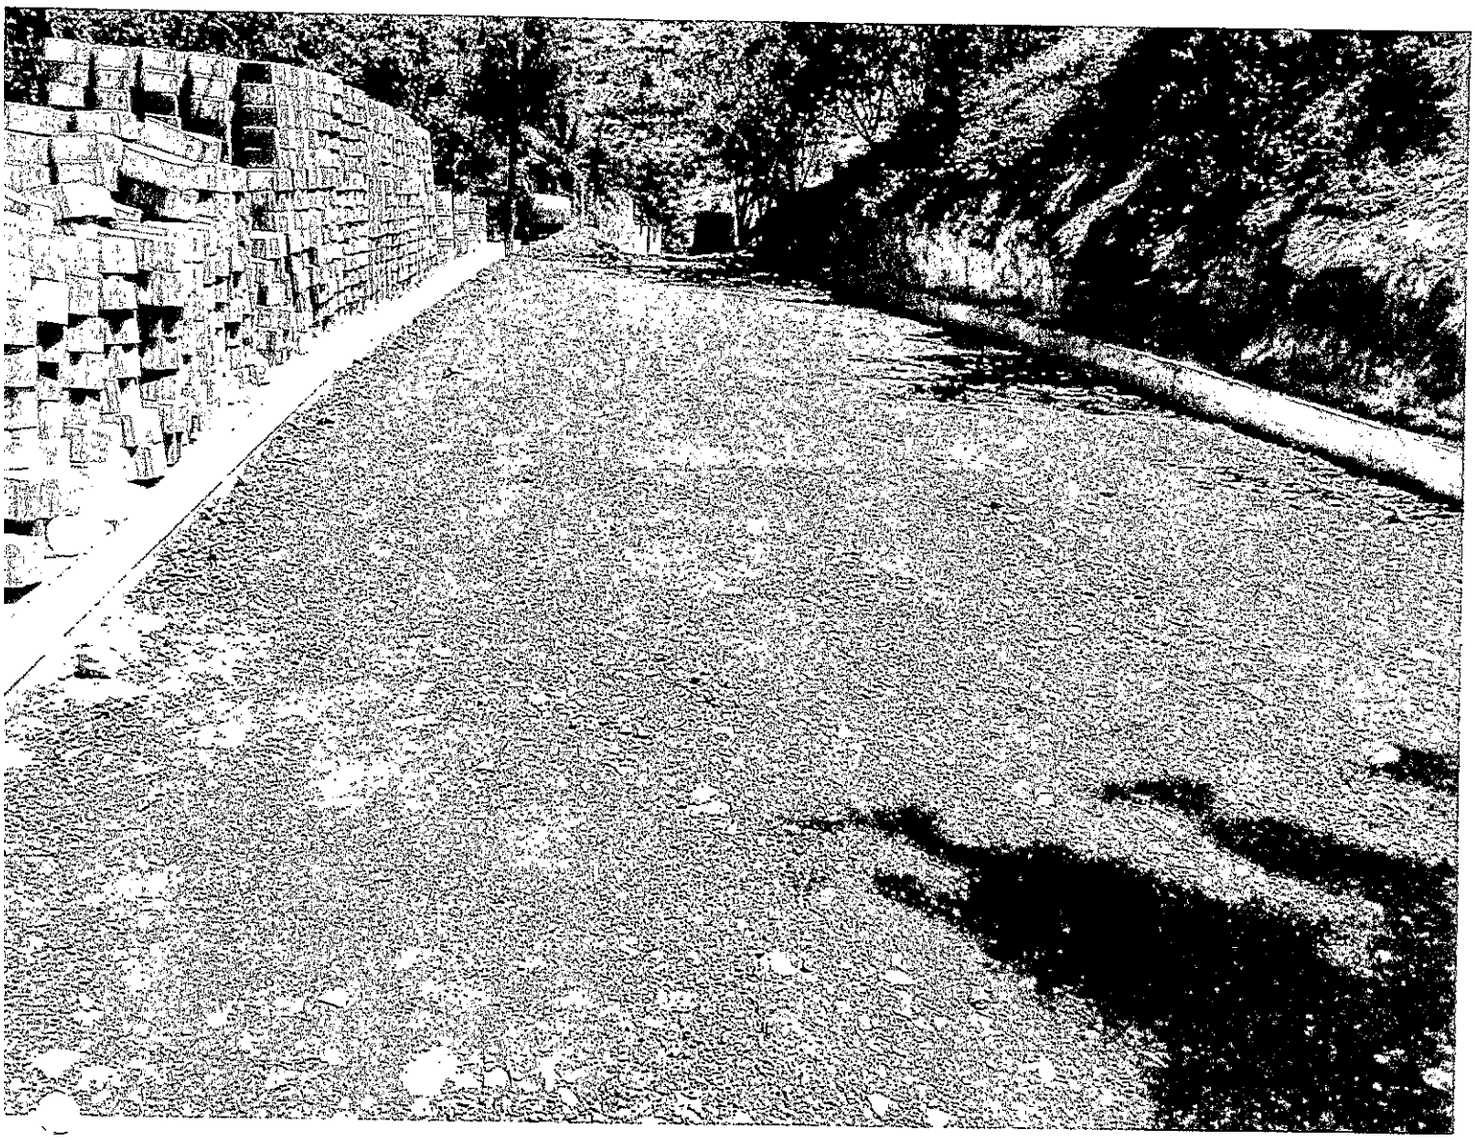




1504

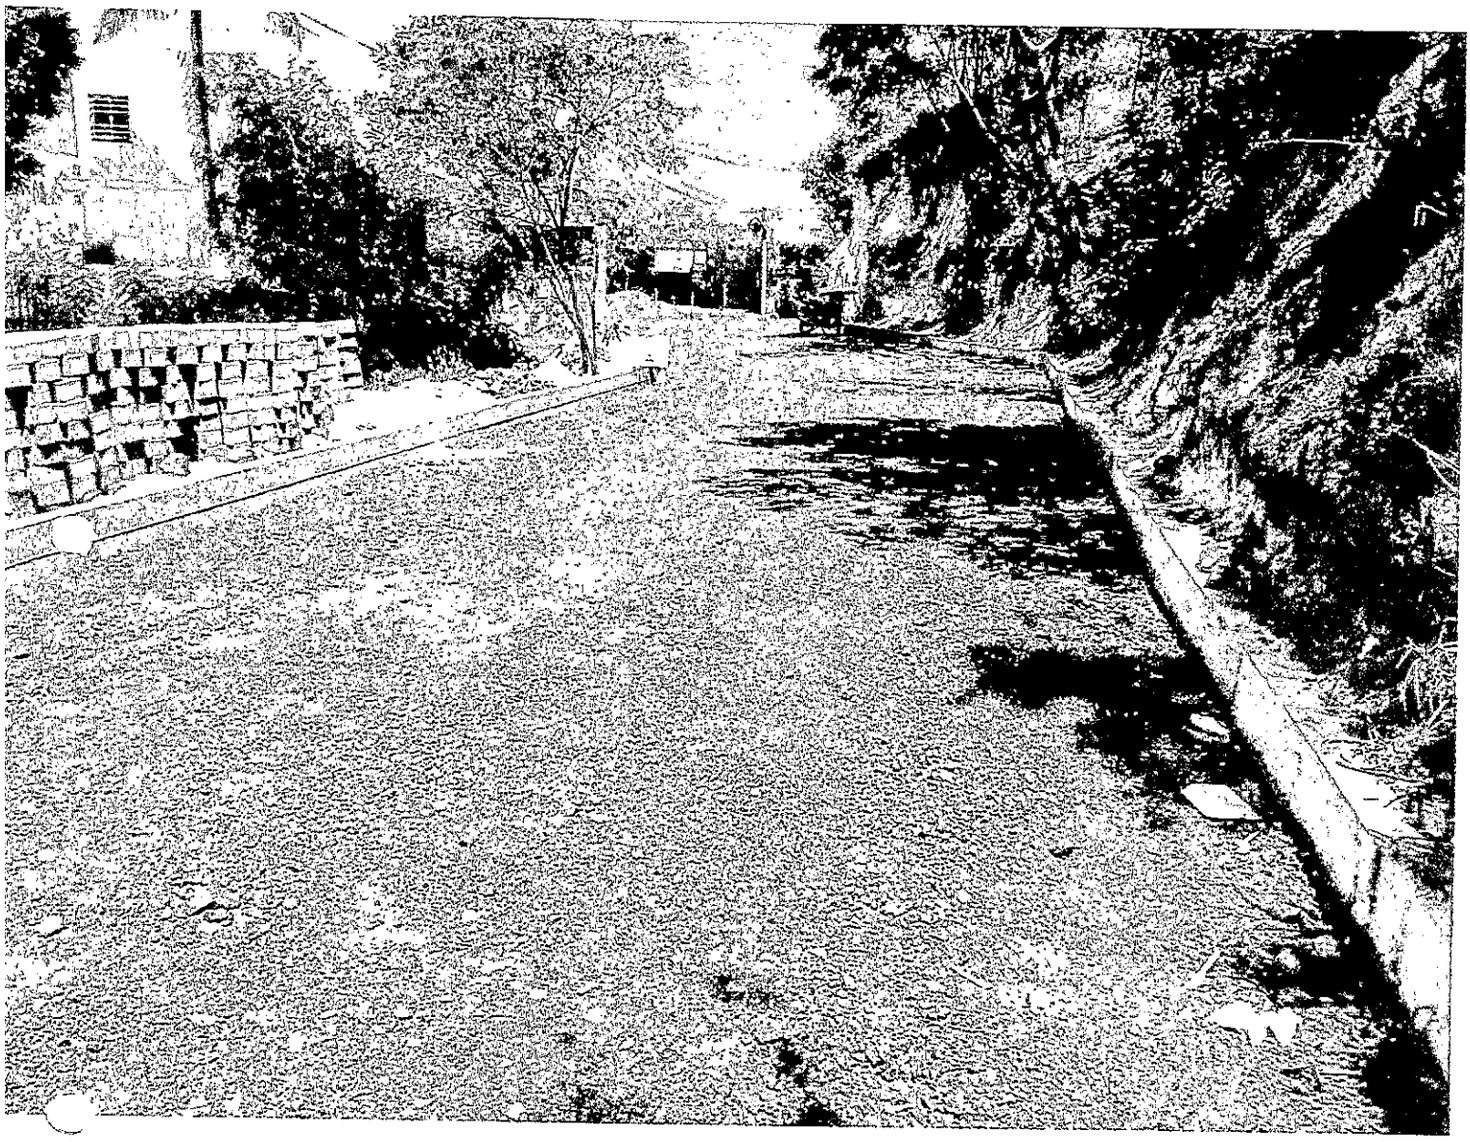







**BITÁCORA ELECTRÓNICA No.** 3005/06/2025

**CONTRATO No.** 09-2025

**NOMBRE:** MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS BORDOS, ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO


**ENTIDAD:** MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

| | |
|---|---|
| **REGISTRO No.** | 5 |
| **FECHA** | 23/08/2025 |
| **TIPO** | AVANCE |
| **DESCRIPCIÓN** | Se realiza la colocación de adoquin y bordillo fundido, se cuenta con personal y materiales suficientes para el avance del proyecto |
| **CREADO POR** | FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA |







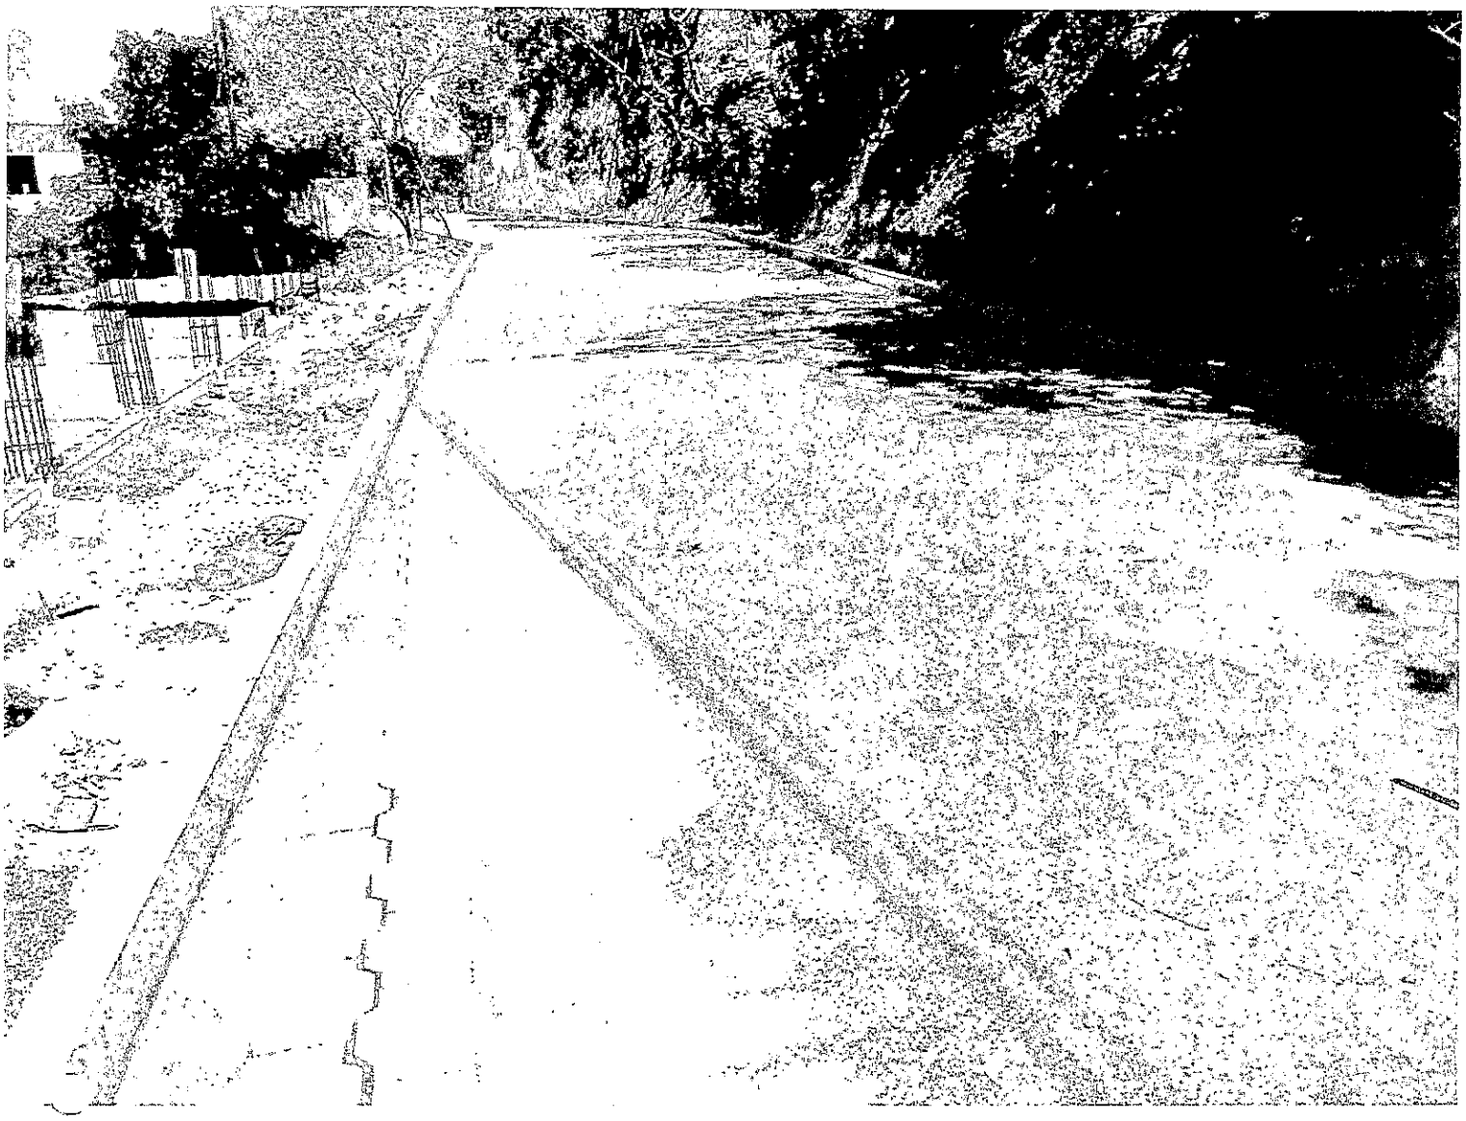





**BITÁCORA ELECTRÓNICA No.** 3005/06/2025

**CONTRATO No.** 09-2025

**NOMBRE:** MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS BORDOS, ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

**ENTIDAD:** MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

| | |
|---|---|
| **REGISTRO No.** | 6 |
| **FECHA** | 30/08/2025 |
| **TIPO** | AVANCE |
| **DESCRIPCIÓN** | Se continua con la colocación de adoquin y bordillo fundido, se cuenta con personal y materiales suficientes para el avance del proyecto |
| **CREADO POR** | FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA |












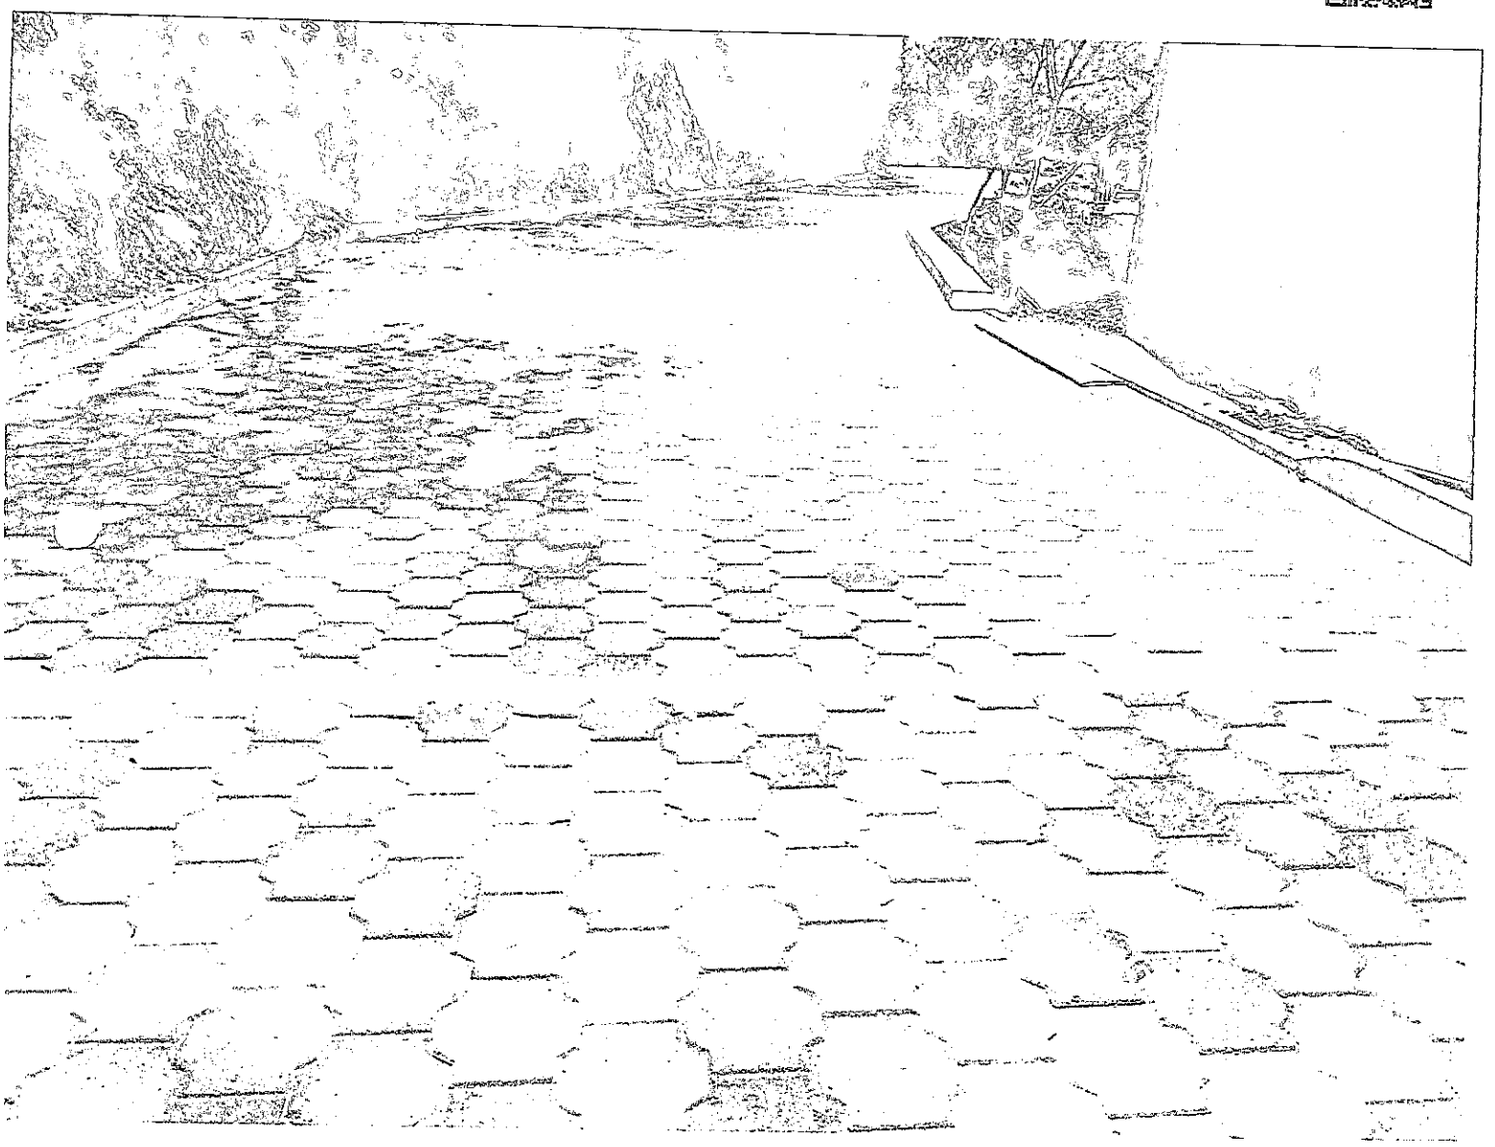

**LA INFRASCRITA SECRETARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO,**

**CERTIFICA:**

Que para su cumplimiento y efectos consiguientes se transcribe la **AUTENTICIDAD** del punto **TERCERO** del acta **66-2025** de fecha cinco de septiembre de dos mil veinticinco del libro número 3,539 de sesiones ordinarias del Concejo Municipal, debidamente autorizado por la Contraloría General de Cuentas, el que copiado literalmente dice:

**TERCERO:** La Secretaria Municipal informa al Concejo Municipal que, Licenciado Alexis Geovanny Marroquín Orellana, Director de Planificación, presenta oficio Ref.agmo/DMP/376-2025, de fecha 05 de septiembre de 2025, el cual en su parte conducente expone: "El motivo de la presente es para informarle que el proyecto **MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS BORDOS, ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO.** Contrato administrativo número 09-2025 de fecha 04 de junio de 2025, ejecutado por la empresa **CONSTRUCTORA Y ELECTRICOS M. Y WALRUD**, presentó informe del 80% de avance físico. Por lo tanto, solicito que apruebe el pago del 80% de avance físico del proyecto antes mencionado a la empresa **CONSTRUCTORA Y ELECTRICOS M. Y WALRUD** siendo su propietario el señor TOMAS REYES PICON." Consiguientemente y en cumplimiento al numeral 2) de la Cláusula Cuarta del contrato en referencia, presenta el informe de supervisión signado por el Ingeniero JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA, Supervisor de Obras Municipales, por medio del cual informa de la estimación, del avance físico del referido proyecto, indicando que se encuentra en un avance físico del 80.00%, anexa el detalle que contiene los renglones de trabajo para la presente estimación. **CONSIDERANDO:** Que el artículo 59 del Decreto número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado, establece: "Estimaciones para pago. La entidad contratante podrá hacer pagos parciales al contratista contra estimaciones periódicas de trabajo ejecutado y aceptado, las que podrán efectuarse mensualmente de acuerdo con las estipulaciones pactadas." **CONSIDERANDO:** Que el Artículo 35 literal a), del Decreto 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Código Municipal y sus reformas establece: Atribuciones Generales del Concejo Municipal "son atribuciones del Concejo Municipal: a) La iniciativa, deliberación y decisión de los asuntos municipales...". **POR TANTO:** El Concejo Municipal fundamentado en lo considerado y con las facultades que le confiere el Código Municipal y sus reformas y por **UNANIMIDAD DE VOTOS. ACUERDA: I)** Se tiene por recibido el oficio presentado, agregándose al expediente respectivo. **II) APROBAR**, el pago equivalente al avance físico del 80%, a favor de la empresa mercantil **CONSTRUCTORA Y ELÉCTRICOS M. Y WALRUD**, propiedad del señor Tomas Reyes Picon, de conformidad con el monto de estimación de avance físico, anexa el detalle que contiene los renglones de trabajo para la presente estimación, presentados por el Supervisor de Obras Municipales del proyecto **MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS BORDOS, ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO**, el que se ejecuta con el Contrato Administrativo de Obras 09-2025. **III)** Se le ordena al Director de Administración Financiera Integrada Municipal, hacer las operaciones contables correspondientes y proceder al pago de conformidad con lo aprobado en el numeral romano II) del presente punto resolutivo. **IV)** Notifíquese.

(Fs) Ilegibles José Elías Herrera Guerra, Alcalde Municipal; Ing. Byron Fernando Calderón Ferrera y Eduardo Ortega Loaiza, Síndicos Primero y Segundo respectivamente, Heman Archila Morales, Erasmo Beltetón Contreras, Nery Rolando Archila Orellana, Julio Mauricio Marroquín Gonzalez, Fryda Aimée Estrada Ortiz, Concejales Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto, respectivamente y Licda. Evelyn Yaneth Oajaca Marroquín, Secretaria Municipal.

**DADO EN EL PALACIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE GUASTATOYA, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, A OCHO DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO.**

SECRETARIA

**LICDA. EVELYN YANETH OAJACA MARROQUÍN**
**SECRETARIA MUNICIPAL**
