MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!

5980-0535 MUNI ALIDAD DE GUASTATOYA
BARRIO EL CALVARIO, **GUASTATOYA EL PROGRESO**

REPORTE DE PAGO DE PROYECTOS POR CONTRATO 2025

EXPEDIENTE No. **298** NOG: **26002485** CONTRATO No. **09-2025**

PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS BORDOS, ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

APORTES	% DE AVANCE	ESTIMACION	AMORTIZACION	LIQUIDO A RECIBIR
Aporte CODEDE	**40.00%**			
Q. 1,000,000.00		Q. 250,000.00	Q. 50,000.00	Q. 200,000.00
31-0101-0004-1054-1-2				
Aporte MUNICIPALIDAD				
Q. 400.00		Q. 100.00	Q. 20.00	Q. 80.00
22-0101-0001-0-0-2				
Aporte COMUNIDAD				
Q. 400.00		Q. 100.00	Q. 20.00	Q. 80.00
31-3101-0002-0-0-2				
TOTALES		Q. 250,200.00	Q. 50,040.00	Q. 200,160.00

Se cuenta con Informe de supervisión por parte de la empresa, informe de supervisión por el Supervisor de Obras Municipales, Punto del Concejo Municipal de aprobación de avance, Copia de bitácora, recibo 7-b, factura.

ENCARGADO DE TESORERÍA
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA ¡Sirviendo!

Lic. Alexis Geovanny Marroquín Orellana
Director Municipal de Planificación

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA ¡Sirviendo!

Factura

TOMAS , REYES PICON
Nit Emisor: 2841347
CONSTRUCTORA Y ELECTRICOS M. Y WALRUD
ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO
NIT Receptor: 6206107
Nombre Receptor: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
Dirección comprador: GUASTATOYA, EL PROGRESO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2DBA7A88-9FAC-4687-8F64-7E0377C59A98
Serie: 2DBA7A88 Número de DTE: 2678867591
Numero Acceso:
Fecha y hora de emision: 16-sep-2025 13:01:29
Fecha y hora de certificación: 16-sep-2025 13:01:29
Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Otros Descuentos(Q)	Total (Q)	Impuestos	
1	Servicio	1	POR EL 40% DE LA PRIMERA ESTIMACION DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS BORDOS, ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO, TOTAL DE ESTA ESTIMACION Q250,200.00 MENOS AMORTIZACION Q50,040.00 LIQUIDO A RECIBIR Q200,160.00 SEGUN CONTRATO 09-2025	250,200.00	0.00	0.00	250,200.00	IVA	26,807.142857
			TOTALES:		0.00	0.00	250,200.00	IVA	26,807.142857

* Sujeto a pagos trimestrales ISR

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

"Contribuyendo por el país que todos queremos"

MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!

5980-0535 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
BARRIO EL CALVARIO, **GUASTATOYA EL PROGRESO**

INFORME DE SUPERVISION

Guastatoya, 06 de Agosto de 2025

SEÑOR: JOSE ELIAS HERRERA GUERRA Y CONSEJO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
EL PROGRESO

De la manera más atenta me dirijo a usted deseándole toda clase de éxitos en sus labores diarias.

El motivo de la presente es para hacerle saber lo siguiente:

En visita de supervisión realizada al proyecto denominado **MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS BORDOS, ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO,** con número de contrato **09-2025** de fecha 04 de Junio de 2025, ejecutado por la empresa **CONSTRUCTORA Y ELECTRICOS M. Y WALRUD**, financiado por la Municipalidad de Guastatoya, se tiene a la vista el oficio de Agosto de 2025 en el cual se hace la solicitud de la estimación del proyecto para un avance del **40.00%**, para lo cual se adjunta el informe de supervisión y el informe de parte de la empresa.

Agradeciendo su atención y en espera de darle seguimiento a este asunto me suscribo de ustedes.

Atentamente

José F. Alexander Aguilar Mejia
Ingeniero Civil
Colegiado No. 9,366

ING. JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA
SUPERVISOR MUNICIPAL, GUASTATOYA
EL PROGRESO

D.M.P.	SUPERVISION DE OBRAS	Dirección Municipal de Planificación

Comunidad.	Contrato Municipal.
Aldea Tierra Blanca, Guastatoya, El Progreso	07-2025

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del proyecto.	Ubicación del proyecto.
MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS BORDOS, ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Aldea Tierra Blanca, Guastatoya, El Progreso
Contratista.	**Ubicación del proyecto.**
CONSTRUCTORA Y ELECTRICOS M. Y WALRUD	Aldea Tierra Blanca, Guastatoya, El Progreso
Monto Contratado. Q 1,000,800.00	**Avance Físico.** 40.00%
Informe de Supervisión No. 1	**Fecha.** 06 de Agosto de 2025

2. AVANCE DE EJECUCION DEL PROYECTO

No.	Descripcion del Renglón	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Total a la Fecha	Avance Físico %
1	TRABAJOS PRELIMINARES	1,531.00	M2	Q 10.50	Q 16,075.50	Q 16,075.50	100%
2	CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO A NIVEL DE RASANTE EXISTENTE	1,531.00	M2	Q 130.23	Q 199,382.13	Q 199,382.13	100%
3	COLOCACION + COMPACTACION DE BASE GRANULAR DE ESPESOR DE 0.10 MTS	400.00	M2	Q 145.40	Q 58,160.00	Q 58,160.00	26%
4	CAMA DE ASIENTO DE ARENA	340.00	M2	Q 31.83	Q 10,822.20	Q 10,822.20	24%
5	COLOCACION DE ADOQUIN TRAFICO PESADO RESISTENCIA 280 KG/CM2	326.27	M2	Q 261.57	Q 85,342.67	Q 85,342.67	23%
6	LLAVES DE CONFINAMIENTO LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES DE 0.10 X 0.25 MTS RESISTENCIA 280 KG/CM2	150.00	ML	Q 112.25	Q 16,837.50	Q 16,837.50	24%
7	BORDILLO FUNDIDO DE 0.10 X 0.30 MTS RESISTENCIA 280 KG/CM2	100.00	ML	Q 137.00	Q 13,700.00	Q 13,700.00	22%
8	RAMPA DE INGRESO E=0.15 MTS RESISTENCIA 280 KG/CM2	-	M2	Q 567.00	Q -	Q -	0%
9	PINTURA PARA TRAFICO PESADO EN LINEA CENTRAL	-	UNIDAD	Q 7,090.12	Q -	Q -	0%
					Q 400,320.00	**Q 400,320.00**	**40.00%**

Estos renglones de trabajo dan como resultado un avance físico del **40.00%** **por lo cual se aprueba realizar el pago correspondiente**

3. DESCRIPCION DEL PROYECTO.

Este proyecto consiste en el mejoramiento de la calle que sirve de ingreso hacia la aldea tierra blanca, en el sector los bordos, de guastatoya, el progreso, la cual se encuentra de terraceria y se va a mejorar utilizando pavimento y bordillos fundidos

4. RECOMENDACIONES.

Chequear los trabajos realizados para garantizar la durabilidad de los mismos, y terminar los trabajos faltantes, los que no se encuentran al 100 % y los que no se han iniciado aun

SUPERVISOR DE PROYECTOS MUNICIPALES.

José F. Alexander Aguilar Mejía
Ingeniero Civil
Colegiado No. 9,366

ING. JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA
SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES

ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA ¡Sirviendo!

JOSE ELIAS HERRERA GUERRA
ALCALDE MUNICIPAL DE GUASTATOYA

D.M.P.	SUPERVISION DE OBRAS	Dirección Municipal de Planificación

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del proyecto.	**Ubicación del proyecto.**
MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS BORDOS, ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Aldea Tierra Blanca, Guastatoya, El Progreso

2. INFORME FOTOGRAFICO.








SUPERVISOR DE PROYECTOS MUNICIPALES.

José F. Alexander Aguilar Mejia
Ingeniero Civil
Colegiado No. 9,366

ING. JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA
SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES

ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
¡Sirviendo!

JOSE ELIAS HERRERA GUERRA
ALCALDE MUNICIPAL DE GUASTATOYA

REPORTE DE AVANCE FISICO No. 1

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS BORDOS, ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	
Municipio: GUASTATOYA	**Departamento: EL PROGRESO**
Comunidad: ALDEA TIERRA BLANCA	**Fecha de Contrato: 04/06/2025**
Fecha de Inicio: 12/06/2025	**Fecha de Supervision: 06/08/2025**
Fecha de Finalizacion: 11/10/2025	**Unidad Ejecutora: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA**
Contrato No.: 09-2025	**Valor del Proyecto: Q.1,000,800.00**
Modificaciones:	**Valor Original: Q.1,000,800.00**
Constructora: CONSTRUCTORA Y ELECTRICOS M. Y WALRUD	**Telefono:**
Representante legal: TOMAS REYES PICON	

RESUMEN DE RENGLONES

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES DE TRABAJO				ORDEN DE CAMBIO	ORDEN DE TRABAJO SUPLEMENTARIO	ORDEN DE TRABAJO EXTRA	RENGLON MODIFICADO	CANTIDADES EJECUTADAS PRIMERA ESTIMACION		ACUMULADO A LA FECHA		PORCENTAJE
		CANTIDAD	UNIDAD	P UNITARIO	TOTAL	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	TOTAL
1	TRABAJOS PRELIMINARES	1,531.00	M2	Q 10.50	Q 16,075.50					1,531.00	Q 16,075.50	1,531.00	Q 16,075.50	1.61%
2	CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO A NIVEL DE RASANTE EXISTENTE	1,531.00	M2	Q 130.23	Q 199,382.13					1,531.00	Q 199,382.13	1,531.00	Q 199,382.13	19.92%
3	COLOCACION + COMPACTACION DE BASE GRANULAR DE ESPESOR DE 0.10 MTS	1,531.00	M2	Q 145.40	Q 222,607.40					400.00	Q 58,160.00	400.00	Q 58,160.00	5.81%
4	CAMA DE ASIENTO DE ARENA	1,399.00	M2	Q 31.83	Q 44,530.17					340.00	Q 10,822.20	340.00	Q 10,822.20	1.08%
5	COLOCACION DE ADOQUIN TRAFICO PESADO RESISTENCIA 280 KG/CM2	1,399.00	M2	Q 261.57	Q 365,936.43					326.27	Q 85,342.67	326.27	Q 85,342.67	8.53%
6	CLAVES DE CONFINAMIENTO LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES DE 0.10 X 0.25 MTS RESISTENCIA 280 KG/CM2	633.00	ML	Q 112.25	Q 71,054.25					150.00	Q 16,837.50	150.00	Q 16,837.50	1.68%
7	BORDILLO FUNDIDO DE 0.10 X 0.30 MTS RESISTENCIA 280 KG/CM2	450.00	ML	Q 137.00	Q 61,650.00					100.00	Q 13,700.00	100.00	Q 13,700.00	1.37%
8	RAMPA DE INGRESO E=0.15 MTS RESISTENCIA 280 KG/CM2	22.00	M2	Q 567.00	Q 12,474.00					-	Q -	-	Q -	0.00%
9	PINTURA PARA TRAFICO PESADO EN LINEA CENTRAL	1.00	UNIDAD	Q 7,090.12	Q 7,090.12					-	Q -	-	Q -	0.00%
	COSTO TOTAL DEL PROYECTO				**Q 1,000,800.00**						**Q 400,320.00**		**Q 400,320.00**	**40.00%**

VALOR DE ESTIMACION No. 1	Q 400,320.00
AMORTIZACION DEL ANTICIPO (20%)	Q 80,064.00
PENDIENTE DE AMORTIZAR	Q 120,096.00
LIQUIDO A RECIBIR	Q 320,256.00

José F. Alexander Aguilar Mejia
Ingeniero Civil
Colegiado No. 9,366

JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES

ALCALDE

JOSE ELIAS HERRERA QUERRA
ALCALDE MUNICIPAL GUASTATOYA

MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Servicio!

Constructora y eléctricos M y WalRud.
Aldea Casas Viejas, Guastatoya, El Progreso
Cel. 5989-4109
tcons53walrud@gmail.com

Guastatoya 07 de agosto del 2025

Señor:
JOSE ELIAS HERRERA GUERRA
ALCALDE MUNICIPAL
Municipalidad de Guastatoya el Progreso
Presente:

Deseando que sus actividades se realicen con éxito me permito enviarle un caluroso saludo.

El motivo de la presente es para **SOLICITARLE** el pago del 44.44% de la primera estimación del proyecto denominado: **MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR BORDOS, ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO.** Contrato numero 09-2025 el cual esta hasta la fecha:

Por lo anteriormente descrito Solicitamos de sus buenos oficios para su conocimiento, análisis y aprobación respectiva del mismo.

Atentamente,

TOMAS REYES PICON
Propietario

CONSTRUCTORA Y ELECTRICOS
M Y WALRUD
NIT. 284134-7 / PROP. TOMAS REYES PICON
ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA EL PROGRESO

Constructora y eléctricos M y WalRud.
Aldea Casas Viejas, Guastatoya, El Progreso
Cel. 5989-4109
tcons53walrud@gmail.com

PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS BORDOS, ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA EL PROGRESO

RENGLON	RENGLONES DE TRABAJO/CANTIDADES	CANTIDAD CONTRATO				CANTIDAD EJECUTADA				CANTIDAD PENDIENTE DE EJECUTAR		
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	ESTE	ACUMULADO	Q.	%	ESTE	Q.	%
1	Trabajos Preliminares	M2	1531	Q10.50	Q16,075.50	1531		Q16,075.50	100.00%	0	Q0.00	0.00%
2	Corte y Nivelacion del Terreno a nivel de Rasante Existente	M2	1531	Q130.23	Q199,382.13	1531		Q199,382.13	100.00%	0	Q0.00	0.00%
3	Colocacion - Compactacion de base granular de espesor de 0.10Mts.	M2	1531	Q145.40	Q222,607.40	1531		Q222,607.40	100.00%	0	Q0.00	0.00%
4	Cama de asiento de arena	M2	1399	Q31.83	Q44,530.17	0		Q0.00	0.00%	1399	Q44,530.17	100.00%
5	Colocacion de Adoquin Trafico pesado, resistencia 280 KG/Cm2	M2	1399	Q261.57	Q365,936.43	0		Q0.00	0.00%	1399	Q365,936.43	100.00%
6	Llaves de confinamiento langitudinales y transversales de 0.10 X 0.25 mts. Resistencia 280 KG/ Cm2	ML	633	Q112.25	Q71,054.25	0		Q0.00	0.00%	633	Q71,054.25	100.00%
7	Bordillo fundido de 0.10 X 030 mts. Resistencia 280 KG/Cm2	ML	450	Q137.00	Q61,650.00	450		Q61,650.00	100.00%	0	Q0.00	0.00%
8	Rampa de ingreso E=0.15 Mts. Resistencia 280 KG/Cm2	M2	22	Q567.00	Q12,474.00	0		Q0.00	0.00%	22	Q12,474.00	100.00%
9	Pintura para trafico pesado en linea central	UNIDAD	1	Q7,090.12	Q7,090.12	0		Q0.00	0.00%	1	Q7,090.12	100.00%
	Total cantidad contratada				Q1,000,800.00	Cantidad Ejecutada		Q444,800.00	44.44%		Q556,000.00	55.56%

Monto bruto de esta Estimacion	Q444,800.00
anticipo	Q0.00
Amortizacion de anticipo 20%	Q200,160.00
monto neto de esta Estimacion	Q244,640.00
Liquido a Recibir	Q244,640.00

TOMAS REYES PICON
CONSTRUCTORA Y ELECTRICOS M& WALRUD

CONSTRUCTORA Y ELECTRICOS M Y WALRUD
NIT. 2841341-7 / PROP. TOMAS REYES PICON
CASAS VIEJAS, GUASTATOYA EL PROGRESO

Guastatoya, 07 de Agosto de 2025

Vo.Bo. JOSE ELIAS HERRERA GUERRA
ALCALDE MUNICIPAL

LUIS LEONEL URIZAR MUR.
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO No. 4301

Prevención
Confianza

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA Y GESTIÓN AMBIENTAL

UNIDAD DE BITÁCORAS – DATOS DE LA BITÁCORA ELECTRÓNICA –

BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 3005/06/2025

No. CONTRATO	09-2025
FECHA CONTRATO	04/06/2025
MONTO CONTRACTUAL	1,000,800.00
NOG	26002485
NOMBRE DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS BORDOS, ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO
UBICACIÓN DEL PROYECTO	Guastatoya, EL PROGRESO
ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
NOMBRE DEL SUPERVISOR	LUIS LEONEL URIZAR MUÑOZ
EMPRESA EJECUTORA	TOMAS REYES PICON
REPRESENTANTE LEGAL O CONTRATISTA	TOMAS REYES PICON
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO	FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA
SUPERVISOR EMPRESA SUPERVISORA	

FECHA DE AUTORIZACIÓN 10/06/2025

BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 3005/06/2025

CONTRATO No.	09-2025
NOMBRE:	MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS BORDOS, ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO
ENTIDAD:	MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

REGISTRO No.	1
FECHA	24/06/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	BITACORA DE INICIO DE PROYECTO se adjunta acta de inicio para hacer constar el inicio de los trabajos a realizar en el proyecto MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS BORDOS, ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA

DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION

LIBRO DE ACTAS DE INICIO DE OBRAS Nº 0195

ACTA DE INICIO NO. 15-2025

PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS BORDOS, ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO. IDENTIFICADO CON NOG. 26002485, EN GUATECOMPRAS. ----------

En el Municipio de Guastatoya, Departamento El Progreso, siendo las ocho horas en punto del día jueves doce de junio de dos mil veinticinco, reunidos en el área donde se va a ejecutar el Proyecto, **MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS BORDOS, ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO.** Los señores: José Elías Herrera Guerra, Alcalde Municipal; Ing. José Fulgencio Alexander Aguilar Mejía, Supervisor de Obras Municipales; Tomas Reyes Picón, Representante Legal de la Empresa Constructora; Ing. Luis Leonel Urizar Muñoz, Supervisor Residente del Proyecto; Lic. Alexis Geovanny Marroquín Orellana, Director de la Dirección Municipal de Planificación; con el objeto de dejar constancia de lo siguiente. **PRIMERO:** Se faciona la presente acta para dejar constancia de Inicio del Proyecto: **MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS BORDOS, ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO.** El cual será ejecutado con fondos provenientes del aporte constitucional para la inversión del ejercicio fiscal 2,025 de forma tripartita (Consejo Departamental de Desarrollo, Municipalidad, Consejo Comunitario de Desarrollo); por un Valor de Un Millón Ochocientos Quetzales Exactos (Q. 1,000,800.00), con un plazo de cuatro meses calendario el cual, por adjudicación en los procesos y requisitos de GUATECOMPRAS, lo ejecutará la empresa **CONSTRUCTORA Y ELECTRICOS M. Y WALRUD,** Habiendo sido publicado en el Sistema de Guatecompras la adjudicación bajo el NOG- 26002485, Según Contrato Administrativo No. 09-2025 de fecha cuatro de junio del dos mil veinticinco. **SEGUNDO:** Los señores anteriormente mencionados declaran iniciados los trabajos, los cuales se realizarán con base a planos y especificaciones elaboradas para el presente proyecto y de acuerdo al contrato respectivo. **TERCERO:** El Señor Alcalde Municipal recomienda al representante de la empresa constructora, al supervisor residente de la empresa y supervisor de obras municipales que los trabajos sean ejecutados en base al diseño y especificaciones propias de este proyecto y presentar los avances del mismo para el pago respectivo con la documentación de soporte. **CUARTO:** No habiendo más que agregar se da por terminada la presente en el mismo lugar y fecha media hora después de su inicio. Leída se acepta, ratifica y firma por los que en ella intervenimos Damos fe. ------

José Elías Herrera Guerra
Alcalde Municipal

Lic Alexis Geovanny Marroquín Orellana
Director
Dirección Municipal de Planificación

Tomas Reyes Picón
Representante de la empresa

CONSTRUCTORA Y ELECTRICOS M Y WALRUD
NIT. 2841247-7 PROP. TOMAS REYES PICON
ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA EL PROGRESO

Ing. Luis Leonel Urizar Muñoz
Supervisor Residente

Ing. José Fulgencio Alexander Aguilar Mejía
Supervisor de Obras Municipales









CGC

Bitácora Electrónica

Prevención
Confianza

FULGENCIO AGUILAR











BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 3005/06/2025


CONTRATO No. 09-2025

NOMBRE: MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS BORDOS, ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

REGISTRO No.	2
FECHA	15/07/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	Se construyen muros de contención previo a la colocación de pavimento, se cuenta con personal y materiales suficientes para el avance del proyecto
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA



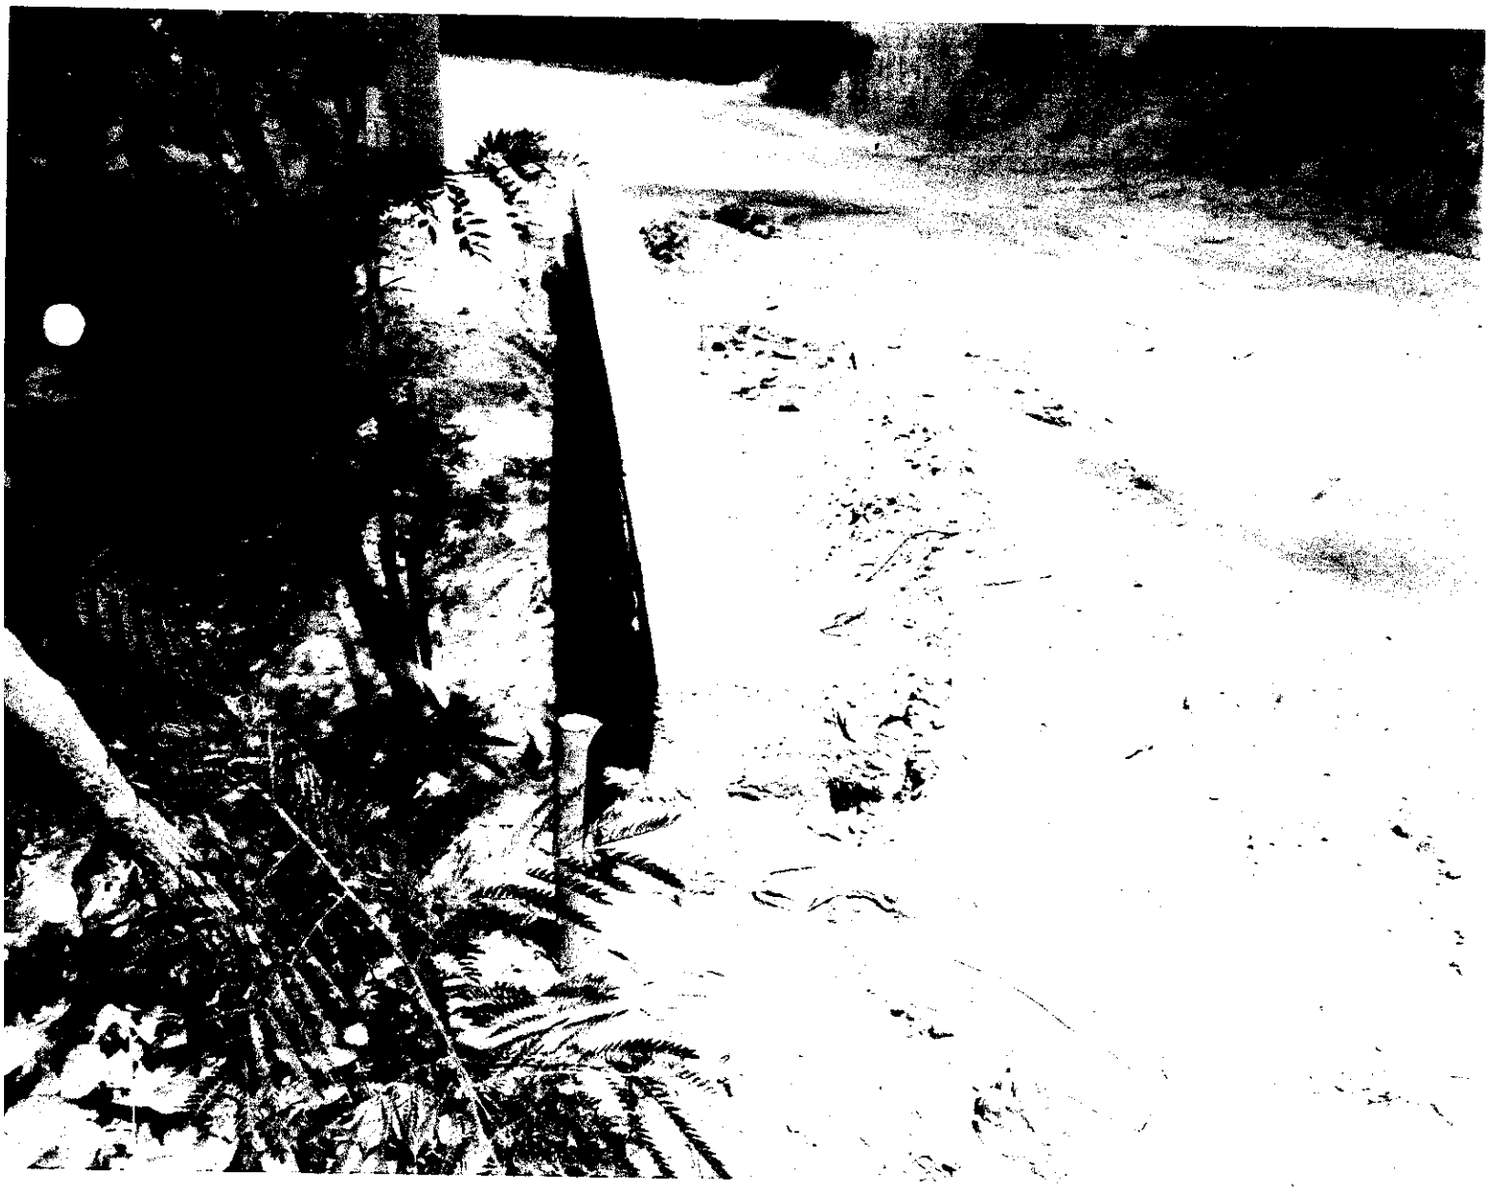















BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 3005/06/2025

CONTRATO No. 09-2025

NOMBRE: MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS BORDOS, ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA


REGISTRO No. 3


FECHA 22/07/2025

TIPO AVANCE

DESCRIPCIÓN Se realiza la fundicion de bordillos y la colocación de base, se cuenta con personal y materiales suficientes para el avance del proyecto p

CREADO POR FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA

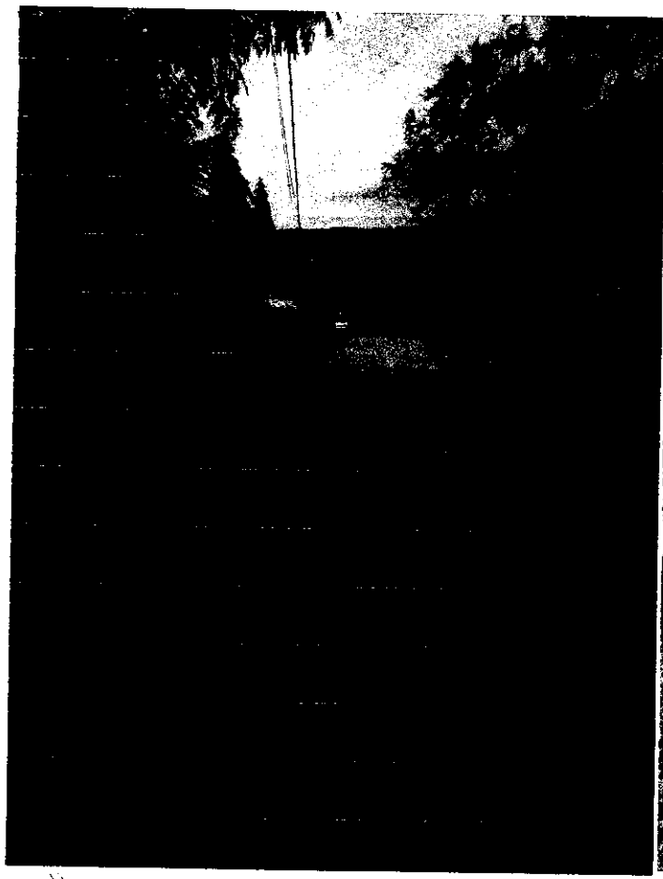

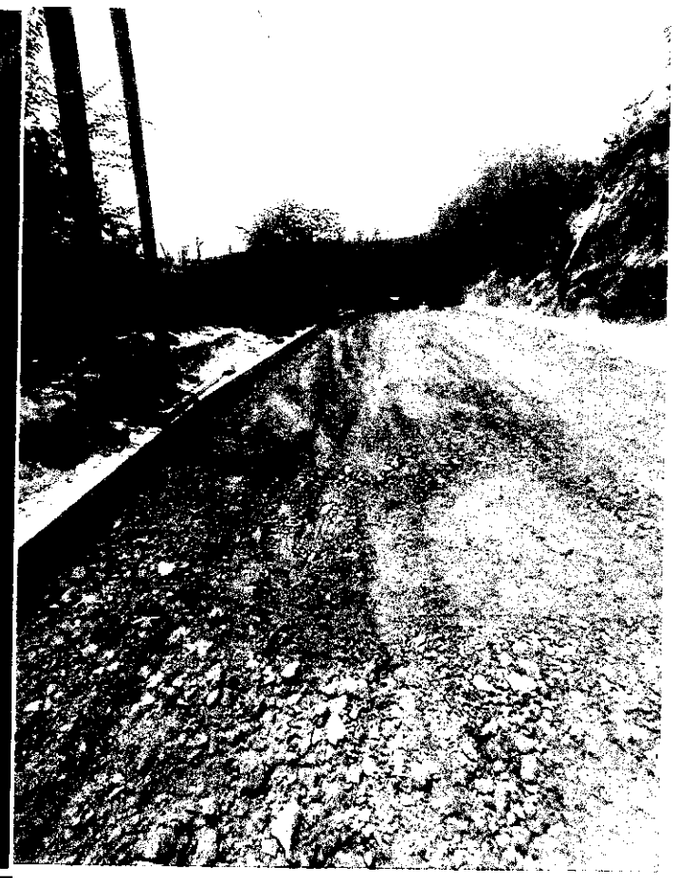













BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 3005/06/2025

CONTRATO No. 09-2025

NOMBRE: MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS BORDOS, ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

REGISTRO No.	4
FECHA	09/08/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	Se tiene lista la base para la colocación de adoquin y el bordillo ya se encuentra fundido
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA
















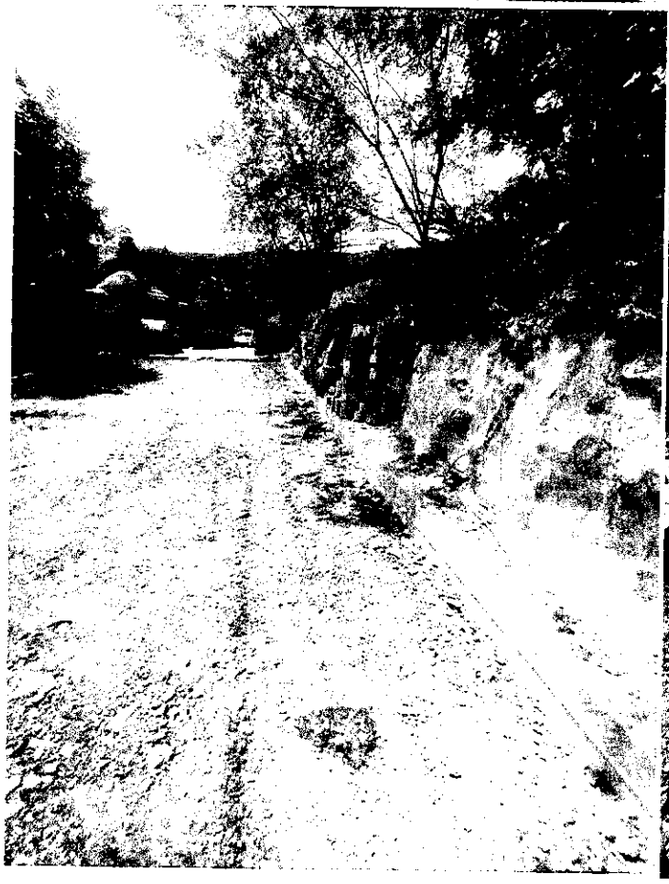

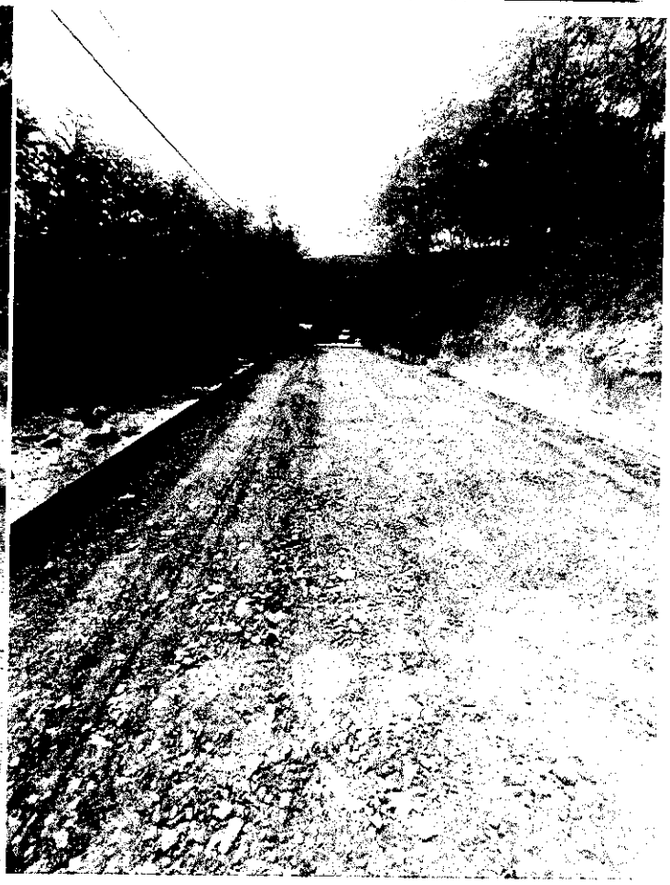


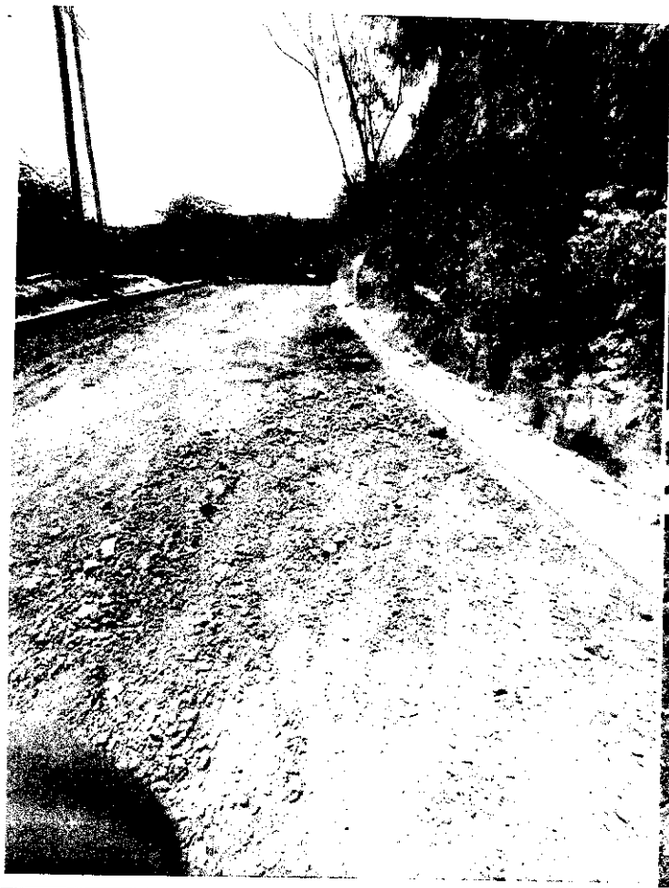









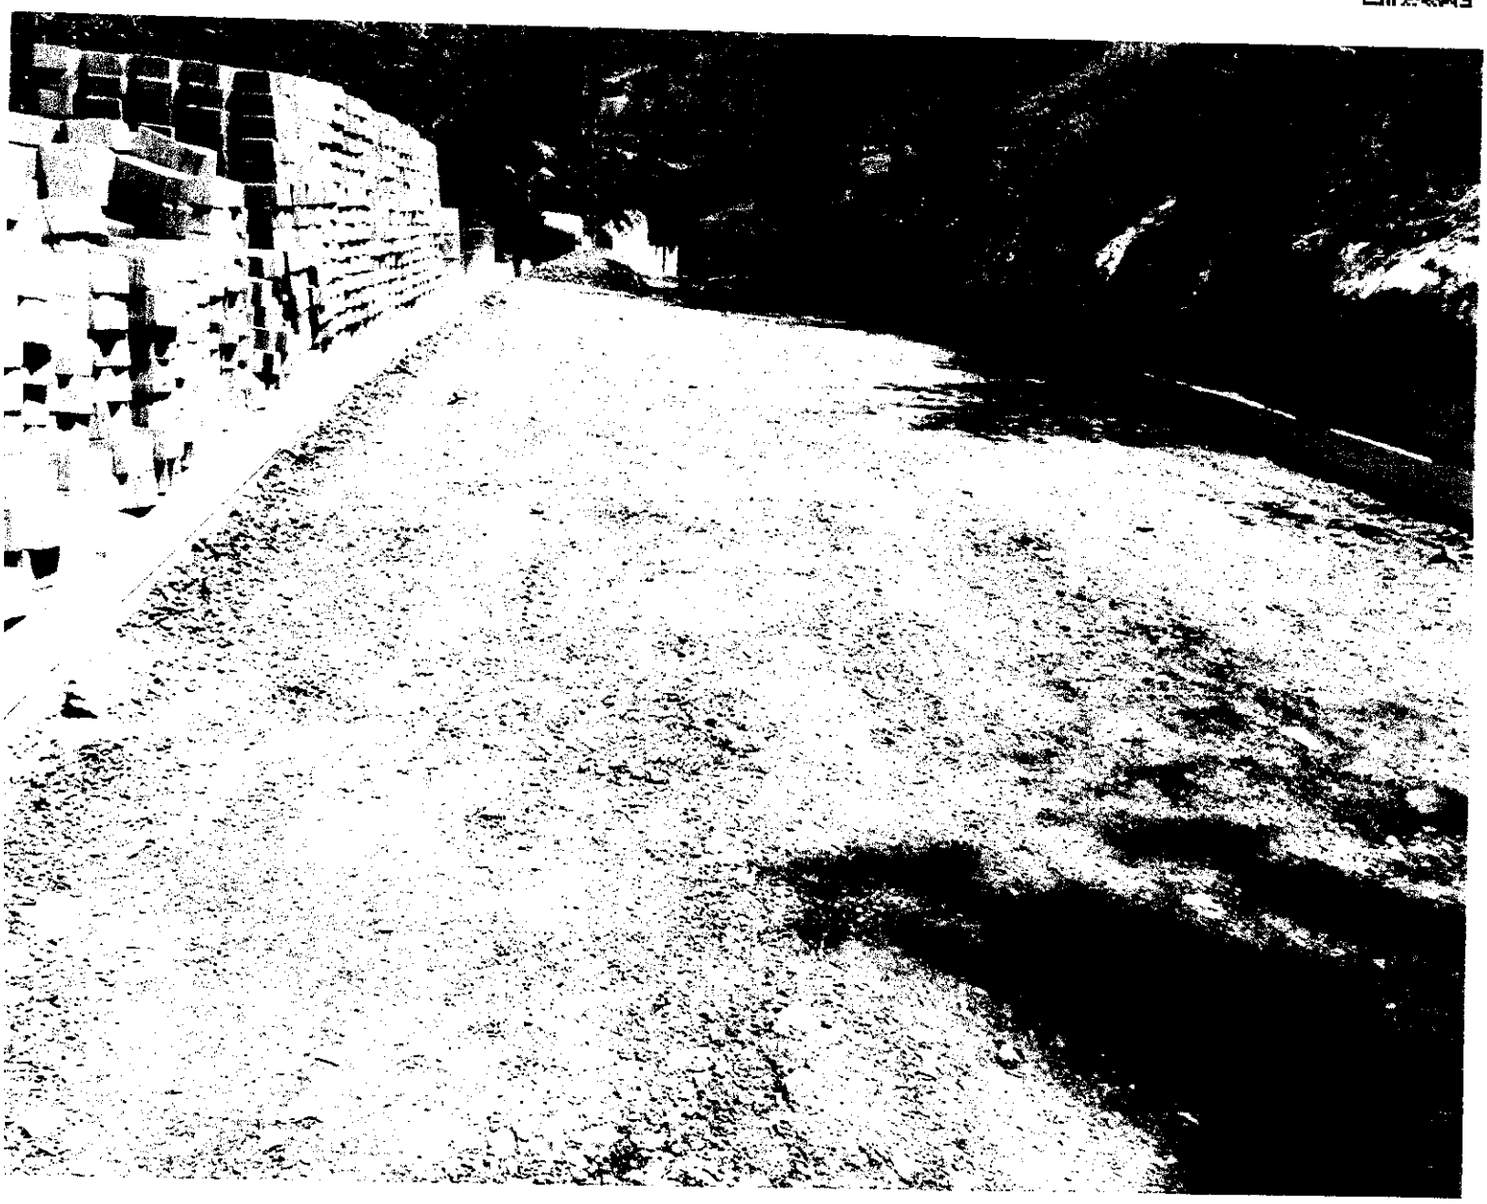


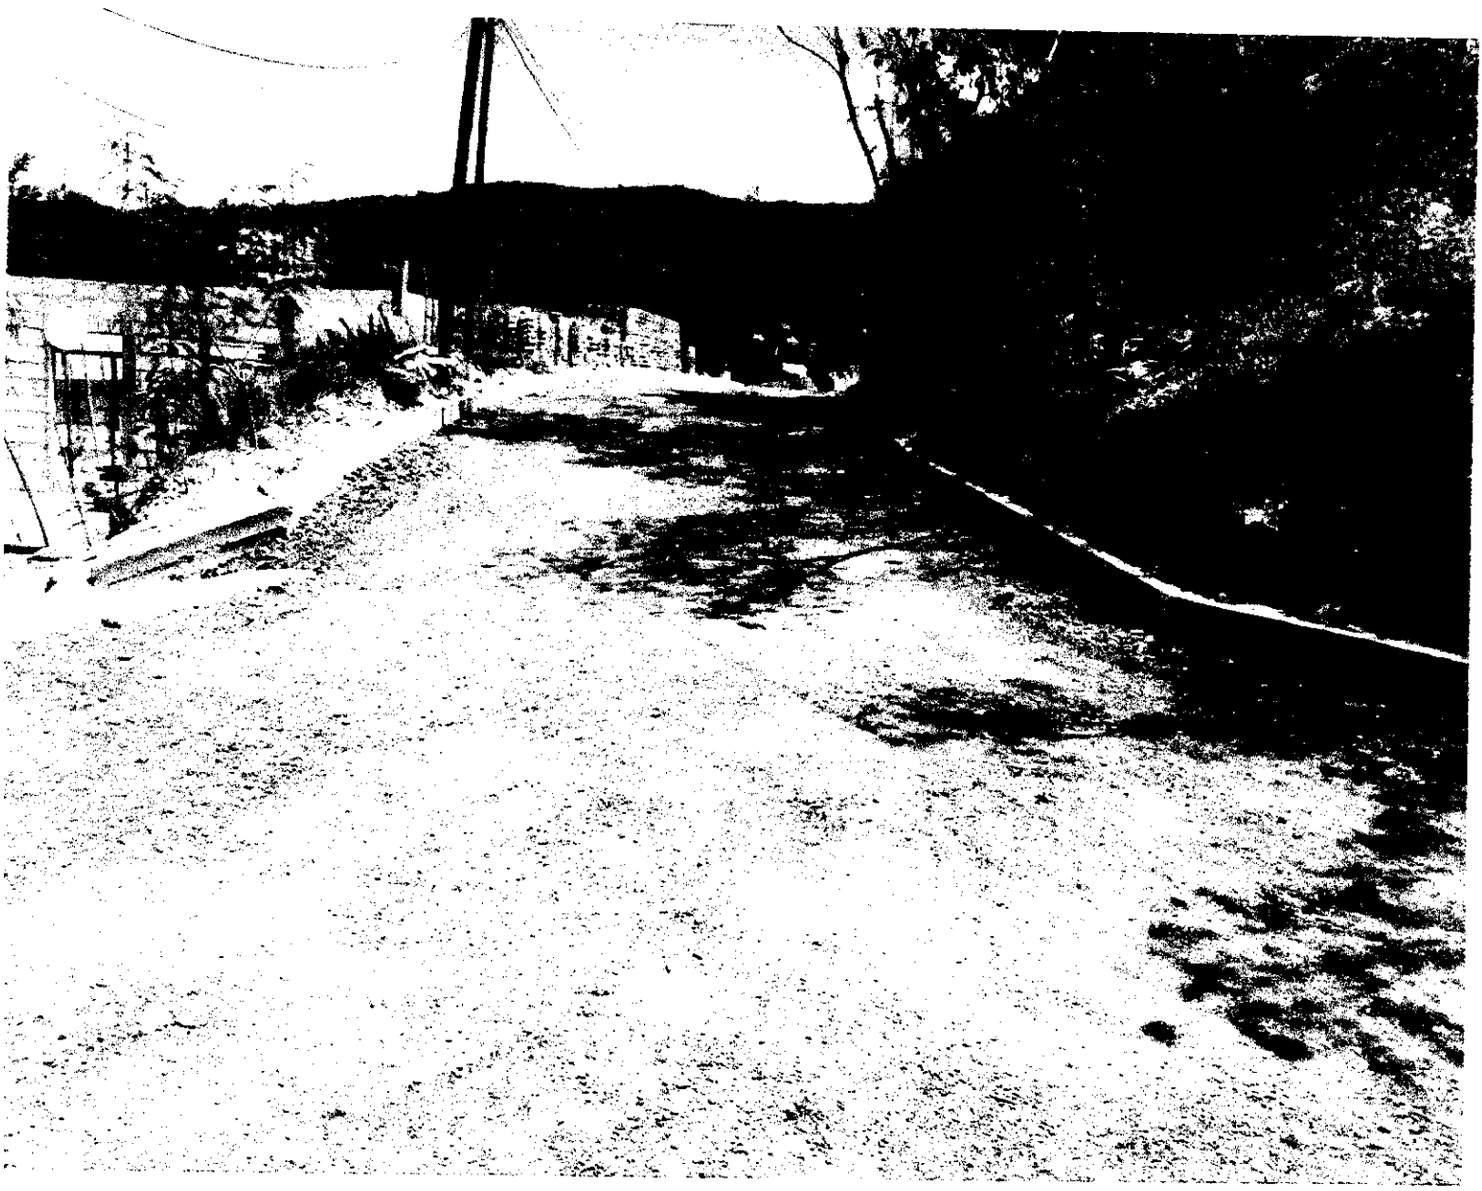

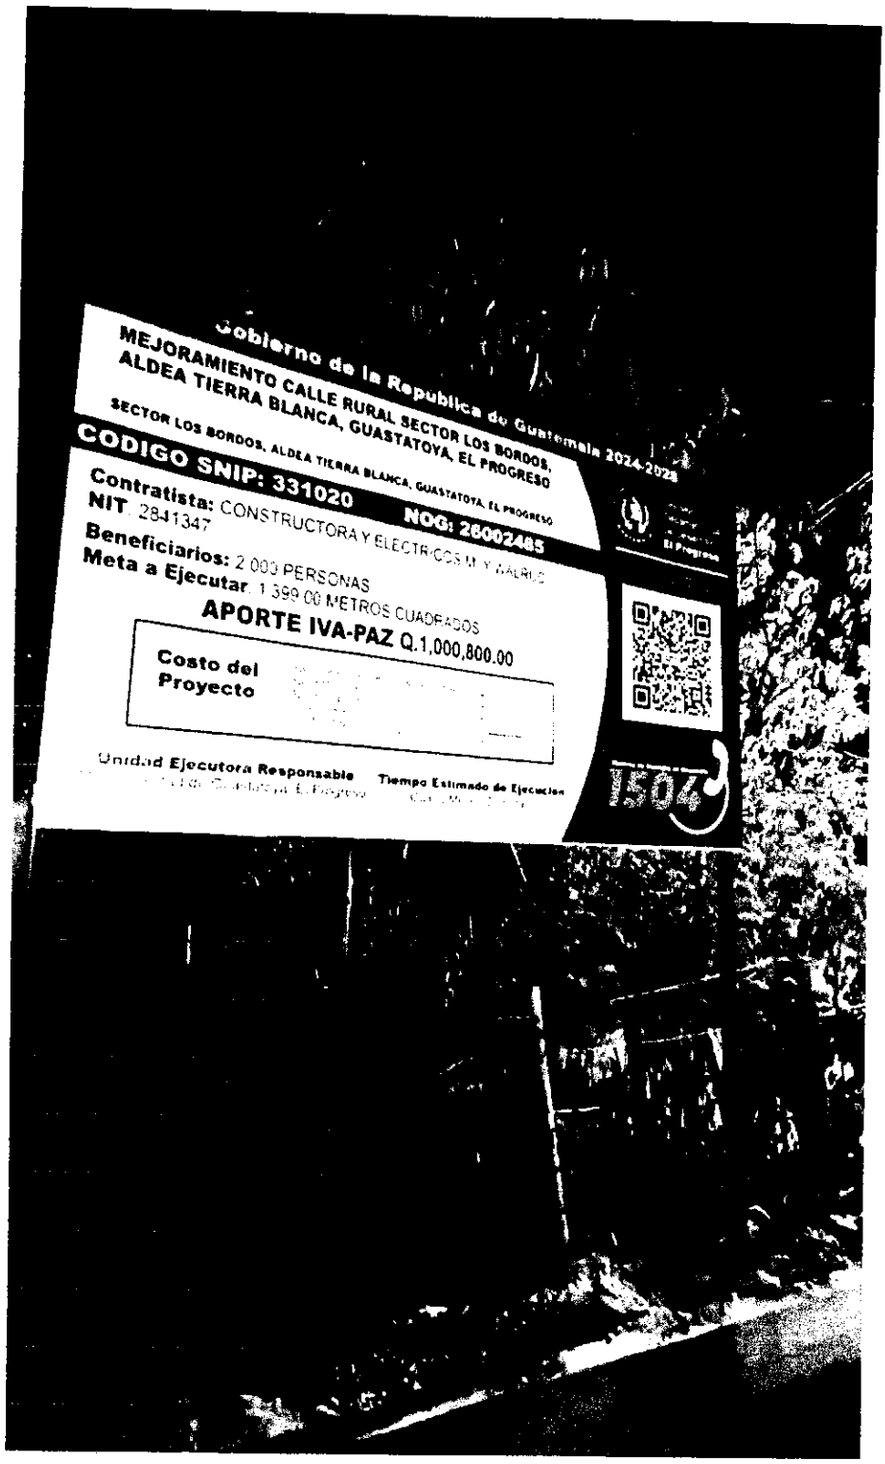
Gobierno de la República de Guatemala 2024-2028
MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS BORDOS, ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO
SECTOR LOS BORDOS, ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO
CODIGO SNIP: 331020
NOG: 26002485
Contratista: CONSTRUCTORA Y ELECTRICOS M Y VALRIZ
NIT: 2841347
Beneficiarios: 2 000 PERSONAS
Meta a Ejecutar: 1 399 00 METROS CUADRADOS
APORTE IVA-PAZ Q.1,000,800.00
Costo del Proyecto
Unidad Ejecutora Responsable
Tiempo Estimado de Ejecucion
1504





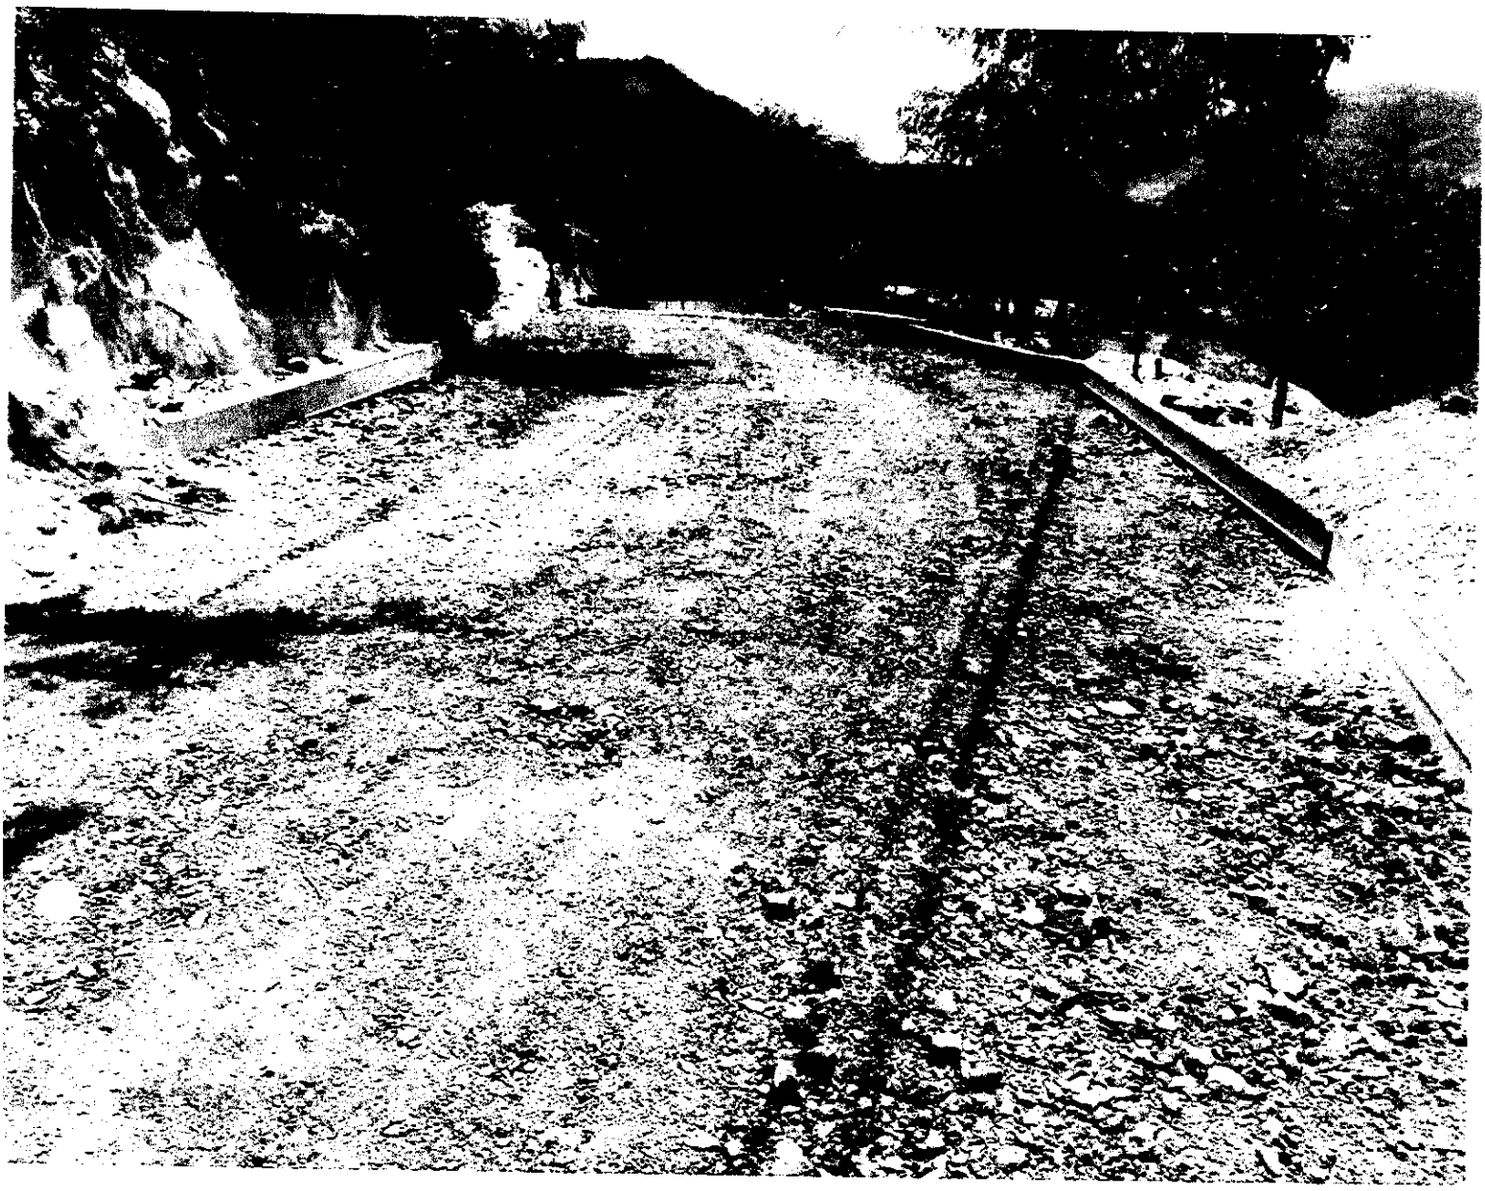



CGC

Bitácora Electrónica

FULGENCIO AGUILAR

Prevención
Confianza



RECIBO DE LA MUNICIPALIDAD

DE GUASTATOYA,
DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO

FORMA 7-B INGRESOS VARIOS

SERIE B **No. 656703**

FECHA: DIA 10 | MES 09 | AÑO 2025

POR: Doscientos mil quetzales con 00/100

CODIGO JURISDICCIONAL: D-4 5201

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: Consejo Departamental de Desarrollo

DIRECCION: El Progreso

ARBITRIOS	ORNATO Q.4.00 ☐ 10.00 ☐ 15.00 ☐ 50.00 ☐ 75.00 ☐ 100.00 ☐ 150.00 ☐ ☐ ☐	Q.	
TASAS	VARIOS		
	LICENCIAS		
	ESTACIONAMIENTOS		
	CERTIFICACIONES		
	CEDULAS		
	MERCADOS		
	SERVICIOS VARIOS		
	SERVICIOS AGUA		
	SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA		
CONTRIBUCIONES	CONCEPTO		
MULTAS	CONCEPTO		
OTROS	VARIOS Pago del 40.00% segundo desembolso del proyecto mejoramiento calle rural sector los bordos, aldea Tierra Blanca, Guastatoya, El Progreso. SNIP No. 331020, convenio 07-2025, fuente 21		Q200,000.00
		TOTAL Q.	Q200,000.00

LECTURA DE CONTADOR ACTUAL: ANTERIOR:

OBSERVACIONES:

VALIDO UNICAMENTE POR EL IMPORTE IMPRESO POR LA CAJA REGISTRADORA MUNICIPAL Y/O NOMBRE FIRMA Y SELLO DEL RECEPTOR MUNICIPAL

FIRMA DEL RECEPTOR MUNICIPAL

CUENTA

SUB-CUENTA

ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA ¡Sirviendo!

ORIGINAL-ENTERANTE

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA ¡Sirviendo!

AUTORIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS RES. BJ/5875 Clas.: 920-12-9-1-4-97 DEL 26-06-97.

4035611 T-0340 2045310 87

FORMULARIOS STANDARD, S. A. PBX: 2423-9900 - NIT: 1512227-7 - 76.000 - 11/2024 DE: Ms. 650.000 AL Ms. 725.000 SERIE B. ENVIO MUNICIPAL No. 43548 DE: 07/11/2024 NUMERO CORRELATIVO D-4-16-2024 DEL 07/11/2024 No. DE CUENTA: 2002-600-301-225-01 OFICIO SIN DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2001 LIBRO 000755 FOLIO 7

www.standard-s.com

MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!

5980-0535 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
BARRIO EL CALVARIO, **GUASTATOYA EL PROGRESO**

LA INFRASCRITA SECRETARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO,

CERTIFICA:

Que para su cumplimiento y efectos consiguientes se transcribe la **AUTENTICIDAD** del punto **CUARTO** del acta **59-2025** de fecha once de agosto de dos mil veinticinco del libro número 3,539 de sesiones ordinarias del Concejo Municipal, debidamente autorizado por la Contraloría General de Cuentas, el que copiado literalmente dice:

CUARTO: La Secretaria Municipal informa al Concejo Municipal que, Licenciado Alexis Geovanny Marroquín Orellana, Director de Planificación, presenta oficio Ref.agmo/DMP/333-2025, de fecha 11 de agosto de 2025, el cual en su parte conducente expone: "El motivo de la presente es para informarle que el proyecto **MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS BORDOS ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO**. Contrato administrativo número 09-2025 de fecha 04 de junio de 2025, ejecutado por la empresa **CONSTRUCTORA Y ELÉCTRICOS M. Y WALRUD**, presentó informe del 40% de avance físico. solicito que apruebe el pago del 40% de avance físico del proyecto antes mencionado a la empresa **CONSTRUCTORA Y ELÉCTRICOS M. Y WALRUD** siendo su propietario el señor **TOMAS REYES PICON**. " Consiguientemente y en cumplimiento al numeral 1) de la Cláusula Cuarta del contrato en referencia, presenta el informe de supervisión signado por el ingeniero JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA, Supervisor de Obras Municipales, por medio del cual informa de la estimación, del avance físico del referido proyecto, indicando que se encuentra en un avance físico del 40%, anexa el detalle que contiene los renglones de trabajo para la presente estimación. **CONSIDERANDO:** Que el artículo 59 del Decreto número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado, establece: "Estimaciones para pago. La entidad contratante podrá hacer pagos parciales al contratista contra estimaciones periódicas de trabajo ejecutado y aceptado, las que podrán efectuarse mensualmente de acuerdo con las estipulaciones pactadas." **CONSIDERANDO:** Que el Artículo 35 literal a), del Decreto 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Código Municipal y sus reformas establece: Atribuciones Generales del Concejo Municipal "son atribuciones del Concejo Municipal: a) La iniciativa, deliberación y decisión de los asuntos municipales...". **POR TANTO:** El Concejo Municipal, con fundamento en lo considerado y las facultades que le confiere el Código Municipal y sus reformas Decreto 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala, **UNANIMIDAD DE VOTOS. ACUERDA: I)** Se tiene por recibido el oficio presentado, agregándose al expediente de mérito. **II) APROBAR**, el pago equivalente al avance físico del 40%, a favor de la empresa mercantil **CONSTRUCTORA Y ELÉCTRICOS M. Y WALRUD**, propiedad del señor **TOMAS REYES PICON** de conformidad con el monto de estimación de avance físico, anexa el detalle que contiene los renglones de trabajo para la presente estimación, presentados por el Supervisor de Obras Municipales del proyecto **"MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS BORDOS, ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO"**, el que se ejecuta con el contrato 09-2025. **III)** Se le ordena al Director de Administración Financiera Integrada Municipal, hacer las operaciones contables correspondientes y proceder al pago de conformidad con lo aprobado en el numeral romano II) del presente punto resolutivo. **IV)** Notifíquese.

(Fs) Ilegibles José Elías Herrera Guerra, Alcalde Municipal, Ing. Byron Fernando Calderón Ferrera y Eduardo Ortega Loaiza, Síndicos Primero y Segundo respectivamente, Hernan Archila Morales, Erasmo Beltetón Contreras, Nery Rolando Archila Orellana, Julio Mauricio Marroquín González, Fryda Aimée Estrada Ortiz, Concejales Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto, respectivamente y Licda. Evelyn Yaneth Oajaca Marroquín, Secretaria Municipal.

DADO EN EL PALACIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE GUASTATOYA, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, A DOCE DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICINCO.

SECRETARIA

LICDA. EVELYN YANETH OAJACA MARROQUÍN
SECRETARIA MUNICIPA

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA ¡Sirviendo!
