MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA

5980-0535 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
BARRIO EL CALVARIO, **GUASTATOYA EL PROGRESO**

REPORTE DE PAGO DE PROYECTOS POR CONTRATO 2024

\EXPEDIENTE No. **283** NOG: **24715425** CONTRATO No. **29-2024**

PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE RURAL BARRIO SAN JUAN, ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

APORTES	% DE AVANCE	ESTIMACION	AMORTIZACION	LIQUIDO A RECIBIR
Aporte CODEDE	**90.00%**			
Q. 400,000.00		Q. 360,000.00	Q. 72,000.00	Q. 288,000.00
32 00 002 000 010 331 31-0101-0004				
Aporte MUNICIPALIDAD	**90.00%**			
Q. 199,000.00		Q. 179,100.00	Q. 35,820.00	Q. 143,280.00
32 00 002 000 010 331 21-0101-0001				
Aporte COMUNIDAD	**90.00%**			
Q. 500.00		Q. 450.00	Q. 90.00	Q. 360.00
32 00 002 000 010 331 31-3101-0002				
TOTALES		Q. 539,550.00	Q. 107,910.00	Q. 431,640.00

Se cuenta con Informe de supervisión por parte de la empresa, informe de supervisión por el Supervisor de Obras Municipales, Acuerdo de aprobación de avance, Copia de bitácora.

Lic. Alexis Geovanny Marroquín Orellana
Director Municipal de Planificación

BANRURAL
El amigo que te ayuda a crecer

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
Capital de la amistad

CUENTA UNICA DEL TESORO
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA C.U.T.
CUENTA No. 3-005-09207-3
GUATEMALA, C.A.

CHEQUE No. 79970

19806020

LUGAR Y FECHA: GUASTATOYA, 16 de MAYO del 2025

Q. ***31,640.00

PAGO A LA ORDEN DE: ***HERNANDEZ,GODOY,,FERNANDO,AUGUSTO***

SUMA DE: ***TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA*** QUETZALES.

No. GT86 BRRL 0101 0000 0030 0509 2073

FIRMA FIRMA

NO NEGOCIABLE

FORMULARIOS STANDARD S.A. PBX: 2422-8900

DESCRIPCION DEL PAGO
POR CONCEPTO: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 50% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE RURAL BARRIO SAN JUAN, ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO 79970

CUENTA No.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	NUMERO DE CHEQUE: 79970 CON NUMERO DE EXPEDIENTE: 283 TRANSACCION No: 61677411 NIT BENEFICIARIO: 9303111 DELMI.ORELLANA1652025 16 de MAYO del 2025 CONSTRUFER ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO FERNANDO AUGUSTO HERNANDEZ GODOY PROPIETARIO 2405873082205		

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	RECIBI CONFORME	DIA	MES	AÑO
			Fernando Hernandez	19	5	2025

Factura

FERNANDO AUGUSTO , HERNÁNDEZ GODOY
Nit Emisor: 9303111
CONSTRUFER
KILÓMETRO 73 RUTA AL ATLÁNTICO KILOMETRO 73 ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO
NIT Receptor: 6206107
Nombre Receptor: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
Dirección comprador: GUASTATOYA EL PROGRESO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
384B9866-B1F7-4B50-B5B9-DDA6C87DBCB3
Serie: 384B9866 Número de DTE: 2985773904
Numero Acceso:
Fecha y hora de emision: 16-may-2025 11:31:56
Fecha y hora de certificación: 16-may-2025 11:31:56
Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos	
1	Servicio	1	PAGO DEL 90.00% DE AVANCE CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE RURAL BARRIO SAN JUAN, ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO. ESTIMACION Q.539,550.00 (-) AMORTIZACIÓN Q.107,910.00. LÍQUIDO A RECIBIR: Q.431,640.00	539,550.00	0.00	539,550.00	IVA	57,808.928571
			TOTALES:		0.00	539,550.00	IVA	57,808.928571

* Sujeto a pagos trimestrales ISR

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

"Contribuyendo por el país que todos queremos"

FORMA 7-B INGRESOS VARIOS

RECIBO DE LA MUNICIPALIDAD

DE GUASTATOYA, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO

SERIE B **No.** 636301

FECHA: DIA 8 | MES 5 | AÑO 2025

Doscientos ochenta y ocho mil con 00/100

POR: quetzales — CODIGO JURISDICCIONAL: D-4 5201

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: Consejo Departamental de Desarrollo

DIRECCION: El Progreso

ARBITRIOS	ORNATO (Q.4.00 10.00 15.00 50.00 75.00 100.00 150.00)	Q.	
TASAS	VARIOS		
	LICENCIAS		
	ESTACIONAMIENTOS		
	CERTIFICACIONES		
	CEDULAS		
	MERCADOS		
	SERVICIOS VARIOS		
	SERVICIOS AGUA		
	SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA		
CONTRIBUCIONES	CONCEPTO	Pago del 90.00% segundo desembolso del	
MULTAS	CONCEPTO	proyecto calle Rural Barrio San Juan, Aldea	Q288,000.00
OTROS	VARIOS	Santa Rita, Guastatoya, El Progreso. SNIP 340093, Convenio No. 130-2024, Fuente 12, subprograma 0	

LECTURA DE CONTADOR: ACTUAL | ANTERIOR

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL RECEPTOR MUNICIPAL — CUENTA

TOTAL Q. Q288,000.00

VALIDO UNICAMENTE POR EL IMPORTE IMPRESO POR LA CAJA REGISTRADORA MUNICIPAL Y/O NOMBRE FIRMA Y SELLO DEL RECEPTOR MUNICIPAL

ORIGINAL-ENTERANTE

ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA ¡Sirviendo!

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA ¡Sirviendo!

AUTORIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS S/RES. No. BJ./5675 Clas.: 920-12-9-1-4-97 DEL 26-06-97.

2045310 T-0340 1019911 87

FORMULARIOS STANDARD, S.A. PBX: 2428-9000 - NIT: 1532227-1 - 150,000 - 100,000 (1) No. 550,001 AL No. 650,000. SERIE B. EMPOMUNICIPAL No. 4510 DE FECHA 13/10/2022 NUMERO CORRELATIVO D-4-10-2022 DE FECHA 13/10/2022 No. DE CUENTA: T3-2-1 OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 10/10/2022 LIBRO 05/155 FOLIO 1.

www.standard-s.com

CONSTRUFER
CONSTRUYENDO GUATEMALA

Aldea Casas Viejas, Guastatoya El Progreso, 05 de abril del año 2025

Señor:
Alcalde
José Elías Herrera Guerra
Municipalidad de Guastatoya
Departamento de El Progreso
Presente.

Por este medio me dirijo a usted, deseándole muchos éxitos y bendiciones en tan distinguido cargo.

El motivo de la presente es para solicitar se nombre a la comisión respectiva de la oficina de planificación para evaluación física del Proyecto denominado: "**MEJORAMIENTO CALLE RURAL BARRIO SAN JUAN, ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO**", según contrato Administrativo Número (29-2024), de fecha nueve de diciembre del año 2,024, ubicado en Barrio San Juan, Aldea Santa Rita, Guastatoya, El Progreso.

Dicha obra tiene un **avance físico del 90.00%,** es por ello que se solicita realizar los trámites correspondientes para el desembolso del porcentaje antes mencionado.

Al oficio se adjuntan los siguientes documentos:
- ✓ Cuadro de estimación
- ✓ Registro fotográfico

Agradeciendo la atención prestada, y en espera de una respuesta positiva, me es grato el suscribirme.

Atentamente,

F._____

CONSTRUFER
ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO
FERNANDO AUGUSTO HERNANDEZ GODOY
PROPIETARIO

Fernando Augusto Hernández Godoy
Propietario
CONSTRUFER

Propietario: Fernando Augusto Hernández Godoy, Km. 73, Aldea Casas Viejas, Guastatoya, El Progreso
Cel.: 5000-5317, Correo Electrónico: construfercho.1979@gmail.com

CONSTRUFER
CONSTRUYENDO GUATEMALA

CONSTRUFER

ESTIMACIÓN DE TRABAJO No. 1

PROYECTO: **"MEJORAMIENTO CALLE RURAL BARRIO SAN JUAN, ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO"**

MONTO DEL CONTRATO: **Q. 599,500.00**

No. RENGLÓN	RENGLONES DE TRABAJO/CANTIDADES			PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANTIDADES EJECUTADAS (ACTUALES Y ACUMULADAS)						% EJECUTADO DEL RENGLÓN	% TOTAL EJECUTADO
	DESCRIPCION	CANTIDAD CONTRATADA	UNIDAD			ESTE PERIODO	PERIODO ANTERIOR	ACUMULADO	ESTE PERIODO	PERIODO ANTERIOR	ACUMULADO		
	TRABAJOS PRELIMINARES												
101.00	Limpieza y Chapeo	746.90	m2	Q 9.00	Q 6,722.10	746.90	0.00	746.90	Q 6,722.10	Q -	Q 6,722.10	100.00%	1.12%
102.00	Replanteo topografico	746.90	m	Q 19.10	Q 14,265.79	746.90	0.00	746.90	Q 14,265.79	Q -	Q 14,265.79	100.00%	2.38%
103.00	Corte de Cajuela + Cortes laterales Altura de corte 0.30m con retiro de material	224.00	m3	Q 290.00	Q 64,960.00	224.00	0.00	224.00	Q 64,960.00	Q -	Q 64,960.00	100.00%	10.84%
	BASE Y COMPACTACION												
201.00	Tendido + compactación de base granular (e= 0.15 m. compactado)	112.00	m3	Q 497.90	Q 55,764.80	112.00	0.00	112.00	Q 55,764.80	Q -	Q 55,764.80	100.00%	9.30%
	PAVIMENTO												
301.00	Pavimento concreto 4000 psi, e=0.15 mts (proporción 1:2:2, vibrado de concreto)	692.40	m2	Q 461.50	Q 319,542.60	692.40	0.00	692.40	Q 319,542.60	Q -	Q 319,542.60	100.00%	53.30%
302.00	Rampa de ingreso de 4000 psi e=0.15 mts	11.00	m2	Q 789.75	Q 8,687.25	11.00	0.00	11.00	Q 8,687.25	Q -	Q 8,687.25	100.00%	1.45%
303.00	Corte y sello de juntas en pavimento y bordillos	426.00	m	Q 56.00	Q 23,856.00	426.00	0.00	426.00	Q 23,856.00	Q -	Q 23,856.00	100.00%	3.98%
	BORDILLOS												
401.00	Bordillo de 0.10x0.40 m concreto tipo 3000 psi	363.00	m	Q 259.59	Q 94,231.17	176.25	0.00	176.25	Q 45,751.46	Q -	Q 45,751.46	48.55%	7.63%
	PINTURA												
501.00	Pintura en bordillos en parte interna y superior + vialetas	363.00	m	Q 20.90	Q 7,586.70	0.00	0.00	0.00	Q -	Q -	Q -	0.00%	0.00%
	LIMPIEZA												
601.00	Limpieza final del proyecto (746.90 m2)	1.00	unidad	Q 3,883.59	Q 3,883.59	0.00	0.00	0.00	Q -	Q -	Q -	0.00%	0.00%
	Total cantidad contratada				Q 599,500.00	Cantidad ejecutada			Q 539,550.00	Q -	Q 539,550.00	TOTAL %	90.00%

MONTO BRUTO DE ESTA ESTIMACIÓN	Q 539,550.00
MONTO DE ESTIMACIONES	Q 539,550.00
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO 20%	Q 107,910.00
LIQUIDO A RECIBIR	Q 431,640.00

CONSTRUFER
ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO
FERNANDO AUGUSTO HERNANDEZ GODOY
PROPIETARIO

FERNANDO AUGUSTO HERNANDEZ GODOY
PROPIETARIO
CONSTRUFER

JOEL AMADO ORELLANA
Colegiado 18357
SUPERVISOR DE LA EMPRESA

JOEL AMADO ORELLANA
INGENIERO CIVIL
CON ENFASIS EN CONSTRUCCIONES RURALES
COLEGIADO No. 18,357

CONSTRUFER
CONSTRUYENDO GUATEMALA

Registro Fotográfico

"MEJORAMIENTO CALLE RURAL BARRIO SAN JUAN, ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO"

Contrato Administrativo Número (29-2024)







CONSTRUFER
ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGR
FERNANDO AUGUSTO HERNANDEZ GOD
PROPIETARIO


CONSTRUFER
CONSTRUYENDO GUATEMALA

Registro Fotográfico

"MEJORAMIENTO CALLE RURAL BARRIO SAN JUAN, ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO"

Contrato Administrativo Número (29-2024)



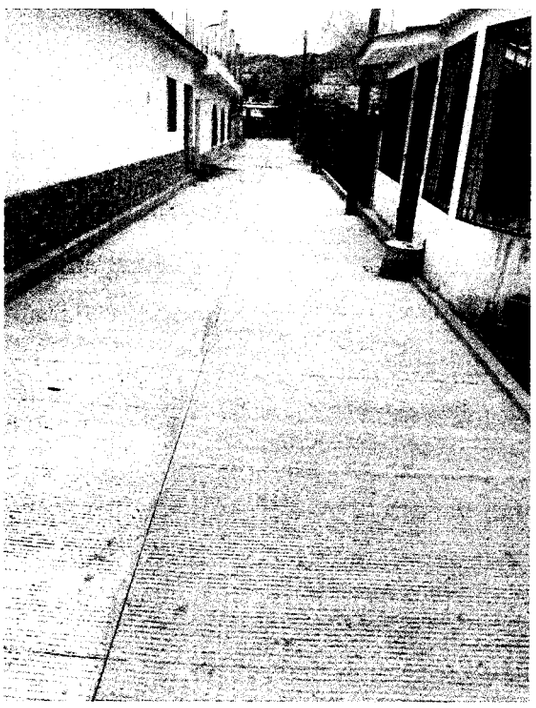



CONSTRUFER
ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO
FERNANDO AUGUSTO HERNANDEZ GODOY
PROPIETARIO

CONSTRUFER
CONSTRUYENDO GUATEMALA


Registro Fotográfico

"MEJORAMIENTO CALLE RURAL BARRIO SAN JUAN, ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO"

Contrato Administrativo Número (29-2024)





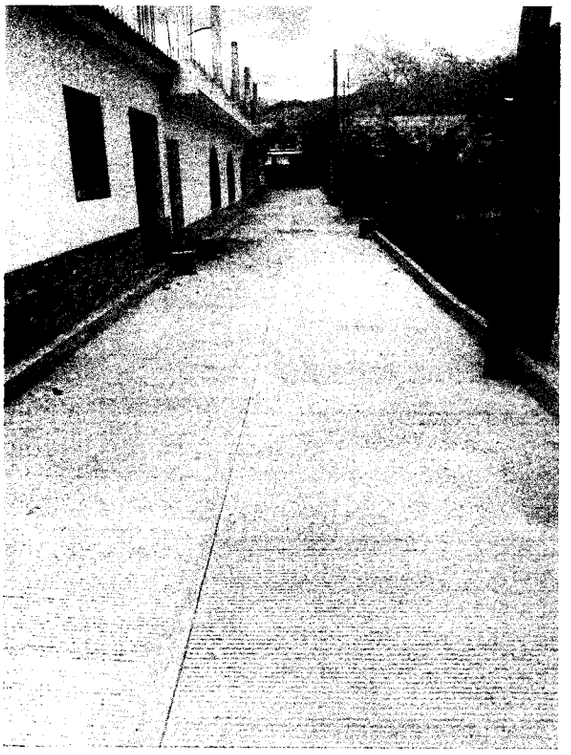


CONSTRUFER
ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO
FERNANDO AUGUSTO HERNANDEZ GODOY
PROPIETARIO

CONSTRUFER
CONSTRUYENDO GUATEMALA

Registro Fotográfico

"MEJORAMIENTO CALLE RURAL BARRIO SAN JUAN, ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO"

Contrato Administrativo Número (29-2024)

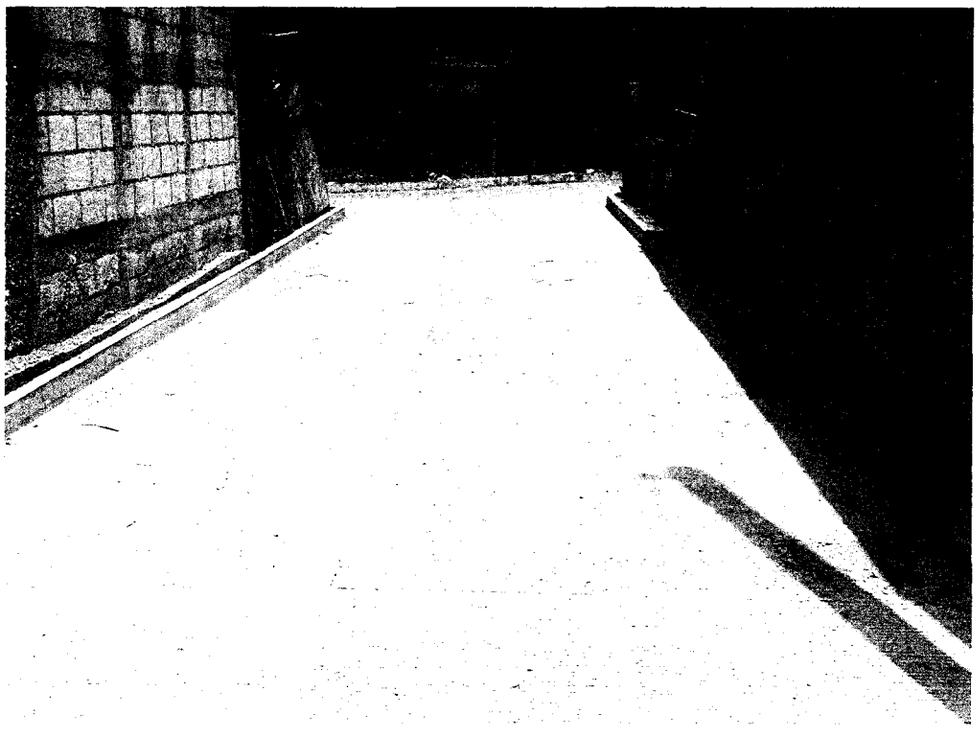

F._____

CONSTRUFER
ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO
FERNANDO AUGUSTO HERNANDEZ GODOY
PROPIETARIO

Fernando Augusto Hernández Godoy
Propietario
CONSTRUFER

CONCURSO: Adición de anexos al concurso en la Fase de Ejecución

Mensaje de confirmación	
13.may..2025 13:13:32	
Documentos asociados:	
1	24715425@INFORME DE SUPERVISION 90 AVANCE FISICO CALLE BARRIO SAN JUAN.pdf(2183 KB)
Si desea imprimir este mensaje, oprima el siguiente botón	

MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!

5980-0535 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
BARRIO EL CALVARIO, **GUASTATOYA EL PROGRESO**

INFORME DE SUPERVISION

Guastatoya, 08 de Abril de 2025

SEÑOR: JOSE ELIAS HERRERA GUERRA Y CONCEJO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
EL PROGRESO

De la manera más atenta me dirijo a usted deseándole toda clase de éxitos en sus labores diarias.

El motivo de la presente es para hacerle saber lo siguiente:

En visita de supervisión realizada al proyecto denominado **MEJORAMIENTO CALLE RURAL BARRIO SAN JUAN, ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO,** con número de contrato **29-2024** de fecha 09 de Diciembre de 2024, ejecutado por la empresa **CONSTRUFER**, financiado por la Municipalidad de Guastatoya, se tiene a la vista el oficio de Abril de 2025 en el cual se hace la solicitud de la estimación del proyecto para un avance del **90.00%**, para lo cual se adjunta el informe de supervisión y el informe de parte de la empresa.

Agradeciendo su atención y en espera de darle seguimiento a este asunto me suscribo de ustedes.

Atentamente

José F. Alexander Aguilar Mejia
Ingeniero Civil
Colegiado No. 9,366

ING. JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA
SUPERVISOR MUNICIPAL, GUASTATOYA
EL PROGRESO

D.M.P.	SUPERVISION DE OBRAS	Dirección Municipal de Planificación

Comunidad.	Contrato Municipal.
Aldea Santa Rita, Guastatoya, El Progreso	29-2024

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del proyecto.	Ubicación del proyecto.
MEJORAMIENTO CALLE RURAL BARRIO SAN JUAN, ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Aldea Santa Rita, Guastatoya, El Progreso
Contratista. CONSTRUFER **Monto Contratado.** Q 599,500.00	**Ubicación del proyecto.** Aldea Santa Rita, Guastatoya, El Progreso **Avance Físico.** 90.00%
Informe de Supervisión No. 1	**Fecha.** 08 de Abril de 2025

2. AVANCE DE EJECUCION DEL PROYECTO

No.	Descripcion del Renglón	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Total a la Fecha	Avance Físico %
1	TRABAJOS PRELIMINARES						
1.01	LIMPIEZA Y CHAPEO	746.90	M2	Q 9.00	Q 6,722.10	Q 6,722.10	100%
1.02	REPLANTEO TOPOGRAFICO	746.90	M	Q 19.10	Q 14,265.79	Q 14,265.79	100%
1.03	CORTE DE CAJUELA + CORTES LATERALES ALTURA DE CORTE 0.30m CON RETIRO DE MATERIAL	224.00	M3	Q 290.00	Q 64,960.00	Q 64,960.00	100%
2	BASE Y COMPACTACION						
2.01	TENDIDO + COMPACTACION DE BASE GRANULAR (e=0.15m compactado)	112.00	M3	Q 497.90	Q 55,764.80	Q 55,764.80	100%
3	PAVIMENTO						
3.01	PAVIMENTO DE CONCRETO 4000 PSI, e=0.15 mts (PROPORCION 1:2:2, VIBRADO DE CONCRETO)	692.40	M2	Q 461.50	Q 319,542.60	Q 319,542.60	100%
3.02	RAMPA DE INGRESO DE 4000 PSI e=0.15mts	11.00	M2	Q 789.75	Q 8,687.25	Q 8,687.25	100%
3.03	CORTE Y SELLO DE JUNTAS EN PAVIMENTO Y BORDILLOS	426.00	M	Q 56.00	Q 23,856.00	Q 23,856.00	100%
4	BORDILLOS						
4.01	BORDILLO DE 0.10X0.40 m CONCRETO TIPO 3000 PSI	176.25	M	Q 259.59	Q 45,751.46	Q 45,751.46	49%
5	PINTURA						
5.01	PINTURA EN BORDILLOS EN PARTE INTERNA Y SUPERIOR + VIALETAS	-	M	Q 20.90	Q -	Q -	0%
6	LIMPIEZA						
6.01	LIMPIEZA FINAL DEL PROYECTO (746.90 m2)	-	UNIDAD	Q 3,883.59	Q -	Q -	0%
					Q 539,550.00	**Q 539,550.00**	**90.00%**

Estos renglones de trabajo dan como resultado un avance físico del **90.00%** **por lo cual se aprueba realizar el pago correspondiente**

3. DESCRIPCION DEL PROYECTO.

Este proyecto consiste en el mejoramiento de la calle en el barrio san juan, se va a colocar pavimento de concreto en 4 calles del sector ademas de bordillo fundido, este proyecto viene a beneficiar a los vecinos del sector

4. RECOMENDACIONES.

Chequear los trabajos realizados para garantizar la durabilidad de los mismos, y terminar los trabajos faltantes, los que no se encuentran al 100 % y los que no se han iniciado aun

SUPERVISOR DE PROYECTOS MUNICIPALES.

ALCALDE

José F. Alexander Aguilar Mejia
Ingeniero Civil
Colegiado No. 9,366

ING. JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA
SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA ¡Sirviendo!

JOSE ELIAS HERRERA GUERRA
ALCALDE MUNICIPAL DE GUASTATOYA

D.M.P.	SUPERVISION DE OBRAS	Dirección Municipal de Planificación


1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO


Nombre del proyecto.	**Ubicación del proyecto.**
MEJORAMIENTO CALLE RURAL BARRIO SAN JUAN, ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Aldea Santa Rita, Guastatoya, El Progreso

2. INFORME FOTOGRAFICO.





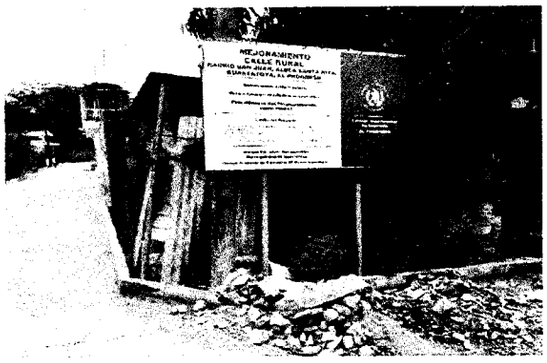

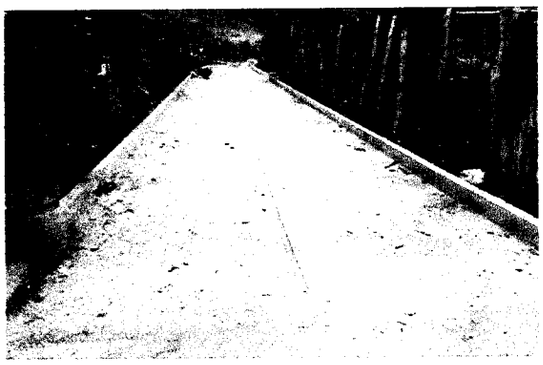





SUPERVISOR DE PROYECTOS MUNICIPALES.

José F. Alexander Aguilar Mejia
Ingeniero Civil
Colegiado No. 9 366

ING. JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA
SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES

JOSE ELIAS HERRERA GUERRA
ALCALDE MUNICIPAL DE GUASTATOYA

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA ¡Sirviendo

REPORTE DE AVANCE FISICO No. 1

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO CALLE RURAL BARRIO SAN JUAN, ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	
Municipio: GUASTATOYA	Departamento: EL PROGRESO
Comunidad: ALDEA SANTA RITA	Fecha de Contrato: 09/12/2024
Fecha de Inicio: 29/01/2025	Fecha de Supervision: 08/04/2025
Fecha de Finalizacion: 28/06/2025	Unidad Ejecutora: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
Contrato No.: 29-2024	Valor del Proyecto: Q.599,500.00
Modificaciones:	Valor Original: Q.599,500.00
Constructora: CONSTRUFER	Telefono:
Representante legal: FERNANDO AUGUSTO HERNANDEZ GODOY	

RESUMEN DE RENGLONES

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES DE TRABAJO				ORDEN DE CAMBIO	ORDEN DE TRABAJO SUPLEMENTARIO	ORDEN DE TRABAJO EXTRA	RENGLON MODIFICADO	CANTIDADES EJECUTADAS PRIMERA ESTIMACION		ACUMULADO A LA FECHA		PORCENTAJE
		CANTIDAD	UNIDAD	P UNITARIO	TOTAL	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	TOTAL
1	TRABAJOS PRELIMINARES													
1.01	LIMPIEZA Y CHAPEO	746.90	M2	Q 9.00	Q 6,722.10					746.90	Q 6,722.10	746.90	Q 6,722.10	1.12%
1.02	REPLANTEO TOPOGRAFICO	746.90	M	Q 19.10	Q 14,265.79					746.90	Q 14,265.79	746.90	Q 14,265.79	2.38%
1.03	CORTE DE CAJUELA + CORTES LATERALES ALTURA DE CORTE 0.30m CON RETIRO DE MATERIAL	224.00	M3	Q 290.00	Q 64,960.00					224.00	Q 64,960.00	224.00	Q 64,960.00	10.84%
2	BASE Y COMPACTACION													
2.01	TENDIDO + COMPACTACION DE BASE GRANULAR (e=0.15m compactado)	112.00	M3	Q 497.90	Q 55,764.80					112.00	Q 55,764.80	112.00	Q 55,764.80	9.30%
3	PAVIMENTO													
3.01	PAVIMENTO DE CONCRETO 4000 PSI, e=0.15 mts (PROPORCION 1:2:2, VIBRADO DE CONCRETO)	692.40	M2	Q 461.50	Q 319,542.60					692.40	Q 319,542.60	692.40	Q 319,542.60	53.30%
3.02	RAMPA DE INGRESO DE 4000 PSI e=0.15mts	11.00	M2	Q 789.75	Q 8,687.25					11.00	Q 8,687.25	11.00	Q 8,687.25	1.45%
3.03	CORTE Y SELLO DE JUNTAS EN PAVIMENTO Y BORDILLOS	426.00	M	Q 56.00	Q 23,856.00					426.00	Q 23,856.00	426.00	Q 23,856.00	3.98%
4	BORDILLOS													
4.01	BORDILLO DE 0.10X0.40 m CONCRETO TIPO 3000 PSI	363.00	M	Q 259.59	Q 94,231.17					176.25	Q 45,751.46	176.25	Q 45,751.46	7.63%
5	PINTURA													
5.01	PINTURA EN BORDILLOS EN PARTE INTERNA Y SUPERIOR + VIALETAS	363.00	M	Q 20.90	Q 7,586.70					-	Q -	-	Q -	0.00%
6	LIMPIEZA													
6.01	LIMPIEZA FINAL DEL PROYECTO (746.90 m2)	1.00	UNIDAD	Q 3,883.59	Q 3,883.59					-	Q -	-	Q -	0.00%
	COSTO TOTAL DEL PROYECTO				Q 599,500.00						Q 539,550.00		Q 539,550.00	90.00%

VALOR DE ESTIMACION No. 1	Q 539,550.00
AMORTIZACION DEL ANTICIPO (20%)	Q 107,910.00
PENDIENTE DE AMORTIZAR	Q 11,990.00
LIQUIDO A RECIBIR	Q 431,640.00

José F. Alexander Aguilar Mejia
Ingeniero Civil
Colegiado No. 9,366

JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES

ALCALDE

JOSE E. ARIAS HERRERA GUERRA
ALCALDE MUNICIPAL GUASTATOYA

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA ¡Sirviendo

Contraloría General de Cuentas
GUATEMALA, C.A.

Bitácora Electrónica

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA Y GESTIÓN AMBIENTAL

UNIDAD DE BITÁCORAS – DATOS DE LA BITÁCORA ELECTRÓNICA –

BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 4562/12/2024	
No. CONTRATO	29-2024
FECHA CONTRATO	09/12/2024
MONTO CONTRACTUAL	599,500.00
NOG	24715425
NOMBRE DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO CALLE RURAL BARRIO SAN JUAN, ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO
UBICACIÓN DEL PROYECTO	Guastatoya, EL PROGRESO
ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JOEL AMADO ORELLANA
EMPRESA EJECUTORA	FERNANDO AUGUSTO HERNÁNDEZ GODOY
REPRESENTANTE LEGAL O CONTRATISTA	FERNANDO AUGUSTO HERNÁNDEZ GODOY
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA
SUPERVISOR EMPRESA SUPERVISORA	

FECHA DE AUTORIZACIÓN 13/12/2024

BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 4562/12/2024

CONTRATO No. 29-2024

NOMBRE: MEJORAMIENTO CALLE RURAL BARRIO SAN JUAN, ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

REGISTRO No.	1
FECHA	11/02/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	ITACORA DE INICIO DE PROYECTO se adjunta acta de inicio no 02-2025 para hacer constar el inicio de los trabajos a realizar en el proyecto MEJORAMIENTO CALLE RURAL BARRIO SAN JUAN, ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA



Municipalidad de Guastatoya, Departamento de El Progreso

DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION

LIBRO DE ACTAS DE INICIO DE OBRAS Nº 0180

ACTA DE INICIO NO. 02-2025

PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE RURAL BARRIO SAN JUAN, ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO. IDENTIFICADO CON NOG. 24715425, EN GUATECOMPRAS. ----------

En el Municipio de Guastatoya, Departamento El Progreso, siendo las diez horas en punto del día miércoles veintinueve de enero de dos mil veinticinco, reunidos en el área donde se va a ejecutar el Proyecto, **MEJORAMIENTO CALLE RURAL BARRIO SAN JUAN, ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO.** Los señores: José Elías Herrera Guerra, Alcalde Municipal; Ing. José Fulgencio Alexander Aguilar Mejía, Supervisor de Obras Municipales; Fernando Augusto Hernández Godoy, Representante Legal de la Empresa Constructora; Ing. Joel Amado Orellana, Supervisor Residente del Proyecto; Lic. Alexis Geovanny Marroquín Orellana, Director de la Dirección Municipal de Planificación; con el objeto de dejar constancia de lo siguiente. **PRIMERO:** Se facciona la presente acta para dejar constancia de Inicio del Proyecto: **MEJORAMIENTO CALLE RURAL BARRIO SAN JUAN, ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO.** El cual será ejecutado con fondos provenientes del aporte constitucional para la inversión del ejercicio fiscal 2,024 de forma tripartita (Consejo Departamental de Desarrollo, Municipalidad, Consejo Comunitario de Desarrollo); por un Valor de Quinientos Noventa y Nueve Mil Quinientos Quetzales Exactos (Q. 599,500.00), con un plazo de cinco meses calendario el cual, por adjudicación en los procesos y requisitos de GUATECOMPRAS, lo ejecutará la empresa **CONSTRUFER,** Habiendo sido publicado en el Sistema de Guatecompras la adjudicación bajo el NOG- 24715425, Según Contrato Administrativo No. 29-2024 de fecha nueve de diciembre del dos mil veinticuatro. **SEGUNDO:** Los señores anteriormente mencionados declaran iniciados los trabajos, los cuales se realizarán con base a planos y especificaciones elaboradas para el presente proyecto y de acuerdo al contrato respectivo. **TERCERO:** El Señor Alcalde Municipal recomienda al representante de la empresa constructora, al supervisor residente de la empresa y supervisor de obras municipales que los trabajos sean ejecutados en base al diseño y especificaciones propias de este proyecto y presentar los avances del mismo para el pago respectivo con la documentación de soporte. **CUARTO:** No habiendo más que agregar se da por terminada la presente en el mismo lugar y fecha media hora después de su inicio. Leída se acepta, ratifica y firma por los que en ella intervenimos Damos fe. ----------

ALCALDE

José Elías Herrera Guerra
Alcalde Municipal

Lic Alexis Geovanny Marroquín Orellana
Director
Dirección Municipal de Planificación

CONSTRUFER

Fernando Augusto Hernández Godoy
Representante de la empresa

Ing. Joel Amado Orellana
Supervisor Residente

Ing. José Fulgencio Alexander Aguilar Mejía
Supervisor de Obras Municipales


BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 4562/12/2024

CONTRATO No. 29-2024

NOMBRE: MEJORAMIENTO CALLE RURAL BARRIO SAN JUAN, ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

REGISTRO No.	2
FECHA	10/03/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	El pavimento se encuentra colocado en unos tramos, al igual que los bordillos, se cuenta con personal y materiales suficientes para el avance del proyecto
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA

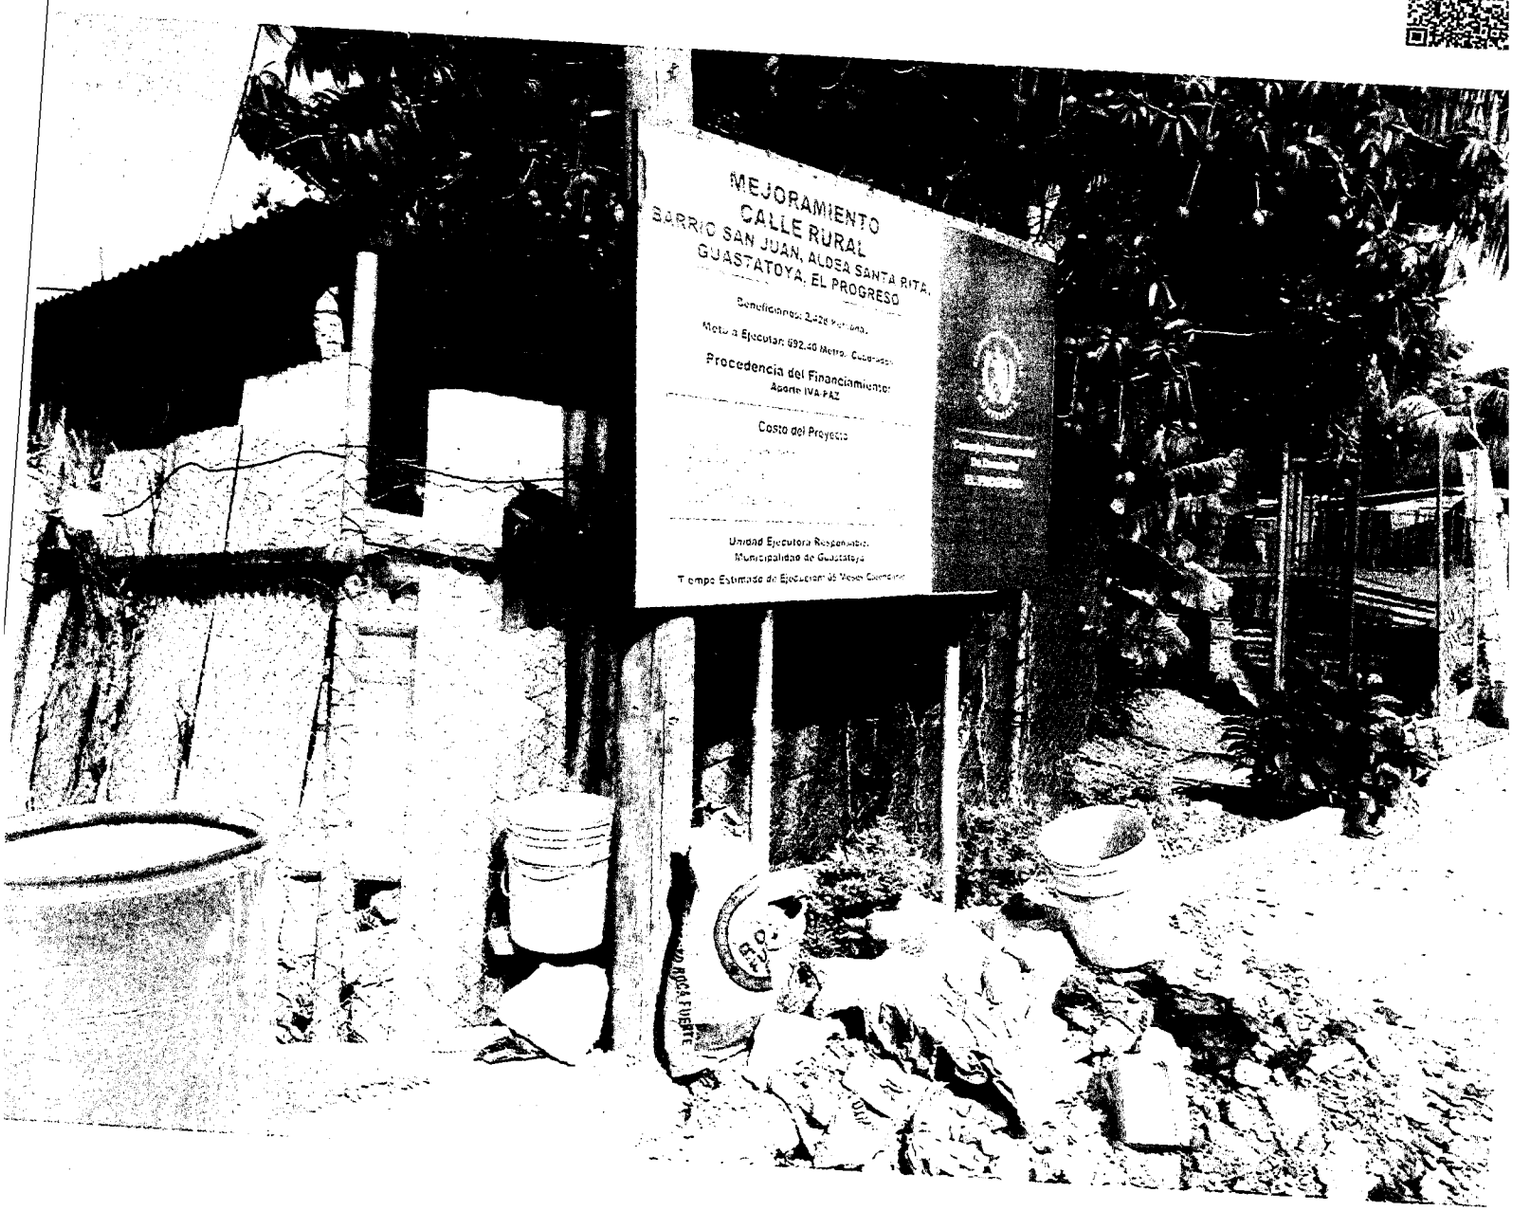

MEJORAMIENTO
CALLE RURAL
BARRIO SAN JUAN, ALDEA SANTA RITA,
GUASTATOYA, EL PROGRESO
Beneficiarios: 2428 personas
Metros a Ejecutar: 692.40 Metros Cuadrados
Procedencia del Financiamiento:
Aporte IVA-PAZ
Costo del Proyecto
Unidad Ejecutora Responsable:
Municipalidad de Guastatoya
Tiempo Estimado de Ejecucion: 06 Meses Calendario









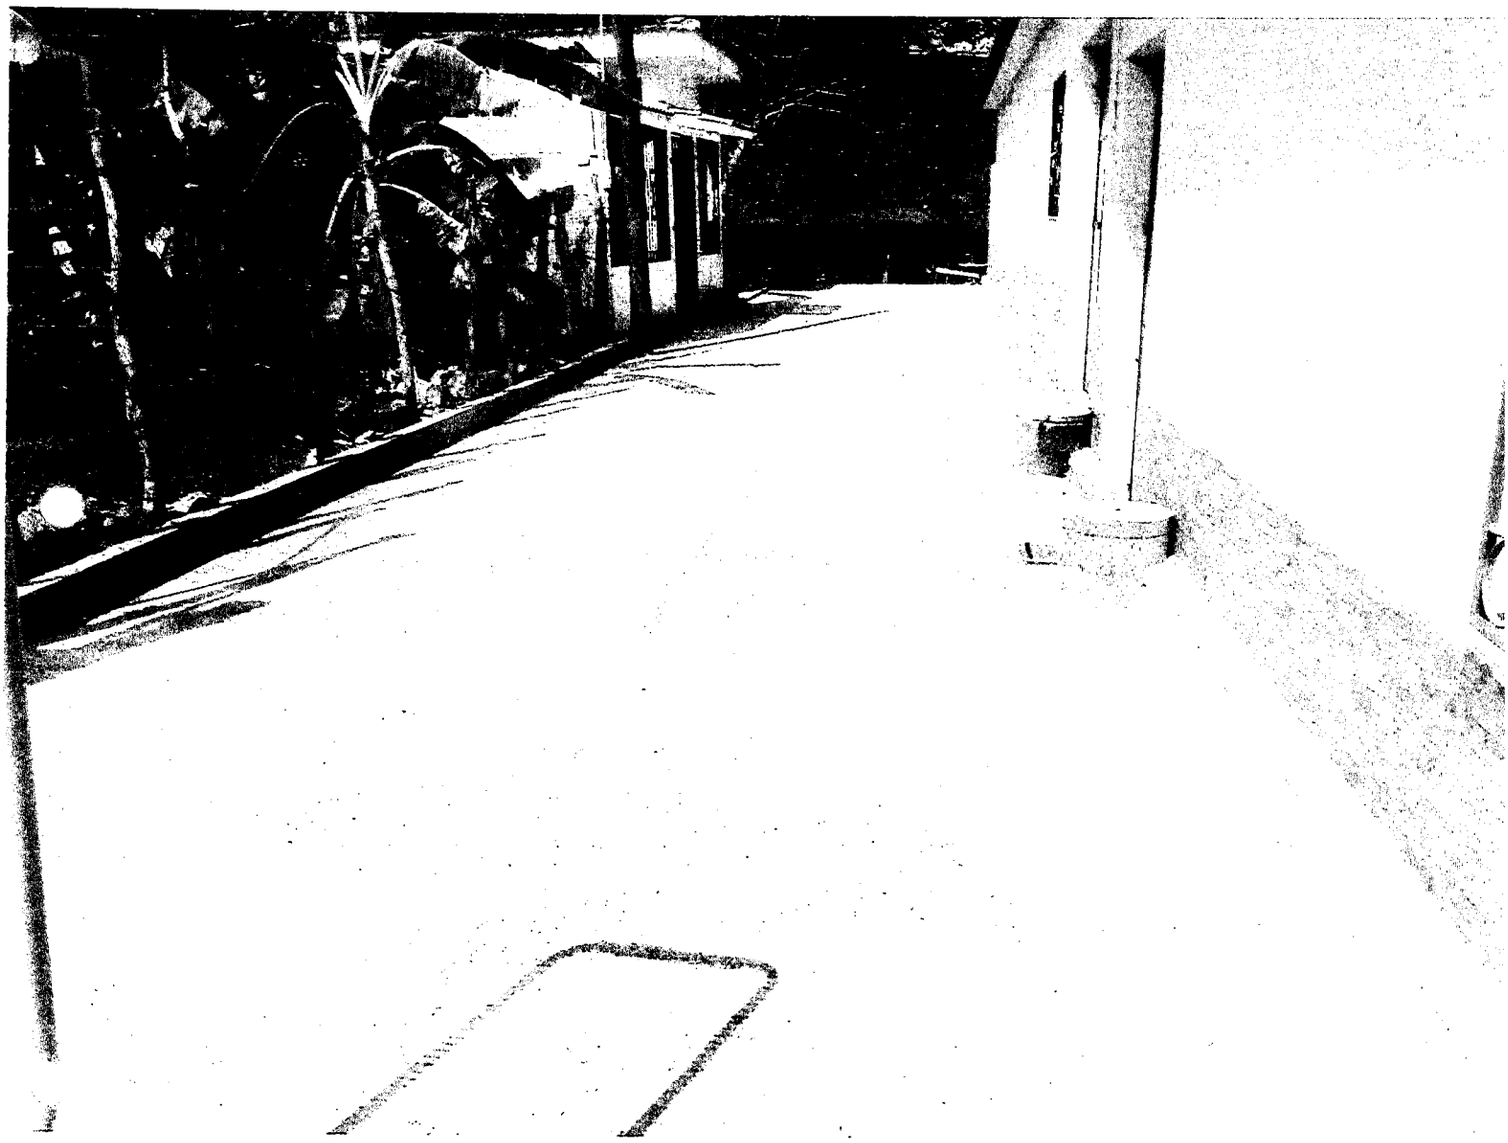

BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 4562/12/2024

CONTRATO No. 29-2024

NOMBRE: MEJORAMIENTO CALLE RURAL BARRIO SAN JUAN, ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA


REGISTRO No.	3
FECHA	08/04/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	El pavimento se encuentra colocado en su totalidad, se realiza la fundicion de bordillos, se cuenta con personal y materiales suficientes para el avance del proyecto
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA









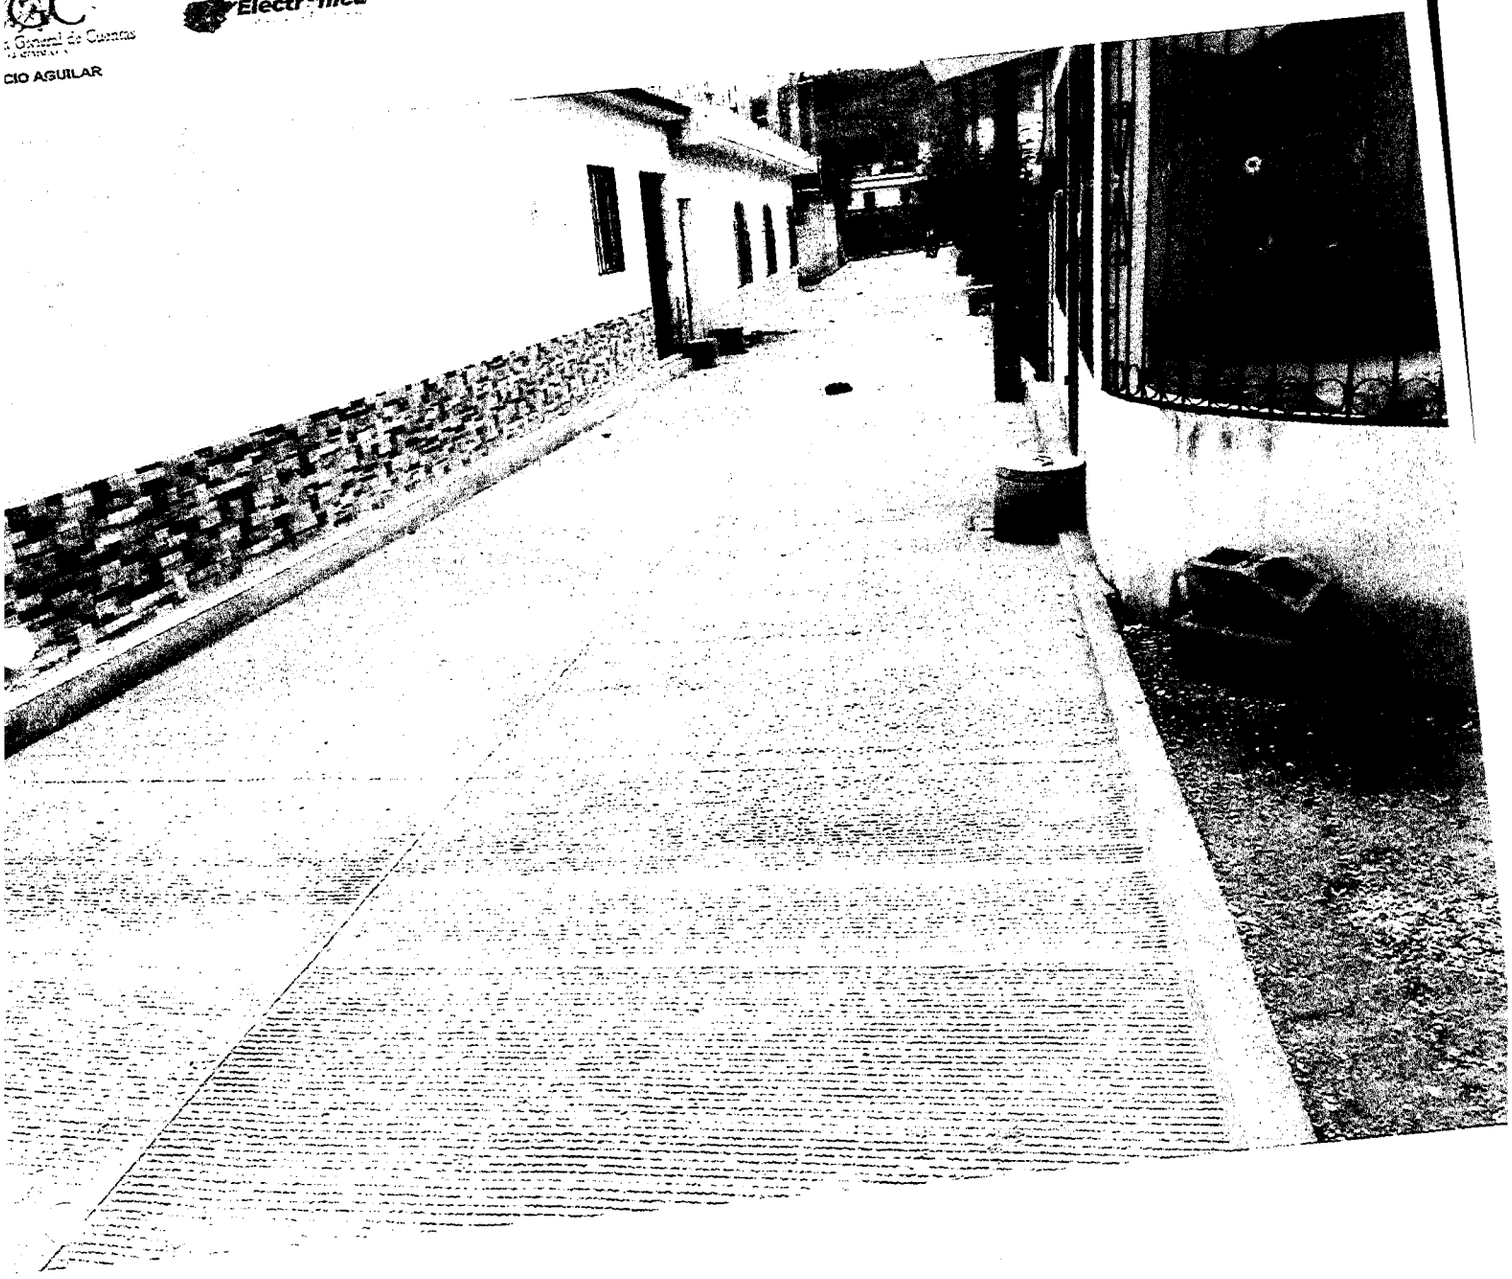





LA INFRASCRITA SECRETARIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO

CERTIFICA

Que para su cumplimiento y efectos consiguientes se transcribe EL ACUERDO MUNICIPAL No. 048-2025 de fecha treinta de abril de dos mil veinticinco del libro número 3,211 de la Alcaldía Municipal, Libro de Acuerdos, debidamente autorizado por la Contraloría General de Cuentas, el que copiado literalmente dice:

ACUERDO MUNICIPAL 048-2025

Guastatoya, 30 de Abril de 2,025

DESPACHO DEL ALCALDE MUNICIPAL

La Autoridad Administrativa Superior

Se tiene a la vista la solicitud presentada por Fernando Augusto Hernández Godoy propietario de la empresa **CONSTRUFER**, en la cual manifiesta que el proyecto denominado **"MEJORAMIENTO CALLE RURAL BARRIO SAN JUAN, ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO",** el que se ejecuta por Contrato Administrativo de Obra número 29-2024, de fecha nueve de diciembre de dos mil veinticuatro; y que el proyecto en referencia se encuentra en un avance físico del 90.00%, en consecuencia solicitan el pago de conformidad con la cláusula cuarta numeral 2) del contrato administrativo de obras.

Consecuentemente se encuentra el informe del Ingeniero Jose Fulgencio Alexander Aguilar Mejía, Supervisor de Obras Municipales, en el cual hace constar la confirmación del avance del proyecto en referencia, por un total de 90.00% de avance físico, adjunta para el efecto la estimación.

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el artículo 59 de la Ley de Contrataciones del Estado, establece: Estimaciones para pago. *"La entidad contratante podrá hacer pagos parciales al contratista contra estimaciones periódicas de trabajo ejecutado y aceptado, las que podrán efectuarse mensualmente de acuerdo con las estipulaciones pactadas.".*

POR TANTO:

Con fundamento en los antecedentes y lo considerado, este Despacho Municipal.

RESUELVE:

I) **APROBAR**, el pago por la cantidad de 90.00%, del proyecto **"MEJORAMIENTO CALLE RURAL BARRIO SAN JUAN, ALDEA SANTA RITA, GUASTATOYA, EL PROGRESO"**, el que se ejecuta por Contrato Administrativo de Obra número 29-2024, de fecha nueve de diciembre de dos mil veinticuatro; suscrito por el Alcalde Municipal y Fernando Augusto Hernández Godoy propietario de **CONSTRUFER.**

II) **SE ORDENA**, al Director de la Administración Financiera Municipal, hacer el pago correspondiente al 90.00% del monto total del proyecto.

III) Cúmplase. -

DADO EN EL PALACIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE GUASTATOYA, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, A TREINTA DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO.

SECRETARIA

LICDA. EVELYN YANETH OAJACA MARROQUIN
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA ¡Sirviendo!
