MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!

5980-0535 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
BARRIO EL CALVARIO, **GUASTATOYA EL PROGRESO**

REPORTE DE PAGO DE PROYECTOS POR CONTRATO 2024

EXPEDIENTE No. **274** NOG: **24429759** CONTRATO No. **20-2024**

PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

APORTES	% DE AVANCE	ESTIMACION	AMORTIZACION	LIQUIDO A RECIBIR
Aporte Codede	**60.00%**			
Q. 899,797.50		Q. 540,000.00	Q. 108,000.00	Q. 432,000.00
23 00 001 000 025 331 31-0101-0004				
TOTALES		Q. 540,000.00	Q. 108,000.00	Q. 432,000.00

Se cuenta con Informe de supervisión por parte de la empresa, informe de supervisión por el Supervisor de Obras Municipales, Acuerdo Municipal de aprobación de avance, Copia de bitácora.

Lic. Alexis Geovanny Marroquín Orellana
Director Municipal de Planificación

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA ¡Sirviendo!

BANRURAL
El amigo que te ayuda a crecer

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
Capital de la amistad

CUENTA UNICA DEL TESORO
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA C.U.T.
CUENTA No. 3-005-09207-3
GUATEMALA, C.A.

CHEQUE No. 80878

No. 19806928

LUGAR Y FECHA: GUASTATOYA, 13 de JUNIO del 2025

Q. **432,000.00*

PAGO A LA ORDEN DE: ***FORTILLO,LIMA,,EDDIE,ERLY DAMARIS***

SUMA DE: ***CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL ***

QUETZALES.

6186 BRRL D101 0000 0030 0509 2073

FIRMA

FIRMA

NO NEGOCIABLE

FORMULARIOS STANDARD, S.A. PBX: 2423-8900

DESCRIPCION CONTABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 60% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

80878

CUENTA No.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	NUMERO DE CHEQUE: 80878 CON NUMERO DE EXPEDIENTE: 274 TRANSACCION No: 62021727 NIT BENEFICIARIO: 89360141 DELMI.ORELLANA1362025 13 de JUNIO del 2025		

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	RECIBI CONFORME	DIA	MES	AÑO
			3051 24625 0201	17	06	2025

MUNICI
GUAS

Factura

EDDIE ERLY DANNIERY, PORTILLO LIMA
Nit Emisor: 89360141
MULTISERVICIOS PL
ALDEA EL BARREAL , Guastatoya, EL PROGRESO
NIT Receptor: 6206107
Nombre Receptor: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
323BCA40-B9E7-4E58-8FB4-02D6FC0A5787
Serie: 323BCA40 Número de DTE: 3118943832
Numero Acceso:
Fecha y hora de emision: 13-jun-2025 15:19:35
Fecha y hora de certificación: 13-jun-2025 15:19:36
Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	PAGO DEL 60% AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO. MONTO DE ESTIMACIÓN. Q. 540,000.00 (-) AMORTIZACIÓN Q. 108,000.00. LÍQUIDO A RECIBIR Q. 432,000.00	540,000.00	0.00	540,000.00	IVA 57,857.142857
			TOTALES:		0.00	540,000.00	IVA 57,857.142857

* Sujeto a pagos trimestrales ISR

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

"Contribuyendo por el país que todos queremos"

FORMA 7-B INGRESOS VARIOS

RECIBO DE LA MUNICIPALIDAD

DE GUASTATOYA, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO

Cuatrocientos treinta y dos mil con 00/100

SERIE B No. 642510

FECHA: DIA 9 | MES 6 | AÑO 2025

POR: quetzales — CODIGO JURISDICCIONAL: D-4 5201

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: Consejo Departamental de Desarrollo

DIRECCION: El Progreso

ARBITRIOS	ORNATO Q.4.00 ☐ 10.00 ☐ 15.00 ☐ 50.00 ☐ 75.00 ☐ 100.00 ☐ 150.00 ☐ ☐ ☐	Q.	
TASAS	VARIOS		
	LICENCIAS		
	ESTACIONAMIENTOS		
	CERTIFICACIONES		
	CEDULAS		
	MERCADOS		
	SERVICIOS VARIOS		
	SERVICIOS AGUA		
	SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA		
CONTRIBUCIONES	CONCEPTO Pago del 60.00% segundo desembolso del proyecto calle rural aldea Tierra Blanca, Guastatoya, El Progreso. SNIP 334531, convenio No. 087-2024, fuente 12	Q432,000.00	
MULTAS	CONCEPTO		
OTROS	VARIOS		

CALDE

LECTURA DE CONTADOR	ACTUAL	ANTERIOR
OBSERVACIONES:		
FIRMA DEL RECEPTOR MUNICIPAL	CUENTA	
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA sirviendo!	SUB-CUENTA	

TOTAL Q. Q432,000.00

VALIDO UNICAMENTE POR EL IMPORTE IMPRESO POR LA CAJA REGISTRADORA MUNICIPAL Y/O NOMBRE FIRMA Y SELLO DEL RECEPTOR MUNICIPAL.

ORIGINAL-ENTERANTE

AUTORIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS S/RES. No. BJ/5875 Clas.: 920-12-8-1-4-97 DEL 28-06-97.
2045310 T-0340 1019911 '97
FORMULARIOS STANDARD, S.A. PBX: 2420-8900 - NIT: 1932927-7 - 150,000 - 100222 DEL No. 500001 AL No. 650000. SERIE B. ENVIO MUNICIPAL No. 45310 DE FECHA 13/10/2022 NUMERO CORRELATIVO D-4-10-2022 DE FECHA 13/10/2022 No. DE CUENTA: T3-2-1 OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 10/10/2022 LIBRO 05576 FOLIO 7.
www.standard-ca.com

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO - DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION

Cerrar Sesión

CONCURSO: Adición de anexos al concurso en la Fase de Ejecución

Mensaje de confirmación	
13.may..2025 08:02:56	
Documentos asociados:	
1	24429759@INFORME DE SUPERVISION 60AVANCE FISCO CALLE TIERRA BLANCA.pdf(2414 KB)
Sí desea imprimir este mensaje, oprima el siguiente botón	

MULTISERVICIOS PL

ALDEA EL BARREAL, GUASTATOYA EL PROGRESO
PROP. EDDIE ERLY DANNIERY PORTILLO LIMA
CEL. 5994-8581

Guastatoya El Progreso, 05 de Mayo del 2025

Señores:
Alcalde y Concejo Municipal
Municipalidad de Guastatoya
Departamento de El Progreso
Presente:

Respetables Señores:

De manera muy atenta me dirijo a ustedes saludándoles y deseándoles que todas sus actividades sean llevadas a cabo con éxito.

El motivo de la presente es para hacer de su conocimiento que se está ejecutando el proyecto denominado **MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO**. Según Contrato Administrativo de Ejecución de Obra número veinte guion dos mil veinticuatro **(20-2024)**, del cual a la presente fecha se tiene un avance físico del sesenta por ciento **(60.00%).** por lo consiguiente solicito a usted el pago de la estimación de acuerdo a dicho avance físico. Se adjunta estimación de Trabajo.

Sin otro particular y esperando que la presente sea tomada en cuenta, me suscribo de ustedes.

Atentamente,

EDDIE ERLY DANNIERY PORTILLO LIMA
Aldea El Barreal, Guastatoya
Cel 5994-8581

F._____
Eddie Erly Danniery Portillo Lima
Multiservicios PL
Propietario

ESTIMACION No. 1

PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

CONTRATO No.: **20-2024**
FECHA DEL CONTRATO: **6 DE NOVIEMBRE DEL 2024**
MONTO CONTRATADO: **Q. 539,878.50**

EMPRESA EJECUTORA: **MULTISERVICIOS PL**
PROPIETARIO: **EDDIE ERLY DANNIERY PORTILLO LIMA**

No.	NOMBRE DEL REGLON	CANTIDADES CONTRATADAS					CANTIDADES EJECUTADAS HASTA ESTA ESTIMACION		
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	P.U. EN Q	TOTAL EN Q	%	CANTIDAD	TOTAL	%
1.00	**PRELIMINARES Y TOPOGRAFIA**								
1.1	REPLANTEO TOPOGRAFICO	ML	215.00	Q 10.72	Q 2,304.80	0.26%	215.00	Q 2,304.80	0.26%
1.2	PRELIMINARES	M2	977.00	Q 10.74	Q 10,492.98	1.17%	977.00	Q 10,492.98	1.17%
1.3	DEMOLICION DE ADOQUIN EXISTENTE	M3	977.00	Q 121.32	Q 118,529.64	13.17%	977.00	Q 118,529.64	13.17%
2.00	**CONFORMACION DE SUB-RASANTE**								
2.1	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB-RASANTE	M2	977.00	Q 30.74	Q 30,032.98	3.34%	977.00	Q 30,032.98	3.34%
3.00	**PAVIMENTO**								
3.1	CAPA DE BASE (E=0.05)	M3	977.00	Q 53.62	Q 52,386.74	5.82%	977.00	Q 52,386.74	5.82%
3.2	CAPA DE SUB-BASE (E=0.10)	M2	977.00	Q 85.76	Q 83,787.52	9.31%	977.00	Q 83,787.52	9.31%
3.3	PAVIMENTO (E=0.15 INCLUYE CORTE Y SELLO)	M2	977.00	Q 499.86	Q 488,363.22	54.27%	442.47	Q 221,175.98	24.57%
3.4	BORDILLO (E=0.10)	ML	413.00	Q 189.10	Q 78,098.30	8.68%	-	Q -	0.00%
3.5	SEÑALIZACION HORIZONTAL	ML	645.00	Q 16.51	Q 10,648.95	1.18%	-	Q -	0.00%
3.6	SEÑALIZACION VERTICAL	UNIDAD	3.00	Q 1,328.17	Q 3,984.51	0.44%	-	Q -	0.00%
4.00	**DRENAJES**								
4.1	TRANSVERSAL METALICA DE 24" (6.00 MTS DE LARGO)	UNIDAD	1.00	Q 17,157.70	Q 17,157.70	1.91%	1.00	Q 17,157.70	1.91%
4.2	CABEZAL + CAJA RECEPTORA	M3	1.05	Q 3,819.20	Q 4,010.16	0.45%	1.05	Q 4,010.16	0.45%
	TOTAL				**Q 899,797.50**	**100.00%**		**Q 539,878.50**	**60.00%**

EDDIE ERLY DANNIERY PORTILLO LIMA
Aldea El Barreal, Guastatoya
Cel 5994-8581

F._____
EDDIE ERLY DANNIERY PORTILLO LIMA
MULTISERVICIOS PL
PROPIETARIO

Jimy Macz Noriega
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO No. 14,970

F._____
ING. JIMY MACZ NORIEGA
SUPERVISOR DE OBRAS
MULTISERVICIOS PL

TIMBRE DE INGENIERÍA 34
Enero 2025
8394578

Jimy Macz Noriega
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO No. 14,970

MULTISERVICIOS PL
ALDEA EL BARREAL, GUASTATOYA EL PROGRESO
PROP. EDDIE ERLY DANNIERY PORTILLO LIMA
CEL. 5994-8581

MULTISERVICIOS PL


ALDEA EL BARREAL, GUASTATOYA EL PROGRESO

PROP. EDDIE ERLY DANNIERY PORTILLO LIMA

CEL. 5994-8581





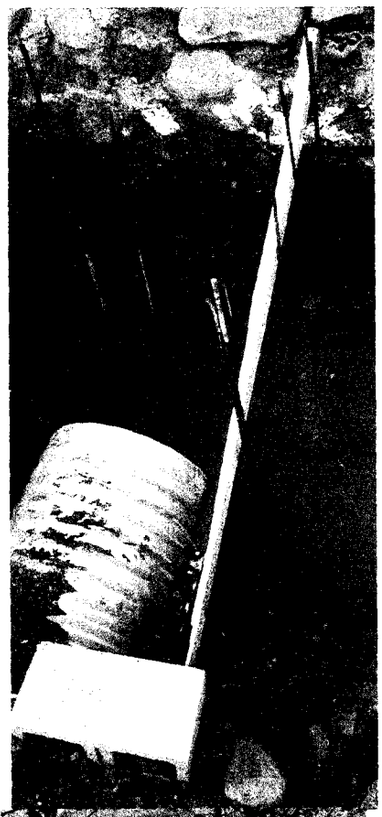







MULTISERVICIOS PL

ALDEA EL BARREAL, GUASTATOYA EL PROGRESO


PROP. EDDIE ERLY DANNIERY PORTILLO LIMA


CEL. 5994-8581








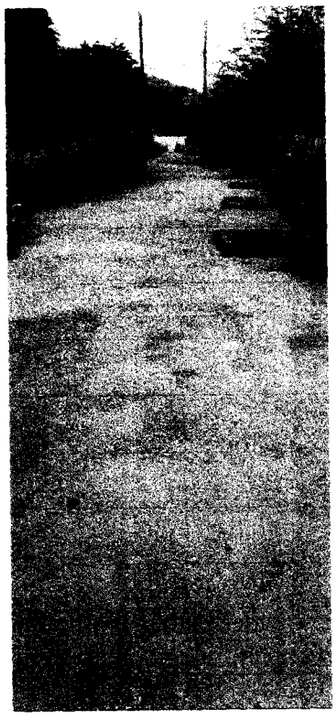

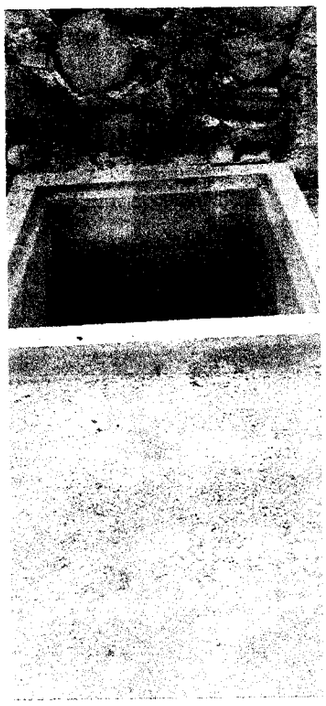

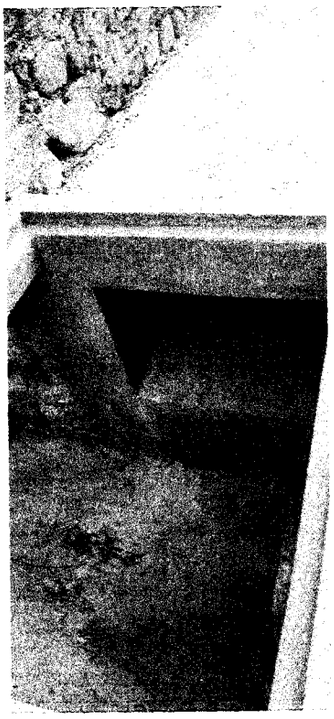

MULTISERVICIOS PL

ALDEA EL BARREAL, GUASTATOYA EL PROGRESO

PROP. EDDIE ERLY DANNIERY PORTILLO LIMA

CEL. 5994-8581

















MULTISERVICIOS PL

ALDEA EL BARREAL, GUASTATOYA EL PROGRESO

PROP. EDDIE ERLY DANNIERY PORTILLO LIMA

CEL. 5994-8581

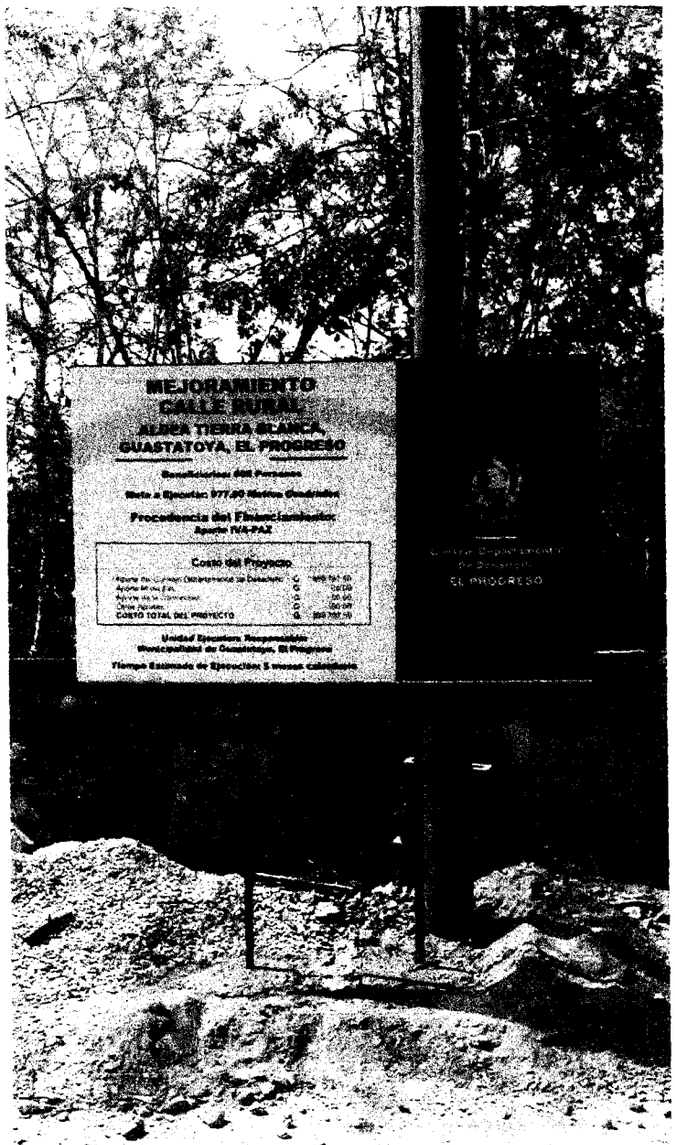

MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!

5980-0535 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
BARRIO EL CALVARIO, **GUASTATOYA EL PROGRESO**

LA INFRASCRITA SECRETARIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO

CERTIFICA

Que para su cumplimiento y efectos consiguientes se transcribe EL ACUERDO MUNICIPAL No. 055-2025 de fecha doce de mayo de dos mil veinticinco del libro número 3,211 de la Alcaldía Municipal, Libro de Acuerdos, debidamente autorizado por la Contraloría General de Cuentas, el que copiado literalmente dice:

ACUERDO MUNICIPAL 055-2025

Guastatoya, 12 de Mayo de 2,025

DESPACHO DEL ALCALDE MUNICIPAL

La Autoridad Administrativa Superior

Se tiene a la vista la solicitud presentada por Eddie Erly Danniery Portillo Lima propietario de la empresa **MULTISERVICIOS PL**, en la cual manifiesta que el proyecto denominado **"MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO"**, el que se ejecuta por Contrato Administrativo de Obra número 20-2024, de fecha seis de noviembre de dos mil veinticuatro; y que el proyecto en referencia se encuentra en un avance físico del 60.00%, en consecuencia solicitan el pago de conformidad con la cláusula cuarta numeral 2) del contrato administrativo de obras.

Consecuentemente se encuentra el informe del Ingeniero Jose Fulgencio Alexander Aguilar Mejía, Supervisor de Obras Municipales, en el cual hace constar la confirmación del avance del proyecto en referencia, por un total de 60.00% de avance físico, adjunta para el efecto la estimación.

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el artículo 59 de la Ley de Contrataciones del Estado, establece: Estimaciones para pago. *"La entidad contratante podrá hacer pagos parciales al contratista contra estimaciones periódicas de trabajo ejecutado y aceptado, las que podrán efectuarse mensualmente de acuerdo con las estipulaciones pactadas."*.

POR TANTO:

Con fundamento en los antecedentes y lo considerado, este Despacho Municipal.

RESUELVE:

I) **APROBAR**, el pago por la cantidad de 60.00%, del proyecto **"MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO"**, el que se ejecuta por Contrato Administrativo de Obra número 20-2024, de fecha seis de noviembre de dos mil veinticuatro; suscrito por el Alcalde Municipal y Eddie Erly Danniery Portillo Lima propietario de **MULTISERVICIOS PL.**

II) **SE ORDENA**, al Director de la Administración Financiera Municipal, hacer el pago correspondiente al 60.00% del monto total del proyecto.

III) Cúmplase. -

DADO EN EL PALACIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE GUASTATOYA, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, A DOCE DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO.

SECRETARIA

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA ¡Sirviendo!

LICDA. EVELYN YANETH OAJACA MARROQUIN
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!

5980-0535 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
BARRIO EL CALVARIO, **GUASTATOYA EL PROGRESO**

INFORME DE SUPERVISION

Guastatoya, 06 de Mayo de 2025

SEÑOR: JOSE ELIAS HERRERA GUERRA Y CONCEJO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
EL PROGRESO

De la manera más atenta me dirijo a usted deseándole toda clase de éxitos en sus labores diarias.

El motivo de la presente es para hacerle saber lo siguiente:

En visita de supervisión realizada al proyecto denominado **MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO,** con número de contrato **20-2024** de fecha 06 de Noviembre de 2024, ejecutado por la empresa **MULTISERVICIOS PL**, financiado por la Municipalidad de Guastatoya, se tiene a la vista el oficio de Mayo de 2025 en el cual se hace la solicitud de la estimación del proyecto para un avance del **60.00%**, para lo cual se adjunta el informe de supervisión y el informe de parte de la empresa.

Agradeciendo su atención y en espera de darle seguimiento a este asunto me suscribo de ustedes.

Atentamente

José F. Alexander Aguilar Mejia
Ingeniero Civil
Colegiado No 9,366

ING. JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA
SUPERVISOR MUNICIPAL, GUASTATOYA
EL PROGRESO

D.M.P.	SUPERVISION DE OBRAS	Dirección Municipal de Planificación

Comunidad.	Contrato Municipal.
Aldea Tierra Blanca, Guastatoya, El Progreso	29-2024

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del proyecto.	Ubicación del proyecto.
MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Aldea Tierra Blanca, Guastatoya, El Progreso
Contratista.	**Ubicación del proyecto.**
CONSTRUFER	Aldea Tierra Blanca, Guastatoya, El Progreso
Monto Contratado. Q 899,797.50	**Avance Físico.** 60.00%
Informe de Supervisión No. 1	**Fecha.** 06 de Mayo de 2025

2. AVANCE DE EJECUCION DEL PROYECTO

No.	Descripcion del Renglón	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Total a la Fecha	Avance Físico %
1	PRELIMINARES Y TOPOGRAFIA						
1.1	REPLANTEO TOPOGRAFICO	215.00	ML	Q 10.72	Q 2,304.80	Q 2,304.80	100%
1.2	PRELIMINARES	977.00	M2	Q 10.74	Q 10,492.98	Q 10,492.98	100%
1.3	DEMOLICION DE ADOQUIN EXISTENTE	977.00	M3	Q 121.32	Q 118,529.64	Q 118,529.64	100%
2	CONFORMACION DE SUB-RASANTE						
2.1	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB-RASANTE	977.00	M2	Q 30.74	Q 30,032.98	Q 30,032.98	100%
3	PAVIMENTO						
3.1	CAPA DE BASE (E=0.05)	977.00	M3	Q 53.62	Q 52,386.74	Q 52,386.74	100%
3.2	CAPA DE SUB-BASE (E=0.10)	977.00	M2	Q 85.76	Q 83,787.52	Q 83,787.52	100%
3.3	PAVIMENTO (E=0.15 INCLUYE CORTE Y SELLO)	442.48	M2	Q 499.86	Q 221,175.98	Q 221,175.98	45%
3.4	BORDILLO (E=0.10)	-	ML	Q 189.10	Q -	Q -	0%
3.5	SEÑALIZACION HORIZONTAL	-	ML	Q 16.51	Q -	Q -	0%
3.6	SEÑALIZACION VERTICAL	-	UNIDAD	Q 1,328.17	Q -	Q -	0%
4	DRENAJES						
4.1	TRANSVERSAL METALICA DE 24" (6.00 MTS DE LARGO)	1.00	UNIDAD	Q 17,157.70	Q 17,157.70	Q 17,157.70	100%
4.2	CABEZAL + CAJA RECEPTORA	1.05	M3	Q 3,819.20	Q 4,010.16	Q 4,010.16	100%
					Q 539,878.50	Q 539,878.50	60.00%

Estos renglones de trabajo dan como resultado un avance físico del **60.00%** **por lo cual se aprueba realizar el pago correspondiente**


3. DESCRIPCION DEL PROYECTO.

Este proyecto consiste en el mejoramiento de la calle en la aldea tierra blanca, se va a colocar pavimento de concreto en calles del sector ademas de bordillo fundido, este proyecto viene a beneficiar a los vecinos del sector

4. RECOMENDACIONES.

Chequear los trabajos realizados para garantizar la durabilidad de los mismos, y terminar los trabajos faltantes, los que no se encuentran al 100 % y los que no se han iniciado aun

SUPERVISOR DE PROYECTOS MUNICIPALES.



ING. JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA
SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES

JOSE ELIAS HERRERA GUERRA
ALCALDE MUNICIPAL DE GUASTATOYA


D.M.P.	SUPERVISION DE OBRAS	Dirección Municipal de Planificación

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del proyecto.	**Ubicación del proyecto.**
MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Aldea Tierra Blanca, Guastatoya, El Progreso

2. INFORME FOTOGRAFICO.



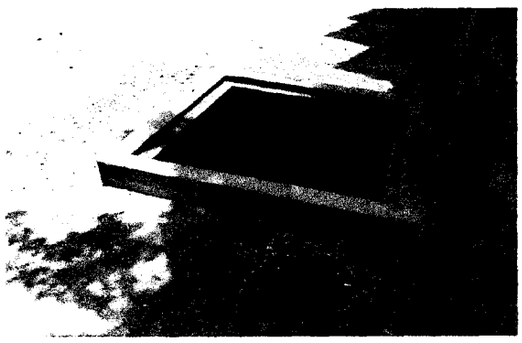







SUPERVISOR DE PROYECTOS MUNICIPALES.

José F. Alexander Aguilar Mejía
Ingeniero Civil
Colegiado No. 9,366

ING. JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA
SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES

JOSE ELIAS HERRERA GUERRA
ALCALDE MUNICIPAL DE GUASTATOYA

REPORTE DE AVANCE FISICO No. 1

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO	
Municipio: GUASTATOYA	Departamento: EL PROGRESO
Comunidad: ALDEA TIERRA BLANCA	Fecha de Contrato: 06/11/2024
Fecha de Inicio: 16/12/2024	Fecha de Supervision: 06/05/2025
Fecha de Finalizacion: 15/05/2025	Unidad Ejecutora: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
Contrato No.: 20-2024	Valor del Proyecto: Q.899,797.50
Modificaciones:	Valor Original: Q.899,797.50
Constructora: MULTISERVICIOS PL	Telefono:
Representante legal: EDDIE ERLY DANNIERY PORTILLO LIMA	

RESUMEN DE RENGLONES

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES DE TRABAJO				ORDEN DE CAMBIO	ORDEN DE TRABAJO SUPLEMENTARIO	ORDEN DE TRABAJO EXTRA	RENGLON MODIFICADO	CANTIDADES EJECUTADAS PRIMERA ESTIMACION		ACUMULADO A LA FECHA		PORCENTAJE
		CANTIDAD	UNIDAD	P UNITARIO	TOTAL	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	TOTAL
1	PRELIMINARES Y TOPOGRAFIA													
1.1	REPLANTEO TOPOGRAFICO	215.00	ML	Q 10.72	Q 2,304.80					215.00	Q 2,304.80	215.00	Q 2,304.80	0.26%
1.2	PRELIMINARES	977.00	M2	Q 10.74	Q 10,492.98					977.00	Q 10,492.98	977.00	Q 10,492.98	1.17%
1.3	DEMOLICION DE ADOQUIN EXISTENTE	977.00	M3	Q 121.32	Q 118,529.64					977.00	Q 118,529.64	977.00	Q 118,529.64	13.17%
2	CONFORMACION DE SUB-RASANTE													
2.1	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB-RASANTE	977.00	M2	Q 30.74	Q 30,032.98					977.00	Q 30,032.98	977.00	Q 30,032.98	3.34%
3	PAVIMENTO													
3.1	CAPA DE BASE (E=0.05)	977.00	M3	Q 53.62	Q 52,386.74					977.00	Q 52,386.74	977.00	Q 52,386.74	5.82%
3.2	CAPA DE SUB-BASE (E=0.10)	977.00	M2	Q 85.76	Q 83,787.52					977.00	Q 83,787.52	977.00	Q 83,787.52	9.31%
3.3	PAVIMENTO (E=0.15 INCLUYE CORTE Y SELLO)	977.00	M2	Q 499.86	Q 488,363.22					442.48	Q 221,175.98	442.48	Q 221,175.98	24.58%
3.4	BORDILLO (E=0.10)	413.00	ML	Q 189.10	Q 78,098.30					-	Q -	-	Q -	0.00%
3.5	SEÑALIZACION HORIZONTAL	645.00	ML	Q 16.51	Q 10,648.95					-	Q -	-	Q -	0.00%
3.6	SEÑALIZACION VERTICAL	3.00	UNIDAD	Q 1,328.17	Q 3,984.51					-	Q -	-	Q -	0.00%
4	DRENAJES													
4.1	TRANSVERSAL METALICA DE 24" (6.00 MTS DE LARGO)	1.00	UNIDAD	Q 17,157.70	Q 17,157.70					1.00	Q 17,157.70	1.00	Q 17,157.70	1.91%
4.2	CABEZAL + CAJA RECEPTORA	1.05	M3	Q 3,819.20	Q 4,010.16					1.05	Q 4,010.16	1.05	Q 4,010.16	0.45%
	COSTO TOTAL DEL PROYECTO				Q 899,797.50						Q 539,878.50		Q 539,878.50	60.00%

VALOR DE ESTIMACION No. 1	Q 539,878.50
AMORTIZACION DEL ANTICIPO (20%)	Q 107,975.70
PENDIENTE DE AMORTIZAR	Q 71,983.80
LIQUIDO A RECIBIR	Q 431,902.80

José Fulgencio Alexander Aguilar Mejía
Ingeniero Civil
Colegiado No. 15,...

JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES

JOSE ELIAS HERRERA GUERRA
ALCALDE MUNICIPAL GUASTATOYA

MULTISERVICIOS PL
ALDEA EL BARREAL, GUASTATOYA EL PROGRESO
PROP. EDDIE ERLY DANNIERY PORTILLO LIMA
CEL. 5994-8581

Guastatoya El Progreso, 05 de Mayo del 2025

Señores:
Alcalde y Concejo Municipal
Municipalidad de Guastatoya
Departamento de El Progreso
Presente:

Respetables Señores:

De manera muy atenta me dirijo a ustedes saludándoles y deseándoles que todas sus actividades sean llevadas a cabo con éxito.

El motivo de la presente es para hacer de su conocimiento que se está ejecutando el proyecto denominado **MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO**. Según Contrato Administrativo de Ejecución de Obra número veinte guion dos mil veinticuatro **(20-2024)**, del cual a la presente fecha se tiene un avance físico del sesenta por ciento **(60.00%).** por lo consiguiente solicito a usted el pago de la estimación de acuerdo a dicho avance físico. Se adjunta estimación de Trabajo.

Sin otro particular y esperando que la presente sea tomada en cuenta, me suscribo de ustedes.

Atentamente,

EDDIE ERLY DANNIERY PORTILLO LIMA
Aldea El Barreal, Guastatoya
Cel 5994-8581

F._____
Eddie Erly Danniery Portillo Lima
Multiservicios PL
Propietario

ESTIMACION No. 1

PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

CONTRATO No.: **20-2024**
FECHA DEL CONTRATO: **6 DE NOVIEMBRE DEL 2024**
MONTO CONTRATADO: **Q. 539,878.50**

EMPRESA EJECUTORA: **MULTISERVICIOS PL**
PROPIETARIO: **EDDIE ERLY DANNIERY PORTILLO LIMA**

No.	NOMBRE DEL REGLON	CANTIDADES CONTRATADAS					CANTIDADES EJECUTADAS HASTA ESTA ESTIMACION		
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	P.U. EN Q	TOTAL EN Q	%	CANTIDAD	TOTAL	%
1.00	**PRELIMINARES Y TOPOGRAFIA**								
1.1	REPLANTEO TOPOGRAFICO	ML	215.00	Q 10.72	Q 2,304.80	0.26%	215.00	Q 2,304.80	0.26%
1.2	PRELIMINARES	M2	977.00	Q 10.74	Q 10,492.98	1.17%	977.00	Q 10,492.98	1.17%
1.3	DEMOLICION DE ADOQUIN EXISTENTE	M3	977.00	Q 121.32	Q 118,529.64	13.17%	977.00	Q 118,529.64	13.17%
2.00	**CONFORMACION DE SUB-RASANTE**								
2.1	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB-RASANTE	M2	977.00	Q 30.74	Q 30,032.98	3.34%	977.00	Q 30,032.98	3.34%
3.00	**PAVIMENTO**								
3.1	CAPA DE BASE (E=0.05)	M3	977.00	Q 53.62	Q 52,386.74	5.82%	977.00	Q 52,386.74	5.82%
3.2	CAPA DE SUB-BASE (E=0.10)	M2	977.00	Q 85.76	Q 83,787.52	9.31%	977.00	Q 83,787.52	9.31%
3.3	PAVIMENTO (E=0.15 INCLUYE CORTE Y SELLO)	M2	977.00	Q 499.86	Q 488,363.22	54.27%	442.47	Q 221,175.98	24.57%
3.4	BORDILLO (E=0.10)	ML	413.00	Q 189.10	Q 78,098.30	8.68%	-	Q -	0.00%
3.5	SEÑALIZACION HORIZONTAL	ML	645.00	Q 16.51	Q 10,648.95	1.18%	-	Q -	0.00%
3.6	SEÑALIZACION VERTICAL	UNIDAD	3.00	Q 1,328.17	Q 3,984.51	0.44%	-	Q -	0.00%
4.00	**DRENAJES**								
4.1	TRANSVERSAL METALICA DE 24" (6.00 MTS DE LARGO)	UNIDAD	1.00	Q 17,157.70	Q 17,157.70	1.91%	1.00	Q 17,157.70	1.91%
4.2	CABEZAL + CAJA RECEPTORA	M3	1.05	Q 3,819.20	Q 4,010.16	0.45%	1.05	Q 4,010.16	0.45%
	TOTAL				**Q 899,797.50**	**100.00%**		**Q 539,878.50**	**60.00%**

EDDIE ERLY DANNIERY PORTILLO LIMA
Aldea El Barreal, Guastatoya
Cel 5994-8581

F.
EDDIE ERLY DANNIERY PORTILLO LIMA
MULTISERVICIOS PL
PROPIETARIO

F.
ING. JIMY MACZ NORIEGA
SUPERVISOR DE OBRAS
MULTISERVICIOS PL

Jimy Macz Noriega
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO No. 14,970

TIMBRE DE INGENIERÍA 33 Enero 2025 8394


MULTISERVICIOS PL
ALDEA EL BARREAL, GUASTATOYA EL PROGRESO
PROP. EDDIE ERLY DANNIERY PORTILLO LIMA
CEL. 5994-8581

MULTISERVICIOS PL


ALDEA EL BARREAL, GUASTATOYA EL PROGRESO

PROP. EDDIE ERLY DANNIERY PORTILLO LIMA

CEL. 5994-8581

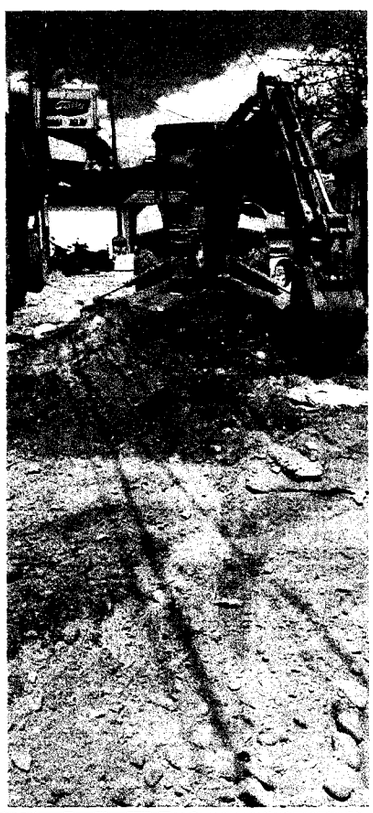




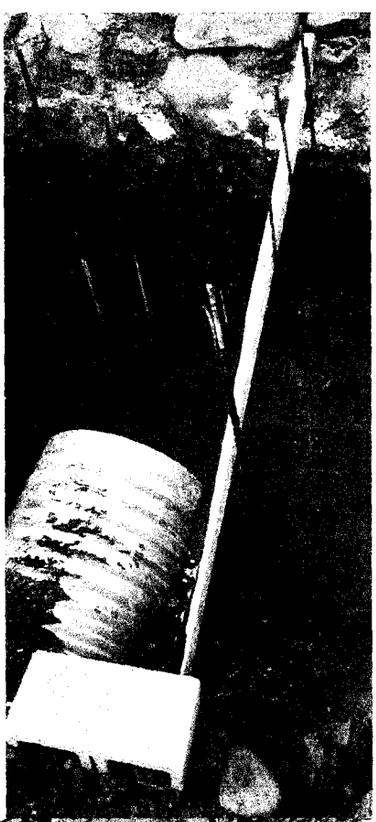





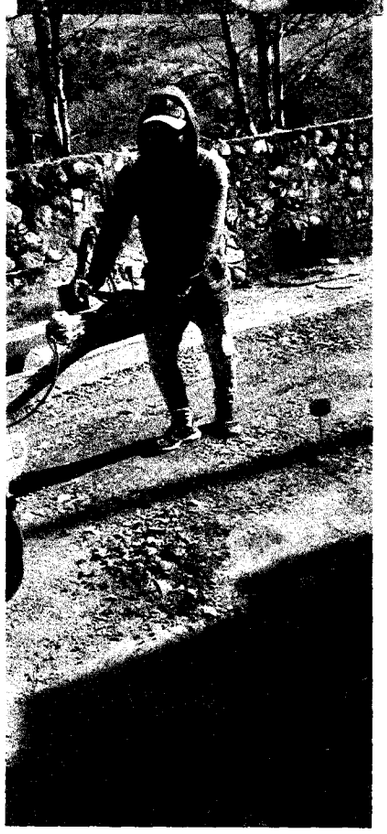

MULTISERVICIOS PL

ALDEA EL BARREAL, GUASTATOYA EL PROGRESO

PROP. EDDIE ERLY DANNIERY PORTILLO LIMA


CEL. 5994-8581










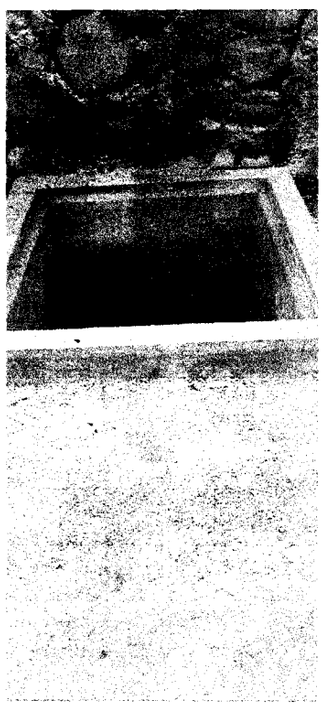

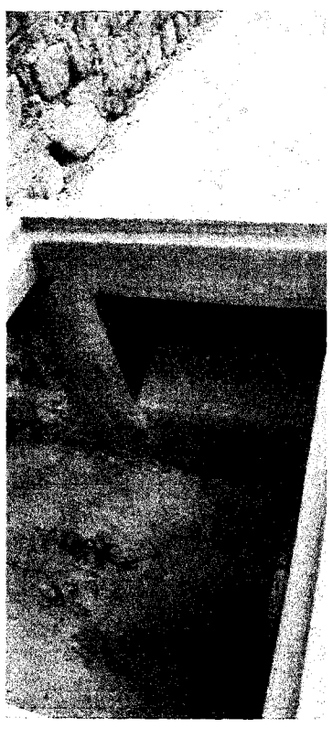

MULTISERVICIOS PL

ALDEA EL BARREAL, GUASTATOYA EL PROGRESO

PROP. EDDIE ERLY DANNIERY PORTILLO LIMA


CEL. 5994-8581









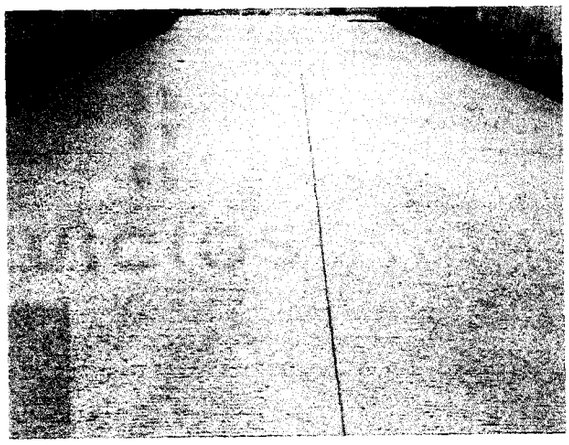






MULTISERVICIOS PL

ALDEA EL BARREAL, GUASTATOYA EL PROGRESO

PROP. EDDIE ERLY DANNIERY PORTILLO LIMA

CEL. 5994-8581

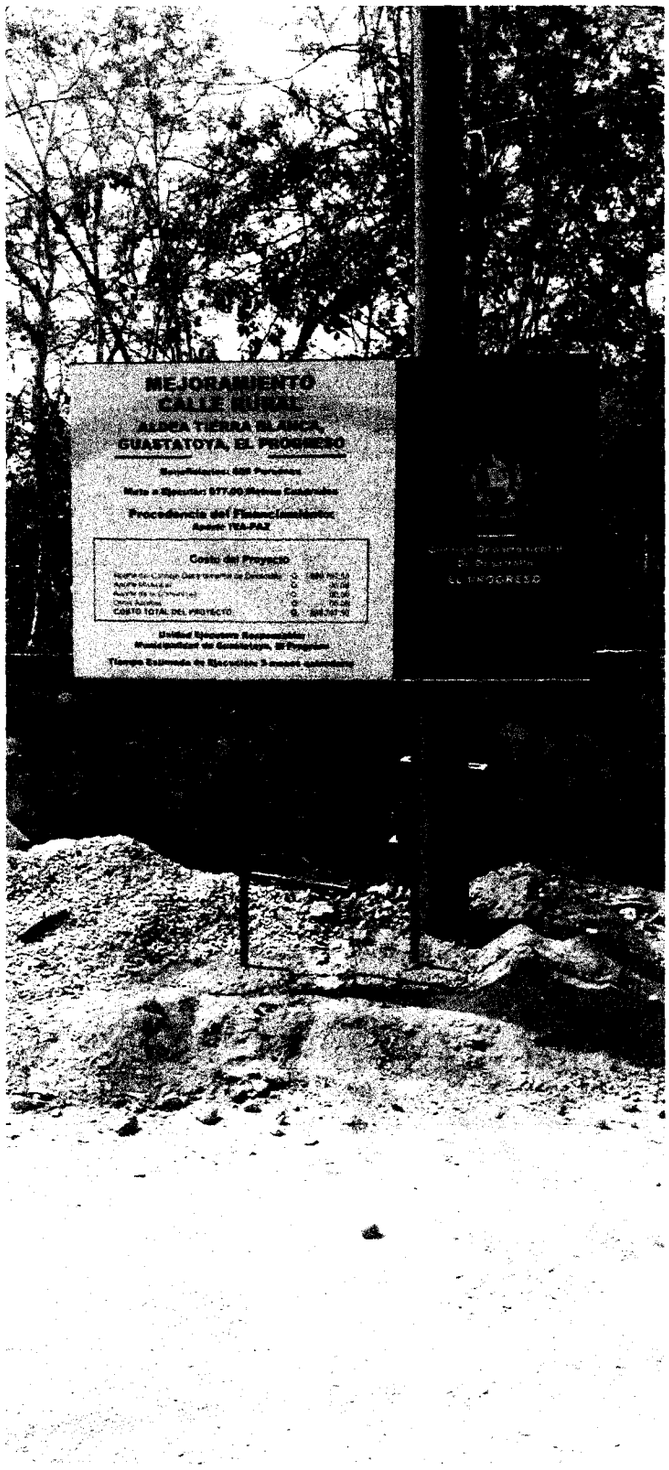

Contraloría General de Cuentas
GUATEMALA, C.A.

Bitácora Electrónica

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA Y GESTIÓN AMBIENTAL

UNIDAD DE BITÁCORAS – DATOS DE LA BITÁCORA ELECTRÓNICA –

BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 4006/11/2024

No. CONTRATO	20-2024
FECHA CONTRATO	06/11/2024
MONTO CONTRACTUAL	899,797.57
NOG	24429759
NOMBRE DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO
UBICACIÓN DEL PROYECTO	Guastatoya, EL PROGRESO
ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JIMY MACZ NORIEGA
EMPRESA EJECUTORA	EDDIE ERLY DANNIERY PORTILLO LIMA
REPRESENTANTE LEGAL O CONTRATISTA	EDDIE ERLY DANNIERY PORTILLO LIMA
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA
SUPERVISOR EMPRESA SUPERVISORA	

FECHA DE AUTORIZACIÓN 13/11/2024

BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 4006/11/2024

CONTRATO No. 20-2024

NOMBRE: MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

REGISTRO No.	1
FECHA	13/01/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	BITACORA DE INICIO DE PROYECTO se adjunta acta de inicio no 22-2024 para hacer constar el inicio de los trabajos a realizar en el proyecto MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA



Municipalidad de Guastatoya, Departamento de El Progreso

DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION

LIBRO DE ACTAS DE INICIO DE OBRAS Nº 0172

ACTA DE INICIO NO. 22-2024

PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO. IDENTIFICADO CON NOG. 24429759, EN GUATECOMPRAS. ----------

En el Municipio de Guastatoya, Departamento El Progreso, siendo las ocho horas en punto del día lunes dieciséis de diciembre de dos mil veinticuatro, reunidos en el área donde se va a ejecutar el Proyecto, **MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO.** Los señores: José Elias Herrera Guerra, Alcalde Municipal; Ing. José Fulgencio Alexander Aguilar Mejía, Supervisor de Obras Municipales; Eddie Erly Danniery Portillo Lima, Representante Legal de la Empresa Constructora; Ing. Jimy Macz Noriega, Supervisor Residente del Proyecto; Lic. Alexis Geovanny Marroquín Orellana, Director de la Dirección Municipal de Planificación; con el objeto de dejar constancia de lo siguiente. **PRIMERO:** Se faccíona la presente acta para dejar constancia de Inicio del Proyecto: **MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO.** El cual será ejecutado con fondos extraordinarios provenientes del Consejo Departamental de Desarrollo para el ejercicio fiscal 2,024; por un Valor de Ochocientos Noventa y Nueve Mil Setecientos Noventa y Siete Quetzales con Cincuenta Centavos (Q. 899,797.50), con un plazo de cinco meses calendario el cual, por adjudicación en los procesos y requisitos de GUATECOMPRAS, lo ejecutará la empresa **MULTISERVICIOS PL,** Habiendo sido publicado en el Sistema de Guatecompras la adjudicación bajo el NOG- 24429759, Según Contrato Administrativo No. 20-2024 de fecha seis de noviembre del dos mil veinticuatro. **SEGUNDO:** Los señores anteriormente mencionados declaran iniciados los trabajos, los cuales se realizarán con base a planos y especificaciones elaboradas para el presente proyecto y de acuerdo al contrato respectivo. **TERCERO:** El Señor Alcalde Municipal recomienda al representante de la empresa constructora, al supervisor residente de la empresa y supervisor de obras municipales que los trabajos sean ejecutados en base al diseño y especificaciones propias de este proyecto y presentar los avances del mismo para el pago respectivo con la documentación de soporte. **CUARTO:** No habiendo más que agregar se da por terminada la presente en el mismo lugar y fecha media hora después de su inicio. Leída se acepta, ratifica y firma por los que en ella intervenimos Damos fe. ----------

ALCALDE

José Elias Herrera Guerra
Alcalde Municipal

Lic Alexis Geovanny Marroquín Orellana
Director
Dirección Municipal de Planificación

EDDIE ERLY DANNIERY PORTILLO LIMA
Aldea El Barreal, Guastatoya
Cel. 5994-8581

Eddie Erly Danniery Portillo Lima
Representante de la empresa

Jimy Macz Noriega
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO No. 14,570

Ing. Jimy Macz Noriega
Supervisor Residente

José Fulgencio Alexander Aguilar Mejía
Ingeniero Civil
Colegiado No. 8,[illegible]

Ing. José Fulgencio Alexander Aguilar Mejía
Supervisor de Obras Municipales


BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 4006/11/2024

CONTRATO No. 20-2024


NOMBRE: MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

REGISTRO No.	2
FECHA	18/01/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	Se realiza visita de campo para ver el avance del proyecto en aldea tierra blanca, se observa el levantamiento de adoquin existente
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA

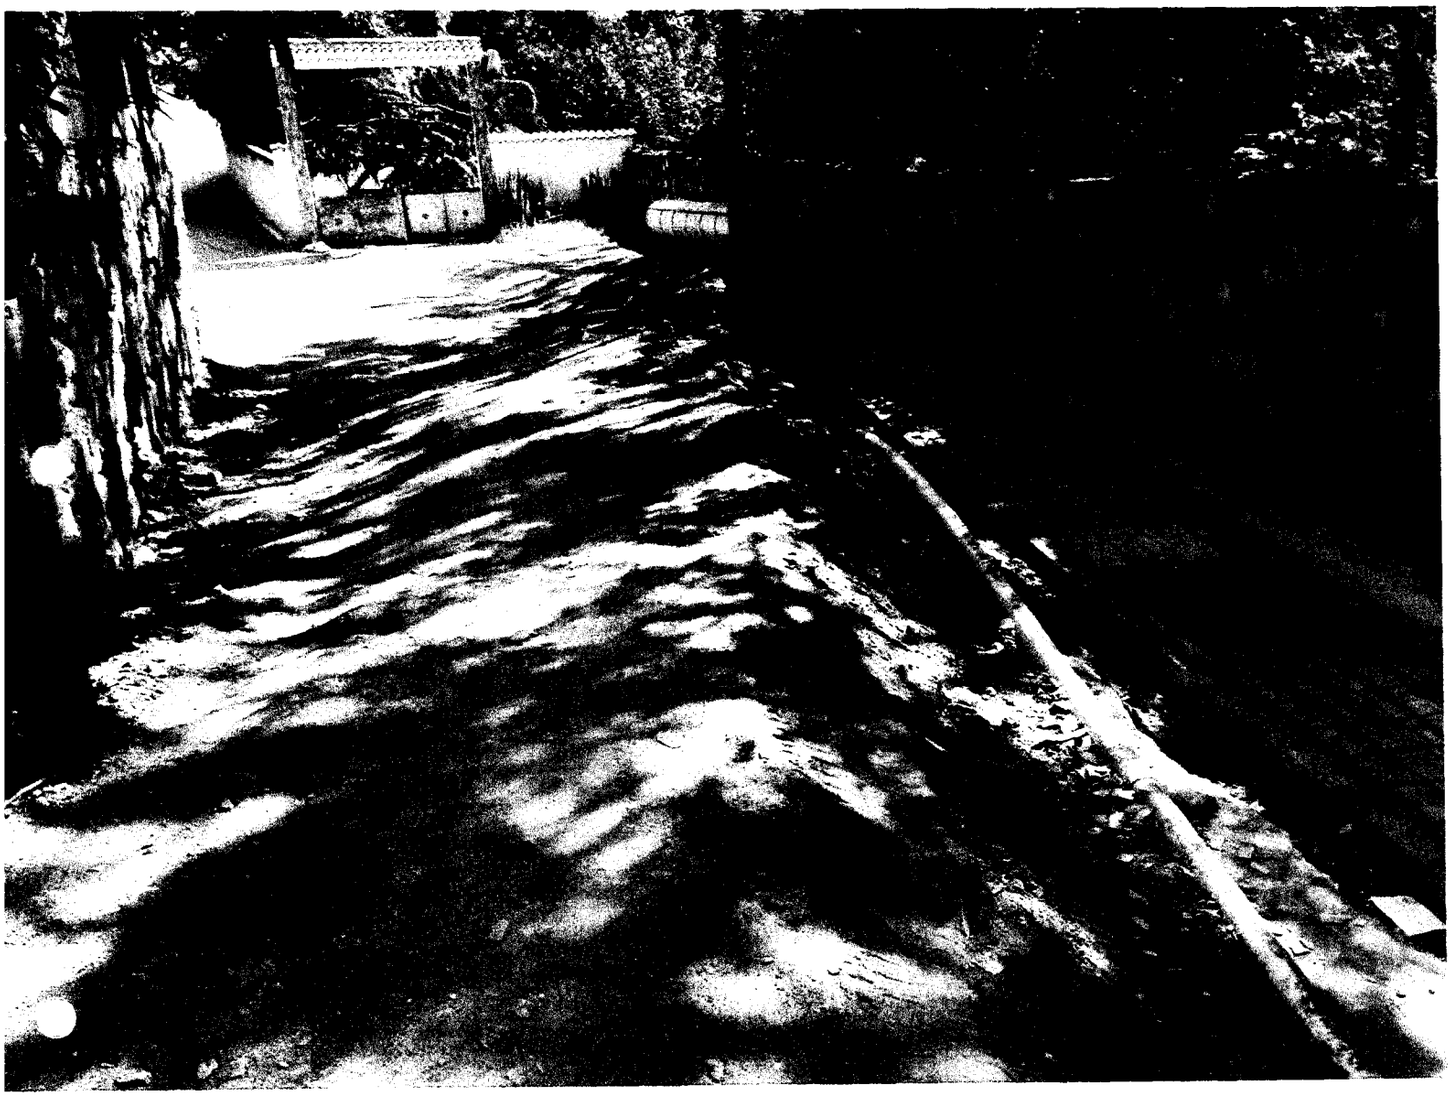



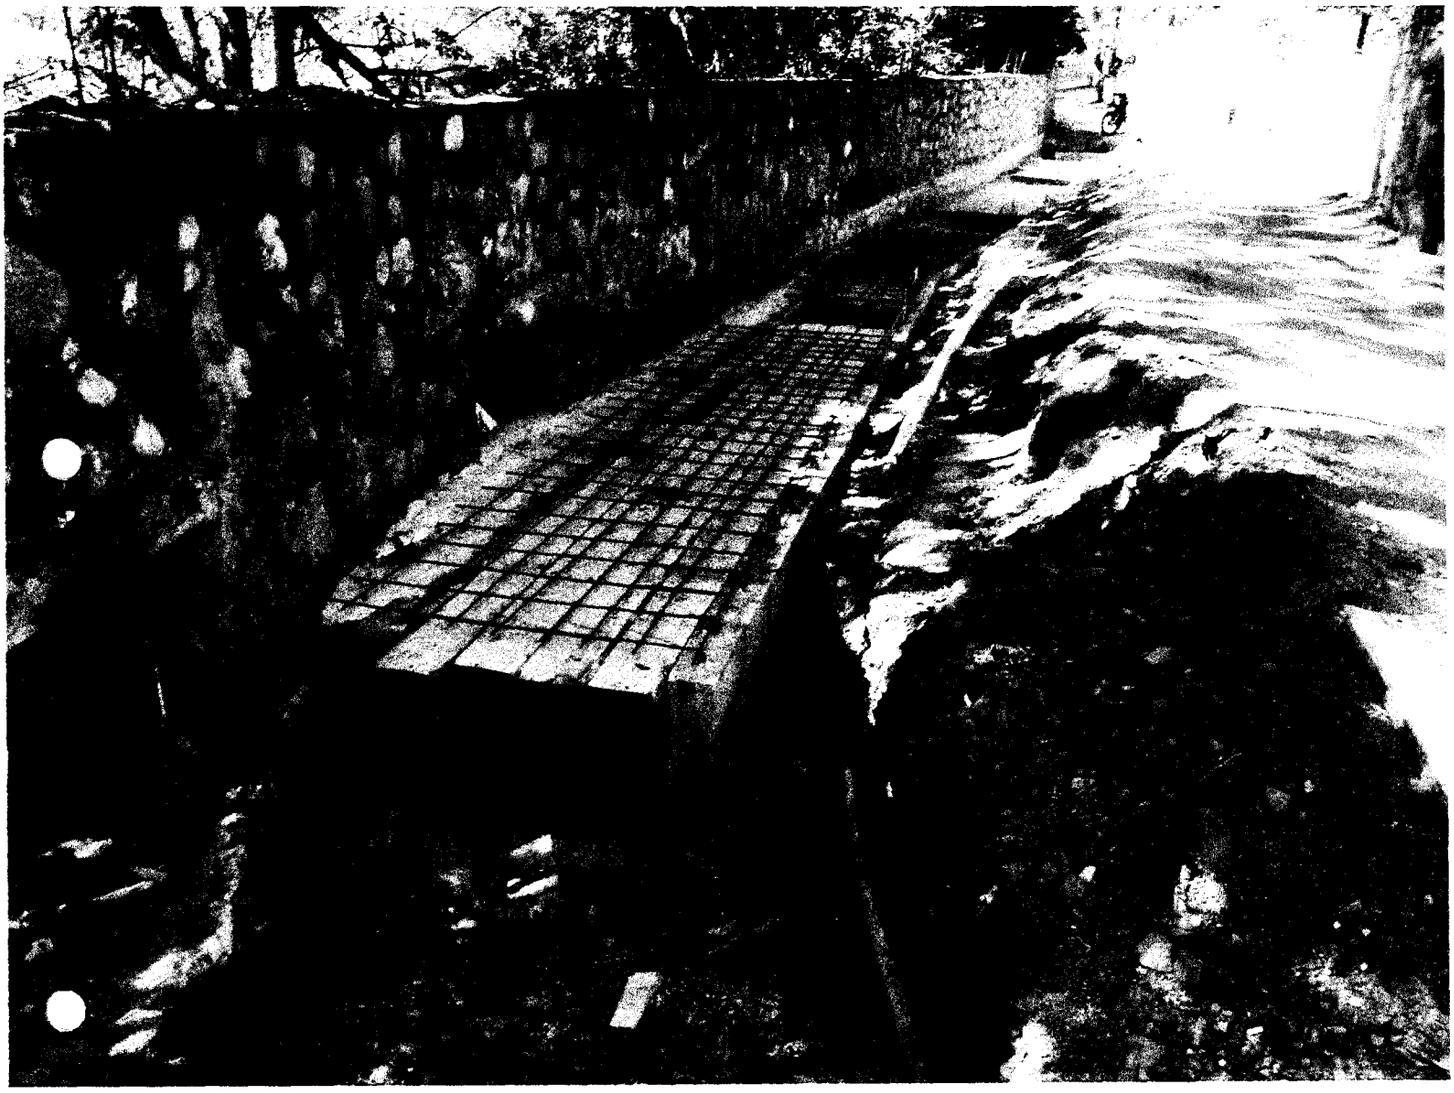









BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 4006/11/2024

CONTRATO No. 20-2024

NOMBRE: MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

REGISTRO No.	3
FECHA	25/01/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	Se realiza visita de campo, observando el retiro de adoquin existente
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA






BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 4006/11/2024

CONTRATO No. 20-2024

NOMBRE: MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA


REGISTRO No.	4
FECHA	01/03/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	Se realizan trabajos previo al pavimento, se cuenta con personal y materiales suficientes para el avance del proyecto
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA

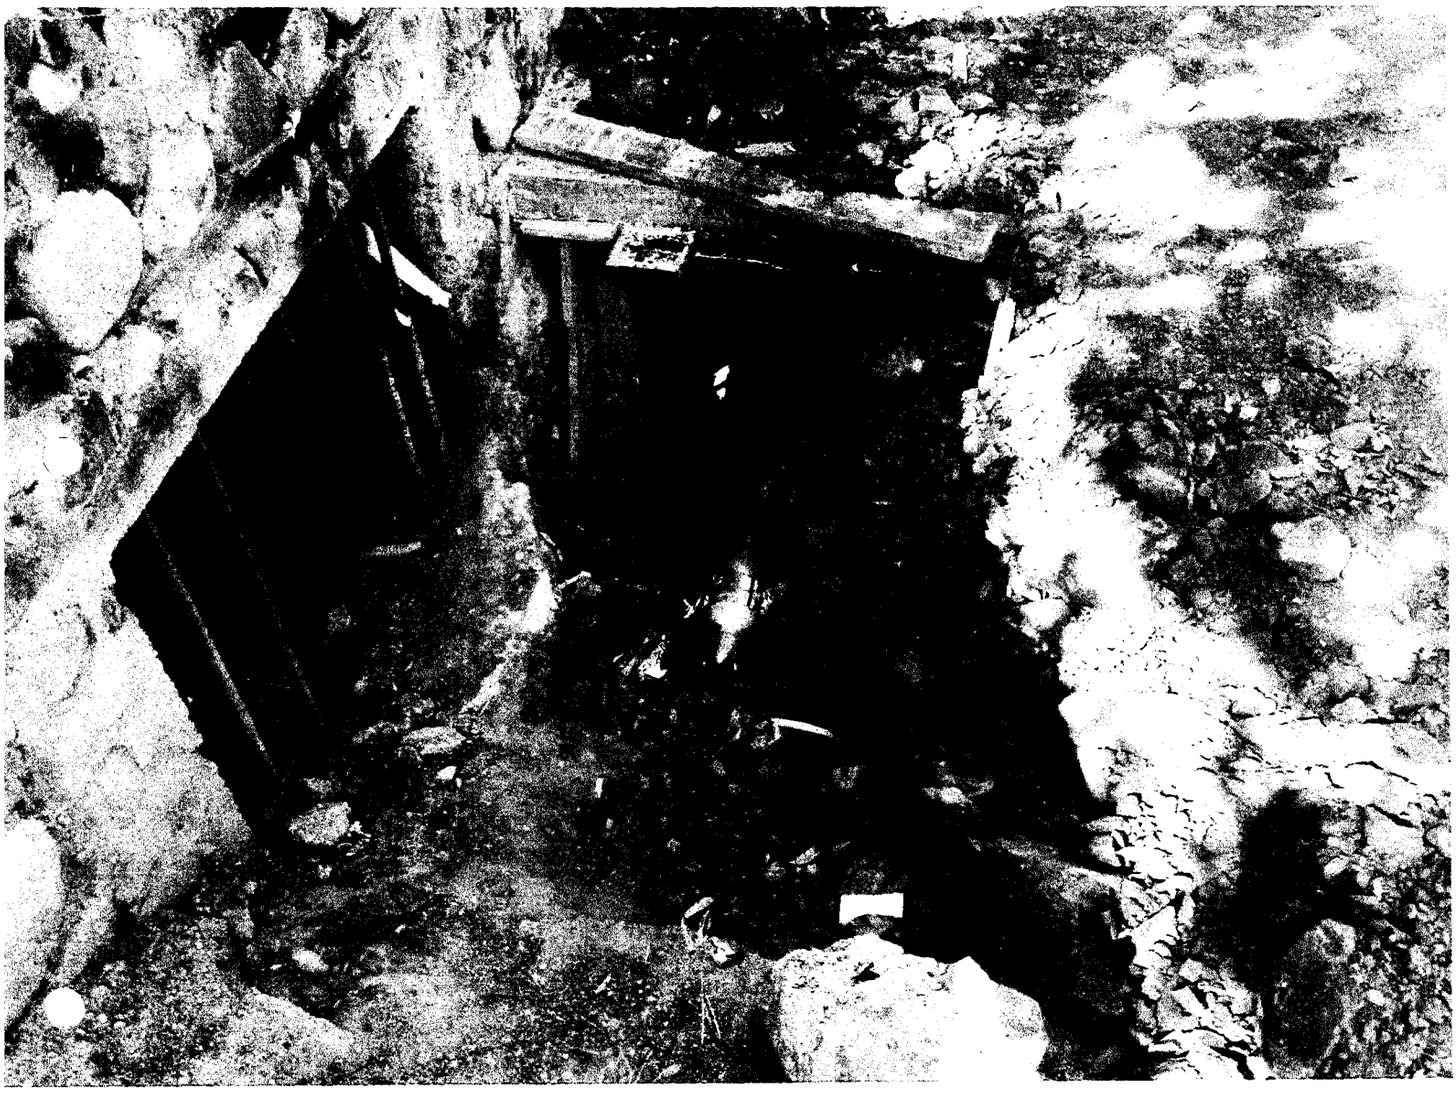







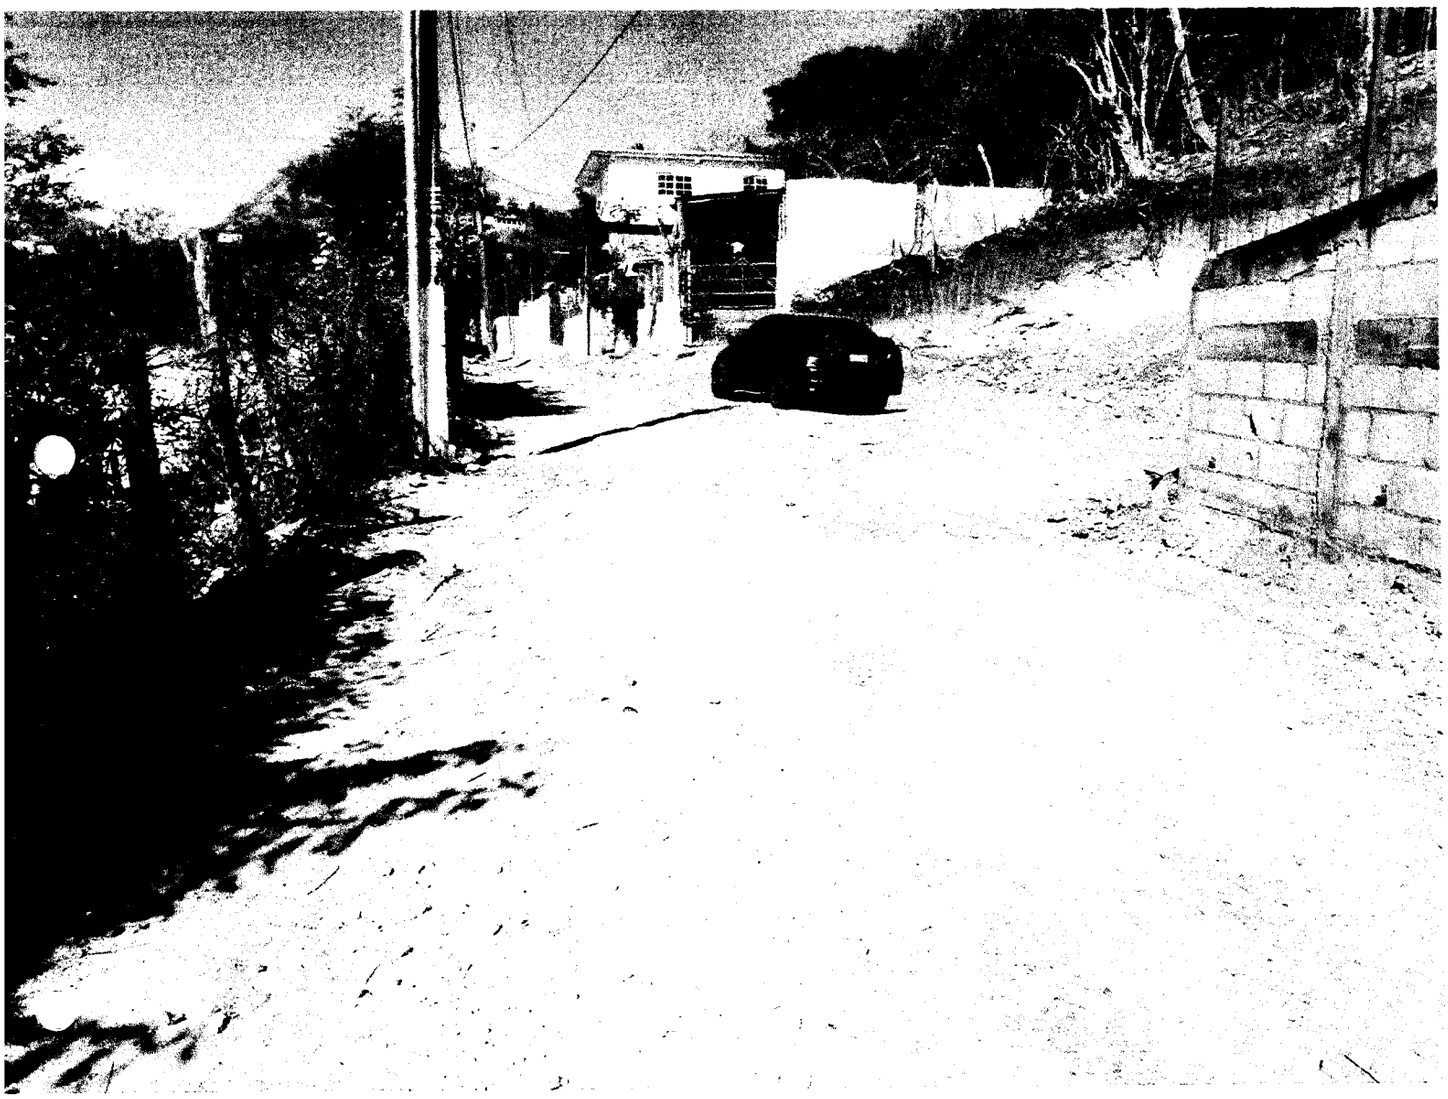

BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 4006/11/2024

CONTRATO No. 20-2024

NOMBRE: MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

REGISTRO No.	5
FECHA	22/03/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	Se encuentra colocada la base y se tiene personal suficiente y materiales adecuados y de calidad para el avance del proyecto
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA









BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 4006/11/2024

CONTRATO No. 20-2024

NOMBRE: MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

REGISTRO No.	6
FECHA	29/03/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	Se realiza la colocación de base, se cuenta con personal y materiales suficientes para el avance del proyecto
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA








BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 4006/11/2024

CONTRATO No. 20-2024

NOMBRE: MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

REGISTRO No.	7
FECHA	05/04/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	Se observa la preparacion de la base para la fundición del pavimento, se cuenta con personal y materiales suficientes para el avance del proyecto
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA

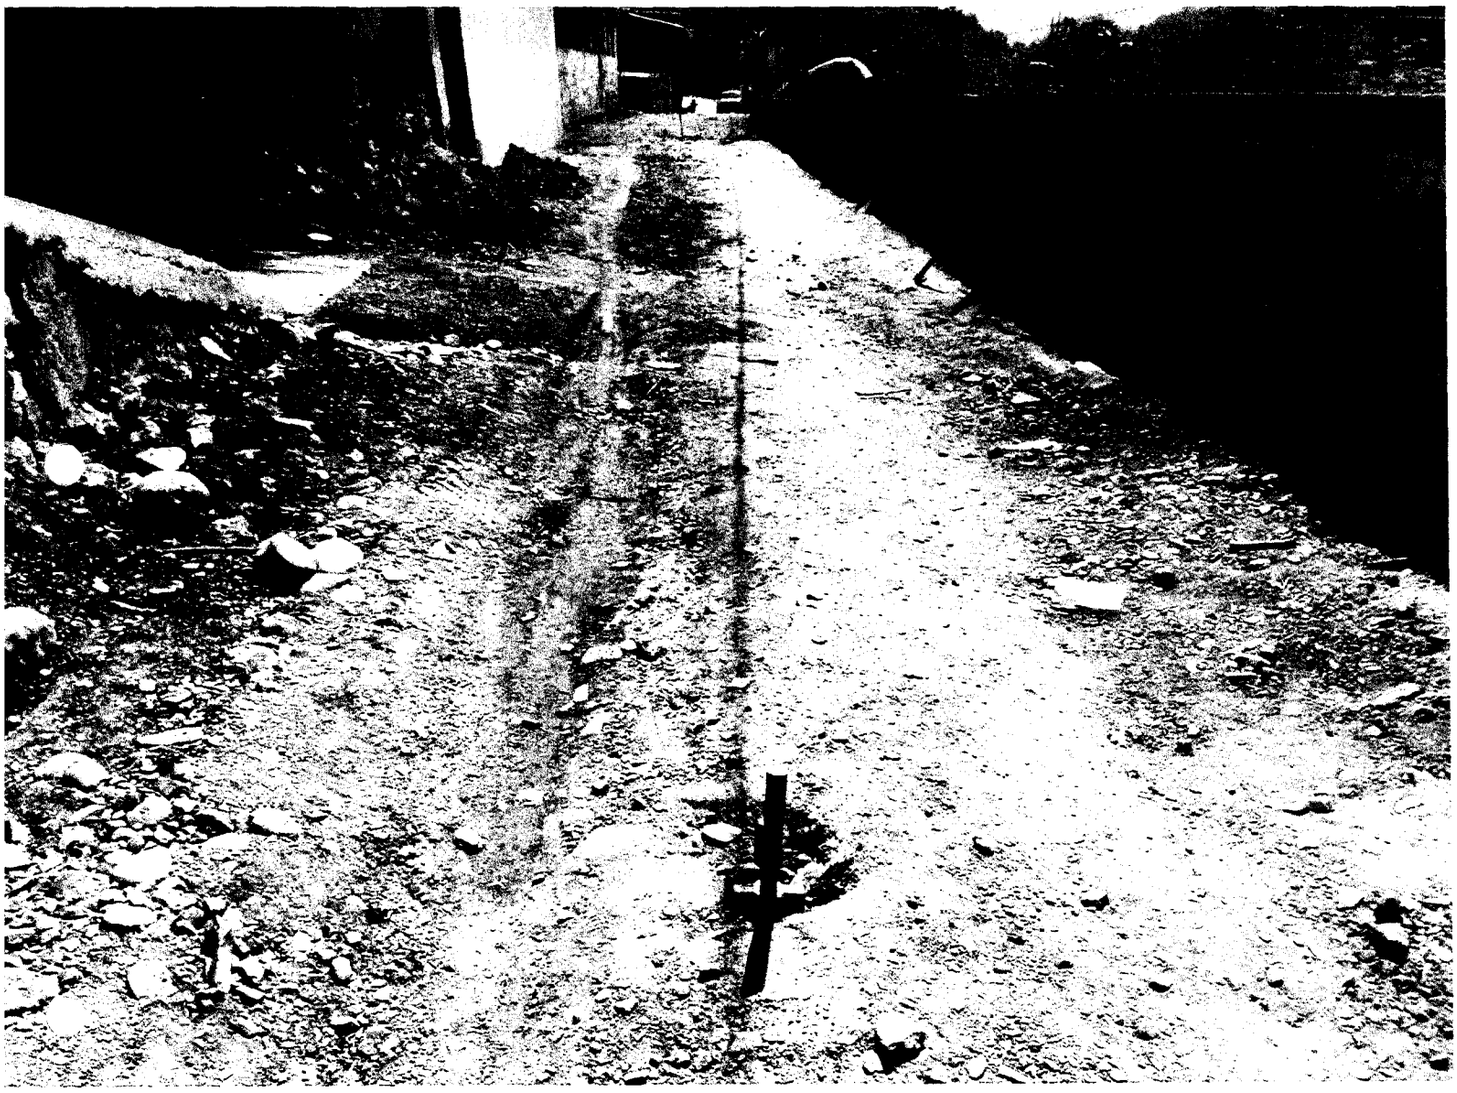







BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 4006/11/2024


CONTRATO No. 20-2024

NOMBRE: MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

REGISTRO No.	8
FECHA	28/04/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	Se realizan los preparativos para la fundicion, ademas de los trabajos previos antes de fundir, se cuenta con personal y materiales suficientes para el avance del proyecto
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA



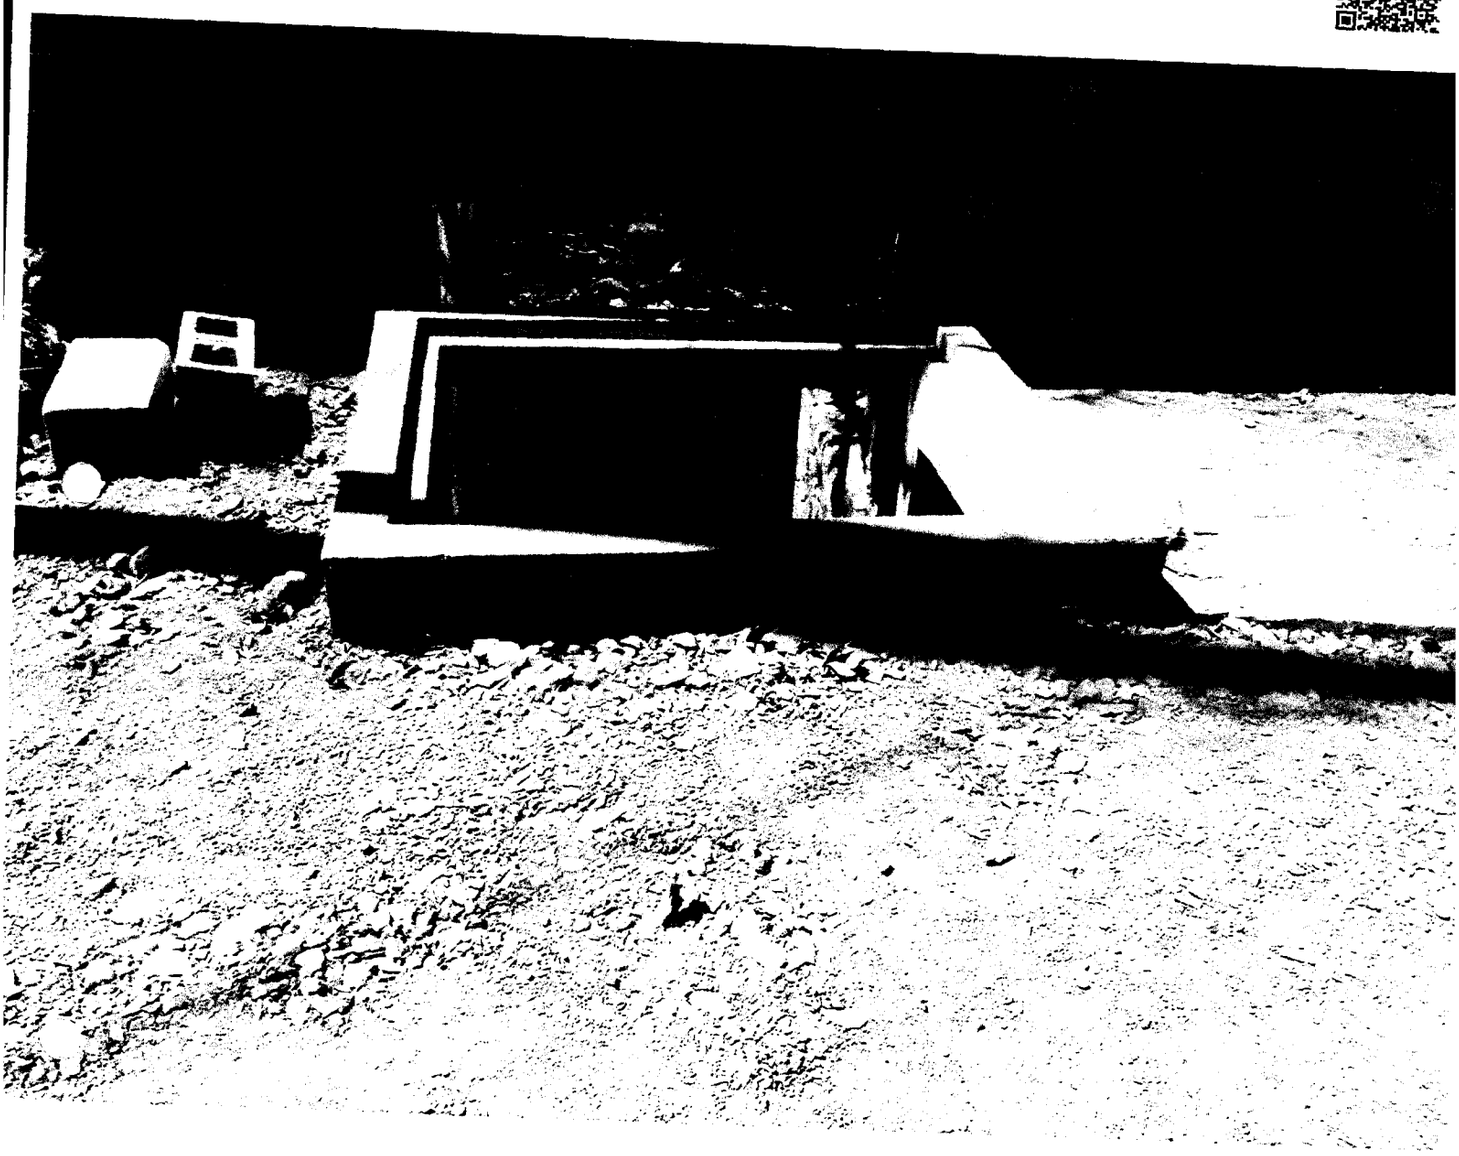









BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 4006/11/2024

CONTRATO No. 20-2024

NOMBRE: MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

REGISTRO No.	9
FECHA	06/05/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	Se tiene lista la base para la fundición del pavimento, se cuenta con personal y materiales suficientes para el avance del proyecto y
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA







