MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!

5980-0535 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
BARRIO EL CALVARIO, **GUASTATOYA EL PROGRESO**

REPORTE DE PAGO DE PROYECTOS POR CONTRATO 2024

EXPEDIENTE No. **281** NOG: **24416185** CONTRATO No. **27-2024**

PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA PATACHE, GUASTATOYA, EL PROGRESO

APORTES	% DE AVANCE	ESTIMACION	AMORTIZACION	LIQUIDO A RECIBIR
Aporte CODEDE	**79.99%**			
Q. 999,710.51		**Q. 799,900.00**	**Q. 159,980.00**	**Q. 639,920.00**
32 00 002 000 007 331 31-0101-0004				
TOTALES		**Q. 799,900.00**	**Q. 159,980.00**	**Q. 639,920.00**

Se cuenta con Informe de supervisión por parte de la empresa, informe de supervisión por el Supervisor de Obras Municipales, Punto de Concejo de aprobación de avance, Copia de bitácora.

Lic. Alexis Geovanny Marroquín Orellana
Director Municipal de Planificación

BANRURAL
El amigo que te ayuda a crecer

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
Capital de la amistad

CUENTA UNICA DEL TESORO
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA C.U.T.
CUENTA No. **3-005-09207-3**
GUATEMALA, C.A.

CHEQUE No. 79972

No. 19806022

LUGAR Y FECHA: GUASTATOYA, 16 de MAYO del 2025

Q. **839,900.00

PAGO A LA ORDEN DE: ***BALCARCEL ORELLANA, NEFTALI ***

SUMA DE: ***OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE*** QUETZALES.

GT86 BRRL 0101 0000 0030 0509 2073

FIRMA FIRMA

NO NEGOCIABLE

79972

DESCRIPCION DEL PAGO
POR CONCEPTO: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 79.99% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE RURAL, ALDEA PATACHE, GUASTATOYA, EL PROGRESO

CUENTA No.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	NUMERO DE CHEQUE: 79972 CON NUMERO DE EXPEDIENTE: 281 TRANSACCION No: 61677431 NIT BENEFICIARIO: 47663812 DELMI.ORELLANA1652025 16 de MAYO del 2025 Neftali Balcarcel Orellana REPRESENTANTE LEGAL FERRCONS BALCARCEL		

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	RECIBI CONFORME	DIA	MES	AÑO
			Neftali Balcarcel O.	20	05	2025

FORMULARIOS BANTRAB S.A. Tel. 2220-2500

T0340 3048407 87
4037407

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA ¡Sirviendo!

EXPEDIE

PROY

Aporte

Q. 999,7

32 00 00

Se cuent

Supervis

bitácora

Lic. Ale

Director

Factura

NEFTALI, BALCARCEL ORELLANA
Nit Emisor: 47663812
FERRCONS BALCARCEL
BARRIO EL PORVENIR Guastatoya, EL PROGRESO, Guastatoya
NIT Receptor: 6206107
Nombre Receptor: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
72061A5F-FB59-4E52-97D1-F05A92FA8E83
Serie: 72061A5F Número de DTE: 4216933970
Numero Acceso:
Fecha y hora de emision: 16-may-2025 11:03:25
Fecha y hora de certificación: 16-may-2025 11:03:25
Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Otros Descuentos(Q)	Total (Q)	Impuestos	
1	Bien	1	PAGO DEL 79.99% DE AVANCE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA PATACHE, GUASTATOYA, EL PROGRESO. SEGUN CONTRATO No. 27-2024 ESTIMACION Q. 799,900.00 AMORTIZACION Q. 159,980.00 LIQUIDO A RECIBIR Q. 639,920.00	799,900.00	0.00	0.00	799,900.00	IVA	85,703.571429
			TOTALES:		0.00	0.00	799,900.00	IVA	85,703.571429

* Sujeto a pagos trimestrales ISR

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

"Contribuyendo por el país que todos queremos"

FORMA 7-B INGRESOS VARIOS

RECIBO DE LA MUNICIPALIDAD

DE GUASTATOYA,

DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO

SERIE B **No.** 636302

FECHA: DIA 8 | MES 5 | AÑO 2025

Seiscientos treinta y nueve mil novecientos

POR: veinte con 00/100 quetzales CODIGO JURISDICCIONAL: D-4 5201

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: Consejo Departamental de Desarrollo

DIRECCION: El Progreso

ARBITRIOS	ORNATO Q.4.00 ☐ 10.00 ☐ 15.00 ☐ 50.00 ☐ 75.00 ☐ 100.00 ☐ 150.00 ☐ ☐ ☐	Q.	
TASAS	VARIOS		
	LICENCIAS		
	ESTACIONAMIENTOS		
	CERTIFICACIONES		
	CEDULAS		
	MERCADOS		
	SERVICIOS VARIOS		
	SERVICIOS AGUA		
	SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA		
CONTRIBUCIONES	CONCEPTO Pago del 79.99 % segundo desembolso del		
MULTAS	CONCEPTO proyecto mejoramiento calle rural aldea		Q639,920.00
OTROS	VARIOS patache, Guastatoya, El Progreso, SNIP 334533 convenio No. 084-2024, fuente 12, subprograma 7		

LECTURA DE CONTADOR: ACTUAL ____ ANTERIOR ____

OBSERVACIONES:

TOTAL Q. Q639,920.00

VALIDO UNICAMENTE POR EL IMPORTE IMPRESO POR LA CAJA REGISTRADORA MUNICIPAL Y/O NOMBRE FIRMA Y SELLO DEL RECEPTOR MUNICIPAL

FIRMA DEL RECEPTOR MUNICIPAL

CUENTA

ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA ¡Sirviendo!

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA ¡Sirviendo!

ORIGINAL-ENTERANTE

AUTORIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SAT/ES. No. 81/5975 Clas.: 920-12-9-1-4-97 DEL 25-06-97.

2045310 T-0340 1019911 87

FORMULARIOS STANDARD, S.A. PBX: 2420-9900 - NIT: 1932227-1 - 150,000 - 10/2022 DEL No. 500,001 AL No. 650,000. SERIE B. EXPO MUNICIPAL No. 4910 DE FECHA 13/10/2022 NUMERO CORRELATIVO 0-10-2022 DE FECHA 13/10/2022 No. DE CUENTA: 13-21 CHICO SIN NUMERO DE FECHA 13/10/2022 LIBRO 10575 FOLIO 7.

www.standard-sa.com

MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!

5980-0535 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
BARRIO EL CALVARIO, GUASTATOYA EL PROGRESO

06/05/25
13:47

LA INFRASCRITA SECRETARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO,

CERTIFICA:

Que para su cumplimiento y efectos consiguientes se transcribe la **AUTENTICIDAD** del punto **SÉPTIMO** del acta **31-2025** de fecha veinticinco de abril de dos mil veinticinco del libro número 3,539 de sesiones ordinarias del Concejo Municipal, debidamente autorizado por la Contraloría General de Cuentas, el que copiado literalmente dice:

SÉPTIMO: La Secretaria Municipal hace del conocimiento del Honorable Concejo Municipal, sobre el oficio Ref.agmo/DMP/164-2025 presentado por el Licenciado Alexis Geovanny Marroquín Orellana, Director de la Dirección Municipal de Planificación, en el cual informa que el proyecto **MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA PATACHE, GUASTATOYA, EL PROGRESO,** Contrato administrativo número **27-2024** de fecha 04 de diciembre de 2024, ejecutado por la empresa **FERRCONS BALCARCEL** siendo su propietario NEFTALI BALCARCEL ORELLANA, presentó informe del **80%** de avance físico. Por lo tanto solicita que se apruebe el pago del 80% de avance físico del proyecto antes mencionado a la empresa **FERRCONS BALCARCEL...** Consiguientemente y en cumplimiento al numeral 2) de la Cláusula Cuarta del contrato en referencia, presenta el informe de supervisión signado por el Ingeniero JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA, Supervisor de Obras Municipales, por medio del cual informa de la estimación, del avance físico del referido proyecto, indicando que se encuentra en un avance físico del 80.00%, anexa el detalle que contiene los renglones de trabajo para la presente estimación. **CONSIDERANDO:** Que la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, en el artículo 59 establece: "Estimaciones para pago. La entidad contratante podrá hacer pagos parciales al contratista contra estimaciones periódicas de trabajo ejecutado y aceptado, las que podrán efectuarse mensualmente de acuerdo con las estipulaciones pactadas." **CONSIDERANDO:** Que el Código Municipal y sus reformas, del Decreto 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala, en el Artículo 35 literal a) establece: Atribuciones Generales del Concejo Municipal "son atribuciones del Concejo Municipal: a) La iniciativa, deliberación y decisión de los asuntos municipales...". **POR TANTO:** El Concejo Municipal, con fundamento en los considerandos y las facultades que le confiere el Código Municipal y sus reformas, del Decreto 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala, y por **UNANIMIDAD DE VOTOS, RESUELVE: I)** Se tiene por recibido el oficio presentado, agregándose al expediente respectivo. **II) APROBAR**, el pago equivalente al avance físico del 80%, a favor de la empresa mercantil **FERRCONS BALCARCEL** siendo su propietario NEFTALI BALCARCEL ORELLANA, de conformidad con el monto de estimación de avance físico, anexa el detalle que contiene los renglones de trabajo para la presente estimación, presentados por el Supervisor de Obras Municipales del proyecto **"MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA PATACHE, GUASTATOYA, EL PROGRESO"**, el que se ejecuta con el Contrato Administrativo 27-2024. **III)** Se le ordena al Director de Administración Financiera Integrada Municipal, hacer las operaciones contables correspondientes y proceder al pago de conformidad con lo aprobado en el numeral romano II) del presente punto resolutivo. **IV)** Notifíquese.

(Fs) Ilegibles José Elías Herrera Guerra, Alcalde Municipal, Ing. Byron Fernando Calderón Ferrera y Eduardo Ortega Loaiza, Síndicos Primero y Segundo respectivamente, Herman Archila Morales, Erasmo Beltetón Contreras, Nery Rolando Archila Orellana, Julio Mauricio Marroquín González, Fryda Aimée Estrada Ortiz, Concejales Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto, respectivamente y Licda. Evelyn Yaneth Oajaca Marroquín, Secretaria Municipal.

DADO EN EL PALACIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE GUASTATOYA, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, A VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICINCO.

SECRETARIA

LICDA. EVELYN YANETH OAJACA MARROQUÍN
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA ¡Sirviendo!

MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!

5980-0535 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
BARRIO EL CALVARIO, **GUASTATOYA EL PROGRESO**

INFORME DE SUPERVISION

Guastatoya, 10 de Marzo de 2025

SEÑOR: JOSE ELIAS HERRERA GUERRA Y CONSEJO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
EL PROGRESO

De la manera más atenta me dirijo a usted deseándole toda clase de éxitos en sus labores diarias.

El motivo de la presente es para hacerle saber lo siguiente:

En visita de supervisión realizada al proyecto denominado **MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA PATACHE, GUASTATOYA, EL PROGRESO,** con número de contrato **27-2024** de fecha 24 de Diciembre de 2024, ejecutado por la empresa **FERRCONS BALCARCEL**, financiado por la Municipalidad de Guastatoya, se tiene a la vista el oficio de Marzo de 2025 en el cual se hace la solicitud de la estimación del proyecto para un avance del **80.00%**, para lo cual se adjunta el informe de supervisión y el informe de parte de la empresa.

Agradeciendo su atención y en espera de darle seguimiento a este asunto me suscribo de ustedes.

Atentamente

ING. JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA
SUPERVISOR MUNICIPAL, GUASTATOYA
EL PROGRESO

D.M.P.	SUPERVISION DE OBRAS	Dirección Municipal de Planificación

Comunidad.	Contrato Municipal.
Aldea Patache, Guastatoya, El Progreso	27-2024

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del proyecto.	Ubicación del proyecto.
MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA PATACHE, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Aldea Patache, Guastatoya, El Progreso
Contratista. FERRCONS BALCARCEL	**Ubicación del proyecto.** Aldea Patache, Guastatoya, El Progreso
Monto Contratado. Q 999,710.51	**Avance Físico.** 80.00%
Informe de Supervisión No. 1	**Fecha.** 10 de Marzo de 2025

2. AVANCE DE EJECUCION DEL PROYECTO

No.	Descripcion del Renglón	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Total a la Fecha	Avance Físico %
1	TRAZO Y ESTAQUEADO	351.00	M	Q 6.73	Q 2,362.23	Q 2,362.23	100%
2	CORTE DE CAJUELA DE 0.20 MTS	1,350.00	M2	Q 68.41	Q 92,353.50	Q 92,353.50	90%
3	NIVELACIÓN DE SUB BASE	1,350.00	M2	Q 69.85	Q 94,297.50	Q 94,297.50	90%
4	COLOCACIÓN + COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR DE 0.10 MTS	1,325.00	M2	Q 131.40	Q 174,105.00	Q 174,105.00	89%
5	COLOCACIÓN DE ADOQUIN TRAFICO LIVIANO	1,275.72	M2	Q 269.87	Q 344,278.56	Q 344,278.56	85%
6	LLAVE DE CONFINAMIENTO	49.99	M	Q 178.43	Q 8,919.62	Q 8,919.62	34%
7	BORDILLO	400.00	M	Q 208.63	Q 83,452.00	Q 83,452.00	65%
8	CUNETA TIPO L	-	M	Q 444.55	Q -	Q -	0%
					Q 799,768.41	**Q 799,768.41**	**80.00%**

Estos renglones de trabajo dan como resultado un avance físico del **80.00% por lo cual se aprueba realizar el pago correspondiente**

3. DESCRIPCION DEL PROYECTO.

Este proyecto consiste en el mejoramiento de la calle de acceso hacia aldea patache, ya que originalmente se encontraba de terraceria y se mejoro con la colocacion de adoquin

4. RECOMENDACIONES.

Chequear los trabajos realizados para garantizar la durabilidad de los mismos, y terminar los trabajos faltantes, los que no se encuentran al 100 % y los que no se han iniciado aun

SUPERVISOR DE PROYECTOS MUNICIPALES.

José F. Alexander Aguilar Mejia
Ingeniero Civil
Colegiado No. 23385

ING. JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA
SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES

D.M.P.	SUPERVISION DE OBRAS	Dirección Municipal de Planificación

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del proyecto.	**Ubicación del proyecto.**
MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA PATACHE, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Aldea Patache, Guastatoya, El Progreso


2. INFORME FOTOGRAFICO.









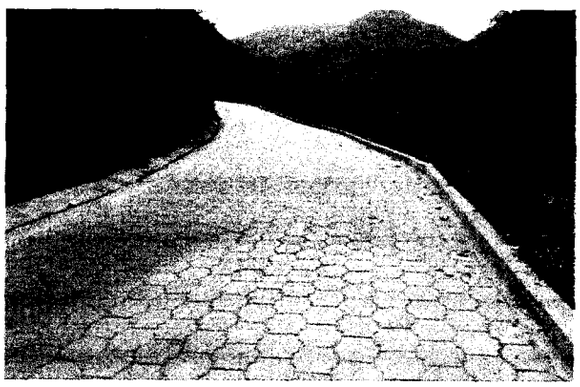

SUPERVISOR DE PROYECTOS MUNICIPALES.

Jose F. Alexander Aguilar Mejia
Ingeniero Civil
Colegiado No. 9,998

ING. JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA
SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES

REPORTE DE AVANCE FISICO No. 1

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA PATACHE, GUASTATOYA, EL PROGRESO	
Municipio: GUASTATOYA	**Departamento: EL PROGRESO**
Comunidad: ALDEA PATACHE	**Fecha de Contrato: 24/12/2024**
Fecha de Inicio: 17/12/2024	**Fecha de Supervision: 06/03/2025**
Fecha de Finalizacion: 16/04/2025	**Unidad Ejecutora: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA**
Contrato No.: 27-2024	**Valor del Proyecto: Q.999,710.51**
Modificaciones:	**Valor Original: Q.999,710.51**
Constructora: FERRCONS BALCARCEL	**Telefono:**
Representante legal: NEFTALI BALCARCEL ORELLANA	

RESUMEN DE RENGLONES

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES DE TRABAJO				ORDEN DE CAMBIO	ORDEN DE TRABAJO SUPLEMENTARIO	ORDEN DE TRABAJO EXTRA	RENGLON MODIFICADO	CANTIDADES EJECUTADAS PRIMERA ESTIMACION		ACUMULADO A LA FECHA		PORCENTAJE
		CANTIDAD	UNIDAD	P UNITARIO	TOTAL	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	TOTAL
1	TRAZO Y ESTAQUEADO	351.00	M	Q 6.73	Q 2,362.23					351.00	Q 2,362.23	351.00	Q 2,362.23	0.24%
2	CORTE DE CAJUELA DE 0.20 MTS	1,495.00	M2	Q 68.41	Q 102,272.95					1,350.00	Q 92,353.50	1,350.00	Q 92,353.50	9.24%
3	NIVELACIÓN DE SUB BASE	1,495.00	M2	Q 69.85	Q 104,425.75					1,350.00	Q 94,297.50	1,350.00	Q 94,297.50	9.43%
4	COLOCACIÓN + COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR DE 0.10 MTS	1,495.00	M2	Q 131.40	Q 196,443.00					1,325.00	Q 174,105.00	1,325.00	Q 174,105.00	17.42%
5	COLOCACIÓN DE ADOQUIN TRAFICO LIVIANO	1,495.00	M2	Q 269.87	Q 403,455.65					1,275.72	Q 344,278.56	1,275.72	Q 344,278.56	34.44%
6	LLAVE DE CONFINAMIENTO	148.00	M	Q 178.43	Q 26,407.64					49.99	Q 8,919.62	49.99	Q 8,919.62	0.89%
7	BORDILLO	613.00	M	Q 208.63	Q 127,890.19					400.00	Q 83,452.00	400.00	Q 83,452.00	8.35%
8	CUNETA TIPO L	82.00	M	Q 444.55	Q 36,453.10					-	Q -	-	Q -	0.00%
				COSTO TOTAL DEL PROYECTO	Q 999,710.51						Q 799,768.41		Q 799,768.41	80.00%

VALOR DE ESTIMACION No. 1	Q	799,768.41
AMORTIZACION DEL ANTICIPO (20%)	Q	159,953.68
PENDIENTE DE AMORTIZAR	Q	39,988.42
LIQUIDO A RECIBIR	**Q**	**639,814.73**

José F. Alexander Aguilar Mejía
Ingeniero Civil

JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES

FERRCONS BALCARCEL
Barrio El Porvenir, Guastatoya, El Progreso.

Neftali Balcarcel Orellana
Propietario
Tel. 7945-0030 Cel. 5630-3868
Correo Electrònico: balcarcel.2000@hotmail.com

Guastatoya, 06 de marzo del 2025

SEÑOR
ALCALDE MUNICIPAL Y
HONORABLE CORPORACION
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA,
GUASTATOYA, EL PROGRESO.

Es un honor para mi, poderles expresar un profundo y respetuoso saludo, y a la vez comunicarles que el proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA PATACHE, GUASTATOYA, EL PROGRESO."** El cual está respaldado con el contrato de obra No. **27-2024** de fecha **04 de diciembre del 2024.** Cuenta con un avance físico del , (80%) por lo que presento a usted el cuadro de estimación sobre dicho avance físico, **SOLICITANDO** a la vez el pago de la misma.

Sin otro particular, me suscribo.

ATENTAMENTE:

Neftali Balcarcel Orellana
REPRESENTANTE LEGAL
FERRCONS BALCARCEL

NEFTALI BALCARCEL ORELLANA
FERRCONS BALCARCEL.

ESTIMACION DE TRABAJO: UNO
NOMBRE DE LA EMPRESA: FERRCONS BALCARCEL
NOMBRE DEL PROYECTO: Mejoramiento Calle rural aldea Patache Guastatoya, El Progreso.

DATOS DEL CONTRATO:	27-2024		FECHA:	4/12/2024	MONTO:	Q 999,710.51

Renglón	RENGLONES DE TRABAJO/CANTIDADES					Cantidad EJECUTADA				Cantidad pendiente de EJECUTAR		
	DESCRIPCION	Cantidad	Unidad	Precio	Costo total	Este	Acumulado	Q	%	Este	Q	%
1	TRAZO Y ESTAQUEADO	351.00	M	Q 6.73	Q 2,362.23	351.00		Q 2,362.23	100%	0	Q -	0%
2	CORTE DE CAJUELA DE 0.20 MTS	1,495.00	M2	Q 68.41	Q 102,272.95	1350.00		Q 92,353.50	90%	145	Q 9,919.45	10%
3	NIVELACIÓN DE SUB BASE	1,495.00	M2	Q 69.85	Q 104,425.75	1350.00		Q 94,297.50	90%	145	Q 10,128.25	10%
4	COLOCACIÓN + COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPEOR DE 0.10 MTS	1,495.00	M2	Q 131.40	Q 196,443.00	1325.00		Q 174,105.00	89%	170	Q 22,338.00	11%
5	COLOCACIÓN DE ADOQUÍN TRÁFICO LIVIANO	1,495.00	M2	Q 269.87	Q 403,455.65	1275.72		Q 344,278.56	85%	219.28	Q 59,177.09	15%
6	LLAVE DE CONFINAMIENTO	148.00	M	Q 178.43	Q 26,407.64	49.98948		Q 8,919.62	34%	98.01052	Q 17,488.02	66%
7	BORDILLO	613.00	M	Q 208.63	Q 127,890.19	400.00		Q 83,452.00	65%	213	Q 44,438.19	35%
8	CUNETA TIPO L	82.00	M	Q 444.55	Q 36,453.10			Q -	0%	82	Q 36,453.10	100%
					Q 999,710.51	Cantidad ejecutada		Q 799,768.41	80.00%		Q 199,942.10	20.00%

NEFTALI BALCARCEL ORELLANA
FERRCONS BALCARCEL

Neftali Balcarcel Orellana
REPRESENTANTE LEGAL
FERRCONS BALCARCEL

Monto bruto de esta Estimación	Q	799,768.41
Anticipos	Q	199,942.10
Amortización de Anticipos 20%	Q	159,953.68
Monto neto de esta Estimación	Q	639,814.73
Menos 1er. Pago		
Menos 2do Pago		
Menos 3er. Pago		
Menos 4to. Pago		

Liquido a Recibir	**Q**	**639,814.73**

Guastatoya 06 de marzo del 2,025

Carlos Ramiro Ortega Lima
Ingeniero Civil
Col. 7118

FERRCONS BALCARCEL
Barrio El Porvenir, Guastatoya, El Progreso.


Neftali Balcarcel Orellana
Propietario
Tel. 7945-0030 Cel. 5630-3868
Correo Electrònico: balcarcel.2000@hotmail.com

INFORME FOTOGRAFICO

MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA PATACHE GUASTATOYA, EL PROGRESO







Neftali Balcarcel Orellana
REPRESENTANTE LEGAL
FERRCONS BALCARCEL

Carlos Ramiro Ortega Lima
Ingeniero Civil
Col. 7118

Contraloría General de Cuentas
GUATEMALA, C.A.

Bitácora Electrónica

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA Y GESTIÓN AMBIENTAL

UNIDAD DE BITÁCORAS – DATOS DE LA BITÁCORA ELECTRÓNICA –

BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 4438/12/2024

No. CONTRATO	27-2024
FECHA CONTRATO	04/12/2024
MONTO CONTRACTUAL	999,710.51
NOG	24416185
NOMBRE DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA PATACHE, GUASTATOYA, EL PROGRESO
UBICACIÓN DEL PROYECTO	Guastatoya, EL PROGRESO
ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
NOMBRE DEL SUPERVISOR	CARLOS RANIRO ORTEGA LIMA
EMPRESA EJECUTORA	NEFTALI BALCARCEL ORELLANA
REPRESENTANTE LEGAL O CONTRATISTA	NEFTALI BALCARCEL ORELLANA
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA
SUPERVISOR EMPRESA SUPERVISORA	

FECHA DE AUTORIZACIÓN 09/12/2024

BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 4438/12/2024

CONTRATO No. 27-2024

NOMBRE: MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA PATACHE, GUASTATOYA, EL PROGRESO

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

REGISTRO No.	1
FECHA	13/01/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	BITACORA DE INICIO DE PROYECTO se adjunta acta de inicio no 26-2024 para hacer constar el inicio de los trabajos a realizar en el proyecto
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA



Municipalidad de Guastatoya, Departamento de El Progreso

DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION

LIBRO DE ACTAS DE INICIO DE OBRAS Nº 0176

ACTA DE INICIO NO. 26-2024

PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA PATACHE, GUASTATOYA, EL PROGRESO. IDENTIFICADO CON NOG. 24416185, EN GUATECOMPRAS. ----------

En el Municipio de Guastatoya, Departamento El Progreso, siendo las nueve horas en punto del día martes diecisiete de diciembre de dos mil veinticuatro, reunidos en el área donde se va a ejecutar el Proyecto. **MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA PATACHE, GUASTATOYA, EL PROGRESO.** Los señores: José Elías Herrera Guerra, Alcalde Municipal; Ing. José Fulgencio Alexander Aguilar Mejía, Supervisor de Obras Municipales; Neftalí Balcárcel Orellana, Representante Legal de la Empresa Constructora; Ing. Carlos Ramiro Ortega Lima, Supervisor Residente del Proyecto; Lic. Alexis Geovanny Marroquín Orellana, Director de la Dirección Municipal de Planificación; con el objeto de dejar constancia de lo siguiente. **PRIMERO:** Se faciona la presente acta para dejar constancia de Inicio del Proyecto: **MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA PATACHE, GUASTATOYA, EL PROGRESO.** El cual será ejecutado con fondos extraordinarios provenientes del Consejo Departamental de Desarrollo para el ejercicio fiscal 2,024; por un Valor de Novecientos Noventa y Nueve Mil Setecientos Diez Quetzales con Cincuenta y Un Centavos (Q. 999.710.51), con un plazo de cuatro meses calendario el cual, por adjudicación en los procesos y requisitos de GUATECOMPRAS, lo ejecutará la empresa **FERRCONS BALCARCEL,** Habiendo sido publicado en el Sistema de Guatecompras la adjudicación bajo el NOG- 24416185, Según Contrato Administrativo No. 27-2024 de fecha cuatro de diciembre del dos mil veinticuatro. **SEGUNDO:** Los señores anteriormente mencionados declaran iniciados los trabajos, los cuales se realizarán con base a planos y especificaciones elaboradas para el presente proyecto y de acuerdo al contrato respectivo. **TERCERO:** El Señor Alcalde Municipal recomienda al representante de la empresa constructora, al supervisor residente de la empresa y supervisor de obras municipales que los trabajos sean ejecutados en base al diseño y especificaciones propias de este proyecto y presentar los avances del mismo para el pago respectivo con la documentación de soporte. **CUARTO:** No habiendo más que agregar se da por terminada la presente en el mismo lugar y fecha media hora después de su inicio. Leída se acepta, ratifica y firma por los que en ella intervenimos Damos fe. ----------

ALCALDE

José Elías Herrera Guerra
Alcalde Municipal

Lic Alexis Geovanny Marroquín Orellana
Director
Direceión Municipal de Planificación

Neftalí Balcarcel Orellana
REPRESENTANTE LEGAL
FERRCONS BALCARCEL

Neftalí Balcárcel Orellana
Representante de la empresa

Ing. Carlos Ramiro Ortega Lima
Supervisor Residente

Carlos Ramiro Ortega Lima
Ingeniero Civil
Col. 7118

José F. Alexander Aguilar Mejía
Ingeniero Civil
Colegiado No. 8 [illegible]

Ing. José Fulgencio Alexander Aguilar Mejía
Supervisor de Obras Municipales

BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 4438/12/2024

CONTRATO No. 27-2024

NOMBRE: MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA PATACHE, GUASTATOYA, EL PROGRESO

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

REGISTRO No.	2
FECHA	18/01/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	El dia de hoy se realiza visita de campo para ver el avance del proyecto de adoquinado, observando un buen avance en la colocación del adoquin, se cuenta con personal y materiales suficientes para el avance del proyecto
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA

















BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 4438/12/2024

CONTRATO No. 27-2024


NOMBRE: MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA PATACHE, GUASTATOYA, EL PROGRESO

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

REGISTRO No.	3
FECHA	25/01/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	Se realiza visita de campo para ver el avance del proyecto, se observa que el adoquin se encuentra colocado en su totalidad y se estan fundiendo los bordillos
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA





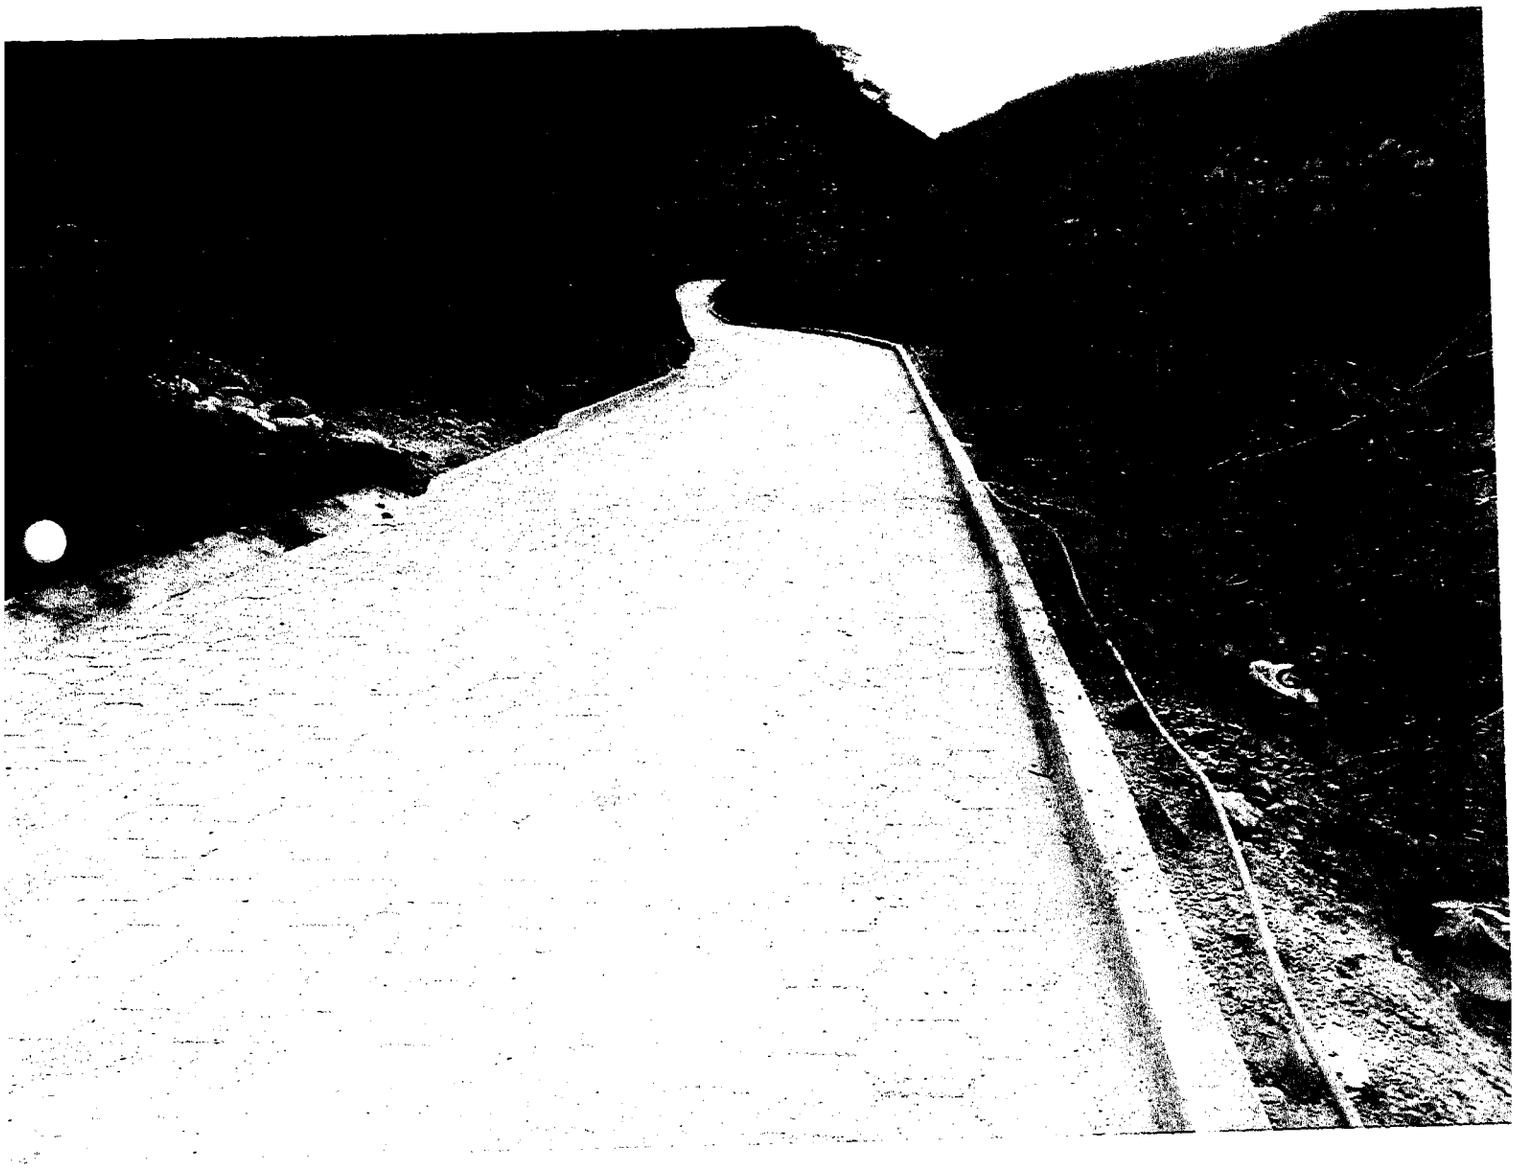





BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 4438/12/2024

CONTRATO No. 27-2024

NOMBRE: MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA PATACHE, GUASTATOYA, EL PROGRESO

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

REGISTRO No.	4
FECHA	01/02/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	El adoquin se encuentra instalado, igual el bordillo, ya se tiene la cuneta, se estan sellando sizas
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA











BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 4438/12/2024

CONTRATO No. 27-2024

NOMBRE: MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA PATACHE, GUASTATOYA, EL PROGRESO

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

REGISTRO No.	5
FECHA	10/03/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	El adoquin se encuentra colocado en su totalidad, también el bordillo fundido, se cuenta con personal y materiales suficientes para el avance del proyecto
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA







