MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!

5980-0535 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
BARRIO EL CALVARIO, **GUASTATOYA EL PROGRESO**

REPORTE DE PAGO DE PROYECTOS POR CONTRATO 2025

EXPEDIENTE No. **304** NOG: **26852306** CONTRATO No. **15-2025**

PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE SECTOR EL TIERRA BLANCAL HACIA CA-9 ALDEA EL SUBINAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO

APORTES	% DE AVANCE	ESTIMACION	AMORTIZACION	LIQUIDO A RECIBIR
Aporte CODEDE	**67.00%**			
Q. 3,999,741.65		**Q. 350,000.00**	**Q.70,000.00**	**Q. 280,000.00**
32 00 002 000 012 331 31-0101-0004 01				
TOTALES		**Q. 350,000.00**	**Q.70,000.00**	**Q. 280,000.00**

Se cuenta con Informe de supervisión por parte de la empresa, informe de supervisión por el Supervisor de Obras Municipales, Punto del Concejo Municipal de aprobación de avance, Copia de bitácora, Recibo 7-b.

Lic. Alexis Geovanny Marroquín Orellana
Director Municipal de Planificación

Factura

NEFTALI , BALCARCEL ORELLANA
Nit Emisor: 47663812
FERRCONS BALCARCEL
BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO
NIT Receptor: 6206107
Nombre Receptor: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
FEC232BE-8D39-4B14-86B4-817DEC135660
Serie: FEC232BE Número de DTE: 2369342228
Numero Acceso:
Fecha y hora de emision: 15-dic-2025 11:57:07
Fecha y hora de certificación: 15-dic-2025 11:57:07
Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Otros Descuentos(Q)	Total (Q)	Impuestos	
1	Bien	1	PAGO DE AVANCE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL TIERRA BLANCAL HACIA CA-9 ALDEA EL SUBINAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO. SEGUN CONTRATO No. 15-2025. ESTIMACION Q.350,000.00 (-) AMORTIZACION Q.70,000.00 LIQUIDO A RECIBIR Q.280,000.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	IVA	37,500.000000
			TOTALES:		0.00	0.00	350,000.00	IVA	37,500.000000

* Sujeto a pagos trimestrales ISR

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



Contribuyendo *juntos por Guatemala*

RECIBO DE LA MUNICIPALIDAD

DE GUASTATOYA,
DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO

FORMA 7-B INGRESOS VARIOS

SERIE B **No. 669602**

FECHA: DIA 8 | MES 12 | AÑO 2025

POR Doscientos ochenta mil quetzales con 00/100 CODIGO JURISDICCIONAL: D-4 5201

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: Consejo Departamental de Desarrollo

DIRECCION El Progreso

ARBITRIOS	ORNATO Q.4.00 ☐ 10.00 ☐ 15.00 ☐ 50.00 ☐ 75.00 ☐ 100.00 ☐ 150.00 ☐ ☐ ☐	Q.	
TASAS	VARIOS		
	LICENCIAS		
	ESTACIONAMIENTOS		
	CERTIFICACIONES		
	CEDULAS		
	MERCADOS		
	SERVICIOS VARIOS		
	SERVICIOS AGUA		
CONTRIBUCIONES	SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA		
MULTAS	CONCEPTO		
OTROS	CONCEPTO Pago del 67.00% tercer desembolso del proyecto mejoramiento camino rural del sector el tierra blancal hacia CA-9 aldea El Subinal, Guastatoya, El Progreso. SNIP 352317, convenio No. 15-2025, fuente 10		Q280,000.00
	VARIOS		

LECTURA DE CONTADOR ACTUAL ANTERIOR

OBSERVACIONES:

TOTAL Q. Q280,000.00

VALIDO UNICAMENTE POR EL IMPORTE IMPRESO POR LA CAJA REGISTRADORA MUNICIPAL Y/O NOMBRE FIRMA Y SELLO DEL RECEPTOR MUNICIPAL

FIRMA DEL RECEPTOR MUNICIPAL

CUENTA

SUB-CUENTA

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA ¡Sirviendo!

ORIGINAL-ENTERANTE

AUTORIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS RES. BJ-5875 Clas.: 920-12-8-1-4-97 DEL 26-06-97.

4035611 T-0340 2045310 87

FORMULARIOS STANDARD, S.A. PBX: 2423-9900 NIT: 1512227 - 7 5,000 - 11/2024 DEL No. 650,001 AL No. 725,000 SERIE B. ENVIO MUNICIPAL No. 45348 DEL 07/11/2024 NUMERO CORRELATIVO D-4-16-2024 DEL 07/11/2024 No. DE CUENTA: 2022-2300-2301-22-001 OFICIO SIN/ DE FECHA 3 DE OCTUBRE DE 2024 LIBRO 05755 FOLIO 7.

www.standard-s.com

CONCURSO: Adición de anexos al concurso en la Fase de Ejecución

Mensaje de confirmación	
15 d...2025 11:55:02	
Documentos asociados:	
1	26852306@INFORME DE SUPERVISION 82 AVANCE FISICO CALLE TIERRA BLANCA.pdf(3507 KB)
Si desea imprimir este mensaje, oprima el siguiente botón	

FERRCONS BALCARCEL
Barrio El Porvenir, Guastatoya, El Progreso.

Neftali Balcarcel Orellana
Propietario
Tel. 7945-0030 Cel. 5630-3868
Correo Electrònico: balcarcel.2000@hotmail.com

Guastatoya, 29 de octubre del 2025

SEÑOR
ALCALDE MUNICIPAL Y
HONORABLE CORPORACION
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA,
GUASTATOYA, EL PROGRESO.

Es un honor para mi, poderles expresar un profundo y respetuoso saludo, y a la vez comunicarles que el proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE SECTOR EL TIERRA BLANCAL HACIA CA-9 ALDEA EL SUBINAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO."** El cual está respaldado con el contrato de obra No. **15-2025** de fecha **13 de agosto del 2025.** Cuenta con un avance físico del , (82%) por lo que presento a usted el cuadro de estimación sobre dicho avance físico repoertado, **SOLICITANDO** a la vez el pago de la misma.

Sin otro particular, me suscribo.

ATENTAMENTE:

Neftali Balcarcel Orellana
REPRESENTANTE LEGAL
FERRCONS BALCARCEL

NEFTALI BALCARCEL ORELLANA
FERRCONS BALCARCEL.

ESTIMACION DE TRABAJO: DOS
NOMBRE DE LA EMPRESA: FERRCONS BALCARCEL
NOMBRE DEL PROYECTO: Mejoramiento Camino Rural de Sector El Tierra Blancal Hacia CA-9 Aldea El Subinal, Guastatoya, El Progreso.

DATOS DEL CONTRATO:	No.	15-2025	FECHA:	13/08/2025	MONTO:	Q 3,999,741.65

Renglón	RENGLONES DE TRABAJO/CANTIDADES	Cantidad Contratada				Cantidad EJECUTADA				Cantidad pendiente de EJECUTAR		
	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	Precio	Costo total	Este	Acumulado	Q	%	Este	Q	%
1	TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRÀFICO	M	833.00	Q 8.57	Q 7,138.81		646.00	Q 5,536.22	78%	187	Q 1,602.59	22%
2	REACONDICIONAMIENTO DE SUB-RASANTE	M2	5057.00	Q 78.39	Q 396,418.23	972.00	3550.00	Q 354,479.58	89%	535	Q 41,938.65	11%
3	CAPA BASE (E=0.10 M.)	M2	5057.00	Q 153.50	Q 776,249.50	1372.01	3149.99	Q 694,127.33	89%	534.99785	Q 82,122.17	11%
4	PAVIMENTO DE CONCRETO e= 0.15 M	M2	4224.00	Q 393.77	Q 1,663,284.48	1391.80	2481.20	Q 1,525,071.21	92%	351	Q 138,213.27	8%
5	CORTE Y SELLO DE JUNTAS	ML	2241.00	Q 58.06	Q 130,112.46	1937.00	0.00	Q 112,462.22	86%	304	Q 17,650.24	14%
6	CUNETA TIPO L	ML	1666.00	Q 340.99	Q 568,089.34	975.4169	0.00	Q 332,607.41	59%	690.5831	Q 235,481.93	41%
7	SEÑALIZACION HORIZONTAL	ML	2083.00	Q 83.51	Q 173,951.33		0.00	Q -	0%	2083	Q 173,951.33	100%
8	CONSTRUCCION TRANSVERSALES DE AGUA PLUVIAL DE 30PLG	UNIDAD	3.00	Q 28,993.32	Q 86,979.96		2.00	Q 57,986.64	67%	1	Q 28,993.32	33%
9	MURO DE CONTENCION	M3	57.00	Q 3,465.22	Q 197,517.54		57.00	Q 197,517.54	100%	0	Q -	0%
	Total cantidad contratada				Q 3,999,741.65	Cantidad ejecutada		Q 3,279,788.15	82.00%		Q 719,953.50	18.00%

NEFTALI BALCARCEL ORELLANA
FERRCONS BALCARCEL

Neftalí Balcarcel Orellana
REPRESENTANTE LEGAL
FERRCONS BALCARCEL

LUIS LEONEL URIZAR MUÑOZ
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO No. 4,001

Guastatoya 29 de octubre del 2,025

Monto bruto de esta Estimación	Q	3,279,788.15
Anticipos	Q	799,948.33
Amortización de Anticipos 20%	Q	655,957.63
Monto neto de esta Estimación	Q	2,623,830.52
Menos 1er. Pago	Q	1,599,896.66
Menos 2do Pago		
Menos 3er. Pago		
Menos 4to. Pago		
Liquido a Recibir	Q	1,023,933.86


FERRCONS BALCARCEL
Barrio El Porvenir, Guastatoya, El Progreso.

Neftali Balcarcel Orellana
Propietario
Tel. 7945-0030 Cel. 5630-3868
Correo Electrònico: balcarcel.2000@hotmail.com


INFORME FOTOGRAFICO

MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE SECTOR EL TIERRA BLANCAL HACIA CA-9 ALDEA EL SUBINAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO






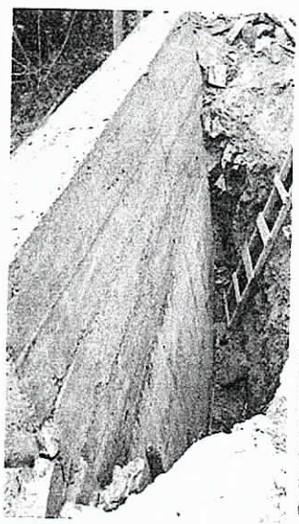


LUIS LEONEL URIZAR MUÑOZ
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO No. 4,001

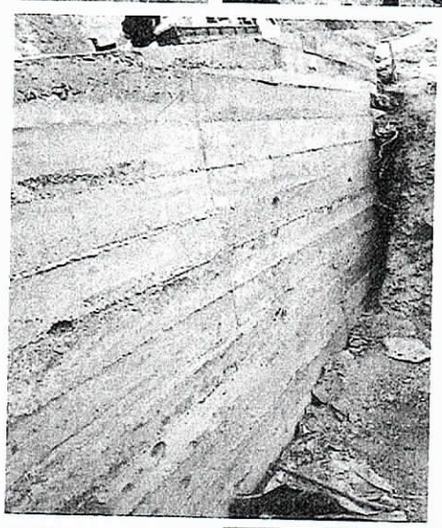


Neftali Balcarcel Orellana
REPRESENTANTE LEGAL
FERRCONS BALCARCEL

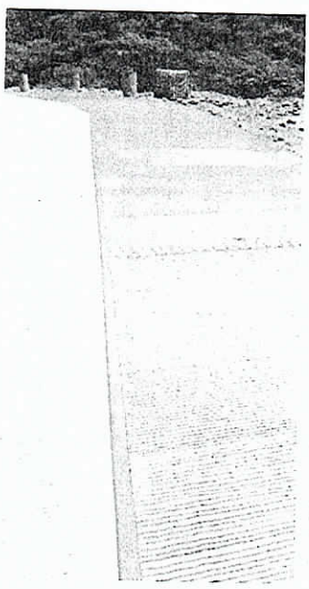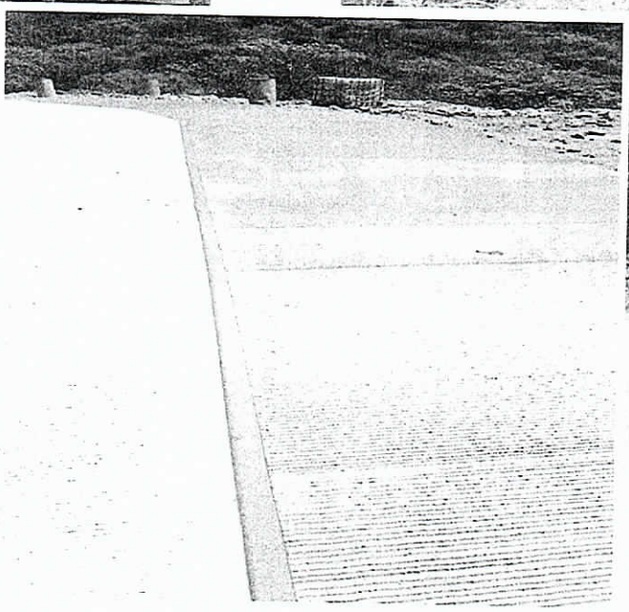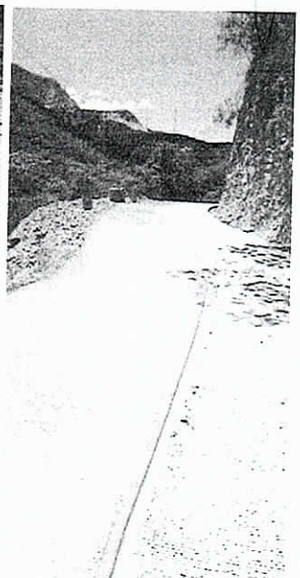MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!

5980-0535 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
BARRIO EL CALVARIO, **GUASTATOYA EL PROGRESO**

INFORME DE SUPERVISION

Guastatoya, 30 de Noviembre de 2025

SEÑOR: JOSE ELIAS HERRERA GUERRA Y CONSEJO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
EL PROGRESO

De la manera más atenta me dirijo a usted deseándole toda clase de éxitos en sus labores diarias.

El motivo de la presente es para hacerle saber lo siguiente:

En visita de supervisión realizada al proyecto denominado **MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE SECTOR EL TIERRA BLANCAL HACIA CA-9 ALDEA EL SUBINAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO,** con número de contrato **15-2025** de fecha 13 de Agosto de 2025, ejecutado por la empresa **FERRCONS BALCARCEL**, financiado por la Municipalidad de Guastatoya, se tiene a la vista el oficio de Noviembre de 2025 en el cual se hace la solicitud de la estimación del proyecto para un avance del **82.00%**, para lo cual se adjunta el informe de supervisión y el informe de parte de la empresa.

Agradeciendo su atención y en espera de darle seguimiento a este asunto me suscribo de ustedes.

Atentamente

José F. Alexander Aguilar Mejía
Ingeniero Civil
Colegiado No 9,366


ING. JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA
SUPERVISOR MUNICIPAL, GUASTATOYA
EL PROGRESO

D.M.P.	SUPERVISION DE OBRAS	Dirección Municipal de Planificación

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO


Nombre del proyecto.	Ubicación del proyecto.
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE SECTOR EL TIERRA BLANCAL HACIA CA-9 ALDEA EL SUBINAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Aldea El Subinal, Guastatoya, El Progreso


2. INFORME FOTOGRAFICO.

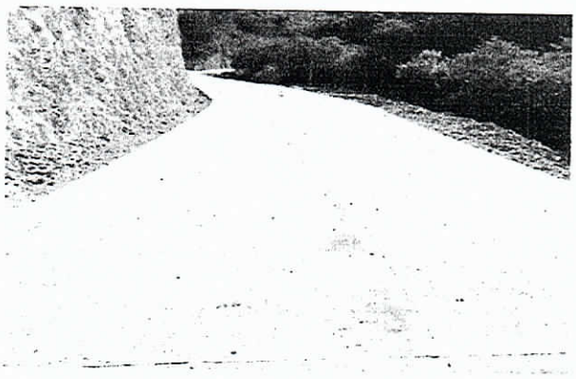





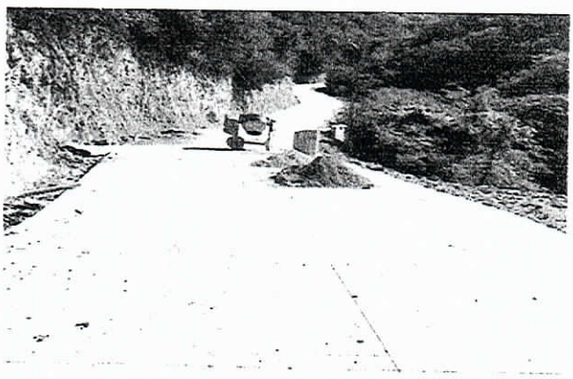

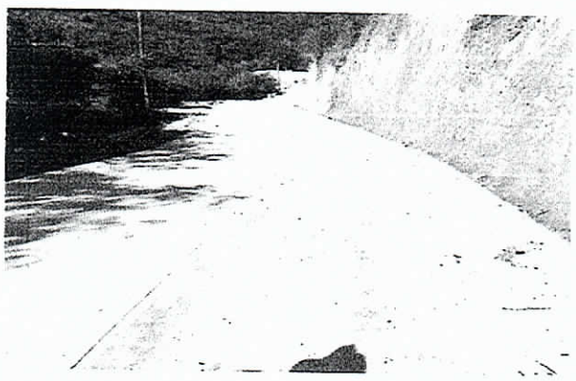

ALCALD

SUPERVISOR DE PROYECTOS MUNICIPALES.

Ing. J. Alexander Aguilar Mejia
Ingeniero Civil
Colegiado No. 9,355

ING. JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA
SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

JOSE ELIAS HERRERA GUERRA
ALCALDE MUNICIPAL DE GUASTATOYA

D.M.P.	SUPERVISION DE OBRAS	Dirección Municipal de Planificación

Comunidad.	Contrato Municipal.
Aldea El Subinal, Guastatoya, El Progreso	07-2025

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del proyecto.	Ubicación del proyecto.
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE SECTOR EL TIERRA BLANCAL HACIA CA-9 ALDEA EL SUBINAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Aldea El Subinal, Guastatoya, El Progreso
Contratista. FERRCONS BALCARCEL **Monto Contratado.** Q 3,999,741.65	**Ubicación del proyecto.** Aldea El Subinal, Guastatoya, El Progreso **Avance Fisico.** 82.00%
Informe de Supervisión No. 2	**Fecha.** 30 de Noviembre de 2025

2. AVANCE DE EJECUCION DEL PROYECTO

No.	Descripcion del Renglón	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Total a la Fecha	Avance Fisico %
1	TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	-	M	Q 8.57	Q -	Q 5,536.22	78%
2	REACONDICIONAMIENTO DE SUB-RASANTE	972.00	M2	Q 78.39	Q 76,195.08	Q 354,479.58	89%
3	CAPA BASE (E=0.10 M.)	1,372.01	M2	Q 153.50	Q 210,603.54	Q 694,127.00	89%
4	PAVIMENTO DE CONCRETO e=0.15 M	1,391.80	M2	Q 393.77	Q 548,049.09	Q 1,525,071.21	92%
5	CORTE Y SELLO DE JUNTAS	1,937.00	ML	Q 58.06	Q 112,462.22	Q 112,462.22	86%
6	CUNETA TIPO L	975.42	ML	Q 340.99	Q 332,607.41	Q 332,608.47	59%
7	SEÑALIZACION HORIZONTAL	-	ML	Q 83.51	Q -	Q -	0%
8	CONSTRUCCION TRANSVERSALES DE AGUA PLUVIAL DE 30PLG	-	UNIDAD	Q 28,993.32	Q -	Q 57,986.64	67%
9	MURO DE CONTENCION	-	M3	Q 3,465.22	Q -	Q 197,517.54	100%
					Q 1,279,917.33	Q 3,279,788.88	82.00%

Estos renglones de trabajo dan como resultado un avance físico del **82.00%** **por lo cual se aprueba realizar el pago correspondiente**

3. DESCRIPCION DEL PROYECTO.

Este proyecto consiste en el mejoramiento de la calle que sirve de ingreso hacia la aldea el subinal, de guastatoya, el progreso, la cual se encuentra de terraceria y se va a mejorar utilizando pavimento y cunetas tipo L

4. RECOMENDACIONES.

Chequear los trabajos realizados para garantizar la durabilidad de los mismos, y terminar los trabajos faltantes, los que no se encuentran al 100 % y los que no se han iniciado aun

SUPERVISOR DE PROYECTOS MUNICIPALES.

José Alexander Aguilar Mejía
Ingeniero Civil
Colegiado No. 9,366

ING. JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA
SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES

JOSE ELIAS HERRERA GUERRA
ALCALDE MUNICIPAL DE GUASTATOYA

REPORTE DE AVANCE FISICO No. 2

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE SECTOR EL TIERRA BLANCAL HACIA CA-9 ALDEA EL SUBINAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO	
Municipio: GUASTATOYA	Departamento: EL PROGRESO
Comunidad: ALDEA EL SUBINAL	Fecha de Contrato: 13/08/2025
Fecha de Inicio: 20/08/2025	Fecha de Supervision: 30/10/2025
Fecha de Finalizacion: 19/02/2026	Unidad Ejecutora: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
Contrato No.: 15-2025	Valor del Proyecto: Q.3,999,741.65
Modificaciones:	Valor Original: Q.3,999,741.65
Constructora: FERRCONS BALCARCEL	Telefono:
Representante legal: NEFTALI BALCARCEL ORELLANA	

RESUMEN DE RENGLONES

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES DE TRABAJO				ORDEN DE CAMBIO	ORDEN DE TRABAJO SUPLEMENTARIO	ORDEN DE TRABAJO EXTRA	RENGLON MODIFICADO	CANTIDADES EJECUTADAS SEGUNDA ESTIMACION		ACUMULADO A LA FECHA		PORCENTAJE
		CANTIDAD	UNIDAD	P UNITARIO	TOTAL	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	TOTAL
1	TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	833.00	M	Q 8.57	Q 7,138.81					-	Q -	646.00	Q 5,536.22	0.14%
2	REACONDICIONAMIENTO DE SUB-RASANTE	5,057.00	M2	Q 78.39	Q 396,418.23					972.00	Q 76,195.08	4,522.00	Q 354,479.58	8.86%
3	CAPA BASE (E=0.10 M.)	5,057.00	M2	Q 153.50	Q 776,249.50					1,372.01	Q 210,603.54	4,522.00	Q 694,127.00	17.35%
4	PAVIMENTO DE CONCRETO e=0.15 M	4,224.00	M2	Q 393.77	Q 1,663,284.48					1,391.80	Q 548,049.09	3,873.00	Q 1,525,071.21	38.13%
5	CORTE Y SELLO DE JUNTAS	2,241.00	ML	Q 58.06	Q 130,112.46					1,937.00	Q 112,462.22	1,937.00	Q 112,462.22	2.81%
6	CUNETA TIPO L	1,666.00	ML	Q 340.99	Q 568,089.34					975.42	Q 332,607.41	975.42	Q 332,608.47	8.32%
7	SEÑALIZACION HORIZONTAL	2,083.00	ML	Q 83.51	Q 173,951.33					-	Q -	-	Q -	0.00%
8	CONSTRUCCION TRANSVERSALES DE AGUA PLUVIAL DE 30PLG	3.00	UNIDAD	Q 28,993.32	Q 86,979.96					-	Q -	2.00	Q 57,986.64	1.45%
9	MURO DE CONTENCION	57.00	M3	Q 3,465.22	Q 197,517.54					-	Q -	57.00	Q 197,517.54	4.94%
	COSTO TOTAL DEL PROYECTO				Q 3,999,741.65						Q 1,279,917.33		Q 3,279,788.88	82.00%

VALOR DE ESTIMACION No. 2	Q 1,279,917.33
AMORTIZACION DEL ANTICIPO (20%)	Q 255,983.47
PENDIENTE DE AMORTIZAR	Q 143,990.55
LIQUIDO A RECIBIR	Q 1,023,933.86

José F. Alexander Aguilar Mejia
Ingeniero Civil
Colegiado No. 21,348

JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES

JOSE ELIAS HERRERA GUERRA
ALCALDE MUNICIPAL GUASTATOYA

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA Y GESTIÓN AMBIENTAL

UNIDAD DE BITÁCORAS – DATOS DE LA BITÁCORA ELECTRÓNICA –

BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 4421/08/2025

No. CONTRATO	15-2025
FECHA CONTRATO	13/08/2025
MONTO CONTRACTUAL	3,999,741.65
NOG	26852386
NOMBRE DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE SECTOR EL TIERRA BLANCAL HACIA CA-9 ALDEA EL SUBINAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO
UBICACIÓN DEL PROYECTO	Guastatoya, EL PROGRESO
ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
NOMBRE DEL SUPERVISOR	LUIS LEONEL URIZAR MUÑOZ
EMPRESA EJECUTORA	NEFTALI BALCARCEL ORELLANA
REPRESENTANTE LEGAL O CONTRATISTA	NEFTALI BALCARCEL ORELLANA
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA
SUPERVISOR EMPRESA SUPERVISORA	

FECHA DE AUTORIZACIÓN 19/08/2025


BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 4421/08/2025

CONTRATO No. 15-2025

NOMBRE: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE SECTOR EL TIERRA BLANCAL HACIA CA-9 ALDEA EL SUBINAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

REGISTRO No.	1
FECHA	08/09/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	Se realiza la colocación de base, se cuenta con personal y materiales suficientes para el avance del proyecto
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA

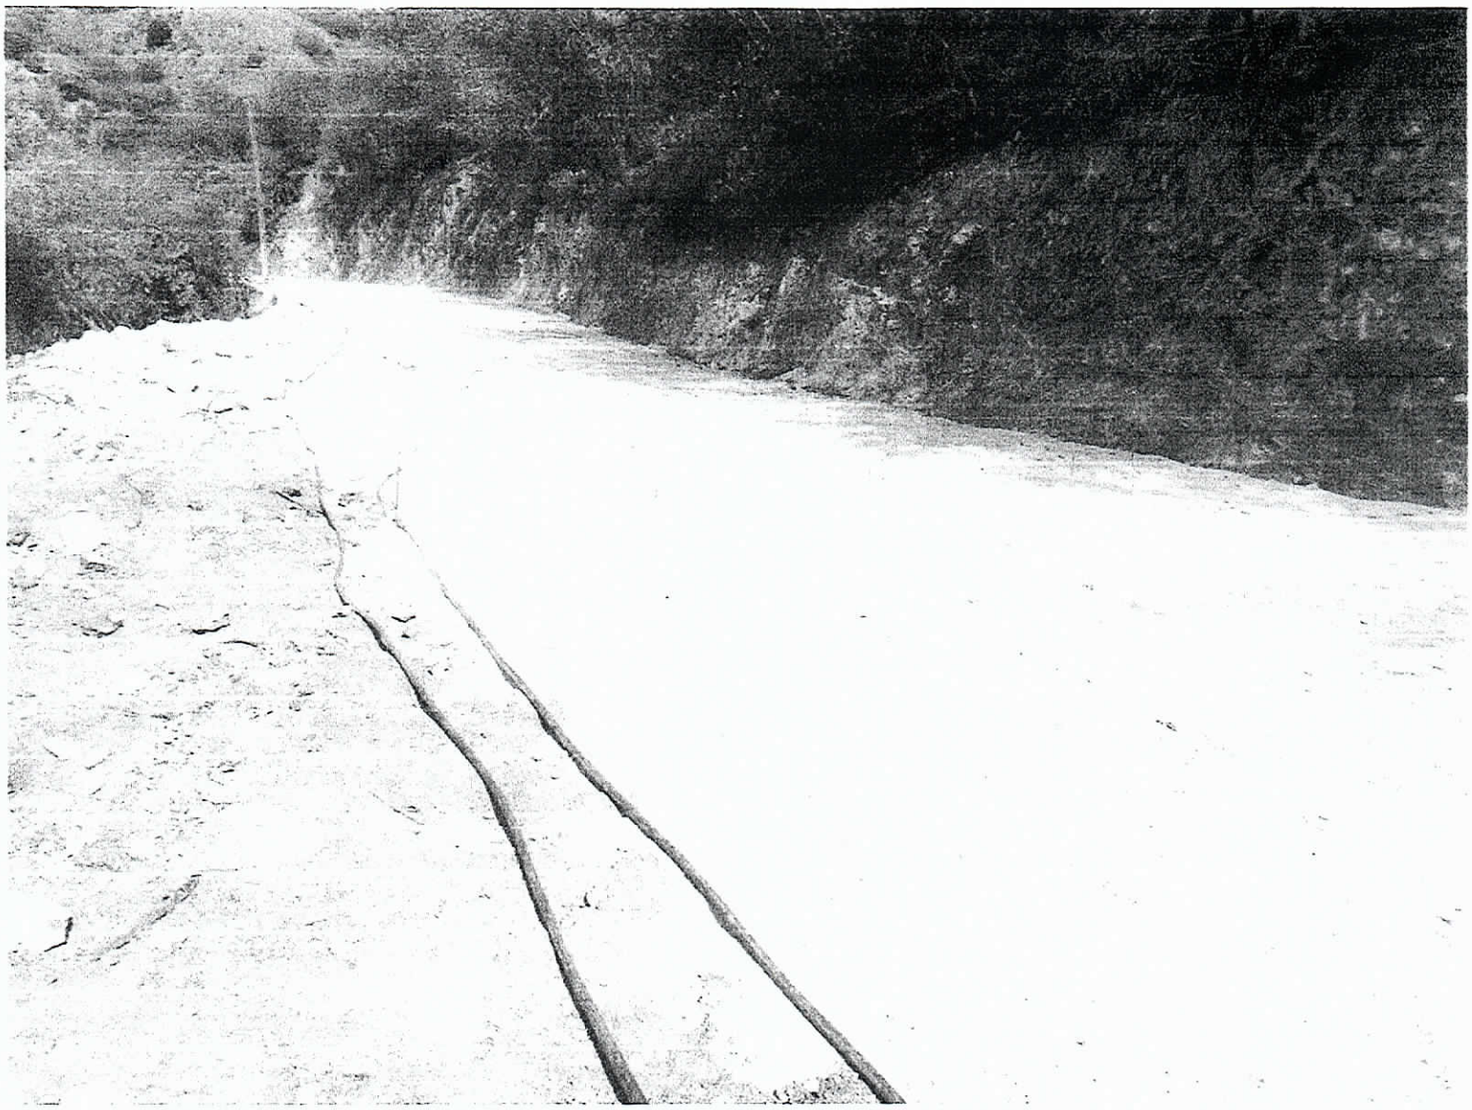









BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 4421/08/2025

CONTRATO No. 15-2025

NOMBRE: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE SECTOR EL TIERRA BLANCAL HACIA CA-9 ALDEA EL SUBINAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA


REGISTRO No.	2
FECHA	20/09/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	Se realiza la fundicion de pavimento y preparación de base para la colocación de pavimento, se cuenta con personal y materiales suficientes para el avance del proyecto
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA







LUTONG



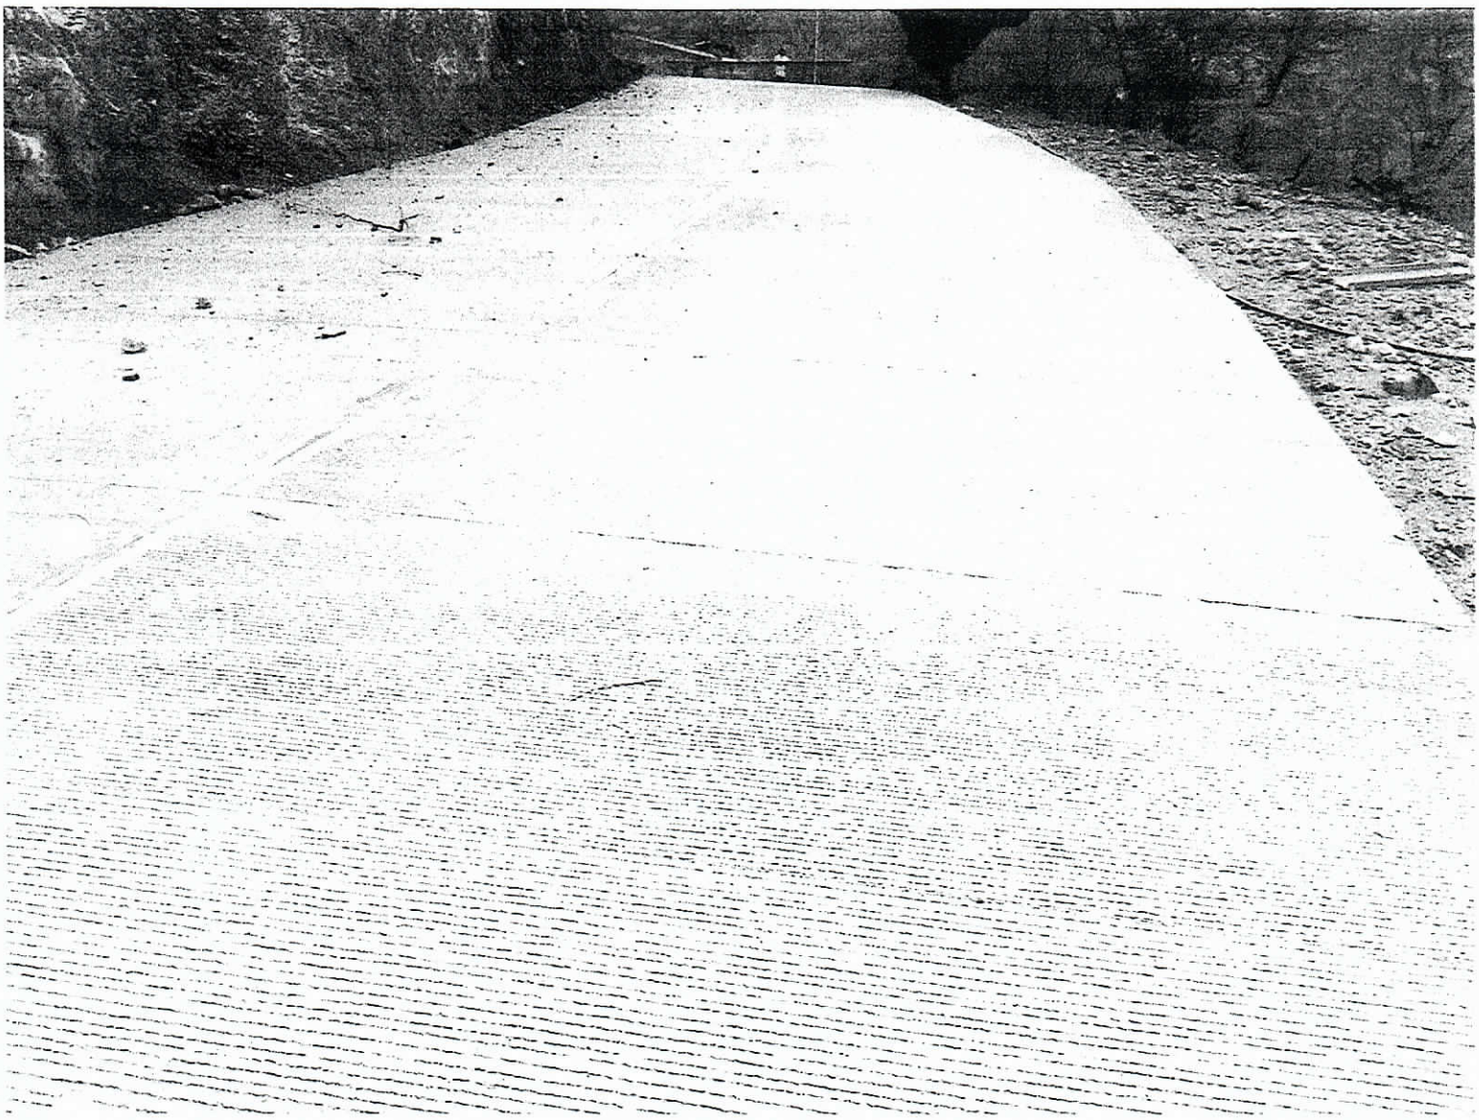


40

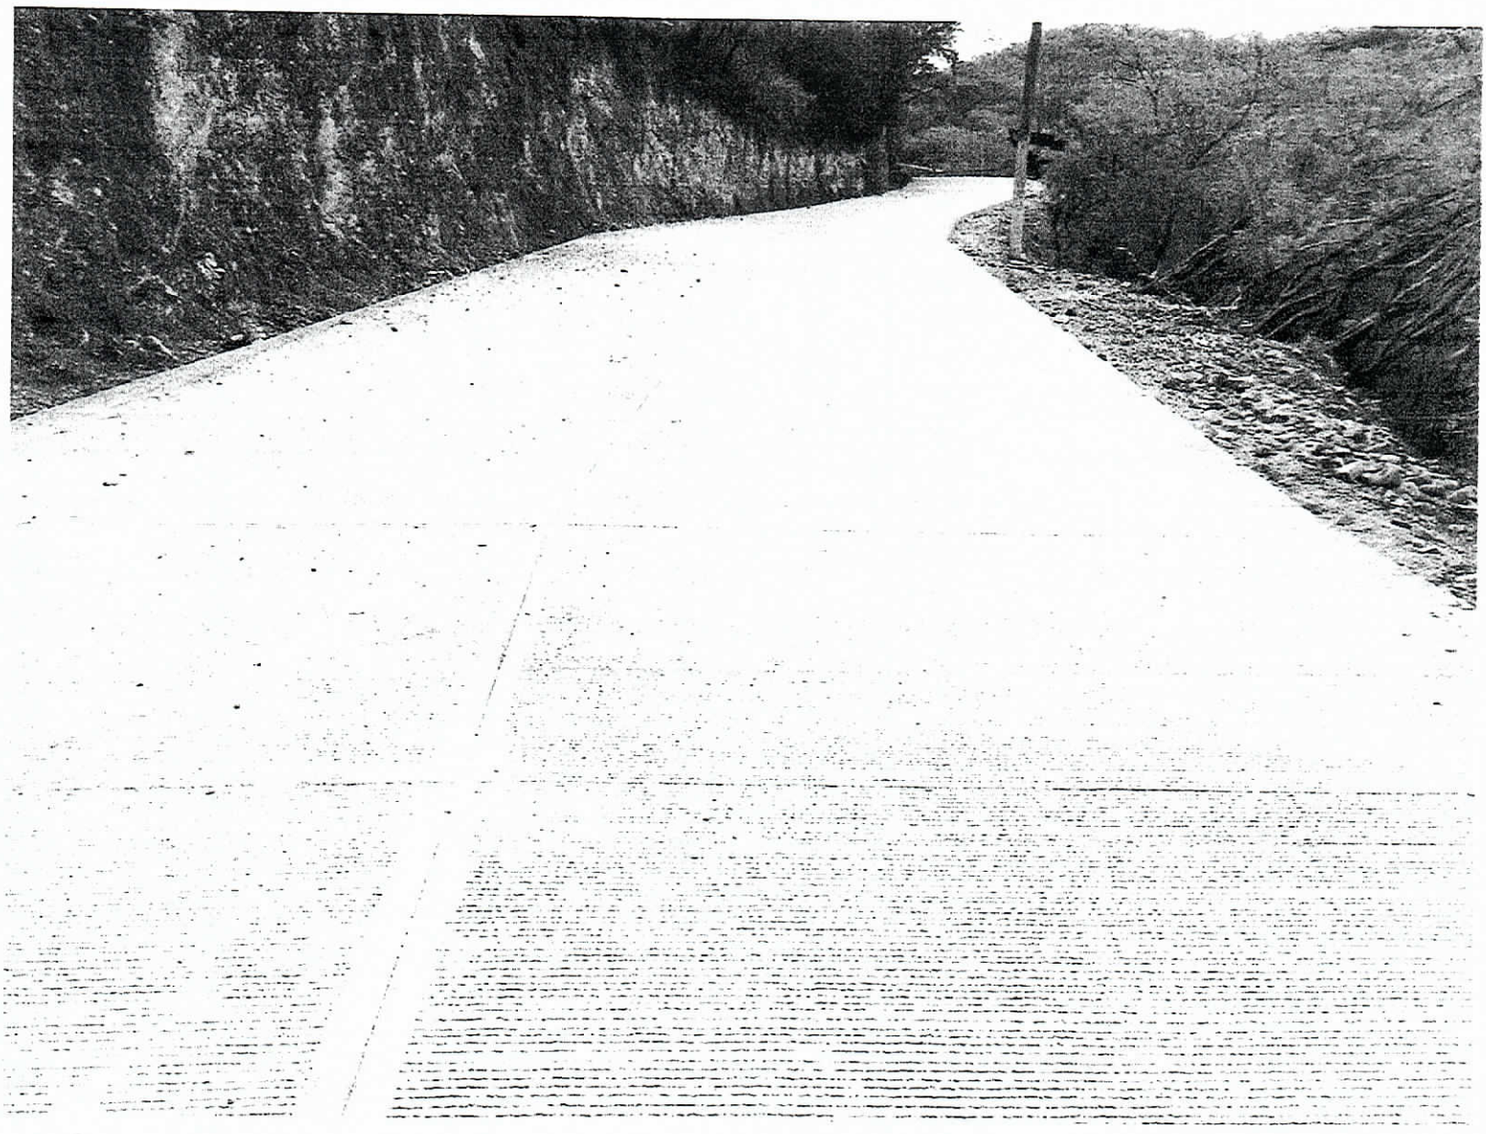

BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 4421/08/2025

CONTRATO No. 15-2025

NOMBRE: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE SECTOR EL TIERRA BLANCAL HACIA CA-9 ALDEA EL SUBINAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

REGISTRO No.	3
FECHA	22/09/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	Se realiza el arreglo de la base, se cuenta con personal y materiales suficientes para el avance del proyecto
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA










BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 4421/08/2025

CONTRATO No. 15-2025


NOMBRE: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE SECTOR EL TIERRA BLANCAL HACIA CA-9 ALDEA EL SUBINAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

REGISTRO No.	4
FECHA	04/10/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	Se continua con la colocación de base para la fundición del pavimento, se cuenta con personal y materiales suficientes para el avance del proyecto
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA

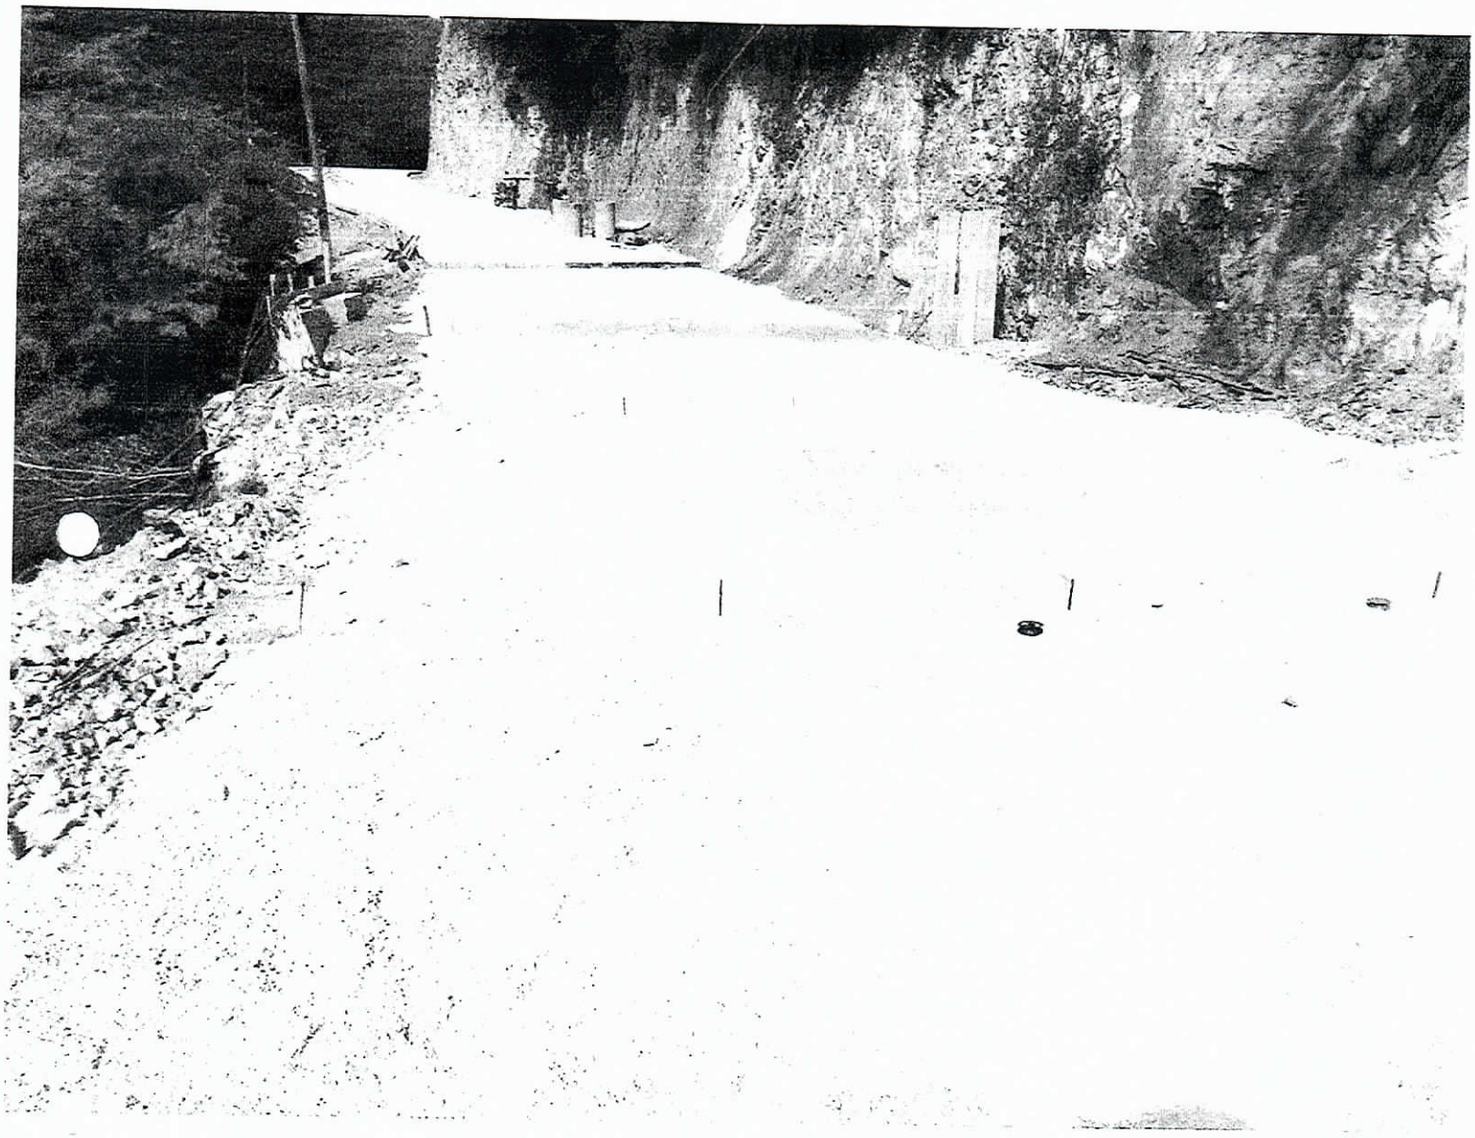



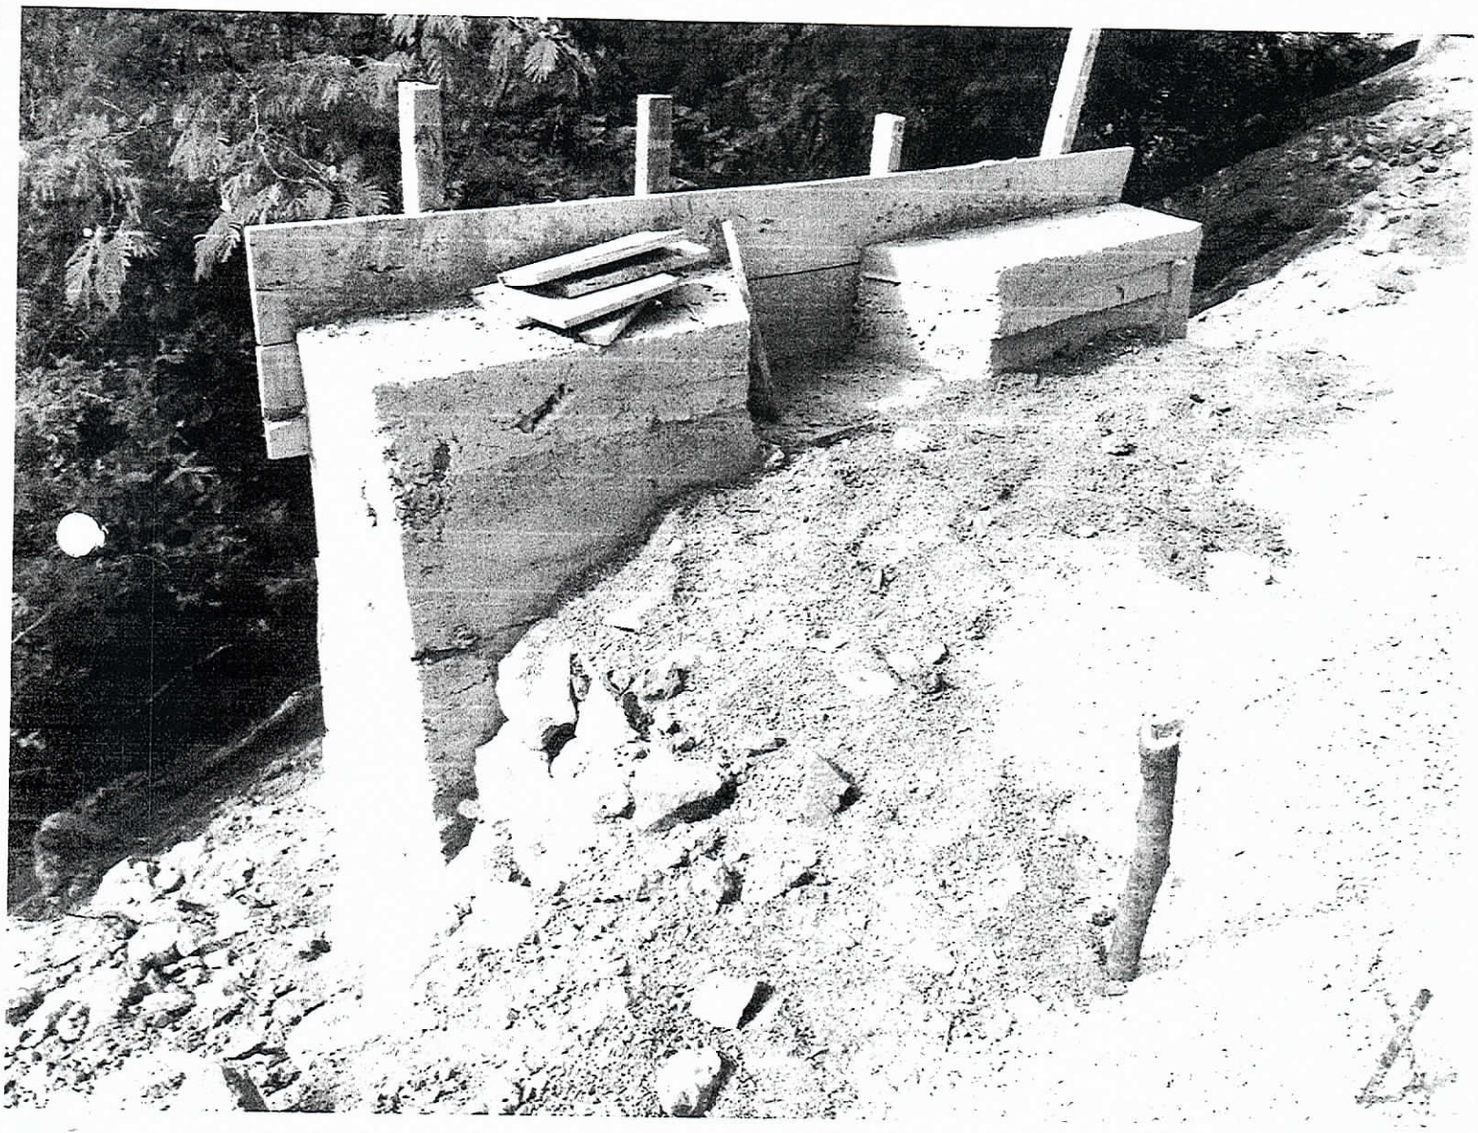










BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 4421/08/2025


CONTRATO No.	15-2025
NOMBRE:	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE SECTOR EL TIERRA BLANCAL HACIA CA-9 ALDEA EL SUBINAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO
ENTIDAD:	MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA


REGISTRO No.	5
FECHA	25/10/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	Se realiza la preparación para fundición de cunetas, se cuenta con personal y materiales suficientes para el avance del proyecto
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA






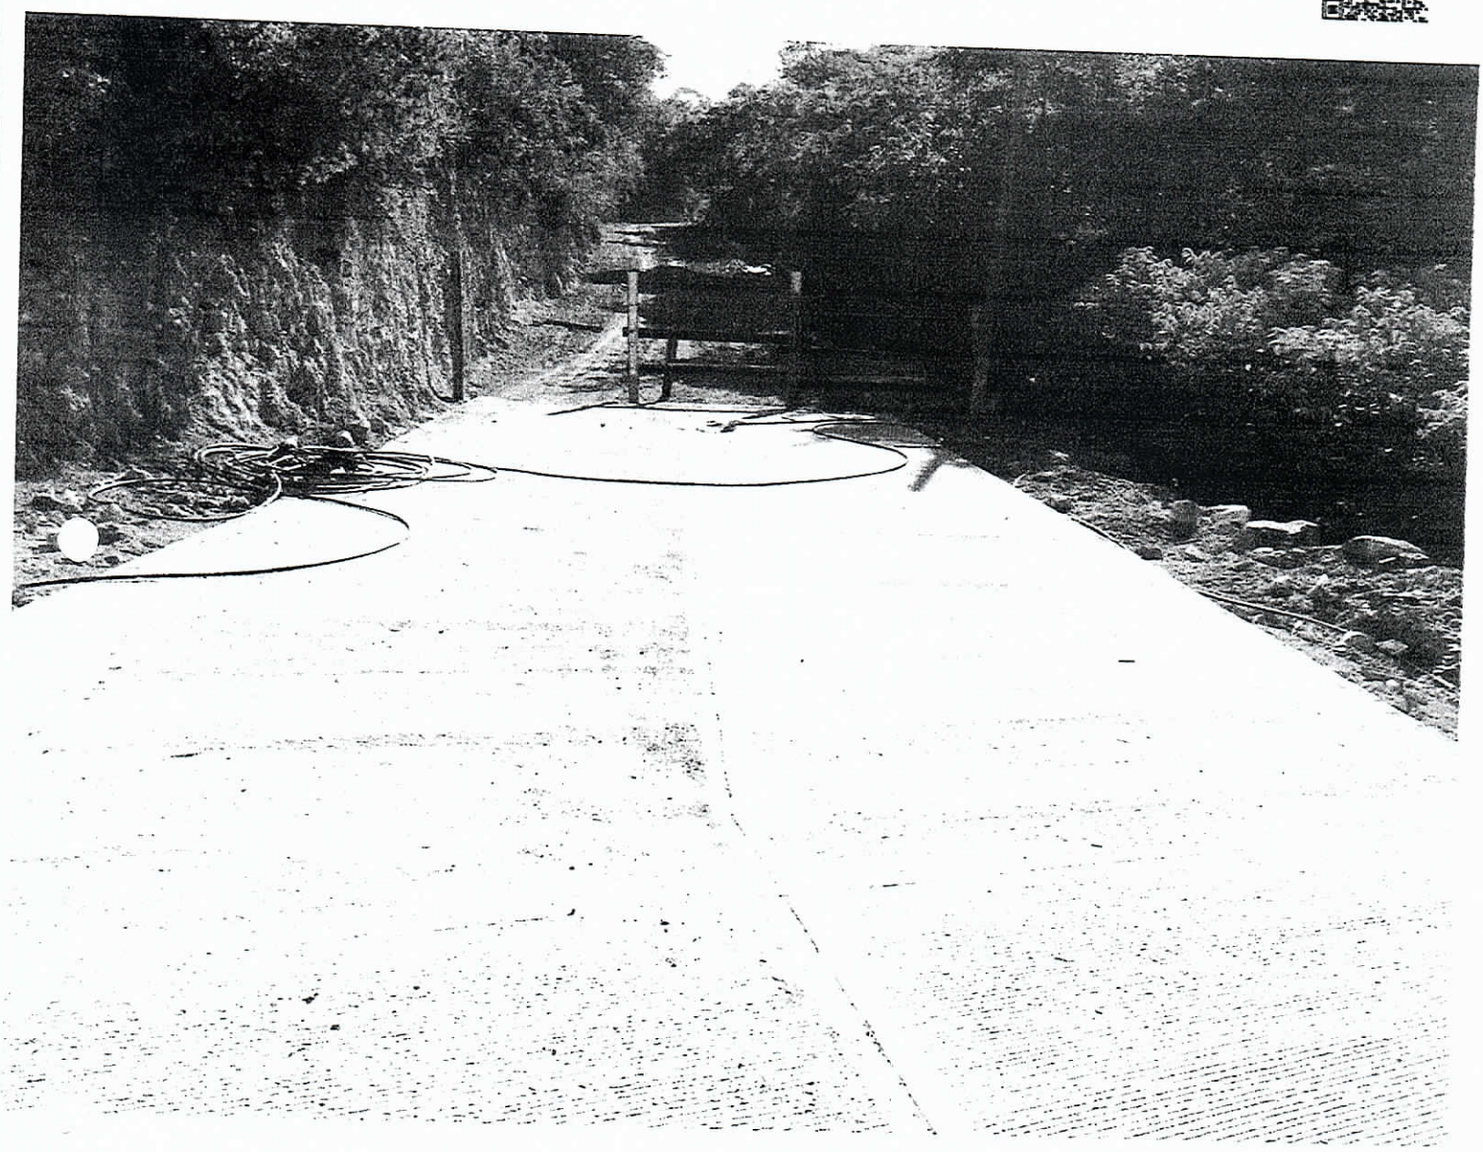

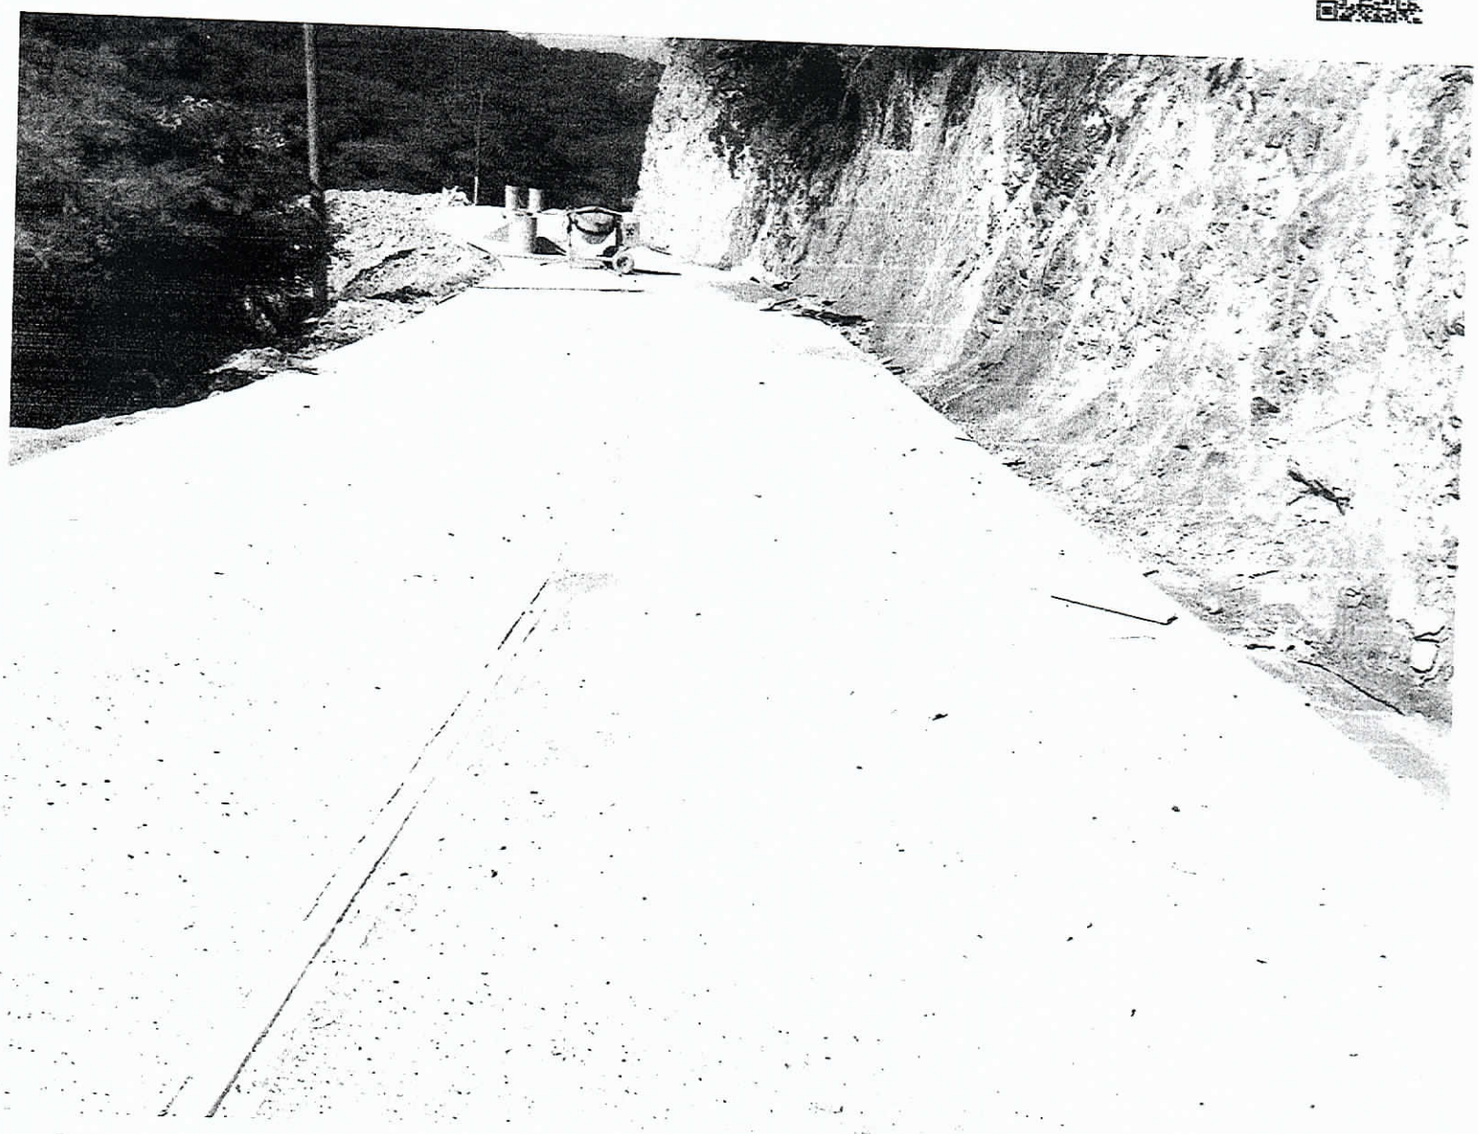

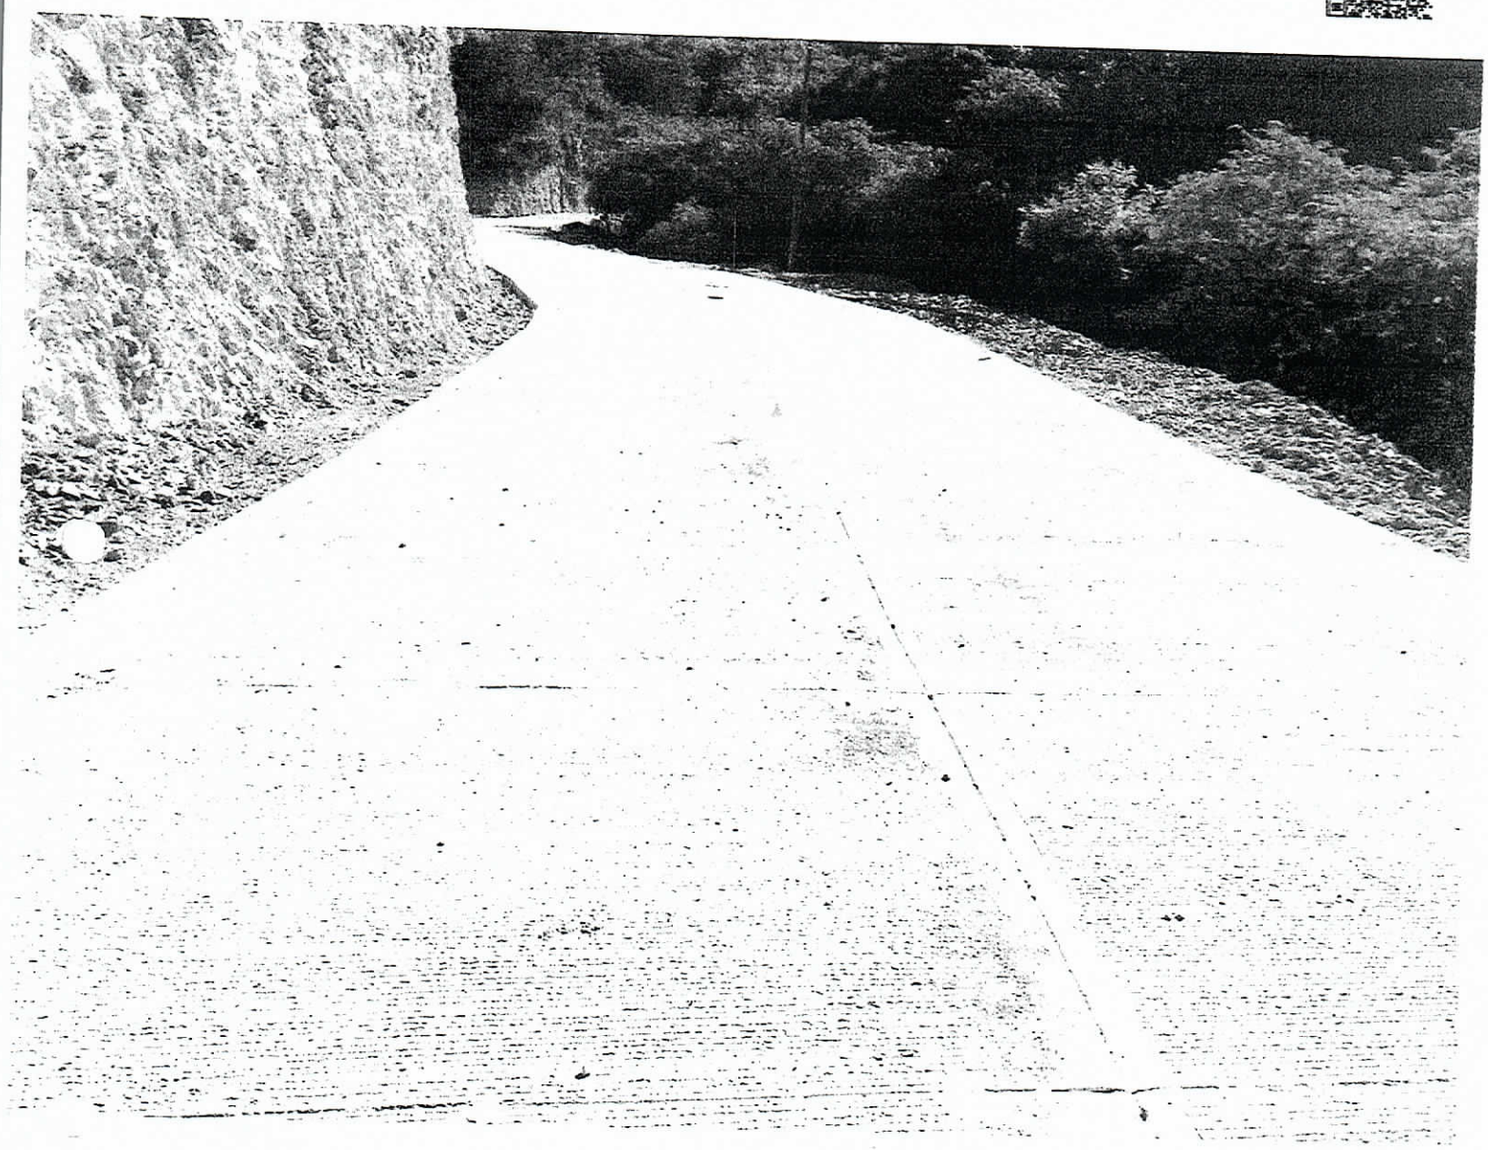

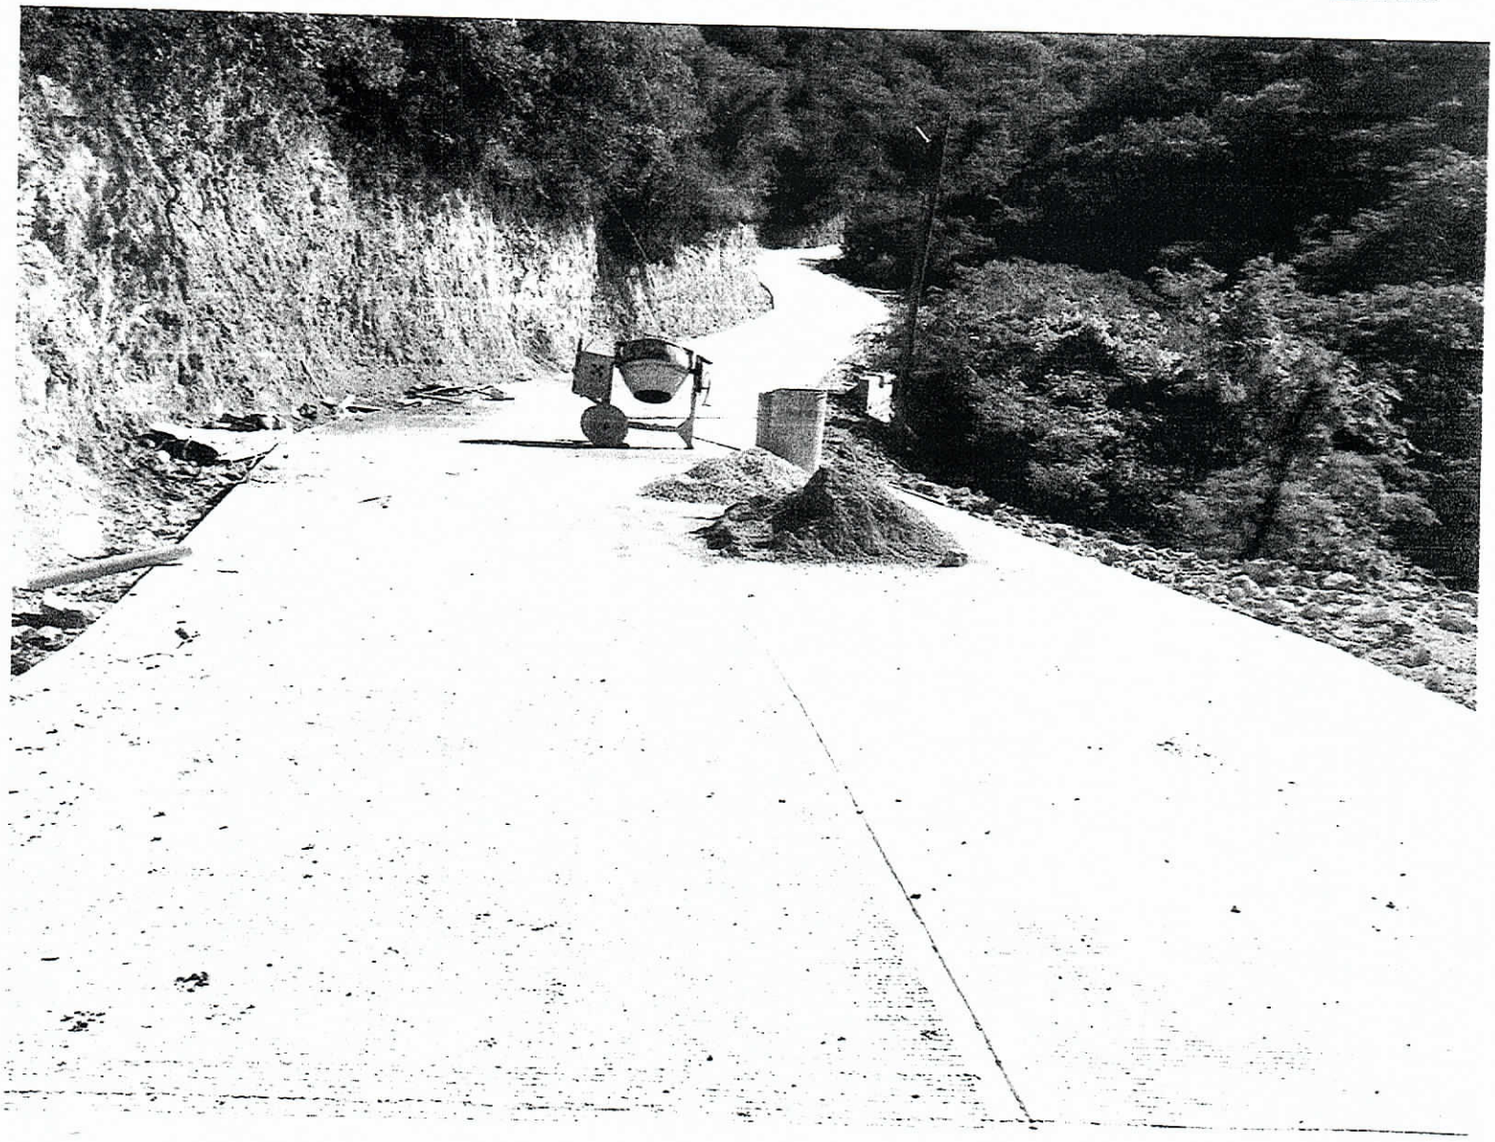



LA INFRASCRITA SECRETARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO,

CERTIFICA:

Que para su cumplimiento y efectos consiguientes se transcribe la **AUTENTICIDAD** del punto **SÉPTIMO** del acta **81-2025** de fecha tres de noviembre de dos mil veinticinco del libro número 3,609 de sesiones ordinarias del Concejo Municipal, debidamente autorizado por la Contraloría General de Cuentas, el que copiado literalmente dice:

SÉPTIMO: La Secretaria Municipal informa al Concejo Municipal que, Licenciado Alexis Geovanny Marroquín Orellana, Director de Planificación, presenta oficio Ref.agmo/DMP/437-2025, de fecha 31 de octubre de 2025, el cual en su parte conducente expone: "El motivo de la presente es para informarle que el proyecto **MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE SECTOR EL TIERRA BLANCAL, ALDEA EL SUBINAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO.** Contrato administrativo número 15-2025 de fecha 13 de agosto de 2025, ejecutado por la empresa **FERRCONS BALCARCEL**, presentó informe del 82% de avance físico. Por lo tanto, solicito que apruebe el pago del 82% de avance físico del proyecto antes mencionado a la empresa **FERRCONS BALCARCEL** siendo su propietario el señor NEFTALI BALCARCEL ORELLANA." Consiguientemente y en cumplimiento al numeral 2) de la Cláusula Cuarta del contrato en referencia, presenta el informe de supervisión signado por el Ingeniero JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA, Supervisor de Obras Municipales, por medio del cual informa de la estimación, del avance físico del referido proyecto, indicando que se encuentra en un avance físico del 82.00%, anexa el detalle que contiene los renglones de trabajo para la presente estimación. **CONSIDERANDO:** Que el artículo 59 del Decreto número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado, establece: "Estimaciones para pago. La entidad contratante podrá hacer pagos parciales al contratista contra estimaciones periódicas de trabajo ejecutado y aceptado, las que podrán efectuarse mensualmente de acuerdo con las estipulaciones pactadas." **CONSIDERANDO:** Que el Artículo 35 literal a), del Decreto 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Código Municipal y sus reformas establece: Atribuciones Generales del Concejo Municipal "son atribuciones del Concejo Municipal: a) La iniciativa, deliberación y decisión de los asuntos municipales…". **POR TANTO:** El Concejo Municipal fundamentado en lo considerado y con las facultades que le confiere el Código Municipal y sus reformas y por **UNANIMIDAD DE VOTOS. ACUERDA: I)** Se tiene por recibido el oficio presentado, agregándose al expediente respectivo. **II) APROBAR**, el pago equivalente al avance físico del 82%, a favor de la empresa mercantil **FERRCONS BALCARCEL**, propiedad del señor Neftali Balcarcel Orellana, de conformidad con el monto de estimación de avance físico, anexa el detalle que contiene los renglones de trabajo para la presente estimación, presentados por el Supervisor de Obras Municipales del proyecto **MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE SECTOR TIERRA BLANCAL HACIA CA-9 ALDEA EL SUBINAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO**, el que se ejecuta con el Contrato Administrativo de Obras 15-2025. **III)** Se le ordena al Director de Administración Financiera Integrada Municipal, hacer las operaciones contables correspondientes y proceder al pago de conformidad con lo aprobado en el numeral romano II) del presente punto resolutivo. **IV)** Notifíquese.

(Fs) Ilegibles José Elías Herrera Guerra, Alcalde Municipal, Ing. Byron Fernando Calderón Ferrera y Eduardo Ortega Loaiza, Síndicos Primero y Segundo respectivamente, Hernan Archila Morales, Erasmo Beltetón Contreras, Nery Rolando Archila Orellana, Julio Mauricio Marroquín González, Fryda Aimée Estrada Ortíz, Concejales Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto, respectivamente y Licda. Evelyn Yaneth Oajaca Marroquín, Secretaria Municipal.

DADO EN EL PALACIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE GUASTATOYA, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, A CUATRO DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO.

SECRETARIA

LICDA. EVELYN YANETH OAJACA MARROQUÍN
SECRETARIA MUNICIPAL
