MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!

5980-0535 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
BARRIO EL CALVARIO, **GUASTATOYA EL PROGRESO**

REPORTE DE PAGO DE PROYECTOS POR CONTRATO 2024

EXPEDIENTE No. **275** NOG: **24430870** CONTRATO No. **21-2024**

PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR BENQUE VIEJO, ALDEA EL BARREAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO

APORTES	% DE AVANCE	ESTIMACION	AMORTIZACION	LIQUIDO A RECIBIR
Aporte Codede	**89.98%**			
Q. 899,500.00		Q. 809,820.00	Q. 161,964.00	Q. 647,856.00
32 00 002 000 011 331 31-0101-0004				
TOTALES		Q. 809,820.00	Q. 161,964.00	Q. 647,856.00

16/05/2025

Se cuenta con Informe de supervisión por parte de la empresa, informe de supervisión por el Supervisor de Obras Municipales, Acuerdo de aprobación de avance, Copia de bitácora.

Lic. Alexis Geovanny Marroquín Orellana
Director Municipal de Planificación

DIRECTOR DE PLANIFICACION
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
¡Sirviendo!

Factura

CARLOS ALBERTO, AMADO ORELLANA
Nit Emisor: 20115989
CONSTRUCTORA M&A
ALDEA SANTA RITA BARRIO SAN JUAN, Guastatoya, EL PROGRESO
NIT Receptor: 6206107
Nombre Receptor: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
AA164C8D-2F18-4FAB-B657-4A874DF49DAD
Serie: AA164C8D Número de DTE: 790122411
Numero Acceso:
Fecha y hora de emision: 16-may-2025 12:18:36
Fecha y hora de certificación: 16-may-2025 12:18:36
Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Otros Descuentos(Q)	Total (Q)	Impuestos	
1	Servicio	1	PAGO DEL 89.98 % DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE RURAL, SECTOR BENQUE VIEJO, ALDEA EL BARREAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO. CONTRATO No. 21-2024, EXPEDIENTE No. 275, NOG 24430870. MONTO DE ESTIMACIÓN: Q. 809,820.00 (–) AMORTIZACIÓN: Q. 161,964.00 (=) LÍQUIDO A RECIBIR: Q. 647,856.00. APROBADO Y AUTORIZADO.	809,820.00	0.00	0.00	809,820.00	IVA	86,766.428571
			TOTALES:		0.00	0.00	809,820.00	IVA	86,766.428571

* Sujeto a pagos trimestrales ISR

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

"Contribuyendo por el país que todos queremos"

FORMA 7-B INGRESOS VARIOS

RECIBO DE LA MUNICIPALIDAD

DE GUASTATOYA,

DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO

Seiscientos cuarenta y siete mil ochocientos

SERIE B **No.** 636306

FECHA: DIA 8 | MES 5 | AÑO 2025

POR: cincuenta y seis con 00/100 quetzales — CODIGO JURISDICCIONAL: D-4 5201

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: Consejo Departamental de Desarrollo

DIRECCION: El Progreso

ARBITRIOS	ORNATO Q.4.00 ☐ 10.00 ☐ 15.00 ☐ 50.00 ☐ 75.00 ☐ 100.00 ☐ 150.00 ☐ ☐	Q.	
TASAS	VARIOS		
	LICENCIAS		
	ESTACIONAMIENTOS		
	CERTIFICACIONES		
	CEDULAS		
	MERCADOS		
	SERVICIOS VARIOS		
	SERVICIOS AGUA		
	SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA		
CONTRIBUCIONES	CONCEPTO Pago del 89.98% segundo desembolso del proyecto mejoramiento calle rural sector benque viejo, aldea el Barreal, Guastatoya, El Progreso, SNIP 334527, convenio No. 086-2024, fuente 12, subprograma 7	Q647,856.00	
MULTAS	CONCEPTO		
OTROS	VARIOS		

DAFIM ALCALDE

LECTURA DE CONTADOR — ACTUAL — ANTERIOR

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL RECEPTOR MUNICIPAL — CUENTA — SUB-CUENTA

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA ¡Sirviendo!

TOTAL Q. Q647,856.00

VALIDO UNICAMENTE POR EL IMPORTE IMPRESO POR LA CAJA REGISTRADORA MUNICIPAL Y/O NOMBRE FIRMA Y SELLO DEL RECEPTOR MUNICIPAL

ORIGINAL-ENTERANTE

AUTORIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS S/RES. No. BJ/5875 Clas.: 920-12-8-1-4-97 DEL 26-06-97.

2045310 T-0340 1019911 67

FORMULARIOS STANDARD, S. A. PBX: 2424-8600 - INT. 1502227 - 1502000 - 1502022 DEL No. 500,001 AL No. 650,000. SERIE B. ENVIO MUNICIPAL No. 45310 DE FECHA 13/10/2022 NUMERO CORRELATIVO D-4-10-2022 DE FECHA 13/10/2022 No. DE CUENTA: T3-2-1 OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 10/10/2022 LIBRO 05/755 FOLIO 7.

www.standard-sa.com

GUATECOMPRAS

CONCURSO: Adición de anexos al concurso en la Fase de Ejecución

Mensaje de confirmación	
14.may..2025 08:07:50	
Documentos asociados:	
1	24430870@INFORME DE SUPERVISION 90 AVANCE FISICO CALLE BENQUE VIEJO.pdf(1746 KB)
Si desea imprimir este mensaje, oprima el siguiente botón	

CONSTRUCTORA
M&A

Guastatoya El Progreso, 07 de MARZO de 2025

Señores
Municipalidad de Guastatoya, E Progreso
Departamento de El Progreso

De la manera más atenta nos dirigimos a ustedes esperando que el desarrollo de sus actividades sea de la mejor manera.

El motivo de la presente es para solicitar pago de la primera estimación del 90.00% de la oferta para el evento **MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR BENQUE VIEJO, ALDEA EL BARREAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO.** según contrato administrativo número 21-2024 de fecha seis de noviembre del año 2024, para cual adjunto el cuadro de estimación del 90.00% de dicho proyecto.

No teniendo más que manifestarles, me suscribo quedando atento y a sus respetables órdenes.

Atentamente,

CONSTRUCTORA M&A
Barrio San Juan, Aldea Santa Rita
Guastatoya El Progreso
30115989

CARLOS ALBERTO AMADO ORELLANA
CONSTRUCTORA M&A

PRIMERA ESTIMACION

MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR BENQUE VIEJO, ALDEA EL BARREAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO

RESUMEN DE RENGLONES												
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES DE TRABAJO				CANTIDADES EJECUTADAS PRIMERA ESTIMACION		ACUMULADO A LA FECHA		PORCENTAJE
		CANTIDAD	UNIDAD	P UNITARIO	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	TOTAL
1	LIMPIEZA, TRAZO Y CHAPEO	1,099.90	M2	Q 9.65	Q 10,614.04	1,099.90	Q 10,614.04	1,099.90	Q 10,614.04	1.18%
2	RETIRO DE PAVIMENTO EXISTENTE	1,099.90	M2	Q 102.75	Q 113,014.73	1,099.90	Q 113,014.73	1,099.90	Q 113,014.73	12.56%
3	CORTE Y NIVELACION DE CAJUELA T = 0.15 m	1,099.90	M2	Q 78.55	Q 86,397.15	1,099.90	Q 86,397.15	1,099.90	Q 86,397.15	9.61%
4	BASE DE MATERIAL GRANULAR T=0.15M	1,099.90	M2	Q 115.55	Q 127,093.45	1,099.90	Q 127,093.45	1,099.90	Q 127,093.45	14.13%
5	BORDILLO	342.00	M	Q 207.75	Q 71,050.50	144.00	Q 29,916.00	144.00	Q 29,916.00	3.33%
6	FUNDICION DE PAVIMENTO DE 0.15 M	1,099.90	M2	Q 413.55	Q 454,863.65	1,070.04	Q 442,514.65	1,070.04	Q 442,514.65	49.20%
7	SEÑALIZACION	1.00	UNIDAD	Q 36,466.50	Q 36,466.50	-	Q -	-	Q -	0.00%
	COSTO TOTAL DEL PROYECTO				Q 899,500.00		Q 809,550.00		Q 809,550.00	90.00%

VALOR DE ESTIMACION No. 1	Q	809,550.00
AMORTIZACION DEL ANTICIPO (20%)	Q	161,910.00
PENDIENTE DE AMORTIZAR	Q	17,990.00
LIQUIDO A RECIBIR	Q	**647,640.00**

GUASTATOYA 07 DE MARZO 2025

CONSTRUCTORA M&A
Barrio San Juan, Aldea Santa Rita
Guastatoya El Progreso
Nit. 20115989

CARLOS ALBERTO AMADO ORELLANA
CONSTRUCTORA M&A

JOEL AMADO ORELLANA
INGENIERO CIVIL
CON ENFASIS EN CONSTRUCCIONES [illegible]
COLEGIADO No. [illegible]

ING. JOEL AMADO ORELLANA
INGENIERO RESIDENTE

CONSTRUCTORA M & A

CONSTRUCTORA
M&A

Guastatoya El Progreso, 07 de MARZO de 2025

Señores
Municipalidad de Guastatoya, E Progreso
Departamento de El Progreso

De la manera más atenta nos dirigimos a ustedes esperando que el desarrollo de sus actividades sea de la mejor manera.

El motivo de la presente es para solicitar pago de la primera estimación del 90.00% de la oferta para el evento **MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR BENQUE VIEJO, ALDEA EL BARREAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO.** según contrato administrativo número 21-2024 de fecha seis de noviembre del año 2024, para cual adjunto el cuadro de estimación del 90.00% de dicho proyecto.

No teniendo más que manifestarles, me suscribo quedando atento y a sus respetables órdenes.

Atentamente,

CONSTRUCTORA M&A
Barrio San Juan, Aldea Santa Rita
Guastatoya El Progreso
NIT: 20115989

CARLOS ALBERTO AMADO ORELLANA
CONSTRUCTORA M&A

PRIMERA ESTIMACION
MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR BENQUE VIEJO, ALDEA EL BARREAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO

RESUMEN DE RENGLONES												
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES DE TRABAJO				CANTIDADES EJECUTADAS PRIMERA ESTIMACION			ACUMULADO A LA FECHA			PORCENTAJE
		CANTIDAD	UNIDAD	P UNITARIO	TOTAL	CANTIDAD		TOTAL	CANTIDAD		TOTAL	TOTAL
1	LIMPIEZA, TRAZO Y CHAPEO	1,099.90	M2	Q 9.65	Q 10,614.04	1,099.90	Q	10,614.04	1,099.90	Q	10,614.04	1.18%
2	RETIRO DE PAVIMENTO EXISTENTE	1,099.90	M2	Q 102.75	Q 113,014.73	1,099.90	Q	113,014.73	1,099.90	Q	113,014.73	12.56%
3	CORTE Y NIVELACION DE CAJUELA T = 0.15 m	1,099.90	M2	Q 78.55	Q 86,397.15	1,099.90	Q	86,397.15	1,099.90	Q	86,397.15	9.61%
4	BASE DE MATERIAL GRANULAR T=0.15M	1,099.90	M2	Q 115.55	Q 127,093.45	1,099.90	Q	127,093.45	1,099.90	Q	127,093.45	14.13%
5	BORDILLO	342.00	M	Q 207.75	Q 71,050.50	144.00	Q	29,916.00	144.00	Q	29,916.00	3.33%
6	FUNDICION DE PAVIMENTO DE 0.15 M	1,099.90	M2	Q 413.55	Q 454,863.65	1,070.04	Q	442,514.65	1,070.04	Q	442,514.65	49.20%
7	SEÑALIZACION	1.00	UNIDAD	Q 36,466.50	Q 36,466.50	-	Q	-	-	Q	-	0.00%
	COSTO TOTAL DEL PROYECTO				Q 899,500.00		Q	809,550.00		Q	809,550.00	90.00%

VALOR DE ESTIMACION No. 1	Q	809,550.00
AMORTIZACION DEL ANTICIPO (20%)	Q	161,910.00
PENDIENTE DE AMORTIZAR	Q	17,990.00
LIQUIDO A RECIBIR	Q	647,640.00

GUASTATOYA 07 DE MARZO 2025

CONSTRUCTORA M&A
Barrio San Juan, Aldea Santa Rita
Guastatoya El Progreso
Nit. 20115989

CARLOS ALBERTO AMADO ORELLANA
CONSTRUCTORA M&A


JOEL AMADO ORELLANA
INGENIERO CIVIL
CON ENFASIS EN CONSTRUCCIONES RIU...
COLEGIADO No. 18,357

ING. JOEL AMADO ORELLANA
INGENIERO RESIDENTE

CONSTRUCTORA M & A


CONSTRUCTORA
M & A

MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR BENQUE VIEJO, ALDEA EL BARREAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO

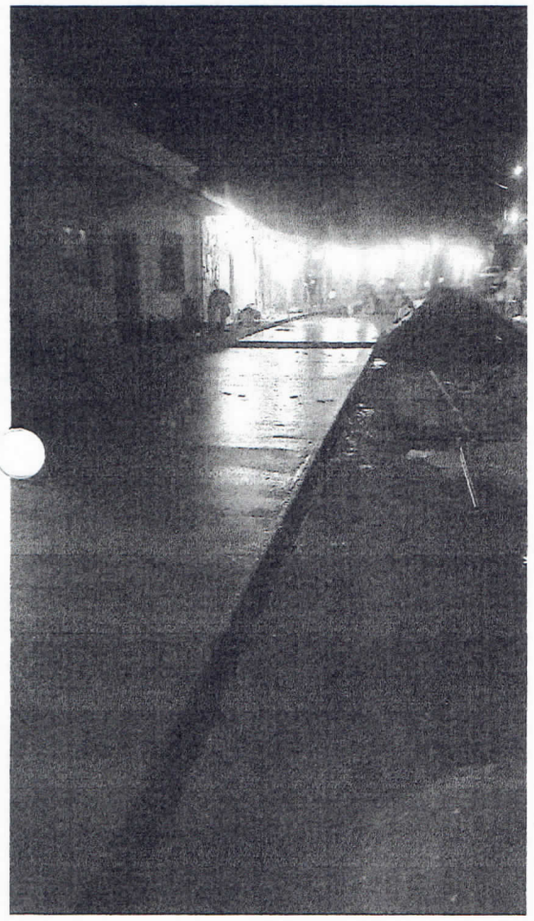






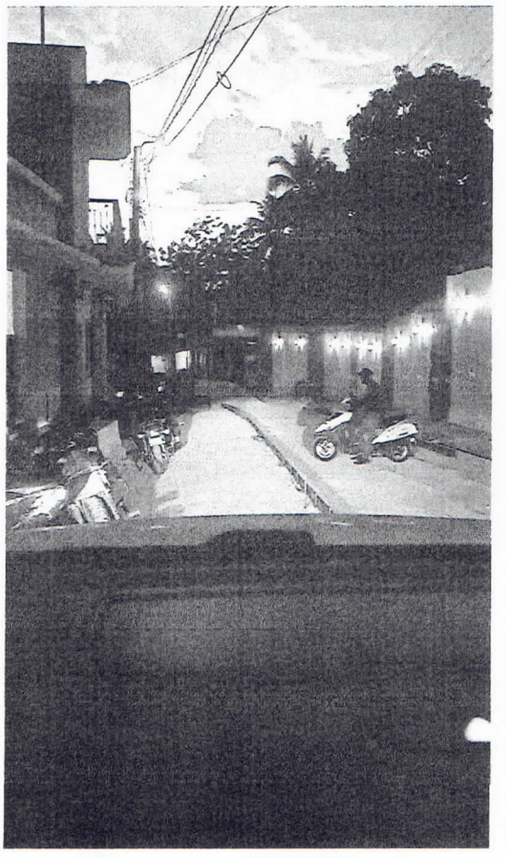

CONSTRUCTORA
M & A

MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR BENQUE VIEJO, ALDEA EL BARREAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO



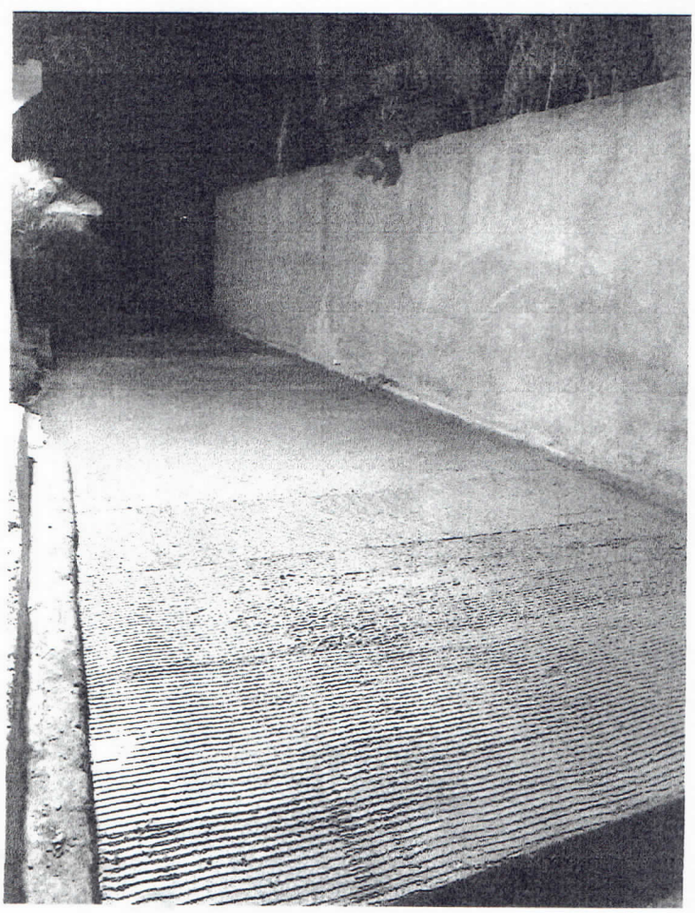

MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!

5980-0535 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
BARRIO EL CALVARIO, **GUASTATOYA EL PROGRESO**

INFORME DE SUPERVISION

Guastatoya, 10 de Marzo de 2025

SEÑOR: JOSE ELIAS HERRERA GUERRA Y CONSEJO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
EL PROGRESO

De la manera más atenta me dirijo a usted deseándole toda clase de éxitos en sus labores diarias.

El motivo de la presente es para hacerle saber lo siguiente:

En visita de supervisión realizada al proyecto denominado **MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR BENQUE VIEJO, ALDEA EL BARREAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO,** con número de contrato **21-2024** de fecha 16 de Diciembre de 2024, ejecutado por la empresa **CONSTRUCTORA M&A**, financiado por la Municipalidad de Guastatoya, se tiene a la vista el oficio de Marzo de 2025 en el cual se hace la solicitud de la estimación del proyecto para un avance del **90.00%**, para lo cual se adjunta el informe de supervisión y el informe de parte de la empresa.

Agradeciendo su atención y en espera de darle seguimiento a este asunto me suscribo de ustedes.

Atentamente

ING. JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA
SUPERVISOR MUNICIPAL, GUASTATOYA
EL PROGRESO

D.M.P.

SUPERVISION DE OBRAS

Dirección Municipal de Planificación

Comunidad.	**Contrato Municipal.**
Aldea El Barreal, Guastatoya, El Progreso	21-2024

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del proyecto.	**Ubicación del proyecto.**
MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR BENQUE VIEJO, ALDEA EL BARREAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Aldea El Barreal, Guastatoya, El Progreso
Contratista. CONSTRUCTORA M&A	**Ubicación del proyecto.** Aldea El Barreal, Guastatoya, El Progreso
Monto Contratado. Q 899,500.00	**Avance Físico.** 90.00%
Informe de Supervisión No. 1	**Fecha.** 10 de Marzo de 2025

2. AVANCE DE EJECUCION DEL PROYECTO

No.	Descripcion del Renglón	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Total a la Fecha	Avance Físico %
1	LIMPIEZA, TRAZO Y CHAPEO	1,099.90	M2	Q 9.65	Q 10,614.04	Q 10,614.04	100%
2	RETIRO DE PAVIMENTO EXISTENTE	1,099.90	M2	Q 102.75	Q 113,014.73	Q 113,014.73	100%
3	CORTE Y NIVELACION DE CAJUELA T = 0.15 m	1,099.90	M2	Q 78.55	Q 86,397.15	Q 86,397.15	100%
4	BASE DE MATERIAL GRANULAR T=0.15M	1,099.90	M2	Q 115.55	Q 127,093.45	Q 127,093.45	100%
5	BORDILLO	144.00	M	Q 207.75	Q 29,916.00	Q 29,916.00	42%
6	FUNDICION DE PAVIMENTO DE 0.15 M	1,070.04	M2	Q 413.55	Q 442,514.65	Q 442,514.65	97%
7	SEÑALIZACION	-	UNIDAD	Q 36,466.50	Q -	Q -	0%
					Q 809,550.00	**Q 809,550.00**	**90.00%**

Estos renglones de trabajo dan como resultado un avance físico del **90.00%** **por lo cual se aprueba realizar el pago correspondiente**

3. DESCRIPCION DEL PROYECTO.

Este proyecto consiste en el mejoramiento de la calle del sector benque viejo, en aldea el barreal, para ello se va a colocar pavimento de concreto para tener una mejor resistencia

4. RECOMENDACIONES.

Chequear los trabajos realizados para garantizar la durabilidad de los mismos, y terminar los trabajos faltantes, los que no se encuentran al 100 % y los que no se han iniciado aun

SUPERVISOR DE PROYECTOS MUNICIPALES.

ING. JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA
SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES

D.M.P.	SUPERVISION DE OBRAS	Dirección Municipal de Planificación

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO


Nombre del proyecto.	**Ubicación del proyecto.**
MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR BENQUE VIEJO, ALDEA EL BARREAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Aldea El Barreal, Guastatoya, El Progreso

2. INFORME FOTOGRAFICO.







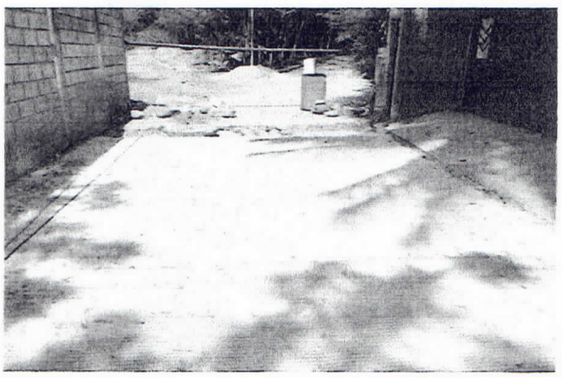



SUPERVISOR DE PROYECTOS MUNICIPALES.

ING. JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA
SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES

REPORTE DE AVANCE FISICO No. 1

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR BENQUE VIEJO, ALDEA EL BARREAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO	
Municipio: GUASTATOYA	Departamento: EL PROGRESO
Comunidad: ALDEA EL BARREAL	Fecha de Contrato:16/12/2024
Fecha de Inicio: 16/12/2024	Fecha de Supervision:10/03/2025
Fecha de Finalizacion: 15/05/2025	Unidad Ejecutora: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
Contrato No.: 21-2024	Valor del Proyecto: Q.899,500.00
Modificaciones:	Valor Original: Q.899,500.00
Constructora: CONSTRUCTORA M&A	Telefono:
Representante legal: CARLOS ALBERTO AMADO ORELLANA	

RESUMEN DE RENGLONES

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES DE TRABAJO				ORDEN DE CAMBIO	ORDEN DE TRABAJO SUPLEMENTARIO	ORDEN DE TRABAJO EXTRA	RENGLON MODIFICADO	CANTIDADES EJECUTADAS PRIMERA ESTIMACION		ACUMULADO A LA FECHA		PORCENTAJE
		CANTIDAD	UNIDAD	P UNITARIO	TOTAL	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	TOTAL
1	LIMPIEZA, TRAZO Y CHAPEO	1,099.90	M2	Q 9.65	Q 10,614.04					1,099.90	Q 10,614.04	1,099.90	Q 10,614.04	1.18%
2	RETIRO DE PAVIMENTO EXISTENTE	1,099.90	M2	Q 102.75	Q 113,014.73					1,099.90	Q 113,014.73	1,099.90	Q 113,014.73	12.56%
3	CORTE Y NIVELACION DE CAJUELA T = 0.15 m	1,099.90	M2	Q 78.55	Q 86,397.15					1,099.90	Q 86,397.15	1,099.90	Q 86,397.15	9.61%
4	BASE DE MATERIAL GRANULAR T=0.15M	1,099.90	M2	Q 115.55	Q 127,093.45					1,099.90	Q 127,093.45	1,099.90	Q 127,093.45	14.13%
5	BORDILLO	342.00	M	Q 207.75	Q 71,050.50					144.00	Q 29,916.00	144.00	Q 29,916.00	3.33%
6	FUNDICION DE PAVIMENTO DE 0.15 M	1,099.90	M2	Q 413.55	Q 454,863.65					1,070.04	Q 442,514.65	1,070.04	Q 442,514.65	49.20%
7	SEÑALIZACION	1.00	UNIDAD	Q 36,466.50	Q 36,466.50					-	Q -	-	Q -	0.00%
	COSTO TOTAL DEL PROYECTO				Q 899,500.00						Q 809,550.00		Q 809,550.00	90.00%

VALOR DE ESTIMACION No. 1	Q 809,550.00
AMORTIZACION DEL ANTICIPO (20%)	Q 161,910.00
PENDIENTE DE AMORTIZAR	Q 17,990.00
LIQUIDO A RECIBIR	**Q 647,640.00**

JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES

Contraloría General de Cuentas
GUATEMALA, C.A.

Bitácora Electrónica

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA Y GESTIÓN AMBIENTAL

UNIDAD DE BITÁCORAS – DATOS DE LA BITÁCORA ELECTRÓNICA –

BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 4007/11/2024	
No. CONTRATO	21-2024
FECHA CONTRATO	06/11/2024
MONTO CONTRACTUAL	899,500.00
NOG	24430870
NOMBRE DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR BENQUE VIEJO, ALDEA EL BARREAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO
UBICACIÓN DEL PROYECTO	Guastatoya, EL PROGRESO
ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JOEL AMADO ORELLANA
EMPRESA EJECUTORA	CARLOS ALBERTO AMADO ORELLANA
REPRESENTANTE LEGAL O CONTRATISTA	CARLOS ALBERTO AMADO ORELLANA
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA
SUPERVISOR EMPRESA SUPERVISORA	

FECHA DE AUTORIZACIÓN 13/11/2024

BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 4007/11/2024

CONTRATO No. 21-2024

NOMBRE: MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR BENQUE VIEJO, ALDEA EL BARREAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

REGISTRO No.	1
FECHA	13/01/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	BITACORA DE INICIO DE PROYECTO se adjunta acta de inicio no 23-2024 para hacer constar el inicio de los trabajos a realizar en el proyecto MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR BENQUE VIEJO, ALDEA EL BARREAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA



Municipalidad de Guastatoya, Departamento de El Progreso

DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION

LIBRO DE ACTAS DE INICIO DE OBRAS Nº 0173

ACTA DE INICIO NO. 23-2024

PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR BENQUE VIEJO, ALDEA EL BARREAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO. IDENTIFICADO CON NOG. 24430870, EN GUATECOMPRAS. ----------

En el Municipio de Guastatoya, Departamento El Progreso, siendo las nueve horas en punto del día lunes dieciséis de diciembre de dos mil veinticuatro, reunidos en el área donde se va a ejecutar el Proyecto, **MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR BENQUE VIEJO, ALDEA EL BARREAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO.** Los señores: José Elías Herrera Guerra, Alcalde Municipal; Ing. José Fulgencio Alexander Aguilar Mejía, Supervisor de Obras Municipales; Carlos Alberto Amado Orellana, Representante Legal de la Empresa Constructora: Ing. Joel Amado Orellana, Supervisor Residente del Proyecto; Lic. Alexis Geovanny Marroquín Orellana, Director de la Dirección Municipal de Planificación; con el objeto de dejar constancia de lo siguiente. **PRIMERO:** Se facciona la presente acta para dejar constancia de Inicio del Proyecto: **MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR BENQUE VIEJO, ALDEA EL BARREAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO.** El cual será ejecutado con fondos extraordinarios provenientes del Consejo Departamental de Desarrollo para el ejercicio fiscal 2,024; por un Valor de Ochocientos Noventa y Nueve Mil Quinientos Quetzales Exactos (Q. 899,500.00), con un plazo de cinco meses calendario el cual, por adjudicación en los procesos y requisitos de GUATECOMPRAS, lo ejecutará la empresa **CONSTRUCTORA M&A,** Habiendo sido publicado en el Sistema de Guatecompras la adjudicación bajo el NOG- 24430870, Según Contrato Administrativo No. 21-2024 de fecha seis de noviembre del dos mil veinticuatro. **SEGUNDO:** Los señores anteriormente mencionados declaran iniciados los trabajos, los cuales se realizarán con base a planos y especificaciones elaboradas para el presente proyecto y de acuerdo al contrato respectivo. **TERCERO:** El Señor Alcalde Municipal recomienda al representante de la empresa constructora, al supervisor residente de la empresa y supervisor de obras municipales que los trabajos sean ejecutados en base al diseño y especificaciones propias de este proyecto y presentar los avances del mismo para el pago respectivo con la documentación de soporte. **CUARTO:** No habiendo más que agregar se da por terminada la presente en el mismo lugar y fecha media hora después de su inicio. Leída se acepta, ratifica y firma por los que en ella intervenimos Damos fe. ----------

ALCALDE

José Elías Herrera Guerra
Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA ¡Sirviendo!

Lic Alexis Geovanny Marroquín Orellana
Director
Dirección Municipal de Planificación

¡Sirviendo!

CONSTRUCTORA M&A
Barrio San Juan, Aldea Santa Rita
Guastatoya El Progreso
Nit. 20115989

Carlos Alberto Amado Orellana
Representante de la empresa

JOEL AMADO ORELLANA
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO

Ing. Joel Amado Orellana
Supervisor Residente

José F. Alexander Aguilar Mejía
Ingeniero Civil
Colegiado No. 7 [illegible]

Ing. José Fulgencio Alexander Aguilar Mejía
Supervisor de Obras Municipales

BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 4007/11/2024

CONTRATO No. 21-2024

NOMBRE: MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR BENQUE VIEJO, ALDEA EL BARREAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

REGISTRO No.	2
FECHA	25/01/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	Se observa que ya se realizó el retiro de adoquin existente, y se observa preparación de area para el pavimento
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA






10




BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 4007/11/2024

CONTRATO No. 21-2024

NOMBRE: MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR BENQUE VIEJO, ALDEA EL BARREAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

REGISTRO No.	3
FECHA	01/03/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	Se observa la preparacion de la base para la fundición del pavimento, se cuenta con personal y materiales suficientes para el avance del proyecto
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA

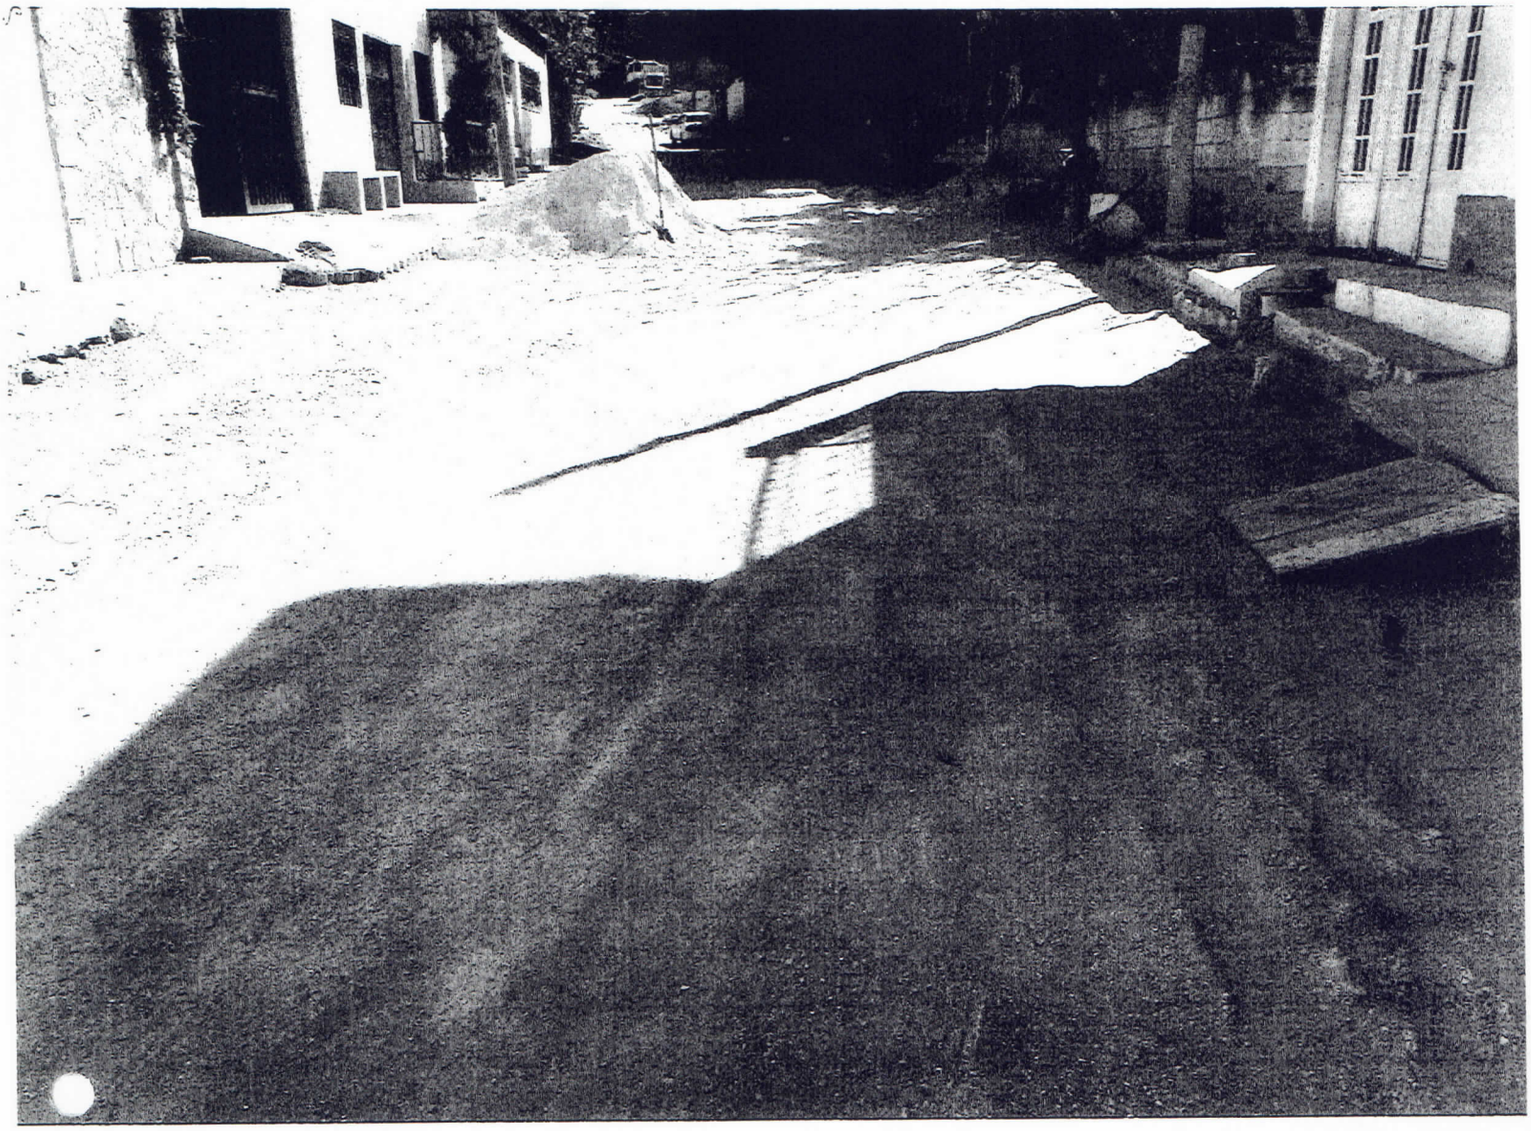









BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 4007/11/2024

CONTRATO No. 21-2024

NOMBRE: MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR BENQUE VIEJO, ALDEA EL BARREAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

REGISTRO No.	4
FECHA	10/03/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	El pavimento se encuentra colocado y también la base, se cuenta con personal y materiales suficientes para el avance del proyecto
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA









5980-0535 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
BARRIO EL CALVARIO, **GUASTATOYA EL PROGRESO**

MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!

LA INFRASCRITA SECRETARIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO

CERTIFICA

Que para su cumplimiento y efectos consiguientes se transcribe EL ACUERDO MUNICIPAL No. 047-2025 de fecha treinta de abril de dos mil veinticinco del libro número 3,211 de la Alcaldía Municipal, Libro de Acuerdos, debidamente autorizado por la Contraloría General de Cuentas, el que copiado literalmente dice:

ACUERDO MUNICIPAL 047-2025

Guastatoya, 30 de Abril de 2,025

DESPACHO DEL ALCALDE MUNICIPAL

La Autoridad Administrativa Superior

Se tiene a la vista la solicitud presentada por Carlos Amado Orellana propietario de la empresa **CONSTRUCTORA M&A**, en la cual manifiesta que el proyecto denominado **"MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR BENQUE VIEJO, ALDEA EL BARREAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO",** el que se ejecuta por Contrato Administrativo de Obra número 21-2024, de fecha seis de noviembre de dos mil veinticuatro; y que el proyecto en referencia se encuentra en un avance físico del 90.00%, en consecuencia solicitan el pago de conformidad con la cláusula cuarta numeral 2) del contrato administrativo de obras.
Consecuentemente se encuentra el informe del Ingeniero Jose Fulgencio Alexander Aguilar Mejía, Supervisor de Obras Municipales, en el cual hace constar la confirmación del avance del proyecto en referencia, por un total de 90.00% de avance físico, adjunta para el efecto la estimación.

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el artículo 59 de la Ley de Contrataciones del Estado, establece: Estimaciones para pago. *"La entidad contratante podrá hacer pagos parciales al contratista contra estimaciones periódicas de trabajo ejecutado y aceptado, las que podrán efectuarse mensualmente de acuerdo con las estipulaciones pactadas.".*

POR TANTO:

Con fundamento en los antecedentes y lo considerado, este Despacho Municipal.

RESUELVE:

I) **APROBAR**, el pago por la cantidad de 90.00%, del proyecto **"MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR BENQUE VIEJO, ALDEA EL BARREAL, GUASTATOYA, EL PROGRESO",** el que se ejecuta por Contrato Administrativo de Obra número 21-2024, de fecha seis de noviembre de dos mil veinticuatro; suscrito por el Alcalde Municipal y Carlos Amado Orellana propietario de **CONSTRUCTORA M&A.**

II) **SE ORDENA**, al Director de la Administración Financiera Municipal, hacer el pago correspondiente al 90.00% del monto total del proyecto.

III) Cúmplase. -

DADO EN EL PALACIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE GUASTATOYA, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, A TREINTA DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO.

SECRETARIA

LICDA. EVELYN YANETH OAJACA MARROQUÍN
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA ¡Sirviendo!
