MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!

5980-0535 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
BARRIO EL CALVARIO, **GUASTATOYA EL PROGRESO**

REPORTE DE PAGO DE PROYECTOS POR CONTRATO 2025

EXPEDIENTE No. **308** NOG: **26918714** CONTRATO No. **19-2025**

PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE URBANA SECTOR MERCADO VIEJO, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO

APORTES	% DE AVANCE	ESTIMACION	AMORTIZACION	LIQUIDO A RECIBIR
Aporte CODEDE	**40.00%**			
Q. 1,999,896.00		Q. 500,000.00	Q. 100,000.00	Q. 400,000.00
32 00 001 000 018 331 31-0101-0004				
TOTALES		Q. 500,000.00	Q. 100,000.00	Q. 400,000.00

Se cuenta con Informe de supervisión por parte de la empresa, informe de supervisión por el Supervisor de Obras Municipales, Punto del Concejo Municipal de aprobación de avance, Copia de bitácora, Recibo 7-b.

Lic. Alexis Geovanny Marroquín Orellana
Director Municipal de Planificación

Factura

CARLOS ALBERTO , AMADO ORELLANA
Nit Emisor: 20115989
CONSTRUCTORA M&A
ALDEA SANTA RITA BARRIO SAN JUAN, GUASTATOYA, EL PROGRESO
NIT Receptor: 6206107
Nombre Receptor: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
C897E16B-ED84-44D7-AC8B-8664712CF53E
Serie: C897E16B Número de DTE: 3984868567
Numero Acceso:

Fecha y hora de emision: 15-dic-2025 15:51:53
Fecha y hora de certificación: 15-dic-2025 15:51:53
Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Otros Descuentos(Q)	Total (Q)	Impuestos	
1	Servicio	1	PAGO DEL 40.00% DE AVANCE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE URBANA SECTOR MERCADO VIEJO, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO. CONTRATO NÚMERO 19-2025. EXPEDIENTE No. 308, NOG: 26918714. ESTIMACIÓN Q. 500,000.00 MENOS AMORTIZACIÓN Q. 100,000.00 IGUAL LÍQUIDO A RECIBIR Q. 400,000.00. APROBADO Y AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTES.	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	IVA	53.571.42857 1
			TOTALES:		0.00	0.00	500,000.00	IVA	53.571.42857 1

* Sujeto a pagos trimestrales ISR

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

Contribuyendo *juntos por Guatemala*

RECIBO DE LA MUNICIPALIDAD

DE GUASTATOYA,
DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO

FORMA 7-B INGRESOS VARIOS

SERIE B **No.** 669603

FECHA: DIA 8 | MES 12 | AÑO 2025

POR: Cuatrocientos mil quetzales con 00/100 CODIGO JURISDICCIONAL: D-4 5201

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: Consejo Departamental de Desarrollo

DIRECCION El Progreso

ARBITRIOS	ORNATO Q.4.00 ☐ 10.00 ☐ 15.00 ☐ 50.00 ☐ 75.00 ☐ 100.00 ☐ 150.00 ☐ ☐ ☐	Q.	
TASAS	VARIOS		
	LICENCIAS		
	ESTACIONAMIENTOS		
	CERTIFICACIONES		
	CEDULAS		
	MERCADOS		
	SERVICIOS VARIOS		
	SERVICIOS AGUA		
	SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA		
CONTRIBUCIONES	CONCEPTO		
MULTAS	CONCEPTO		
OTROS	VARIOS Pago del 40.00% segundo desembolso del proyecto mejoramiento calle urbana sector mercado viejo, barrio El Golfo, Guastatoya, El Progreso. SNIP 352326 convenio No. 18-2025, fuente 12		Q400,000.00
	LECTURA DE CONTADOR ACTUAL / ANTERIOR	TOTAL	Q. Q400,000.00
	OBSERVACIONES:		
	FIRMA DEL RECEPTOR MUNICIPAL		

VALIDO UNICAMENTE POR EL IMPORTE IMPRESO POR LA CAJA REGISTRADORA MUNICIPAL Y/O NOMBRE FIRMA Y SELLO DEL RECEPTOR MUNICIPAL.

CUENTA

SUB-CUENTA

ORIGINAL-ENTERANTE

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA ¡Sirviendo!

AUTORIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS RES. BJ/5875 Clas.: 920-12-9-1-4-97 DEL 26-06-97.

S 4035611 T-0340 2045310 87

FORMULARIOS STANDARD, S. A. PBX: 2424-8900 - NIT: 1332227-7 - 75000 - MR0004 DPI No. 6502001 AM No. 2162609 SERIE B EMPRO MUNICIPAL No. 4534 DEL 07/11/2024 NUMERO CORRELATIVO D-4-16-2024 DEL 07/11/2024 No. DE CUENTA: 2022 2003 2012 2401 OFICIO SIN DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2024 LIBRO 00315 FOLIO 7.

www.standard-c.com

CONCURSO: Adición de anexos al concurso en la Fase de Ejecución

Mensaje de confirmación

15/01/2025 10:56:21

Documentos asociados:

1	26918714@INFORME DE SUPERVISION 40 AVANCE FISICO CALLE MERCADO VIEJO.pdf(3574 KB)

Si desea imprimir este mensaje, oprima el siguiente botón

CONSTRUCTORA M&A

Barrió San Juan, Aldea Santa Rita Guastatoya El progreso
Propietario: Carlos Alberto Amado Orellana
NIT: 20115989 TEL. 3024-9033

Guastatoya, El Progreso, 10 de noviembre 2025

Señor:

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
Alcalde Municipal Y Concejo
Guastatoya, El Progreso.

Respetable Señor:

Me dirijo a usted deseándole que sus labores diarias sean realizadas con éxito, el motivo de la presente es para SOLICITARLE el **40% DE AVANCE** del proyecto denominado MEJORAMIENTO CALLE URBANA SECTOR MERCADO VIEJO, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO. el cual se ejecutó los trabajos por mi empresa Constructora M&A no habiendo más que hacer solicito su aprobación para dicha solicitud.

Sin otro particular y esperando su aprobación, me suscribo de usted.

Atentamente:

CONSTRUCTORA M&A
Barrio San Juan, Aldea Santa Rita
Guastatoya El Progreso
Nit. 20115989

Carlos Alberto Amado Orellana
Representante Legal
CONSTRUCTORA M&A.

CUADRO DE PROGRAMA DE INVERSION 40% DE AVANCE

EMPRESA: CONSTRUCTORA M&A

PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE URBANA SECTOR MERCADO VIEJO, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO.

FECHA: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2025

EXPRESADO EN QUETZALES

RENGLONES	UNIDAD	CANT.	VALOR UNI.	%	TOTAL	AVANCE FISICO TOTAL	AVANCE FISICO ESTE PERIODO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO ESTE PERIODO	AVANCE FINANCIERO TOTAL PENDIENTE	AVANCE FINANCIERO % PENDIENTE
LIMPIEZA, TRAZO Y CHAPEO	m2	2,538.00	Q 10.00	1.2691	Q 25,380.00	2,538.00	Q 10.00	1.2691	Q 25,380.00	Q -	0.0000
RETIRO DE ADOQUIN EXISTENTE	m2	2,538.00	Q 90.00	11.4216	Q 228,420.00	2,538.00	Q 90.00	11.4216	Q 228,420.00	Q -	0.0000
CORTE Y NIVELACION DE CAJUELA T = 0.15 m	m2	2,538.00	Q 85.00	10.7871	Q 215,730.00	2,538.00	Q 85.00	10.7871	Q 215,730.00	Q -	0.0000
BASE DE MATERIAL GRANULAR T=0.15M	m2	2,538.00	Q 127.00	16.1171	Q 322,326.00	2,538.00	Q 127.00	16.1171	Q 322,326.00	Q -	0.0000
FUNDICION DE PAVIMENTO DE 0.15 M	m2	2,538.00	Q 450.00	57.1080	Q 1,142,100.00	18.01	Q 450.00	0.4051	Q 8,102.40	Q 1,133,997.60	56.7028
SEÑALIZACION	Unidad	1.00	Q 65,940.00	3.2972	Q 65,940.00	-	Q 65,940.00	-	Q -	Q 65,940.00	3.2972
TOTALES				100.00%	Q 1,999,896.00	AVANCE FISICO >		40.00%	799,958.40	1,199,937.59	60.00%

MONTO DEL PROYECYO		Q 1,999,896.00
MONTO DEL 100%		Q 1,999,896.00
40% DE AVANCE		Q 799,958.40
MENOS EL 20% DE AMORTIZACION	Q 159,991.68	
AVANCE FINANCIERO A DAR		Q 639,966.73


F.


CARLOS ALBERTO AMADO ORELLANA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA M&A


CONSTRUCTORA M&A
Barrio San Juan, Aldea Santa Rita
Guastatoya El Progreso
NIT. 20115989


CONSTRUCTORA M&A

Barrió San Juan, Aldea Santa Rita Guastatoya El progreso
Propietario: Carlos Alberto Amado Orellana
NIT: 20115989 TEL. 3024-9033

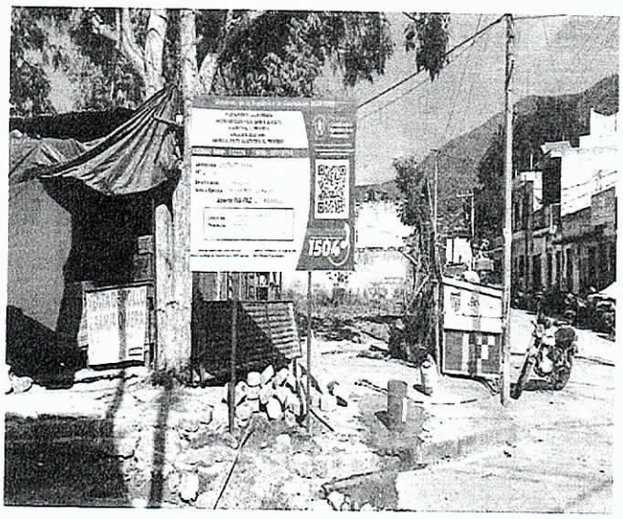


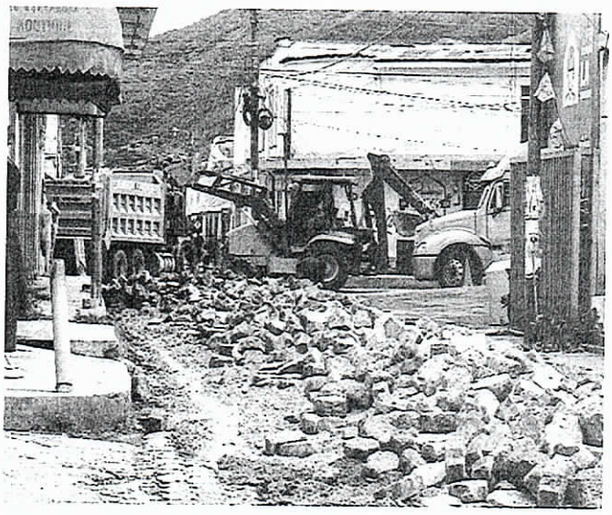

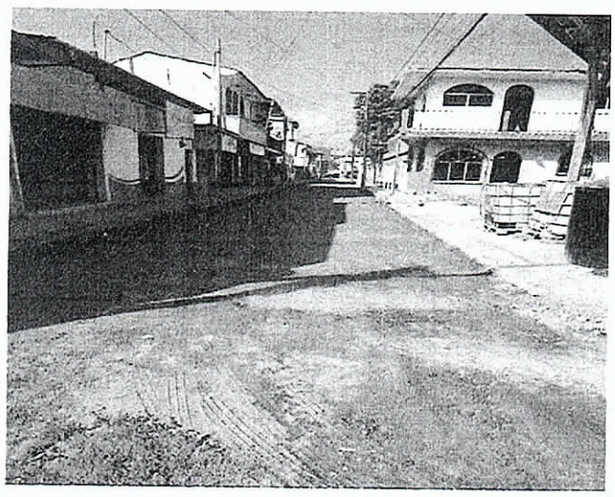

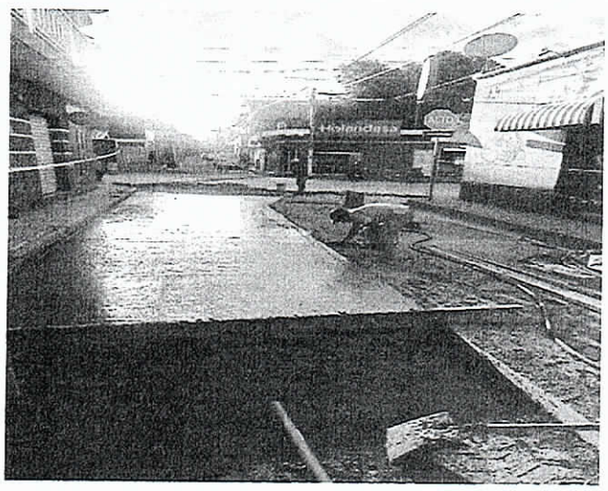



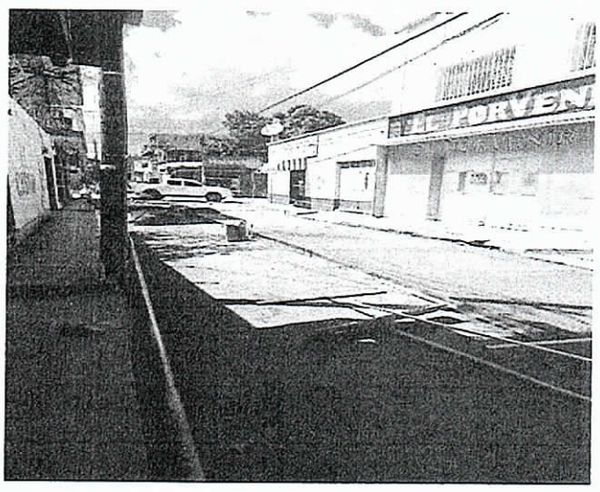

MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!

5980-0535 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
BARRIO EL CALVARIO, **GUASTATOYA EL PROGRESO**

INFORME DE SUPERVISION

Guastatoya, 30 de Noviembre de 2025

SEÑOR: JOSE ELIAS HERRERA GUERRA Y CONSEJO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
EL PROGRESO

De la manera más atenta me dirijo a usted deseándole toda clase de éxitos en sus labores diarias.

El motivo de la presente es para hacerle saber lo siguiente:

En visita de supervisión realizada al proyecto denominado **MEJORAMIENTO CALLE URBANA SECTOR MERCADO VIEJO, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO**, con número de contrato **19-2025** de fecha 20 de Agosto de 2025, ejecutado por la empresa **CONSTRUCTORA M&A**, financiado por la Municipalidad de Guastatoya, se tiene a la vista el oficio de Noviembre de 2025 en el cual se hace la solicitud de la estimación del proyecto para un avance del **40.00%**, para lo cual se adjunta el informe de supervisión y el informe de parte de la empresa.

Agradeciendo su atención y en espera de darle seguimiento a este asunto me suscribo de ustedes.

Atentamente

José F. Alexander Aguilar Mejía
Ingeniero Civil
Colegiado No. 9,366

ING. JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA
SUPERVISOR MUNICIPAL, GUASTATOYA
EL PROGRESO

D.M.P.	SUPERVISION DE OBRAS	Dirección Municipal de Planificación

Comunidad.	Contrato Municipal.
Cabecera Municipal, Guastatoya, El Progreso	19-2025

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del proyecto.	Ubicación del proyecto.
MEJORAMIENTO CALLE URBANA SECTOR MERCADO VIEJO, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Cabecera Municipal, Guastatoya, El Progreso
Contratista. CONSTRUCTORA M&A **Monto Contratado.** Q 1,999,896.00	**Ubicación del proyecto.** Cabecera Municipal, Guastatoya, El Progreso **Avance Físico.** 40.00%
Informe de Supervisión No. 1	**Fecha.** 30 de Noviembre de 2025

2. AVANCE DE EJECUCION DEL PROYECTO

No.	Descripcion del Renglón	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Total a la Fecha	Avance Físico %
1	LIMPIEZA, TRAZO Y CHAPEO	2,538.00	M2	Q 10.00	Q 25,380.00	Q 25,380.00	100%
2	RETIRO DE ADOQUIN EXISTENTE	2,538.00	M2	Q 90.00	Q 228,420.00	Q 228,420.00	100%
3	CORTE Y NIVELACION DE CAJUELA T = 0.15 m	2,538.00	M2	Q 85.00	Q 215,730.00	Q 215,730.00	100%
4	BASE DE MATERIAL GRANULAR T=0.15M	650.00	M2	Q 127.00	Q 82,550.00	Q 82,550.00	26%
5	FUNDICION DE PAVIMENTO DE 0.15 M	550.84	M2	Q 450.00	Q 247,878.40	Q 247,878.40	22%
6	SEÑALIZACION	-	UNIDAD	Q 65,940.00	Q -	Q -	0%
					Q 799,958.40	Q 799,958.40	40.00%

Estos renglones de trabajo dan como resultado un avance físico del **40.00%** **por lo cual se aprueba realizar el pago correspondiente**

3. DESCRIPCION DEL PROYECTO.

Este proyecto consiste en el mejoramiento de la calle que sirve de ingreso al area del mercado viejo, barrio el golfo, de guastatoya, el progreso, la cual se encuentra con adoquin en mal estado, el cual se va a retirar para colocar pavimento de concreto

4. RECOMENDACIONES.

Chequear los trabajos realizados para garantizar la durabilidad de los mismos, y terminar los trabajos faltantes, los que no se encuentran al 100 % y los que no se han iniciado aun

SUPERVISOR DE PROYECTOS MUNICIPALES.

ALCALDE

José F. Alexander Aguilar Mejia
Colegiado No. 9,365

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA ¡Sirviendo!

ING. JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA
SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES

JOSE ELIAS HERRERA GUERRA
ALCALDE MUNICIPAL DE GUASTATOYA

D.M.P.	SUPERVISION DE OBRAS	Dirección Municipal de Planificación


1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO


Nombre del proyecto.	Ubicación del proyecto.
MEJORAMIENTO CALLE URBANA SECTOR MERCADO VIEJO, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO	Cabecera Municipal, Guastatoya, El Progreso

2. INFORME FOTOGRAFICO.





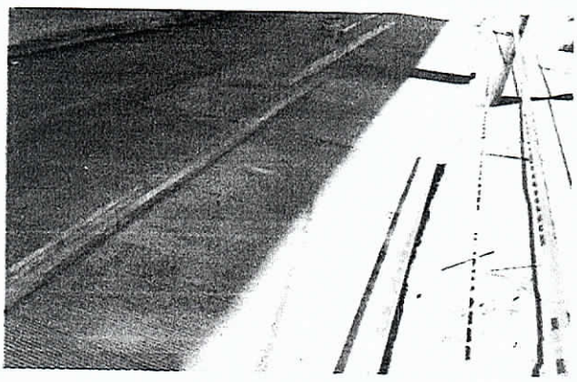

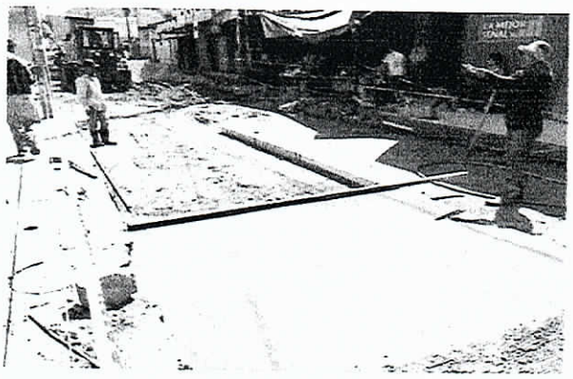



ALCALDE

SUPERVISOR DE PROYECTOS MUNICIPALES

Jose F. Alexander Ingeniero Civil Colegiado No. 9,366

ING. JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA
SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA ¡Sirviendo

JOSE ELIAS HERRERA GUERRA
ALCALDE MUNICIPAL DE GUASTATOYA

REPORTE DE AVANCE FISICO No. 1

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO CALLE URBANA SECTOR MERCADO VIEJO, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO	
Municipio: GUASTATOYA	Departamento: EL PROGRESO
Comunidad: CABECERA MUNICIPAL	Fecha de Contrato: 20/08/2025
Fecha de Inicio: 25/08/2025	Fecha de Supervision: 30/10/2025
Fecha de Finalizacion: 24/02/2026	Unidad Ejecutora: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
Contrato No.: 19-2025	Valor del Proyecto: Q.1,999,896.00
Modificaciones:	Valor Original: Q.1,999,896.00
Constructora: CONSTRUCTORA M&A	Telefono:
Representante legal: CARLOS ALBERTO AMADO ORELLANA	

RESUMEN DE RENGLONES

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES DE TRABAJO				ORDEN DE CAMBIO	ORDEN DE TRABAJO SUPLEMENTARIO	ORDEN DE TRABAJO EXTRA	RENGLON MODIFICADO	CANTIDADES EJECUTADAS PRIMERA ESTIMACION		ACUMULADO A LA FECHA		PORCENTAJE
		CANTIDAD	UNIDAD	P UNITARIO	TOTAL	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	TOTAL
1	LIMPIEZA, TRAZO Y CHAPEO	2,538.00	M2	Q 10.00	Q 25,380.00					2,538.00	Q 25,380.00	2,538.00	Q 25,380.00	1.27%
2	RETIRO DE ADOQUIN EXISTENTE	2,538.00	M2	Q 90.00	Q 228,420.00					2,538.00	Q 228,420.00	2,538.00	Q 228,420.00	11.42%
3	CORTE Y NIVELACION DE CAJUELA T = 0.15 m	2,538.00	M2	Q 85.00	Q 215,730.00					2,538.00	Q 215,730.00	2,538.00	Q 215,730.00	10.79%
4	BASE DE MATERIAL GRANULAR T=0.15M	2,538.00	M2	Q 127.00	Q 322,326.00					650.00	Q 82,550.00	650.00	Q 82,550.00	4.13%
5	FUNDICION DE PAVIMENTO DE 0.15 M	2,538.00	M2	Q 450.00	Q 1,142,100.00					550.84	Q 247,878.40	550.84	Q 247,878.40	12.39%
6	SEÑALIZACION	1.00	UNIDAD	Q 65,940.00	Q 65,940.00					-	Q -	-	Q -	0.00%
	COSTO TOTAL DEL PROYECTO				Q 1,999,896.00						Q 799,958.40		Q 799,958.40	40.00%

VALOR DE ESTIMACION No. 1	Q 799,958.40
AMORTIZACION DEL ANTICIPO (20%)	Q 159,991.68
PENDIENTE DE AMORTIZAR	Q 239,987.52
LIQUIDO A RECIBIR	Q 639,966.72

José de Jesús Alexander Aguilar Mejía
Ingeniero Civil
Colegiado No. 9,303

JOSE DE JESUS ALEXANDER AGUILAR MEJIA
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES

JOSE ELIAS HERRERA GUERRA
ALCALDE MUNICIPAL GUASTATOYA

ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA Y GESTIÓN AMBIENTAL

UNIDAD DE BITÁCORAS – DATOS DE LA BITÁCORA ELECTRÓNICA –

BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 5008/09/2025

No. CONTRATO	19-2025
FECHA CONTRATO	20/08/2025
MONTO CONTRACTUAL	1,999,896.00
NOG	26918714
NOMBRE DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO CALLE URBANA SECTOR MERCADO VIEJO, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO
UBICACIÓN DEL PROYECTO	Guastatoya, EL PROGRESO
ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JOEL AMADO ORELLANA
EMPRESA EJECUTORA	CARLOS ALBERTO AMADO ORELLANA
REPRESENTANTE LEGAL O CONTRATISTA	CARLOS ALBERTO AMADO ORELLANA
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA
SUPERVISOR EMPRESA SUPERVISORA	

FECHA DE AUTORIZACIÓN 26/08/2025

BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 5008/09/2025


CONTRATO No. 19-2025

NOMBRE: MEJORAMIENTO CALLE URBANA SECTOR MERCADO VIEJO, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

REGISTRO No.	1
FECHA	07/10/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	Se realiza el retiro de adoquin existente, se cuenta con personal y materiales suficientes para el avance del proyecto
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA


BARBERIA
"EL TRIUNFO"

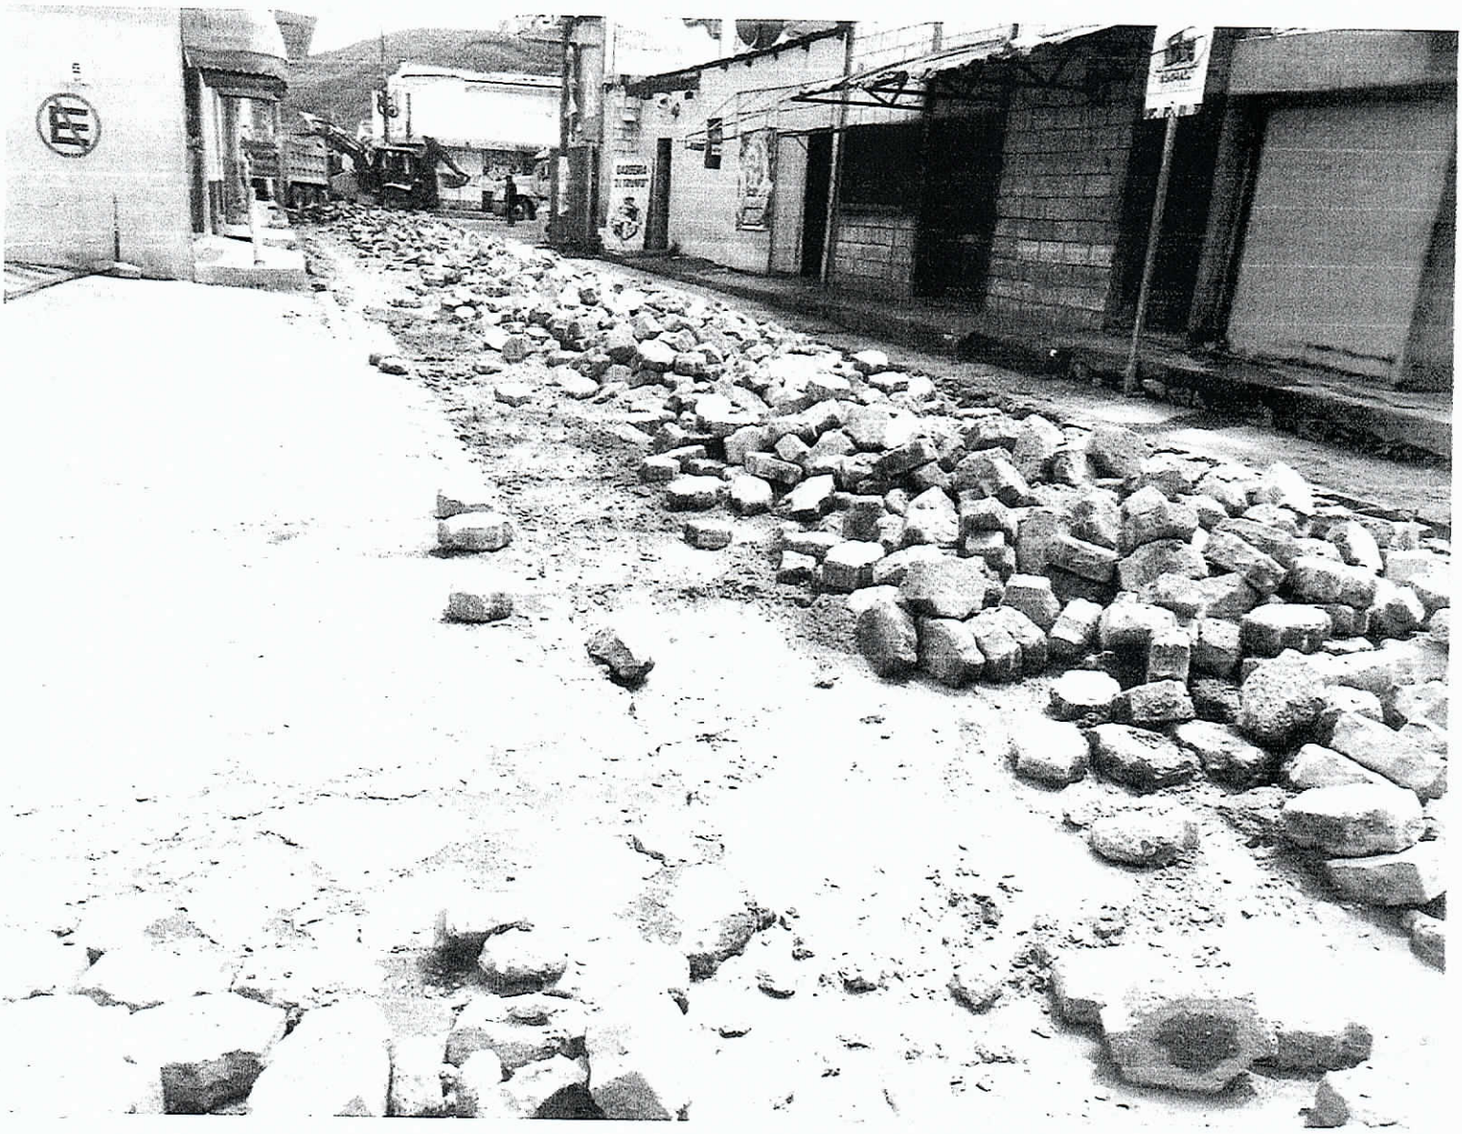





BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 5008/09/2025


CONTRATO No. 19-2025


NOMBRE: MEJORAMIENTO CALLE URBANA SECTOR MERCADO VIEJO, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

REGISTRO No.	2
FECHA	13/10/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	Se realiza el corte de cajuela para la colocación de base y, fundición de pavimento, se cuenta con personal y materiales suficientes para el avance del proyecto
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA


LA MEJOR SEÑAL

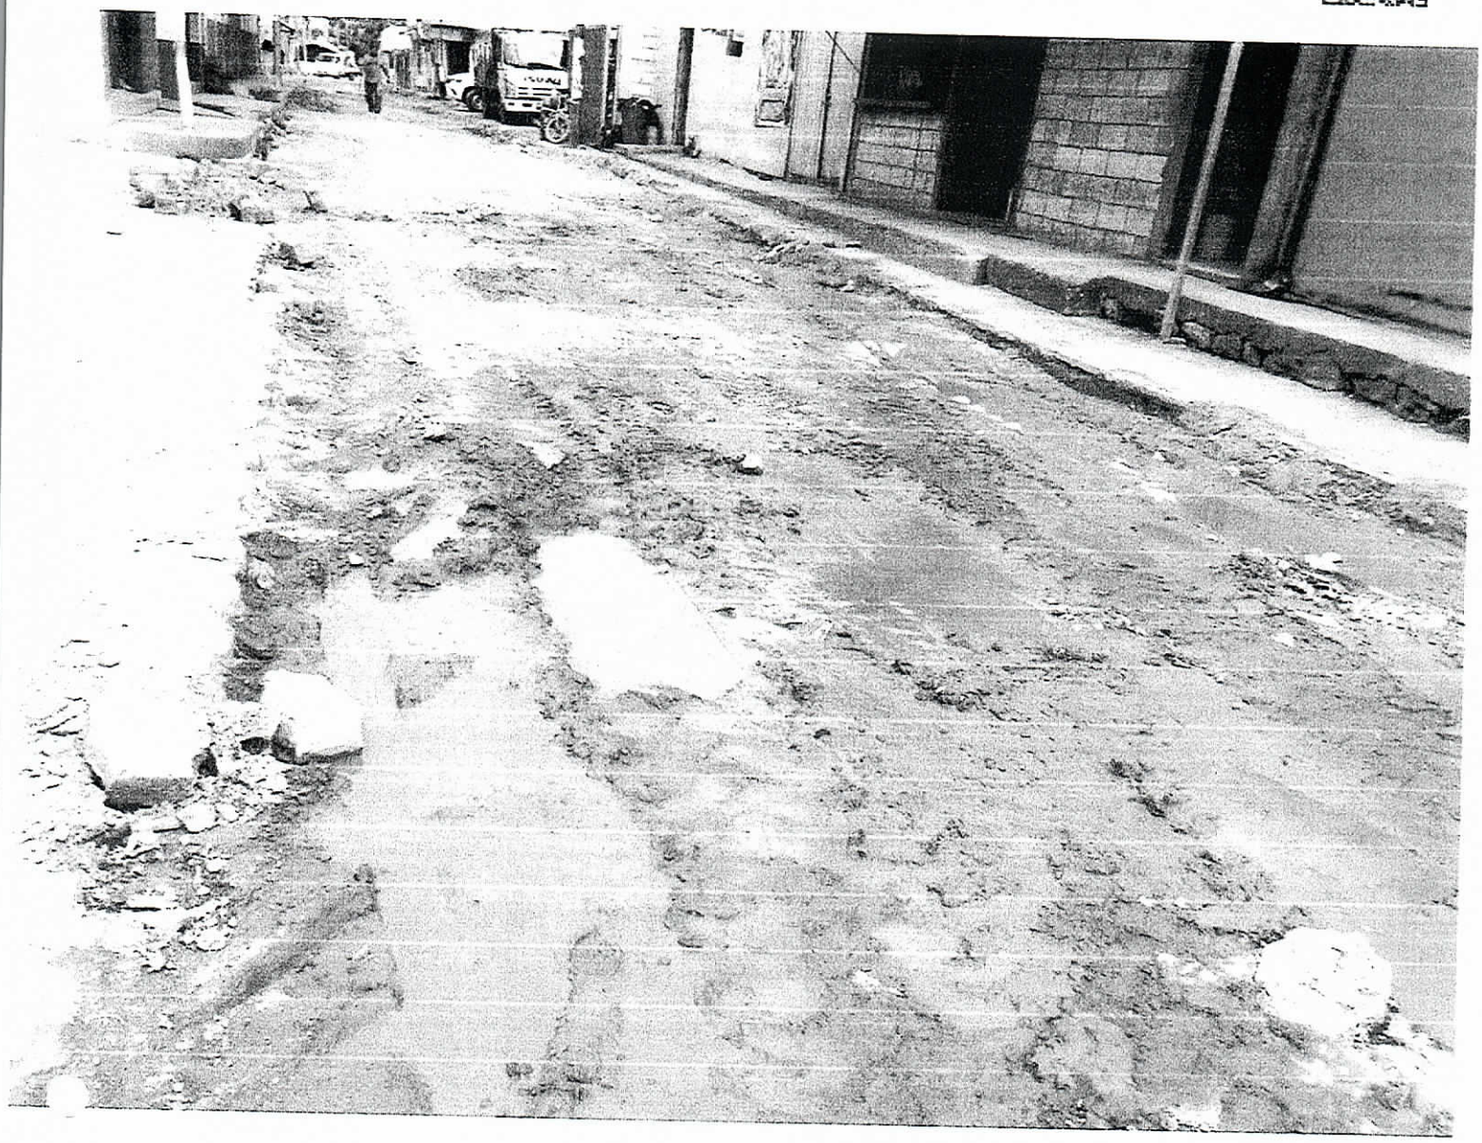

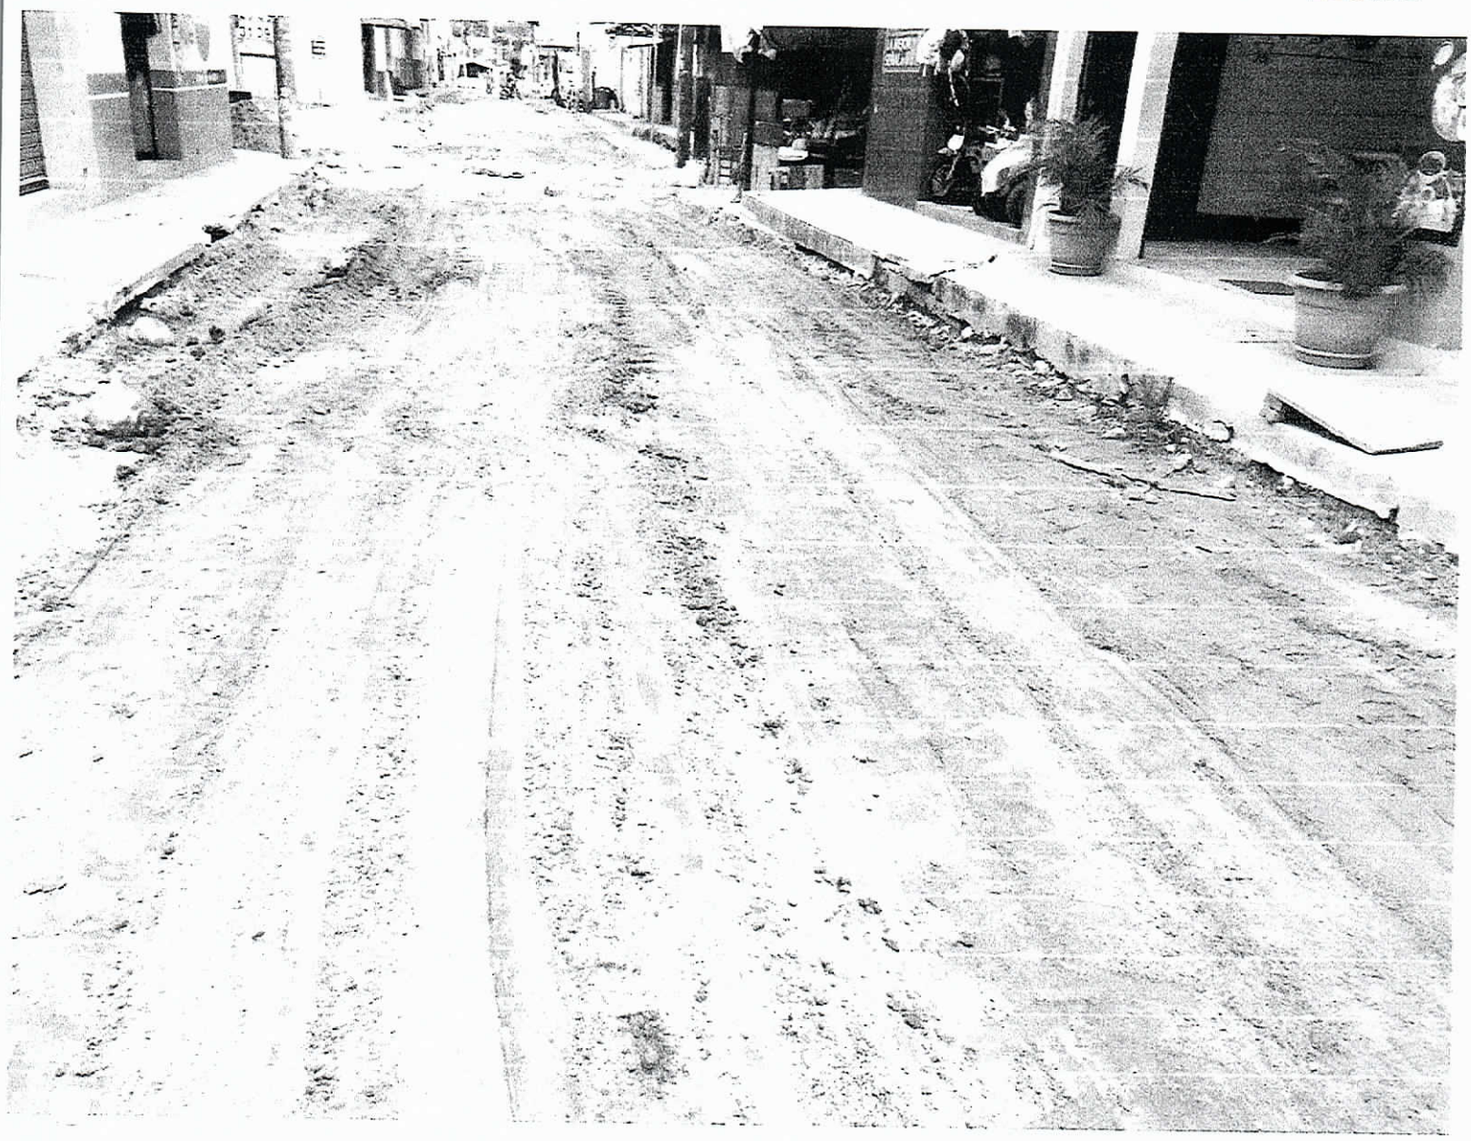




CONSTANZA

BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 5008/09/2025

CONTRATO No. 19-2025


NOMBRE: MEJORAMIENTO CALLE URBANA SECTOR MERCADO VIEJO, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

REGISTRO No.	3
FECHA	15/10/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	Se continua con el corte de cajuela y la colocación de base previo a la fundición de pavimento, se cuenta con personal y materiales suficientes para el avance del proyecto
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA





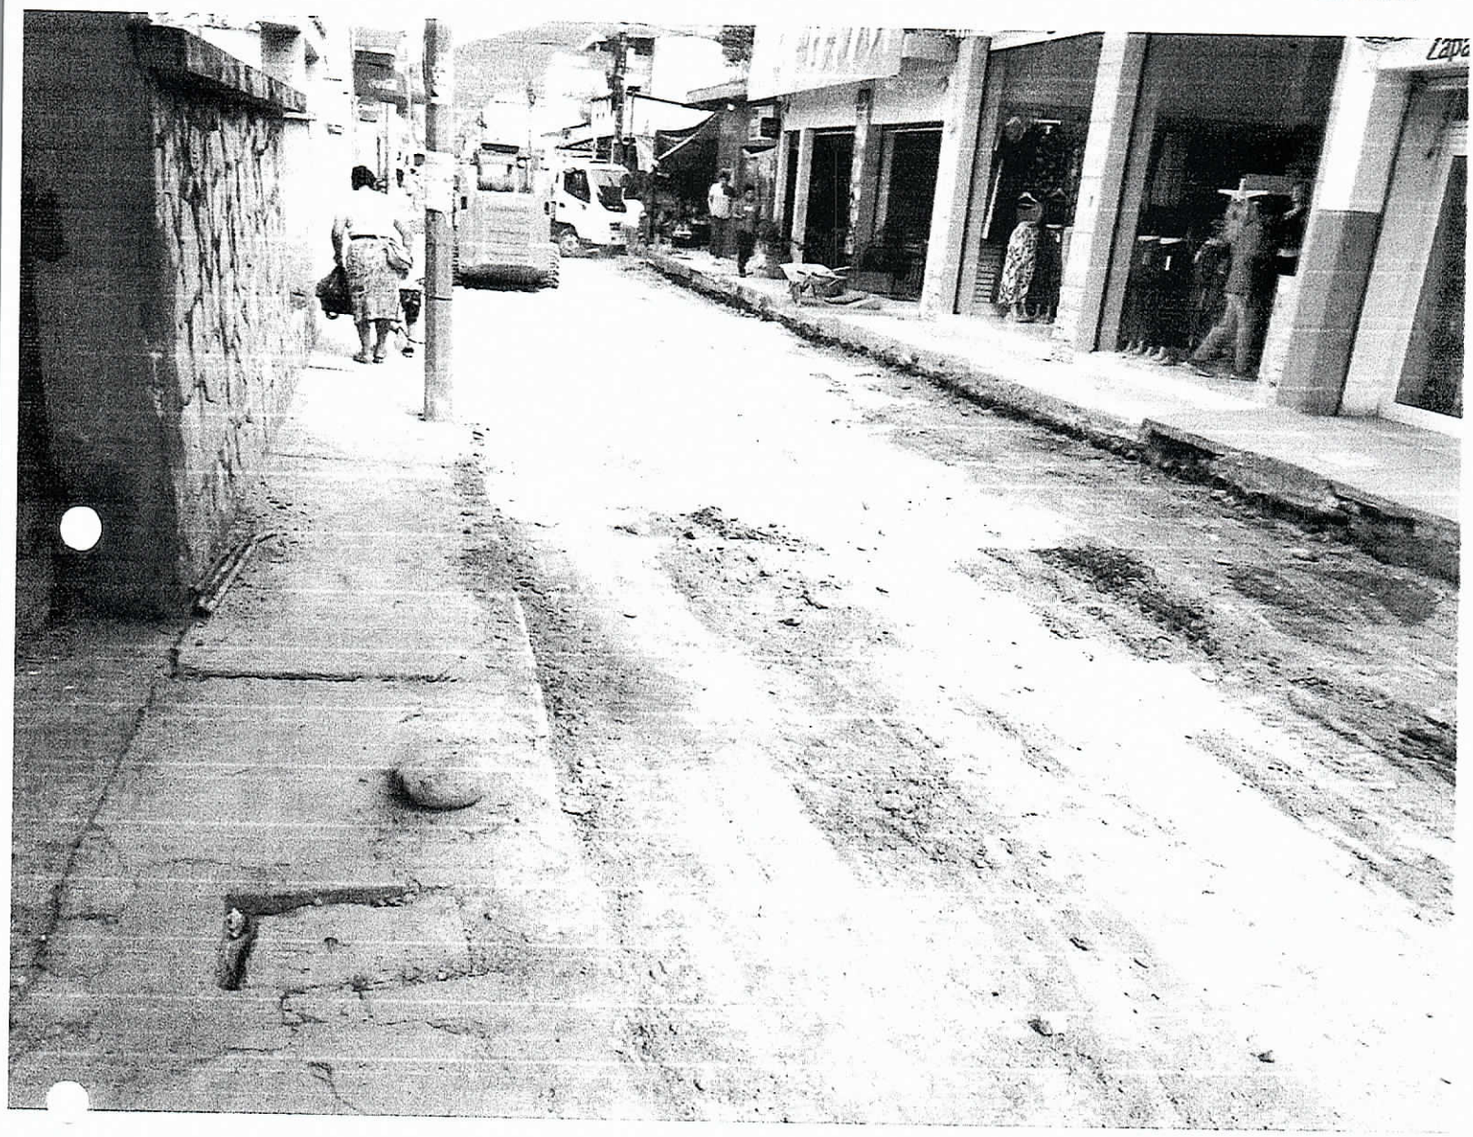



BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 5008/09/2025

CONTRATO No. 19-2025

NOMBRE: MEJORAMIENTO CALLE URBANA SECTOR MERCADO VIEJO, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

REGISTRO No.	4
FECHA	21/10/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	Se realiza la colocación de la base para la fundición de pavimento, se cuenta con personal y materiales suficientes para el avance del proyecto
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA











BITÁCORA ELECTRÓNICA No. 5008/09/2025


CONTRATO No. 19-2025

NOMBRE: MEJORAMIENTO CALLE URBANA SECTOR MERCADO VIEJO, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA


REGISTRO No.	5
FECHA	25/10/2025
TIPO	AVANCE
DESCRIPCIÓN	Se realiza fundición de pavimento, se cuenta con personal y materiales suficientes para el avance del proyecto
CREADO POR	FULGENCIO ALEXÁNDER AGUILAR MEJÍA


GUASTATOYA

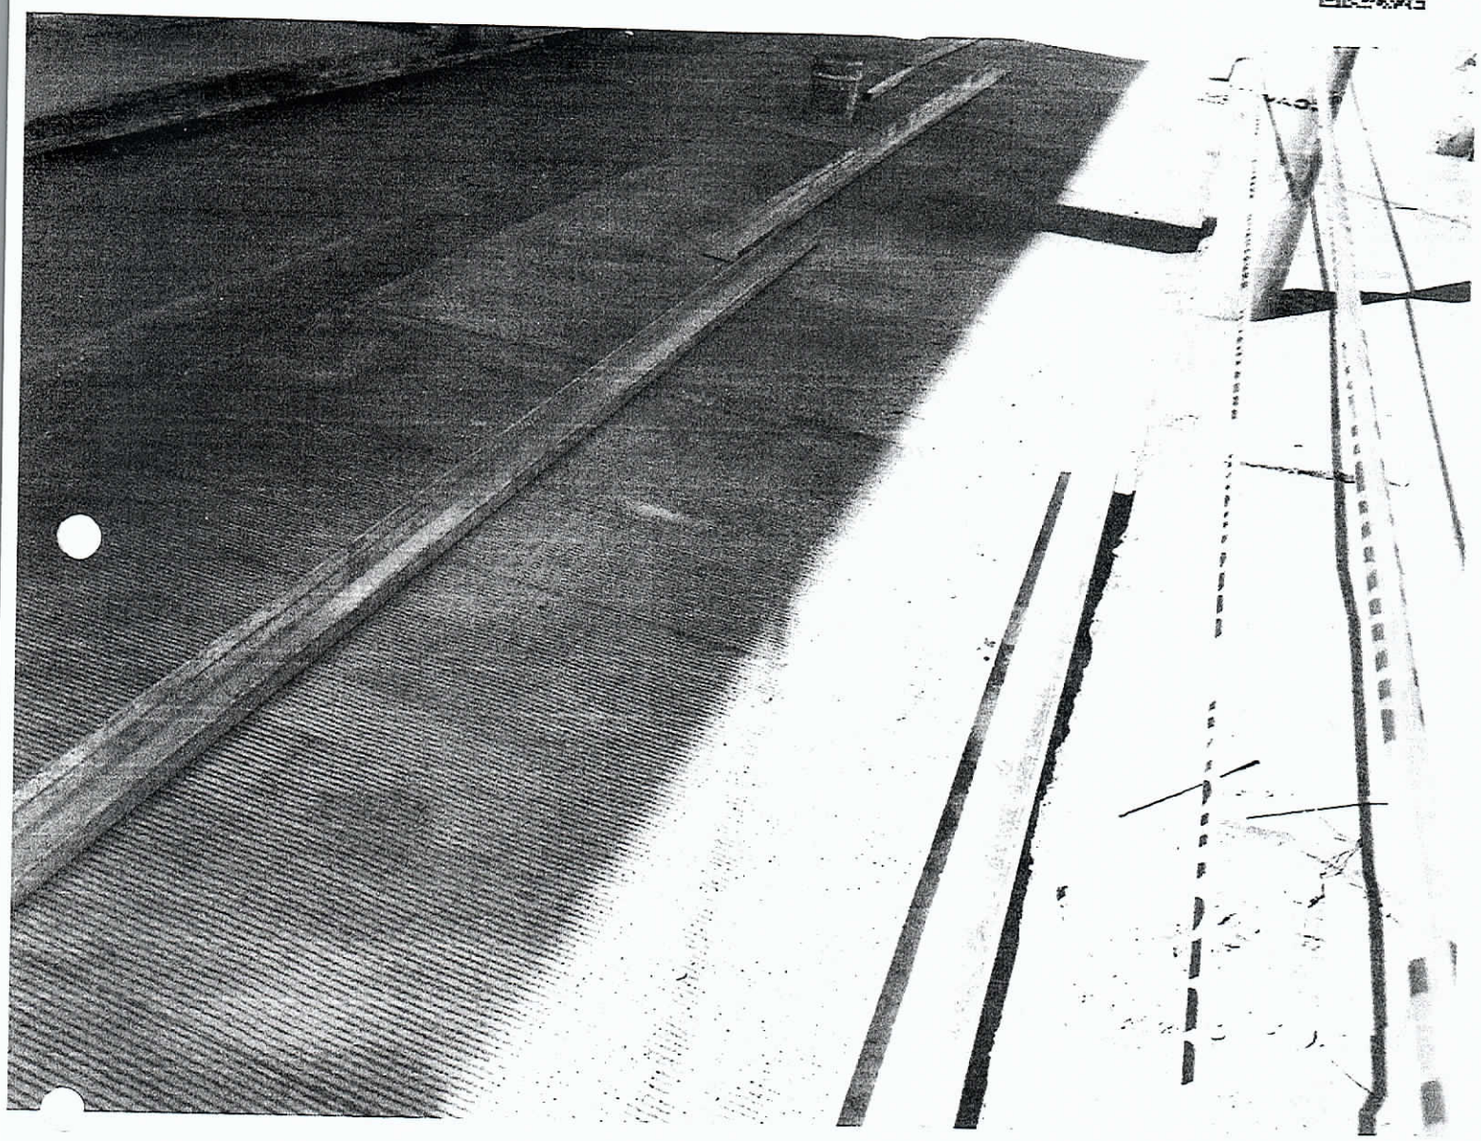


BLESSING

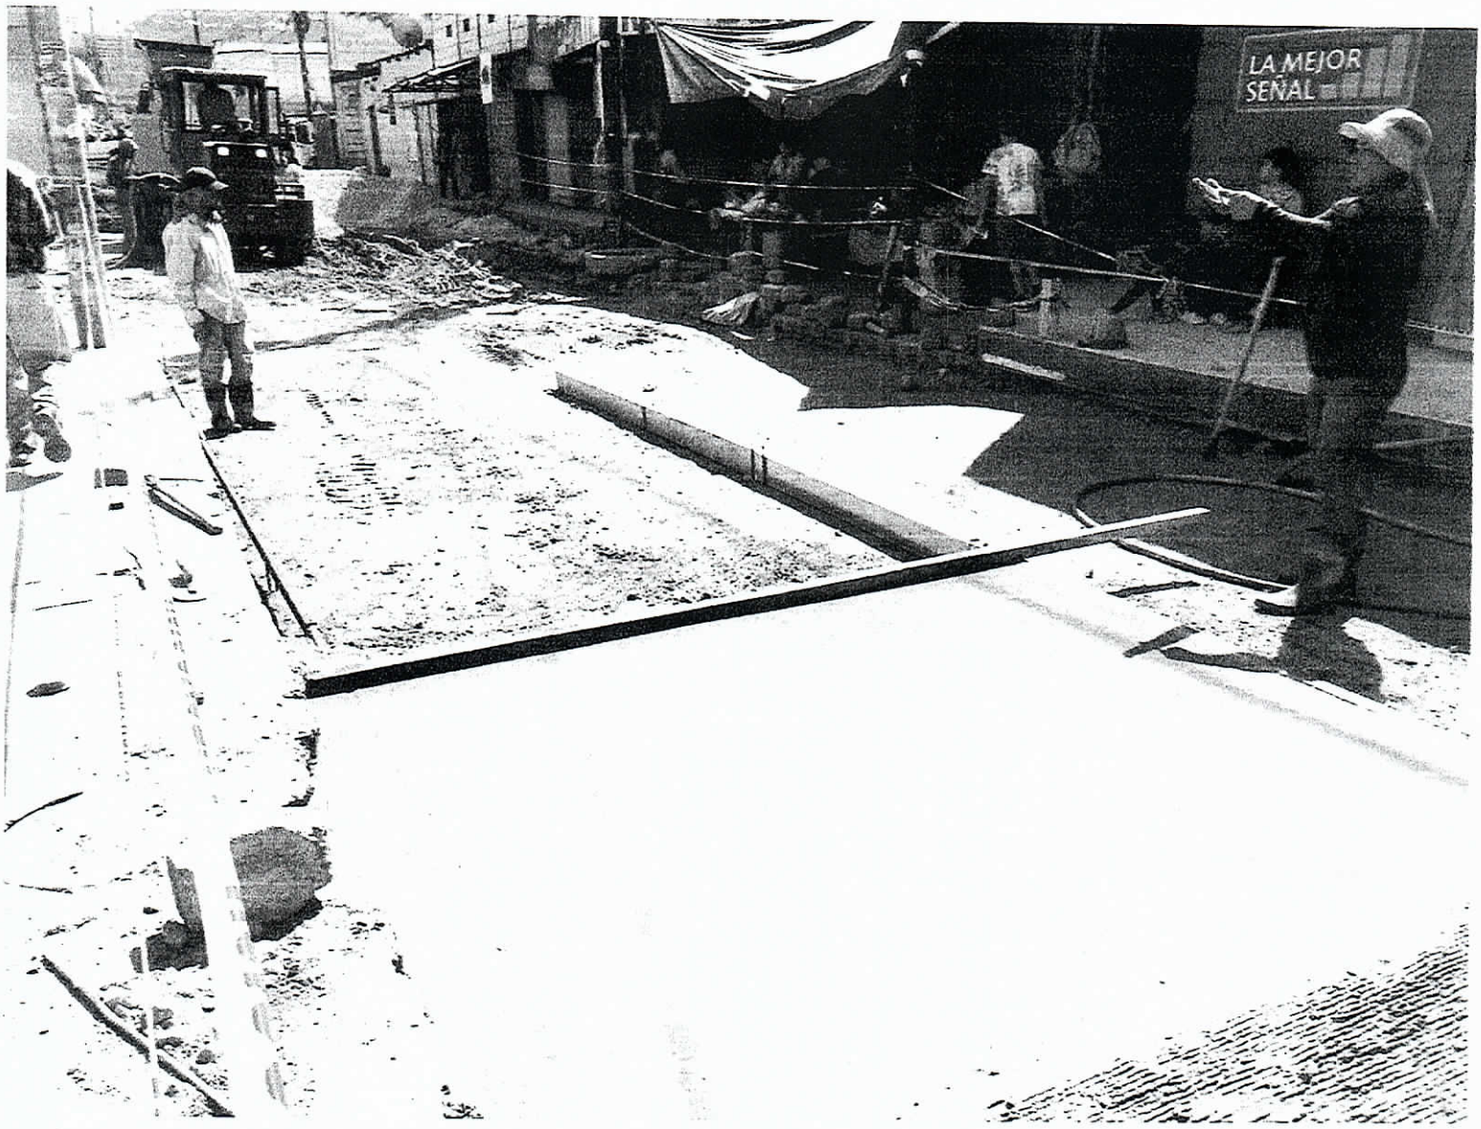


LA MEJOR
SEÑAL

MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA
¡Sirviendo!

5980-0535 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
BARRIO EL CALVARIO, **GUASTATOYA EL PROGRESO**

LA INFRASCRITA SECRETARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO,

CERTIFICA:

Que para su cumplimiento y efectos consiguientes se transcribe la **AUTENTICIDAD** del punto **DÉCIMO SEGUNDO** del acta **84-2025** de fecha catorce de noviembre de dos mil veinticinco del libro número 3,609 de sesiones ordinarias del Concejo Municipal, debidamente autorizado por la Contraloría General de Cuentas, el que copiado literalmente dice:

DÉCIMO SEGUNDO: La Secretaria Municipal informa al Concejo Municipal que, Licenciado Alexis Geovanny Marroquín Orellana, Director de Planificación, presenta oficio Ref.agmo/DMP/461-2025, de fecha 14 de noviembre de 2025, el cual en su parte conducente expone: "El motivo de la presente es para informarle que el proyecto **MEJORAMIENTO CALLE URBANA SECTOR MERCADO VIEJO, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO**. Contrato administrativo número 19-2025 de fecha 20 de agosto de 2025, ejecutado por la empresa **CONSTRUCTORA M&A**, presentó informe del 40% de avance físico. solicito que apruebe el pago del 40% de avance físico del proyecto antes mencionado a la empresa **CONSTRUCTORA M&A** siendo su propietario el señor **CARLOS ALBERTO AMADO ORELLANA**." Consiguientemente y en cumplimiento al numeral 1) de la Cláusula Cuarta del contrato en referencia, presenta el informe de supervisión signado por el ingeniero JOSE FULGENCIO ALEXANDER AGUILAR MEJIA, Supervisor de Obras Municipales, por medio del cual informa de la estimación, del avance físico del referido proyecto, indicando que se encuentra en un avance físico del 40%, anexa el detalle que contiene los renglones de trabajo para la presente estimación. **CONSIDERANDO:** Que el artículo 59 del Decreto número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado, establece: "Estimaciones para pago. La entidad contratante podrá hacer pagos parciales al contratista contra estimaciones periódicas de trabajo ejecutado y aceptado, las que podrán efectuarse mensualmente de acuerdo con las estipulaciones pactadas." **CONSIDERANDO:** Que el Artículo 35 literal a), del Decreto 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Código Municipal y sus reformas establece: Atribuciones Generales del Concejo Municipal "son atribuciones del Concejo Municipal: a) La iniciativa, deliberación y decisión de los asuntos municipales...". **POR TANTO:** El Concejo Municipal, con fundamento en lo considerado y las facultades que le confiere el Código Municipal y sus reformas Decreto 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala, **UNANIMIDAD DE VOTOS. ACUERDA: I)** Se tiene por recibido el oficio presentado, agregándose al expediente de mérito. **II) APROBAR**, el pago equivalente al avance físico del 40%, a favor de la empresa mercantil **CONSTRUCTORA M&A**, propiedad del señor **CARLOS ALBERTO AMADO ORELLANA** de conformidad con el monto de estimación de avance físico, anexa el detalle que contiene los renglones de trabajo para la presente estimación, presentados por el Supervisor de Obras Municipales del proyecto **"MEJORAMIENTO CALLE URBANA SECTOR MERCADO VIEJO, BARRIO EL GOLFO, GUASTATOYA, EL PROGRESO"**, el que se ejecuta con el contrato 19-2025. **III)** Se le ordena al Director de Administración Financiera Integrada Municipal, hacer las operaciones contables correspondientes y proceder al pago de conformidad con lo aprobado en el numeral romano II) del presente punto resolutivo. **IV)** Notifíquese.

(Fs) Ilegibles Hernan Archila Morales, Alcalde Municipal en Funciones, Ing. Byron Fernando Calderón Ferrera y Eduardo Ortega Loaiza, Síndicos Primero y Segundo respectivamente, Erasmo Beltetón Contreras, Nery Rolando Archila Orellana, Julio Mauricio Marroquín González, Fryda Aimée Estrada Ortiz, Concejales Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto, respectivamente y Licda. Evelyn Yaneth Oajaca Marroquín, Secretaria Municipal.

DADO EN EL PALACIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE GUASTATOYA, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, A DIECISIETE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO.

SECRETARIA

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA ¡Sirviendo!

LICDA. EVELYN YANETH OAJACA MARROQUÍN
SECRETARIA MUNICIPAL
