





**CONTRATO DE EJECUCION DE PROYECTOS VEINTISEIS GUION DOS MIL VEINTITRÉS (26-2023)
CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA EL NARANJO, GUASTATOYA, EL
PROGRESO
NOG. 19969775**

En el Municipio de Guastatoya, del departamento de El Progreso, el día **VEINTE (20) DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS (2023)**. **NOSOTROS:** Por una parte comparezco Yo, **JORGE ANTONIO ORELLANA PINTO**, de cincuenta y un años de edad, casado, guatemalteco, Licenciado en Administración de Empresas, domiciliado en el departamento de El Progreso, me identifico con el documento personal de identificación -DPI-, Código Único de Identificación -CUI-, dos mil quinientos setenta espacio cincuenta y tres mil novecientos sesenta y cuatro espacio cero dos cero uno, (2570 53964 0201), extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala; DE LA CALIDAD CON QUE ACTUO. Actúo en calidad de **Alcalde Municipal**, de la ciudad de Guastatoya, del departamento de El Progreso, calidad que acredito, con la certificación del acta de toma de posesión, dos guion dos mil veinte (2-2020), de fecha quince de enero de dos mil veinte, contenida en el libro número dos mil seiscientos cuarenta y siete (2647), de sesiones extraordinarias del Concejo Municipal, debidamente autorizado por la Contraloría General de Cuentas, y el Acuerdo número cero cero uno guión dos mil diecinueve (001-2019), de la Junta Electoral Departamental de El Progreso, con el número de **CUENTADANCIA: Gestión dos mil veintidós guion doscientos guion doscientos uno guion veintidós guion cero cero uno (2022-200-201-22-001)**; y por la otra parte comparezco Yo, **LEONEL AMILCAR CHACON ROSALES**, de treinta y un años de edad, casado, Guatemalteco, Constructor, domiciliado en el departamento de El Progreso, se identifica con el Documento Personal de Identificación -DPI- dos mil noventa espacio cincuenta y cuatro mil trescientos ochenta y siete espacio mil ochocientos cuatro (2090 54387 1804), extendido por el Registro Nacional de las Personas, actúo en calidad de **PROPIETARIO** de la Empresa Mercantil denominada **CONSTRUCTORA CRL9**, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de la República de Guatemala, con Registro 808603, folio 659 del libro 1023 de Empresas Mercantiles, con dirección del propietario Aldea Santa Lucía, Guastatoya, El Progreso, y con el número de identificación tributaria setenta y cuatro millones sesenta y un mil ochocientos uno (74061801); con Registro de actualización del Registro General de Adquisiciones del Estado Expediente 202316707 RGAE-2023, Resolución 202337333 y constancia de inscripción y precalificación como proveedor del Estado, resolución 202337539, constancia con vigencia hasta el 29 de abril de 2024, con el cual hace constar la capacidad económica y las especialidades de la sociedad referida, constancias emitidas por el Registro General de Adquisiciones del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas. Ambos comparecientes manifestamos encontrarnos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles y que las representaciones que acreditamos son suficientes de conformidad con la ley y a nuestro juicio para celebrar el presente contrato, toda la documentación indicada se tiene a la vista y en lo sucesivo simplemente se denominará LA MUNICIPALIDAD y "EL CONSTRUCTOR", sujetándonos a las cláusulas siguientes.

PRIMERA: El Licenciado **JORGE ANTONIO ORELLANA PINTO**, Alcalde Municipal, manifiesto que actúo en representación de la Municipalidad de Guastatoya del departamento de El Progreso, y expongo que de conformidad con el Punto Resolutivo emitido por la Autoridad Superior, contenido en el punto resolutivo de Concejo Municipal, **punto DECIMO TERCERO, del acta 57-2023, de fecha diecisiete de julio de dos mil veintitrés**, del libro 3277, de sesiones ordinarias, debidamente autorizado por la Contraloría General de Cuentas, en la cual la Autoridad Superior aprueba la adjudicación realizada por la Junta de Licitación, para la ejecución del proyecto denominado **CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA EL NARANJO, GUASTATOYA, EL**



¡GUASTATOYA seguirá cambiando!







PROGRESO, de conformidad con las bases técnicas, especificaciones generales y planos presentados. El presente contrato se suscribe con fundamento en los artículos 9, numeral 6) literal b), artículo 47, 49, del a Ley de Contrataciones del Estado y sus Reformas y Artículo 42 del Reglamento de la misma ley, 53 literal I del Decreto 12-2002 Código Municipal y sus reformas; se tienen incorporados al instrumento contractual el proceso establecido en la Ley de Contrataciones del Estado, la oferta presentada por el constructor y la adjudicación correspondiente.

SEGUNDA: El Constructor se compromete a ejecutar para la Municipalidad de Guastatoya, el proyecto denominado **CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA EL NARANJO, GUASTATOYA, EL PROGRESO**, obra que se encuentra en el sector rural, de este municipio el que se ejecutará de conformidad con el presupuesto presentado por la Empresa Constructora.

REGLON	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Limpieza y Demoliciones	807.60	m2	Q25.00	Q20,190.00
Replanteo Topográfico	807.60	m2	Q12.00	Q9,691.20
Corte y Conformación de Plataformas	340.70	m3	Q155.00	Q52,808.50
Relleno y Conformación de Plataformas	79.10	m3	Q171.00	Q13,526.10
Cimiento Corrido 1	189.60	ml	Q369.00	Q69,962.40
Cimiento corrido 2	93.40	ml	Q344.00	Q32,129.60
Columna C3	1.30	ml	Q1,490.00	Q1,937.00
Columna C4	186.90	ml	Q282.00	Q52,705.80
Columna C5	25.40	ml	Q355.00	Q9,017.00
Solera 1	266.60	ml	Q278.00	Q74,114.80
Solera 2	14.50	ml	Q341.00	Q4,944.50
Solera 3	93.40	ml	Q262.00	Q24,470.80
Levantado de Muro con pin de Refuerzo No. 3	40.50	m2	Q421.00	Q17,050.50
Levantado de muros	172.40	m2	Q332.00	Q57,236.80
Bancas en muros	28.00	ml	Q1,185.00	Q33,180.00
Banca de Concreto	7.00	unidad	Q2,528.00	Q17,696.00
Instalaciones de Agua Pluvial de Conjunto	1.00	global	Q58,095.40	Q58,095.40
Instalaciones de Aguas Negras de Conjunto	1.00	global	Q9,833.00	Q9,833.00
Instalaciones de Agua Potable de Conjunto	1.00	global	Q4,444.00	Q4,444.00
Instalaciones Eléctricas de Conjunto	1.00	global	Q15,596.00	Q15,596.00
Piso de Loseta Atermica	198.90	m2	Q355.00	Q70,609.50
Piso de Adoquín Decorativo	380.10	m2	Q229.00	Q87,042.90
Gradas	36.40	m2	Q1,104.00	Q40,185.60
Repello	177.90	m2	Q72.00	Q12,808.80
Fachaleta	177.90	m2	Q218.00	Q38,782.20
Jardinización	103.10	m2	Q245.00	Q25,259.50
Barandal	114.60	ml	Q706.00	Q80,907.60
Zapata Z-1	20.00	unidad	Q1,870.00	Q37,400.00
Columna C-1	20.00	unidad	Q2,969.00	Q59,380.00
Viga V-1	65.00	ml	Q550.00	Q35,750.00





Viga V-2	319.60	ml	Q336.00	Q107,385.60
Modulo de Baños	38.90	m2	Q5,801.00	Q225,658.90
TOTAL				Q1,399,800.00



El tiempo de entrega de la obra es de **OCHO (8) MESES CALENDARIO**, de conformidad con el cronograma de ejecución presentado por el constructor, el plazo referido se computará a partir de la aprobación del contrato a la fecha de aprobación de la liquidación del mismo.

TERCERA: EL CONSTRUCTOR: Por su parte manifiesta que respecto a la ejecución del proyecto reitera que se compromete a lo siguiente: a) entregar totalmente terminada la obra a satisfacción de la Municipalidad de Guastatoya. b) a contratar un Profesional quien será el Supervisor de Proyectos Residente, quien conjuntamente con el Ingeniero Supervisor de la Municipalidad informarán en forma simultánea a la Autoridad Administrativa, al Concejo Municipal y a la Contraloría General de Cuentas de la Nación cuando lo requiera, de los avances físicos del proyecto y las estimaciones de pago, para el efecto deberán presentar las fotocopias de la bitácora del Proyecto, autorizada por la Contraloría General de Cuentas.

CUARTA: El señor Alcalde Municipal en representación de la Municipalidad de Guastatoya, manifiesta que está de acuerdo en las condiciones del constructor, especialmente en lo que respecta al total del proyecto; así como en el tiempo de entregar la obra, ambos de común acuerdo llegaron a establecer la forma de pago de la manera siguiente:

QUINTA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato pactado entre la Municipalidad y la Empresa Mercantil **CONSTRUCTORA CRL9**, asciende a la cantidad de **UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS QUETZALES (Q. 1,399,800.00)**, incluido el impuesto al valor agregado -IVA-, los que se pagarán con fondos de -INVERSION- de conformidad con la constancia de disponibilidad presupuestaria, de conformidad con la estructura presupuestaria 17-001-001-000-001 RENGLON # 332, FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21-0101-0001 y 31-0151-0002. Los pagos se efectuarán de conformidad con el artículo 58 de la Ley de Contrataciones del Estado, de la manera siguiente: a). Un anticipo del veinte por ciento (20%) equivalente a la cantidad de **DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA QUETALES (Q. 279,960.00)**, el que se entregará previo a cumplir con los siguientes requisitos: I). Otorgar a la Municipalidad **PLAN DE INVERSIÓN, FIANZA DE ANTICIPO, FIANZA DE CUMPLIMIENTO**, las cuales garantizarán la correcta aplicación del mismo con fundamento en Artículos 64, 65, 66, de la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas y los artículos 53, 54, 55, 56, 58 Y 59 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y, II). Los **PAGOS SIGUIENTES, se efectuarán de conformidad con las estimaciones de pago de conformidad con el artículo 59 de la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas, en el cual la Municipalidad de Guastatoya, hará los pagos contra las estimaciones periódicas de trabajo ejecutado y aceptado, las que podrán efectuarse mensualmente, trabajos debidamente comprobados, con los informes presentados por el Supervisor del Proyecto Residente juntamente con el Supervisor de Proyectos de la Municipalidad de Guastatoya.** III). El último pago equivalente al 100% de avance físico del proyecto, presentando para el efecto, **GARANTIA DE CONSERVACION DE OBRA, CALIDAD O FUNCIONAMIENTO, FIANZA DE SALDOS DEUDORES, ACTA DE RECEPCIÓN DEL PROYECTO POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD E INFORME FINAL DE LOS SUPERVISORES PROFESIONALES DEL PROYECTO.**

SEXTA: SANCIONES: El constructor se compromete a entregar los trabajos conforme el contrato suscrito. Y en caso de atraso por parte del Constructor en la entrega de los trabajos, se determinará el atraso en la entrega de la obra con base en las fechas de terminación, parciales o total, fijadas en el programa de ejecución convenido, debiendo aplicarse las multas sin perjuicio de la facultad que tiene la entidad contratante para exigir el cumplimiento del contrato para rescindirlo. Para efecto de la multa, se tomará en cuenta solo la parte proporcional del atraso, por lo que su aplicación no debe afectar la parte del cumplimiento parcial. Se sancionará con el pago de una multa que se aplique al contratista entre el uno al cinco por millar del monto de los trabajos, que no se hayan ejecutado o





prestado oportunamente, por cada día de atraso en que incurra el contratista desde la fecha de terminación pactada hasta la total conclusión de los mismos, en ningún caso podrán ser superiores en su conjunto al monto de la garantía de cumplimiento. Asimismo, el Constructor deberá cumplir con los trabajos estipulados en el presente contrato y la Municipalidad no concederá ningún plazo de prórroga a excepción de los siguientes casos: a). si se trata de órdenes de trabajo extra u otros convenios, b). Indicar claramente el plazo improrrogable que se le otorgue al constructor para el trabajo correspondiente y deberá solicitarlo dentro del plazo que indica el Artículo 43, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas.

En relación a lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas, el atraso de la entrega de la obra, por causa imputable al contratista será sancionado del 1 al 5 por millar del monto de las obras que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente, calculando a partir de las fechas pactadas de la entrega parcial o total con respecto a la ejecución convenida con la entidad contratante. Dicha multa solamente se tomará de la parte proporcional del atraso, sin afectar el cumplimiento parcial.


Tasa de cálculo	Días
1o/oo	1 a 20
2o/oo	21 a 30
3o/oo	31 a 60
4o/oo	61 a 120
5o/oo	121 hasta su cumplimiento

La entidad ejecutora será la que emita las sanciones correspondientes.


SEPTIMA: OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR: El constructor se obliga a presentar informes periódicos, cronograma de ejecución de la obra, bitácora de los trabajos de conformidad con el Artículo 37 inciso a). del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, deben de autorizar los libros en la Dirección de Infraestructura Pública de la Contraloría General de Cuentas, así como permitir en cualquier momento que las personas autorizadas por la Municipalidad supervisen las actividades que se desarrollan, asimismo instruirá a su personal para que se le preste la debida colaboración a las personas que supervisan y que son parte de esta Municipalidad, el Constructor deberá de revisar cuidadosamente los documentos contractuales y señalará cualquier omisión o error, contradicción o incongruencia que observe a este respecto, deberá formular la consulta y observación del caso antes de los quince días de ejecutar el proyecto, el constructor previamente a la adquisición de materiales deberá proporcionar a la Municipalidad cuando esto lo requiere muestras de materiales para analizarlos y aprobarlos. El Constructor queda facultado para retirar de la obra a cualquier trabajador que considere incompetente, negligente insubordinado o perjudicial a la buena marcha de dichos trabajos. El constructor deberá de aprobar las herramientas, materiales, mano de obra, transporte y demás elementos necesarios.

El Constructor se obliga al cumplimiento del artículo 82 de la LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, por medio de cual obliga al constructor a colocar y mantener en pleno funcionamiento dispositivos de grabación digital para visualizar en línea el desarrollo integral de las obras a través de internet, para realizar monitoreo y seguimiento que permita a la población observar el avance físico de las mismas.

El Constructor queda obligado a solicitar la publicación en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (GUATECOMPRAS) de la dirección de la página de internet que permita consultar en línea el avance físico de la obra, el cual es obligatorio en proyectos mayores de novecientos mil quetzales (Q. 900,000.00), y deberá de contar con un archivo electrónico que contenga el historial de ejecución de los proyectos, el cual deberá ser actualizado mensualmente.



¡GUASTATOYA seguirá cambiando!





OCTAVA: CLAUSULA RELATIVA AL COHECHO: Yo el Contratista, bajo juramento de Ley, manifiesto que conozco las penas relativas al delito de cohecho así como las disposiciones contenida en el Capítulo III del Título XIII del Decreto 17-73 del Congreso de la República, Código Penal. Adicionalmente, conozco las normas jurídicas que facultan a la Autoridad Superior de la entidad afectada para aplicar las sanciones administrativas que pudieren corresponderme, incluyendo la inhabilitación en el sistema GUATECOMPRAS".

NOVENA: OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD: a) La Municipalidad se obliga a efectuar el pago en tiempo y en formas convenidas, b). Faccionar el acta de inicio y avances físicos y actas de recepción para realizar la liquidación final de los trabajos a ejecutar y prestar la colaboración necesaria para el constructor para realizar los mismos, c). Designar a la persona o Personas que supervisen los trabajos del proyecto citado anteriormente previa inspección final.

DECIMA: OTRAS OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR: a). Se compromete a sostener el precio de la oferta, b). Entregar la obra en el tiempo y lugar indicado, c). Ejecutar la obra con material de buena calidad y garantizados de conformidad con lo que estipula la ley de contrataciones del estado, d). Contratar mano de obra necesaria y suficiente para la realización del proyecto, y se compromete a obtener en este municipio el cual será calificado por el constructor, e). Es responsable por el trabajo ejecutado por las personas que contrate así como de los daños y perjuicios que causen a terceras personas como consecuencia de la realización de la obra contratada. f). De conformidad con el artículo 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, se podrá ampliar el monto del contrato, previo que sean aprobadas las ordenes de cambio, ordenes de trabajo suplementario o acuerdo de trabajo extra, y se suscribirá un contrato adicional de conformidad con el contenido relativo a la Ley de la materia.

DECIMA PRIMERA: FIANZAS: 1. El constructor se obliga a presentar:

1. FIANZA DE SOSTENIMIENTO DE OFERTA no menor del uno por ciento (1%) ni mayor del cinco por ciento (5%) del valor del contrato, que cubrirá el periodo comprendido desde la recepción y apertura de plicas hasta la aprobación de las adjudicaciones, y, en todo caso, tendrá una vigencia de ciento veinte (120) días, como lo establece el artículo 64 de la Ley de Contrataciones.

2. FIANZA DE CUMPLIMIENTO: Como requisito previo para la aprobación del presente contrato de conformidad con el Artículo 65 de la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas, que garantizara el cumplimiento de todas las obligaciones estipuladas en el contrato, el contratista deberá prestar fianza, deposito en efectivo o constituir hipoteca en los porcentajes y condiciones que señale el reglamento. Para el caso de obras, además esta garantía cubrirá las fallas o desperfectos que aparecieren durante la ejecución del contrato, antes que se constituya la garantía de conservación. **Por un valor del diez por ciento (10%) del monto del contrato respectivo.**

La Garantía de Cumplimiento deberá estar vigente, según el caso:

1. Cuando se trate de la adquisición de bienes, suministros y servicios hasta que la entidad interesada extienda la constancia de haber recibido a su entera satisfacción la garantía de calidad o de funcionamiento, o haberse prestado el servicio en su caso;
2. Cuando se trate de construcción de obras, hasta que la entidad interesada extienda la constancia de haber recibido a su satisfacción la garantía de conservación de obra.

Para los casos en que las bases el contrato respectivo, se contemplen recepciones parciales para el cumplimiento del objeto del contrato, se podrá ajustar la garantía de cumplimiento conforme se establezca en dichos instrumentos y siempre que se cuente con la constancia a que se refiere el presente artículo.

3. FIANZA DE ANTICIPO: Previo a recibir cualquier suma por concepto de anticipo, el contratista constituirá garantía mediante fianza o hipoteca por el monto de un cien por ciento (100%) del mismo. La garantía podrá reducirse en la medida que se amortice el valor del anticipo cubriendo siempre el máximo del saldo deudor y estará vigente hasta su total amortización. El reglamento establecerá el procedimiento de reducción y lo concerniente en los casos de rescisión, resolución y terminación de contrato.


4. FIANZA DE CONSERVACION DE LA OBRA O DE LA CALIDAD DE FUNCIONAMIENTO: El contratista responderá por la conservación de la obra, mediante depósito en efectivo, fianza, hipoteca o prenda, a su elección, que cubra el valor de las reparaciones de las fallas o desperfectos que le sean

CONSTRUCTORA





¡GUASTATOYA seguirá cambiando!





imputables y que aparecieren durante el tiempo de responsabilidad de dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha de recepción de la obra. Tratándose de bienes y suministros, deberá otorgarse garantía de calidad y/o funcionamiento, cuando proceda. La garantía de conservación de obra, o de calidad y/o funcionamiento, deberá otorgarse por el equivalente al quince por ciento (15%) del valor original del contrato, como requisito previo para la recepción de la obra, bien o suministro. El vencimiento del tiempo de responsabilidad previsto en el párrafo anterior, no exime al contratista de las responsabilidades por destrucción o deterioro de la obra debido a dolo o culpa de su parte, por el plazo de cinco (5) años, a partir de la recepción definitiva de la obra.



Garantía de Conservación de obra, calidad o funcionamiento. El contratista dentro de los veinte (20) días calendario previo a la finalización de la vigencia de la garantía de cumplimiento de contrato, deberá presentar la garantía de conservación de obra, calidad o funcionamiento, según corresponde de conformidad con lo siguiente:

- Para el caso de obras, la garantía de conservación de obras.
- Para el caso de maquinaria, medios de transporte, equipos instalados u otros equipos cuyo funcionamiento deba garantizarse por el contratista en el tiempo que determina La Ley o el contrato, la garantía de funcionamiento.
- Para el caso de bienes que no se incluyen en los indicados en la literal anterior, corresponderá a la entidad contratante determinar la procedencia de la presentación de la garantía de calidad.

Para las adquisiciones de suministros e insumos consumibles que por su naturaleza sean de alta rotación y a los servicios, no les será aplicable la presentación de la garantía de calidad o funcionamiento, en virtud de su fungibilidad y la intangibilidad de determinados servicios; debiendo en todo caso, sujetar su plazo en el contrato respectivo, siendo responsabilidad de la entidad contratante establecer en las bases y en el contrato, los medios u otras garantías que aseguren el cumplimiento del contratista respecto al objeto del contrato.

5. FIANZA DE SALDOS DEUDORES Para garantizar el pago de saldos deudores que pudieran resultar a favor del Estado, de la entidad correspondiente o de terceros en la liquidación, el contratista deberá prestar fianza, depósito en efectivo; constituir hipoteca o prenda, a su elección, por el cinco por ciento (5%) del valor original del contrato. Esta garantía deberá otorgarse simultáneamente con la de conservación de obra como requisito previo para la recepción de la obra, bien o suministro. Aprobada la liquidación, si no hubiere saldos deudores, se cancelará esta garantía.

Las fianzas descritas en el presente contrato, deberán formalizarse mediante póliza emitida por instituciones autorizadas para operar en Guatemala, de conformidad con las siguientes disposiciones: La vigencia de las fianzas será exactamente igual al plazo contractual y deberá ajustarse ante cualquier ampliación o variación del contrato, manteniendo las condiciones de cobertura que aplicaron al contrato original. Lo anterior no es aplicable a las fianzas de conservación de obra, de calidad, de funcionamiento o de saldos deudores. a) Las fianzas garantizarán exacta y fielmente las obligaciones a cargo del contratista o proveedor. Estas obligaciones deben estar estipuladas en el contrato original y en cada una de las modificaciones documentadas. b) El funcionario que corresponda será responsable de exigir la actualización de las fianzas otorgadas por el contratista o proveedor. De omitirlo, el funcionario incurrirá en incumplimiento de deberes. c) El contratista o proveedor que omita actualizar la fianza otorgada ante modificaciones del contrato original, se hará acreedor a una multa y a la suspensión inmediata de los pagos a que tenga derecho. d) Cuando la garantía consistiere en depósitos, deberá hacerse en Quetzales o por medio de cheque certificado. Cuando la garantía sea hipotecaria o prendaria, se formalizará a través de escritura pública debidamente registrada. En todo caso, quedará a criterio del contratista o proveedor la garantía a proporcionar. Las fianzas deberán publicarse en el sistema GUATECOMPRAS. Las juntas a las que se refiere el artículo 10 de esta Ley, serán responsables de verificar la autenticidad de las fianzas de sostenimiento de oferta, y las autoridades suscriptoras de los contratos serán responsables de verificar la autenticidad de las demás fianzas a las que se refiere este capítulo. El sistema GUATECOMPRAS llevará un registro de las fianzas presentadas, así como de las solicitudes de ejecución, ejecución de fianzas y pago de las mismas. Con fundamento en el artículo 69 de la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas





DECIMA SEGUNDA: FORMA DE EFECTUAR LOS TRABAJOS DEL CONSTRUCTOR: El constructor efectuará los trabajos bajo estricta responsabilidad bajo la supervisión de un Profesional del Ramo, colegiado activo de quién deberá presentar la certificación o constancia correspondiente; asimismo incluirá los materiales, mano de obra, equipo y demás elementos necesarios para la correcta aplicación y ejecución del proyecto, mismas que se estarán supervisando por el Ingeniero Supervisor de Obras Municipales, quien cuenta con el aval y aprobación de la Corporación Municipal, así como de la comisión de recepción de la citada obra. El Constructor se compromete a dejar limpias las áreas donde se ejecute el proyecto.

DECIMA TERCERA: CONTROVERSIAS: Toda controversia que pudiera surgir entre los contrayentes en lo que se refiere a la interpretación cumplimiento, aplicación y ejecución de este contrato será resuelto en el menor tiempo posible en forma conciliatoria entre ambas partes y en última instancia de no ponerse de acuerdo en el Tribunal correspondiente de lo contencioso administrativo de conformidad con el Artículo 102 de la citada ley; asimismo que se acepta los procedimientos señalados en el Código Procesal Civil y Mercantil, renunciando el constructor al fuero de su domicilio y señalando como lugar para recibir notificaciones y citaciones BARRIO EL CALVARIO, GUASTATOYA, EL PROGRESO.

DECIMA CUARTA: TERMINACION DEL CONTRATO: La Municipalidad puede dar por terminado, resuelto y/o rescindido el presente contrato en forma unilateral y sin responsabilidad de su parte en los siguientes casos: a). Por vencimiento del plazo pactado, siempre que no haya ocurrido prórroga, b). Si el constructor incumple con sus obligaciones, c). Si paraliza sin causa justificada los trabajos por más de diez días consecutivos, d). Por rescisión de mutuo acuerdo, e). Si el constructor le fueren embargado bienes y que evidentemente afecten el cumplimiento del contrato.

DECIMA QUINTA: PROHIBICIONES: EL CONSTRUCTOR: declara bajo juramento de ley y bien enterados de las penas relativas al delito de perjurio que no se encuentra comprendido dentro de las limitaciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Y que, si en el transcurso del proceso de adquisición o en la ejecución de un contrato se presenta alguna de las prohibiciones definidas en el artículo 80 de la Ley, el contratista o proveedor deberá hacerlo de conocimiento de la autoridad competente dentro de los dos días siguientes al conocimiento del acaecimiento de la prohibición, para que ésta analice la situación planteada y resuelva sobre el proceso del contrato.


La falta de aviso sobre el acaecimiento de alguna de las prohibiciones definida en la Ley, será causal suficiente para la inhabilitación del contratista o proveedor, quien de conformidad con la ley será responsable de compensar a la entidad contratante por los daños y perjuicios ocasionados.

El trámite de la inhabilitación y de la rehabilitación es responsabilidad de la entidad contratante o ejecutora, quien deberá cumplir con el procedimiento, plazos y condiciones que definan las Normas de Uso del Sistema GUATECOMPRAS y, en todo caso, debe respetarse el derecho de defensa.

La inhabilitación y la rehabilitación en el Sistema GUATECOMPRAS implica la correspondiente inhabilitación o rehabilitación en el Registro General de Adquisiciones del Estado.

DECIMA SEXTA: INSPECCION, RECEPCION Y LIQUIDACION FINAL: 1. El constructor deberá de permitir en cualquier momento que las personas autorizadas por la Municipalidad Inspeccionen las instalaciones, actividades y trabajos que realicen e instruirá a su personal para que atiendan a las personas nombradas proporcionándoles toda información requerida. 2. La Municipalidad nombrará una comisión receptora de los trabajos y harán la inspección correspondiente ante la presencia del constructor su representante legal y posteriormente informarán al Concejo Municipal si se puede faccionar el acta de recepción respectiva para que la Dirección de Administración Financiera efectúe la liquidación final o en su defecto si hay que corregir algunos trabajos o complementar otros, en este último caso deberá indicar cuales son los trabajos a efectuar y el tiempo a emplear y si el plazo es necesario se incluye dentro del tiempo contractual o le concede o no algún tiempo adicional.

DECIMA SEPTIMA: APROBACION: Para que el presente contrato surta sus efectos legales y obligue a las partes al cumplimiento de las cláusulas contenidas deberá ser aprobado de conformidad con el artículo 42 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas.





DECIMA OCTAVA: ACEPTACION DEL CONTRATO: En todos los términos y condiciones estipuladas LA MUNICIPALIDAD Y EL CONSTRUCTOR aceptan para si el presente contrato el que se encuentra contenido en ocho (8), hojas membretadas impresas de un solo lado, leemos íntegramente lo escrito y bien enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo aceptamos, ratificamos y firmamos. Damos Fe.

LIC. JORGE ANTONIO ORELLANA PINTO
ALCALDE MUNICIPAL




ALCALDE




LEONEL AMILCAR CHACON ROSALES
PROPIETARIO CONSTRUCTORA CRL9



8



¡GUASTATOYA seguirá cambiando!





Municipalidad de GUASTATOYA

Departamento de El Progreso, Guatemala, C.A.

info@muniguasta.com

www.muniguastatoya.com

Telefax: 7945-1594, 7945-1602, 7945-1603



Guastatoya, jueves, 21 de diciembre de 2023

SEÑOR(es):

ALCALDE MUNICIPAL Y
HONORABLE CORPORACION
GUASTATOYA, EL PROGRESO

Respetables señor(es):

El motivo del presente es para informar los resultados de la siguiente estimacion de pago:

No. De Supervision de Avance Físico:	ESTIMACION No.3		
Nombre del Proyecto:	CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA EL NARANJO, GUASTATOYA, EL PROGRESO.		
No. De Contrato del Proyecto:	26-2023	Fecha del Contrato:	20/07/2023
NOG.	19969775		
Estimacion del Avance Físico:	95.0000000%		
Monto de Estimacion del Avance Físico:	Q303,791.35	en letras:	TRESCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN QUETZALES CON 35/100 CENTAVOS
Amorización del Anticipo:	Q60,758.27	en letras:	SESENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO QUETZALES CON 27/100 CENTAVOS
Cantidad Líquida a Recibir:	Q243,033.08	en letras:	DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TREINTA Y TRES QUETZALES CON 08/100 CENTAVOS

Se adjunta anexo que contiene el detalle de la presente estimacion para que se continúe con lo procedente.

Agradeciendo desde ya, me suscribo.

Atentamente,


ING. CARLOS RAMIRO ORTEGA LIMA
COLEGIADO: 7118

SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

Carlos Ramiro Ortega Lima
Ingeniero Civil
Col. 7118

[illegible]

Emilee May



Municipalidad de GUASTATOYA

Departamento de El Progreso, Guatemala, C.A.

info@muniguasta.com

www.muniguastatoya.com

Telefax: 7945-1594, 7945-1602, 7945-1603



Guastatoya, jueves, 21 de diciembre de 2023

SEÑOR(es):

ALCALDE MUNICIPAL Y
HONORABLE CORPORACION
GUASTATOYA, EL PROGRESO

Respetables señor(es):

Respetuosamente me dirijo a usted, con el proposito de REMITIR el INFORME
DE SUPERVISION que acontinuacion se describe:

Nombre del Proyecto:	CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA EL NARANJO, GUASTATOYA, EL PROGRESO.		
No. De Contrato del Proyecto:	26-2023	Fecha del Contrato:	20/07/2023
NOG.	19969775		
Empres constructura:	CONSTRUCTORA CRL9		

Se realizo la visita al proyecto antes en mencion para hacer constar los avances de los renglones contratados en su avance fisico notificado por la empresa Constructora los cuales se describen a continuacion:

82 m2 DE Piso de loseta atermica

GUASTATOYA esta cambiando



Municipalidad de GUASTATOYA

Departamento de El Progreso, Guatemala, C.A.

info@muniguasta.com

www.muniguastatoya.com

Telefax: 7945-1594, 7945-1602, 7945-1603



301.5832 m2 DE Piso de adoquin decorativo

110 ml DE Barandal

7.34 m2 DE Modulo de baños

3 Unidad DE Poste con lampara tipo farol

TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR

208.42 m2 DE Piso de adoquin decorativo

24.59 m2 DE Jardinizacion

23 ml DE Barandal

Estimacion del Avance Fisico:	95.0000000%
-------------------------------	-------------

Se adjunta anexo que contiene el detalle de la presente estimacion para que se continúe con lo procedente.

Agradeciendo desde ya, me suscribo.

Atentamente,

ING. CARLOS RAMIRO ORTEGA LIMA

COLEGIADO: 7118

SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

Carlos Ramiro Ortega Lima
Ingeniero Civil
Col. 7118

GUASTATOYA esta cambiando



Municipalidad de GUASTATOYA

Departamento de El Progreso, Guatemala, C.A.

info@muniguasta.com






www.muniguastatoya.com

Telefax: 7945-1594, 7945-1602, 7945-1603



INFORME
FOTOGRAFICO

CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO
ALDEA EL NARANJO, GUASTATOYA, EL PROGRESO.

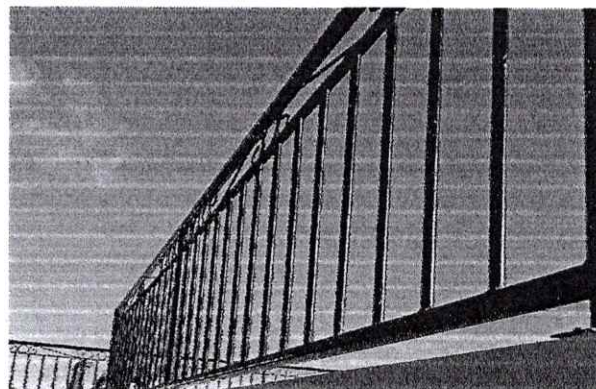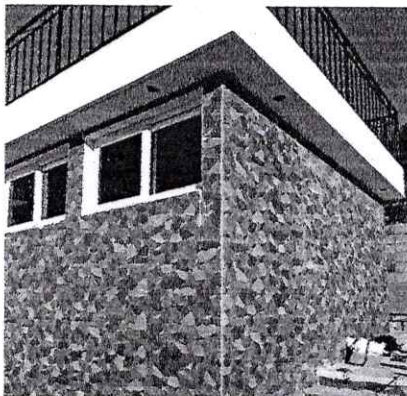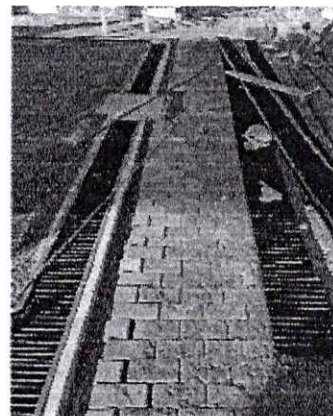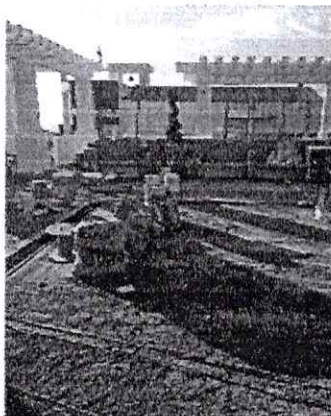

GUASTATOYA esta cambiando

Guastatoya 27 de Diciembre del 2023

Señor
Jorge Antonio Orellana Pinto
Alcalde Municipal
Guastatoya El Progreso.

Señor Alcalde:

Es un gusto poder saludarle, deseándole éxitos al frente de sus importantes labores edilicias. El motivo de la presente es para informar que con base al artículo 59 del Decreto Numero 57-92 "Ley de Contrataciones del Estado". Solicitamos el respectivo avance físico para el proyecto denominado: **CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA EL NARANJO, GUASTATOYA, EL PROGRESO.**

Como empresa estimamos los avances en la ejecución de la obra en Un 100.00%

Agradeciendo de antemano su atención a esta solicitud, me suscribo de usted, muy atentamente,



Leonel Amilcar Chacon Rosales
Propietario
Constructora CRL 9

ESTIMACION DE TRABAJO No. 04-2023																			
NOMBRE DEL PROYECTO:				CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA EL NARANJO, GUASTATOYA, EL PROGRESO.															
UBICACIÓN:				COORDENADAS															
ALDEA EL NARANJO																			
REPRESENTANTE LEGAL EMPRESA CONSTRUCTORA:				LEONEL AMILCAR CHACON ROSALES		NUMERO DE TELEFONO EMPRESA CONSTRUCTORA: 321-2616													
NOMBRE DEL PROFESIONAL RESIDENTE EMPRESA CONSTRUCTORA:				LUIS LEONEL URIZAR MUÑOZ Colegiado: 4001		NUMERO DE TELEFONO INGENIERO RESIDENTE: 4219-0440													
No.	DESCRIPCION DEL RENDION DE TRABAJO	COSTO FINANCIERO																	
		Cantidad Contratada						Cantidad Ejecutada											
		Unidad	Cantidad Contratada	Orden de Cambio	Orden de Trabajo Sup	Acuerdo Trabajo Extra	Cantidad Actual	Precio Unitario Q.	Costo Total Estimado	Ete Período	Acumulado Anterior	Total a la fecha	%						
1	LIMPIEZA Y DEMOLICIONES	M2	807.60	57.60			750.00	Q 25.00	Q 18,750.00	0.00	750.00	750.00	100.00%	Q -	Q 18,750.00	Q 18,750.00	100.00%	Q -	0.00%
2	REFRANTE TOPOGRAFICO	M2	807.60	57.60			750.00	Q 12.00	Q 9,000.00	0.00	750.00	750.00	100.00%	Q -	Q 9,000.00	Q 9,000.00	100.00%	Q -	0.00%
3	CORTE Y CONFORMACION DE PLATAFORMAS	M3	340.70		162.20		502.90	Q 155.00	Q 77,949.50	0.00	502.90	502.90	100.00%	Q -	Q 77,949.50	Q 77,949.50	100.00%	Q -	0.00%
4	RELLENO Y CONFORMACION DE PLATAFORMAS	M3	79.10		57.40		136.50	Q 171.00	Q 23,341.50	0.00	136.50	136.50	100.00%	Q -	Q 23,341.50	Q 23,341.50	100.00%	Q -	0.00%
5	CIMIENTO CORRIDO 1	ML	189.60	41.60			148.00	Q 369.00	Q 54,612.00	0.00	148.00	148.00	100.00%	Q -	Q 54,612.00	Q 54,612.00	100.00%	Q -	0.00%
6	CIMIENTO CORRIDO 2	ML	93.40	81.40			12.00	Q 344.00	Q 4,128.00	0.00	12.00	12.00	100.00%	Q -	Q 4,128.00	Q 4,128.00	100.00%	Q -	0.00%
7	COLUMNA C3	ML	1.30	1.30			0.00	Q 1,490.00	Q -	0.00	0.00	0.00	0.00%	Q -	Q -	Q -	0.00%	Q -	0.00%
8	COLUMNA C4	ML	186.90	54.50			132.40	Q 282.00	Q 37,336.80	0.00	132.40	132.40	100.00%	Q -	Q 37,336.80	Q 37,336.80	100.00%	Q -	0.00%
9	COLUMNA C5	ML	25.40		4.40		29.80	Q 355.00	Q 10,579.00	0.00	29.80	29.80	100.00%	Q -	Q 10,579.00	Q 10,579.00	100.00%	Q -	0.00%
10	SOLETA 1	ML	266.60	69.40			197.20	Q 278.00	Q 54,821.60	0.00	197.20	197.20	100.00%	Q -	Q 54,821.60	Q 54,821.60	100.00%	Q -	0.00%
11	SOLETA 2	ML	14.50	14.50			0.00	Q 341.00	Q -	0.00	0.00	0.00	0.00%	Q -	Q -	Q -	0.00%	Q -	0.00%
12	SOLETA 3	ML	93.40	73.00			20.40	Q 262.00	Q 5,344.80	0.00	20.40	20.40	100.00%	Q -	Q 5,344.80	Q 5,344.80	100.00%	Q -	0.00%
13	LEVANTADO DE MURO CON PIN DE REFUEZO DE No. 3	M2	40.50	28.26			12.24	Q 421.00	Q 5,153.04	0.00	1,224.00	1,224.00	100.00%	Q -	Q 5,153,04.00	Q 5,153,04.00	100.00%	Q -	0.00%
14	LEVANTADO DE MURO	M2	172.40	42.92			129.48	Q 332.00	Q 42,987.36	0.00	129.48	129.48	100.00%	Q -	Q 42,987.36	Q 42,987.36	100.00%	Q -	0.00%
15	BANCA EN MUROS	ML	28.00	8.00			20.00	Q 1,185.00	Q 23,700.00	0.00	20.00	20.00	100.00%	Q -	Q 23,700.00	Q 23,700.00	100.00%	Q -	0.00%
16	BANCA DE CONCRETO	UNIDAD	7.00		1.00		8.00	Q 2,528.00	Q 20,224.00	0.00	8.00	8.00	100.00%	Q -	Q 20,224.00	Q 20,224.00	100.00%	Q -	0.00%
17	INSTALACIONES DE AGUA PLUVIAL DE CONJUNTO	GLOBAL	1.00				1.00	Q 58,095.40	Q 58,095.40	0.00	1.00	1.00	100.00%	Q -	Q 58,095.40	Q 58,095.40	100.00%	Q -	0.00%
18	INSTALACIONES DE AGUAS NEGRAS DE CONJUNTO	GLOBAL	1.00				1.00	Q 9,833.00	Q 9,833.00	0.00	1.00	1.00	100.00%	Q -	Q 9,833.00	Q 9,833.00	100.00%	Q -	0.00%




1 Av. 6-32 Zona 6, Colonia Santa Marta, Mixco, Guatemala.
Prop. Leonel Amilcar Chacon Rosales

19	INSTALACIONES DE AGUA POTABLE DE CONJUNTO	GLOBAL	1.00					1.00	Q	4,444.00	Q	4,444.00	0.00	1.00	1.00	100.00%	Q	-	Q	4,444.00	Q	4,444.00	100.00%	Q	-	0.00%
20	INSTALACION ELECTRICA DE CONJUNTO	GLOBAL	1.00					1.00	Q	15,596.00	Q	15,596.00	0.00	1.00	1.00	100.00%	Q	-	Q	15,596.00	Q	15,596.00	100.00%	Q	-	0.00%
21	PISO LOSETA ATERMICA	M2	198.90	116.90				82.00	Q	355.00	Q	29110.00	0.00	82.00	82.00	100.00%	Q	-	Q	29110.00	Q	29110.00	100.00%	Q	-	0.00%
22	PISO DE ADOQUIN DECORATIVO	M2	380.10		129.90			510.00	Q	229.00	Q	116,790.00	208.4168	301.5832	510.00	100.00%	Q	47,727.45	Q	69,062.55	Q	116,790.00	100.00%	Q	-	0.00%
23	GRADAS	M2	36.40		13.55			22.85	Q	1,104.00	Q	25,226.40	0.00	22.85	22.85	100.00%	Q	-	Q	25,226.40	Q	25,226.40	100.00%	Q	-	0.00%
24	REFELLO	M2	177.90			185.81		363.71	Q	72.00	Q	26,187.12	0.00	363.71	363.71	100.00%	Q	-	Q	26,187.12	Q	26,187.12	100.00%	Q	-	0.00%
25	FACHALETA	M2	177.90					177.90	Q	218.00	Q	38,782.20	0.00	177.90	177.90	100.00%	Q	-	Q	38,782.20	Q	38,782.20	100.00%	Q	-	0.00%
26	JARDINIZACION	M2	103.10		78.51			24.59	Q	245.00	Q	6,024.55	24.59	0.00	24.59	100.00%	Q	6,024.55	Q	-	Q	6,024.55	100.00%	Q	-	0.00%
27	BARANDAL	ML	114.60			18.40		133.00	Q	706.00	Q	93,898.00	23.00	110.00	133.00	100.00%	Q	16,238.00	Q	77,660.00	Q	93,898.00	100.00%	Q	-	0.00%
28	ZAPATA L-1	UNIDAD	20.00					20.00	Q	1,870.00	Q	37,400.00	0.00	20.00	20.00	100.00%	Q	-	Q	37,400.00	Q	37,400.00	100.00%	Q	-	0.00%
29	COLUMNA C-1	UNIDAD	20.00					20.00	Q	2,969.00	Q	59,380.00	0.00	20.00	20.00	100.00%	Q	-	Q	59,380.00	Q	59,380.00	100.00%	Q	-	0.00%
30	VIGA V-1	ML	65.00			2.52		67.52	Q	550.00	Q	37,136.00	0.00	67.52	67.52	100.00%	Q	-	Q	37,136.00	Q	37,136.00	100.00%	Q	-	0.00%
31	VIGA V-2	ML	319.60		8.45			311.15	Q	336.00	Q	104,546.40	0.00	311.15	311.15	100.00%	Q	-	Q	104,546.40	Q	104,546.40	100.00%	Q	-	0.00%
32	MODULO DE BAÑOS	M2	38.90					38.90	Q	5,801.00	Q	225,658.90	0.00	38.90	38.90	100.00%	Q	-	Q	225,658.90	Q	225,658.90	100.00%	Q	-	0.00%
ACUERDO DE TRABAJO EXTRA																										
33	FAROL COLONIAL PARA EXTERIOR	UNIDAD					34.00	34.00	Q	1,128.97	Q	38,384.98	0.00	34.00	34.00	100.00%	Q	-	Q	38,384.98	Q	38,384.98	100.00%	Q	-	0.00%
34	POSTE CON LAMPARA TIPO FAROL	UNIDAD					3.00	3.00	Q	28,459.82	Q	85,379.46	0.00	3.00	3.00	100.00%	Q	-	Q	85,379.46	Q	85,379.46	100.00%	Q	-	0.00%
TOTAL CONTRATADO										Q	1,397,800.01															
VALOR DE LA ESTIMACION										Q	69,290.00	Q	1,329,810.01	Q	1,397,800.01	100.00%	Q	-								
MONTIO ASORAVINDO POR LA EMPRESA										Q	0.01															
AMORTIZACION DEL ANTICIPO										Q	13,298.00															
TOTAL LIQUIDO A RECIBIR										Q	55,991.99															

LEONEL AMILCAR CHACON ROSALES
PROPIETARIO
CONSTRUCTORA CRL9



LUIS LEONEL URIZAR MUÑOZ
(COL. No. 4001)





CONSTANCIA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA



MONTO RESERVADO VIGENTE (Q):
MONTO EN LETRAS:

Q 1,400,000.00
UN MILLON CUATROCIENTOS MIL 00/100

CDP No. 29
Ejercicio Fiscal: 2023

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
FECHA DE EMISION: viernes, 12 de mayo de 2023
MODALIDAD DE COMPRA O CONTRATACION: LICITACION
NUMERO DE OPERACIÓN GUATECOMPRAS:

DESCRIPCION DEL PROCESO:

CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA EL NARANJO, GUASTATOYA, EL PROGRESO

NIT:
NOMBRE O RAZON SOCIAL:
CORREO ELECTRONICO:

PROGRAMCION No.:

ESTRUCTURA (S) PRESUPUESTARIA (S) ASIGNADA (S):
17-001-001-000-001 RENGLON # 332
FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Q 1,400,000.00

21-0101-0001 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA-PAZ
31-0151-0002 IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES (POR ADMON MPAL)

CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA EL NARANJO, GUASTATOYA, EL PROGRESO

Q 1,400,000.00

UN MILLON CUATROCIENTOS MIL 00/100


Edgar Ivan Monterroso Gonzalez
Encargado de Presupuesto



ULTIMA LINEA

RECIBIDO
Fecha: 15-05-23 Hora: 12:16 PM

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN Y PRECALIFICACIÓN COMO PROVEEDOR DEL ESTADO

Fecha de emisión de esta constancia: Guatemala, 10 de enero de 2023.

Estatus: **HABILITADO**

202337539



EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Hace constar

Que a la presente fecha **LEONEL AMILCAR CHACÓN ROSALES** con NIT 74061801 se encuentra INSCRITO en el REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO, en el folio 95116 del LIBRO DE INSCRIPCIONES y registro número 9692 del LIBRO DE REGISTRO DE PROVEEDORES.

Esta constancia le habilita para proveer: **OBRAS** A ENTIDADES DEL ESTADO, HASTA UN MONTO MÁXIMO DE CONTRATACIÓN DE CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS QUETZALES CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS (Q. 469,182,676.44). Como resultado de la evaluación de la capacidad técnica y financiera del proveedor.

Asimismo, precalificado en la especialidad o especialidades siguientes: (Si no se listan especialidades, se debe a que el proveedor no acreditó documentación de respaldo requerida).

- 4312 Preparación del terreno
- 4216 - Carreteras de terracería
- 7118 - Cartografía, catastro, agrimensura, topografía y sistemas de información geográfica
- 4211 - Carreteras pavimentadas
- 4313 Movimientos de tierra y/o excavaciones
- 4295 Construcción de instalaciones deportivas
- 4321 - Instalaciones eléctricas
- 7710 - Alquiler y arrendamiento de vehículos automotores
- 4663 - Venta de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción
- 4652 - Venta de equipo, partes y piezas electrónicas y de telecomunicaciones
- 7111 - Asesorías y/o estudios, profesionales, diseño y supervisión en el área de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de consultoría técnica
- 7116 - Asesorías y/o estudios de diseño y supervisión en el área de ingeniería civil
- 4298 - Adoquinado y empedrado
- 4226 Sistemas de saneamiento y drenaje
- 7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles
- 7115 - Red privada de telecomunicaciones
- 4217 - Mantenimiento de carreteras
- 2511 - Fabricación de productos metálicos para uso estructural
- 4224 - Sistemas de captación, conducción y distribución de agua

ESTE DOCUMENTO ES VÁLIDO SIN FIRMA, SU AUTENTICIDAD PUEDE SER VERIFICADA INGRESANDO EL NÚMERO DE LA CONSTANCIA EN LA OPCIÓN VALIDAR CONSTANCIAS EN EL PORTAL www.rgae.gob.gt O A TRAVÉS DEL CÓDIGO QR DE ESTE DOCUMENTO.

NOTA:

- Los términos de la presente constancia se basan en la información y documentación presentada por el interesado bajo los términos y condiciones establecidos por el Registro General de Adquisiciones del Estado en el que declara que dicha información y documentación corresponden a la persona individual o jurídica identificada en esta constancia y sabiendo de la pena relativa al delito que establece el artículo 459 del Código Penal. No asumiendo el Registro responsabilidad alguna por omisión o actos previos o posteriores, realizados por los proveedores que transgredan el marco legal.

-El Registro General de Adquisiciones del Estado no prejuzga sobre procesos, procedimientos administrativos o requisitos que para una eventual contratación establezcan las entidades reguladas en el artículo 1 de la Ley de Contrataciones del Estado, ni sobre los procesos de ejecución o imputación de los renglones que para cada tipo de

PBX: 2374-2822 ext. 10290

Ministerio de Finanzas Públicas, Registro General de Adquisiciones del Estado.
8a. Avenida 20-59 Zona 1, Centro Cívico, Guatemala

MUNICIPALIDAD DE
GUASTATOYA, EL PROGRESO



[Handwritten signature]
Lic. GERSON MAURICIO CALINDO CATALÁN
Abogado y Notario

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN Y PRECALIFICACIÓN COMO PROVEEDOR DEL ESTADO

Fecha de emisión de esta constancia: Guatemala, 10 de enero de 2023.

Estatus: HABILITADO

202337539



- 4223 - Líneas de transmisión eléctrica

Información comercial de la Entidad*:

- CONSTRUCTORA CRL9 - 1 AVENIDA 6-32 ZONA 6 COLONIA SANTA MARTA MIXCO, GUATEMALA

*Conforme a lo establecido en el artículo 71 el Registro es el responsable del control, actualización, vigencia, seguridad, certeza y publicidad de la información, por lo que a partir del 09 de julio de 2021, se refleja en las constancias la información comercial y la información de copropietario(s) de las entidades con el fin de facilitar el proceso de revisión a las entidades reguladas por el artículo 1 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Vigencia de esta precalificación, hasta:

29 de abril de 2024

Fecha de última actualización:

10 de enero de 2023

Fecha de última modificación:

29 de abril de 2022

Resolución número:

202337333

Fecha de Resolución:

10 de enero de 2023

ESTE DOCUMENTO ES VÁLIDO SIN FIRMA, SU AUTENTICIDAD PUEDE SER VERIFICADA INGRESANDO EL NÚMERO DE LA CONSTANCIA EN LA OPCIÓN VALIDAR CONSTANCIAS EN EL PORTAL www.rgae.gob.gt O A TRAVÉS DEL CÓDIGO QR DE ESTE DOCUMENTO.

NOTA:

- Los términos de la presente constancia se basan en la información y documentación presentada por el interesado bajo los términos y condiciones establecidos por el Registro General de Adquisiciones del Estado en el que declara que dicha información y documentación corresponden a la persona individual o jurídica identificada en esta constancia y sabiendo de la pena relativa al delito que establece el artículo 459 del Código Penal. No asumiendo el Registro responsabilidad alguna por omisión o actos previos o posteriores, realizados por los proveedores que transgredan el marco legal.

-El Registro General de Adquisiciones del Estado no prejuzga sobre procesos, procedimientos administrativos o requisitos que para una eventual contratación establezcan las entidades reguladas en el artículo 1 de la Ley de Contrataciones del Estado, ni sobre los procesos de ejecución o imputación de los renglones que para cada tipo de

PBX: 2374-2822 ext. 10290

Ministerio de Finanzas Públicas, Registro General de Adquisiciones del Estado.
8a. Avenida 20-59 Zona 1, Centro Cívico, Guatemala

MUNICIPALIDAD DE
GUASTATÓYA EL PROGRESO



TU NUEVA MUNI-
JUNTA DE
LICITACIÓN

[Handwritten signature]
Lit. GERSON MAURICIO CALINDO CATALÁN
Abogado y Notario

Página 2 de 2

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO:

Nombre del proyecto: Forma Capital Fijo

CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA EL NARANJO, GUASTATOYA, EL PROGRESO

Institución responsable: GOBIERNOS LOCALES

Unidad ejecutora responsable: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

Modalidad de planificación : Planificación Institucional

Modalidad específica: Planificación Institucional

Finalidad-Función-Division:

Función:	Municipio
Sub-función anterior:	GUASTATOYA
Sub-función:	GUASTATOYA

Área de influencia: Municipal

Responsables:

Responsable del proyecto:

Nombre: JORGE ANTONIO ORELLANA PINTO
Cargo: ALCALDE MUNICIPAL
Teléfono: 79451594
Email: info@muniguastatoya.com

Formulador del proyecto:

Nombre: EDGAR ANIBAL CHAVEZ PALENCIA
Cargo: DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
Teléfono: 79451594
Email: dmp.guastatoya@gmail.com

Modalidad de ejecución del Proyecto : CONTRATO

DIAGNÓSTICO:

Antecedentes:

El Municipio de Guastatoya, se encuentra situado en el kilómetro 73.5 sobre la ruta al Atlántico. El sector donde se necesita la construcción del parque deportivo y recreativo está ubicado en la Aldea El Naranjo del Municipio de Guastatoya, El Progreso. Actualmente residen 1600 habitantes aproximadamente 400 familias de los cuales el 98% son de origen ladino y el 2% indígenas.

Desde hace muchos años vienen gestionando por medio de los diferentes COCODES, por tal motivo, se decidió facultar al Consejo Comunitario de Desarrollo COCODE para gestionar dicha actividad, quienes se dirigieron a la Municipalidad para el apoyo técnico y asesorar todos los trámites ante una institución que pudiera ejecutar el proyecto satisfaciendo así su necesidad de los habitantes y así tengan un lugar para poder recrearse.

Problemática / Arbol del Problema:

Efectos Indirectos

No se cuentan con instalaciones para recreación, Falta de gestión por el COCODE, Mala organización del área administrativa en cuanto la recreación de los niños y niñas

Efectos Directos

Aumento de niños y niñas, Falta de Gestión Administrativa, Servicios Deficientes

PROBLEMA CENTRAL:

FALTA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DIGNAS

Causas Indirectas

Mala Administración, Aumento de la población y en la práctica del deporte y la recreación, Mala gestión administrativa

Causas Directas

Falta de los recursos, Falta de manejo en la buena atención ante las reuniones familiares, Falta de Inversión Pública

ALTERNATIVAS DE SOLUCION**Alternativa 01 : CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO**

TIR : 12.00 **VAN :** 2,114,273.97 **CAE :** 283,312.71

Alternativa 02 : PARQUE INFANTIL

TIR : 12.00 **VAN :** 2,114,273.97 **CAE :** 283,312.71

Alternativa 03 : CENTRO DE RECREACION

TIR : 12.00 **VAN :** 2,114,273.97 **CAE :** 283,312.71

Justificación:

Actualmente los vecinos del municipio de Guastatoya, se ven obligados a utilizar instalaciones deportivas y recreativas en condiciones inadecuadas, es decir, deterioradas, abandonadas y sin la atención que requiere brindar un servicio municipal en excelentes condiciones. Aunado a ello, podemos mencionar que por el deterioro de las instalaciones se constituyen hospederos y vectores de transmisores de enfermedades tropicales (Paludismo, Dengue); ocasionando gastos en medicinas para curación y disminuyendo así también los ingresos familias.

Descripción AJUSTADA:

- EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN PARQUE EPORTIVO Y RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE EL NARANJO

Objetivos:**General:**

Contribuir al desarrollo integral de los vecinos del municipio de Guastatoya; a través del CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA EL NARANJO, GUASTATOYA, EL PROGRESO, que permita contar con instalaciones en excelentes condiciones.

Específicos:

- 1) Mejorar las condiciones deportivas y recreativas del municipio.
- 2) Facilitar la práctica de actividades recreativas.
- 3) Mejorar las condiciones de vida de las familias.

Resultados esperados:

Contribuir con el desarrollo integral de los habitantes del municipio de Guastatoya con el CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA EL NARANJO, GUASTATOYA, EL PROGRESO

Beneficiarios :**Tipificación de la población :**

Población Afectada	1,600
Población Objetivo	1,600
Población Proyectada	2,200

Caracterización de la poblacion por EDAD :**Hombres :****Mujeres :**

Menores de 4 años	65	81
De 5 a 13 años	78	92
De 14 a 18 años	82	93
De 19 a 28 años	103	135
De 29 a 50 años	118	141
De 51 a 60 años	134	161
De 61 en adelante	145	172



Clasificación por ETNIA :

Ladino / Mestizo	1,552
Otro	48

Clasificación por ZONA :

Costo/eficiencia: TIR: % VAN:

Empleo a requerir:

	Durante la ejecución en hombre/mes	Durante la operación en hombre/mes
Calificada		
No calificada		

Situación del terreno: Ninguno

Diseños (especificaciones):

Vida útil del proyecto: años

Fecha de inicio de la operación:

Institución responsable de operación:

Costo anual de operación:



0306445 - CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA EL NARANJO, GUASTATOYA, EL PROGRESO

Información General del Proyecto

SNIPgt

Información Técnica AJUSTADA:

Duración del proyecto: Inicio: 01/01/2023 Finalización : 31/12/2023 Duración : 12 meses.
Meta GLOBAL del proyecto : CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECRE/ 400.00 Metro cuadrado
Costo TOTAL del proyecto Q.: 1,400,000.00

Metas ANUALES del proyecto :

Año	Descripción de la meta	Unidad de medida	Vigente	% Ejec.
2,023	CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO	Metro cuadrado	400.00	95.05

Programación FISICA Multianual

Rubro	Unidad de medida	Program.
-------	------------------	----------

2,023

Limpieza y detalles finales	m²	400
Adecuación del terreno	m²	400
Instalaciones	m²	400
Trabajos preliminares	m²	400

Programación FISICA Mensual

Rubro	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
-------	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------

2,023

Limpieza y detalles finales	70	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Adecuación del terreno	70	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Instalaciones	70	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Trabajos preliminares	70	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30


Información FINANCIERA del Proyecto:

RESUMEN AJUSTE DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS

Ejercicio	Solicitado	Asignado	Ejecutado	% Financiero	% Fisico
2023	1,400,000.00	1,399,800.00	1,329,810.01	95.00	95.05%
			1,329,810.01		

Avance Financiero: 95.00%

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2023	Monto Vigente	Ejecutado 2023
TOTAL :	1,400,000	1,399,800	1,329,810
Recursos internos :	1,400,000	1,399,800	1,329,810
Situado Constitucional :			
Iva paz :		1,399,800	1,329,810
Ingresos Propios :			
Otros aportes :			
Otras fuentes :			

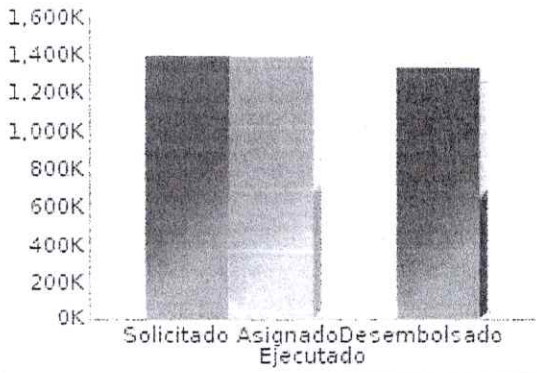

PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL



0306445 - CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO ALDEA EL NARANJO, GUASTATOYA, EL PROGRESO

Información General del Proyecto

SNIPgt

Fuente de Financiamiento	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2023												
TOTAL	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	113,000
Recursos internos	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	113,000
Gobierno central :												
Comunidad :												
Aporte municipal :	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	113,000
Otros aportes :												
Otras fuentes:												
