




**CONTRATO DE EJECUCION DE PROYECTOS DOCE GUION DOS MIL VEINTITRES (12-2023)
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO
NOG. 19112149**

En el Municipio de Guastatoya, del departamento de El Progreso, el día **DIECIOCHO (18) DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRES (2023)**. **NOSOTROS:** Por una parte comparezco Yo, **JORGE ANTONIO ORELLANA PINTO**, de cincuenta y un años de edad, casado, guatemalteco, Licenciado en Administración de Empresas, domiciliado en el departamento de El Progreso, me identifico con el documento personal de identificación -DPI-, Código Único de Identificación -CUI-, dos mil quinientos setenta espacio cincuenta y tres mil novecientos sesenta y cuatro espacio cero dos cero uno, (2570 53964 0201), extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala; **DE LA CALIDAD CON QUE ACTUO.** Actúo en calidad de **Alcalde Municipal**, de la ciudad de Guastatoya, del departamento de El Progreso, calidad que acredito, con la certificación del acta de toma de posesión, dos guion dos mil veinte (2-2020), de fecha quince de enero de dos mil veinte, contenida en el libro número dos mil seiscientos cuarenta y siete (2647), de sesiones extraordinarias del Concejo Municipal, debidamente autorizado por la Contraloría General de Cuentas, y el Acuerdo número cero cero uno guión dos mil diecinueve (001-2019), de la Junta Electoral Departamental de El Progreso, con el número de **CUENTADANCIA: Gestión dos mil veintidós guion doscientos guion doscientos uno guion veintidós guion cero cero uno (2022-200-201-22-001)**; y por la otra parte comparezco Yo, **WILLIAM ARCHILA ORELLANA**, de cuarenta y un años de edad, casado, Guatemalteco, Constructor, domiciliado en el departamento de El Progreso, se identifica con el Documento Personal de Identificación -DPI- dos mil trescientos diez espacio cuarenta y seis mil quinientos veintinueve espacio cero doscientos uno (2310 46529 0201), extendido por el Registro Nacional de las Personas, actúo en calidad de **PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION Y REPRESENTANTE LEGAL**, de la Sociedad denominada **DESARROLLOS DE PROYECTOS E INVERSIONES DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, calidad que acredita con el acta notarial de nombramiento de fecha siete de mayo de dos mil veintiuno, faccionada y autorizada por el Notario Omar Eduardo Archila Escobar, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de la República de Guatemala, con Registro 623944, folio 977 del libro 774 de Auxiliares de Comercio, con fecha de nombramiento veintinueve de enero de dos mil veintiuno, con plazo definido, con vigencia a partir de nombramiento tres años, expediente 45395-2021; la Sociedad descrita se encuentra debidamente inscrita en el Registro Mercantil de conformidad con la Patente de Sociedad, número de Registro CIENTO CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE (151387), folio CIENTO DIECIOSiete (117), del libro CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO (478), de Sociedades, y con el número de identificación tributaria 100670547; con Registro de actualización del Registro General de Adquisiciones del Estado Expediente 2022166878 RGAE-202355909, Resolución 202355909 y resolución 202356252, constancia con vigencia hasta el 26 de abril de 2024, con el cual hace constar la capacidad económica y las especialidades de la sociedad referida, constancias emitidas por el Registro General de Adquisiciones del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas. Ambos comparecientes manifestamos encontrarnos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles y que las representaciones que acreditamos son suficientes de conformidad con la ley y a nuestro juicio para celebrar el presente contrato, toda la documentación indicada se tiene a la vista y en lo sucesivo simplemente se denominará LA MUNICIPALIDAD y "EL CONSTRUCTOR", sujetándonos a las cláusulas siguientes.

PRIMERA: El Licenciado **JORGE ANTONIO ORELLANA PINTO**, Alcalde Municipal, manifiesto que actúo en representación de la Municipalidad de Guastatoya del departamento de El Progreso, y expongo que de conformidad con el Punto Resolutivo emitido por la Autoridad Superior, contenido en el **PUNTO TERCERO**, del acta 28-2023, de fecha siete de abril de dos mil veintitres, del libro



[Handwritten signature]

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA



10	Pavimento de concreto hidráulico (e = 0.15m) 4,000 PSI	M2	3,660.00	377.00	1,379,820.00
11	Corte y sello de junta	ML	1,780.00	30.99	55,162.20
12	CUNETAS TIPO L (e = 0.07m) 3,000 PSI	ML	1,220.00	224.50	273,890.00

TOTAL 2,770,144.20

El tiempo de entrega de la obra es de **SEIS (6) MESES CALENDARIO**, de conformidad con el cronograma de ejecución presentado por el constructor, el plazo referido se computará a partir de la aprobación del contrato a la fecha de aprobación de la liquidación del mismo.

TERCERA: EL CONSTRUCTOR: Por su parte manifiesta que respecto a la ejecución del proyecto reitera que se compromete a lo siguiente: a) entregar totalmente terminada la obra a satisfacción de la Municipalidad de Guastatoya. b) a contratar un Profesional quien será el Supervisor de Proyectos Residente, quien conjuntamente con el Ingeniero Supervisor de la Municipalidad informarán en forma simultánea a la Autoridad Administrativa, al Concejo Municipal y a la Contraloría General de Cuentas de la Nación cuando lo requiera, de los avances físicos del proyecto y las estimaciones de pago, para el efecto deberán presentar las fotocopias de la bitácora del Proyecto, autorizada por la Contraloría General de Cuentas.


CUARTA: El señor Alcalde Municipal en representación de la Municipalidad de Guastatoya, manifiesta que está de acuerdo en las condiciones del constructor, especialmente en lo que respecta al total del proyecto; así como en el tiempo de entregar la obra, ambos de común acuerdo llegaron a establecer la forma de pago de la manera siguiente:

QUINTA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato pactado entre la Municipalidad y la Sociedad **DESARROLLO DE PROYECTOS E INVERSIONES DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, asciende a la cantidad de **DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO QUETZALES CON VEINTE CENTAVOS (Q. 2,770,144.20)**, incluido el impuesto al valor agregado -IVA-, los que se pagarán con fondos tripartitos, descritos de la manera siguiente:

INSTITUCION	MONTO
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO DE EL PROGRESO	Q. 2,769,159.30
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA	Q. 485.00
CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO	Q. 500.00
TOTAL	Q. 2,770,144.20

Aportes definitivos aprobados de conformidad con el Acuerdo del Concejo Municipal contenido en el punto **CUADRAGESIMO SEXTO** del acta **30-2023** de fecha **14 de abril de 2,023**, libro de sesiones ordinarias número 3222, del Concejo Municipal, y de conformidad con la constancia de disponibilidad presupuestaria que obra en el expediente administrativo para el presente proyecto; la estructura presupuestaria queda integrada de la manera siguiente: **23-00-001-000-013, RENGLON # 331, FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21-0101-0001, 31-0101-0004, 31-3101-0002. PAGOS:** Los cuales se efectuarán de conformidad con el artículo 58 de la Ley de Contrataciones del Estado, de la manera siguiente: a). Un anticipo del veinte por ciento (20%) equivalente a la cantidad de **QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL VEINTIOCHO QUETZALES CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS (Q. 554,028.84)**, el que se entregará previo a cumplir con los siguientes requisitos: I). Otorgar a la Municipalidad **PLAN DE INVERSIÓN, FIANZA DE ANTICIPO, FIANZA DE CUMPLIMIENTO**, las cuales garantizarán la correcta aplicación del mismo con fundamento en Artículos 64, 65, 66, de la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas y los artículos 53, 54, 55, 56, 58 Y 59 del Reglamento de la

ANONIMA
NIT. 100670547
BARRIO EL PORVENIR
GUASTATOYA, EL PROGRESO

Ley de Contrataciones y, II). Los **PAGOS SIGUIENTES**, se efectuarán de conformidad con las estimaciones de pago de conformidad con el artículo 59 de la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas, en el cual la **Municipalidad de Guastatoya**, hará los pagos contra las estimaciones periódicas de trabajo ejecutado y aceptado, las que podrán efectuarse mensualmente, trabajos debidamente comprobados, con los informes presentados por el Supervisor del Proyecto Residente juntamente con el Supervisor de Proyectos de la Municipalidad de Guastatoya. III). El último pago equivalente al 100% de avance físico del proyecto, presentando para el efecto, **GARANTIA DE CONSERVACION DE OBRA, CALIDAD O FUNCIONAMIENTO, FIANZA DE SALDOS DEUDORES, ACTA DE RECEPCIÓN DEL PROYECTO POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD E INFORME FINAL DE LOS SUPERVISORES PROFESIONALES DEL PROYECTO.**

SEXTA: SANCIONES: El constructor se compromete a entregar los trabajos conforme el contrato suscrito. Y en caso de atraso por parte del Constructor en la entrega de los trabajos, se determinará el atraso en la entrega de la obra con base en las fechas de terminación, parciales o total, fijadas en el programa de ejecución convenido, debiendo aplicarse las multas sin perjuicio de la facultad que tiene la entidad contratante para exigir el cumplimiento del contrato para rescindirlo. Para efecto de la multa, se tomará en cuenta solo la parte proporcional del atraso, por lo que su aplicación no debe afectar la parte del cumplimiento parcial. Se sancionará con el pago de una multa que se aplique al contratista entre el uno al cinco por millar del monto de los trabajos, que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente, por cada día de atraso en que incurra el contratista desde la fecha de terminación pactada hasta la total conclusión de los mismos, en ningún caso podrán ser superiores en su conjunto al monto de la garantía de cumplimiento. Asimismo, el Constructor deberá cumplir con los trabajos estipulados en el presente contrato y la Municipalidad no concederá ningún plazo de prórroga a excepción de los siguientes casos: a). si se trata de órdenes de trabajo extra u otros convenios, b). Indicar claramente el plazo improrrogable que se le otorgue al constructor para el trabajo correspondiente y deberá solicitarlo dentro del plazo que indica el Artículo 43, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas.

En relación a lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas, el atraso de la entrega de la obra, por causa imputable al contratista será sancionado del 1 al 5 por millar del monto de las obras que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente, calculando a partir de las fechas pactadas de la entrega parcial o total con respecto a la ejecución convenida con la entidad contratante. Dicha multa solamente se tomará de la parte proporcional del atraso, sin afectar el cumplimiento parcial.

Tasa cálculo	de	Días
1o/oo		1 a 20
2o/oo		21 a 30
3o/oo		31 a 60
4o/oo		61 a 120
5o/oo		121 hasta su cumplimiento

La entidad ejecutora será la que emita las sanciones correspondientes.

LOS DE PROYECTOS
INVERSIONES DE
CENTROAMERICA, SOCIEDAD
ANONIMA
NIT. 100670547
BARRIO EL PORVENIR

SEPTIMA: OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR: El constructor se obliga a presentar informes periódicos, cronograma de ejecución de la obra, bitácora de los trabajos de conformidad con el Artículo 37 inciso a). del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, deben de autorizar los libros en la Dirección de Infraestructura Pública de la Contraloría General de Cuentas, así como permitir en cualquier momento que las personas autorizadas por la Municipalidad supervisen las actividades que se desarrollan, asimismo instruirá a su personal para que se le preste la debida colaboración a las personas que supervisan y que son parte de esta Municipalidad, el Constructor deberá de revisar cuidadosamente los documentos contractuales y señalará cualquier omisión o error, contradicción o incongruencia que observe a este respecto, deberá formular la consulta y observación del caso antes de los quince días de ejecutar el proyecto, el constructor previamente a la adquisición de materiales deberá proporcionar a la Municipalidad cuando este requiere muestras de materiales para analizarlos y aprobarlos. El Constructor queda facultado para



retirar de la obra a cualquier trabajador que considere incompetente, negligente insubordinado o perjudicial a la buena marcha de dichos trabajos. El constructor deberá de aprobar las herramientas, materiales, mano de obra, transporte y demás elementos necesarios.

El Constructor se obliga al cumplimiento del artículo 82 de la LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, por medio de cual obliga al constructor a colocar y mantener en pleno funcionamiento dispositivos de grabación digital para visualizar en línea el desarrollo integral de las obras a través de internet, para realizar monitoreo y seguimiento que permita a la población observar el avance físico de las mismas.

El Constructor queda obligado a solicitar la publicación en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (GUATECOMPRAS) de la dirección de la página de internet que permita consultar en línea el avance físico de la obra, el cual es obligatorio en proyectos mayores de novecientos mil quetzales (Q. 900,000.00), y deberá de contar con un archivo electrónico que contenga el historial de ejecución de los proyectos, el cual deberá ser actualizado mensualmente.

OCTAVA: CLAUSULA RELATIVA AL COHECHO: Yo el Contratista, bajo juramento de Ley, manifiesto que conozco las penas relativas al delito de cohecho así como las disposiciones contenida en el Capítulo III del Título XIII del Decreto 17-73 del Congreso de la República, Código Penal. Adicionalmente, conozco las normas jurídicas que facultan a la Autoridad Superior de la entidad afectada para aplicar las sanciones administrativas que pudieren corresponderme, incluyendo la inhabilitación en el sistema GUATECOMPRAS".

NOVENA: OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD: a) La Municipalidad se obliga a efectuar el pago en tiempo y en formas convenidas, b). Faccionar el acta de inicio y avances físicos y actas de recepción para realizar la liquidación final de los trabajos a ejecutar y prestar la colaboración necesaria para el constructor para realizar los mismos, c). Designar a la persona o Personas que supervisen los trabajos del proyecto citado anteriormente previa inspección final.

DECIMA: OTRAS OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR: a). Se compromete a sostener el precio de la oferta, b). Entregar la obra en el tiempo y lugar indicado, c). Ejecutar la obra con material de buena calidad y garantizados de conformidad con lo que estipula la ley de contrataciones del estado, d). Contratar mano de obra necesaria y suficiente para la realización del proyecto, y se compromete a obtener en este municipio el cual será calificado por el constructor, e). Es responsable por el trabajo ejecutado por las personas que contrate así como de los daños y perjuicios que causen a terceros personas como consecuencia de la realización de la obra contratada. f). De conformidad con artículo 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, se podrá ampliar el monto del contrato, previo el consentimiento de la Municipalidad, cuando sean aprobadas las ordenes de cambio, ordenes de trabajo suplementario o acuerdo de trabajo extra y se suscribirá un contrato adicional de conformidad con el contenido relativo a la Ley de la materia.

DECIMA PRIMERA: FIANZAS: 1. El constructor se obliga a presentar:

1. **FIANZA DE SOSTENIMIENTO DE OFERTA** no menor del uno por ciento (1%) ni mayor del cinco por ciento (5%) del valor del contrato, que cubrirá el periodo comprendido desde la recepción y apertura de plicas hasta la aprobación de las adjudicaciones, y, en todo caso, tendrá una vigencia de ciento veinte (120) días, como lo establece el artículo 64 de la Ley de Contrataciones.

2. **FIANZA DE CUMPLIMIENTO:** Como requisito previo para la aprobación del presente contrato de conformidad con el Artículo 65 de la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas, que garantizara el cumplimiento de todas las obligaciones estipuladas en el contrato, el contratista deberá prestar fianza, deposito en efectivo o constituir hipoteca en los porcentajes y condiciones que señale el reglamento. Para el caso de obras, además esta garantía cubrirá las fallas o desperfectos que aparecieren durante la ejecución del contrato, antes que se constituya la garantía de conservación. **Por un valor del diez por ciento (10%) del monto del contrato respectivo.**

La Garantía de Cumplimiento deberá estar vigente, según el caso:

MUNICIPALIDAD
DE GUASTATOYA.



1. Cuando se trate de la adquisición de bienes, suministros y servicios hasta que la entidad interesada extienda la constancia de haber recibido a su entera satisfacción la garantía de calidad o de funcionamiento, o haberse prestado el servicio en su caso;
2. Cuando se trate de construcción de obras, hasta que la entidad interesada extienda la constancia de haber recibido a su satisfacción la garantía de conservación de obra.

Para los casos en que las bases el contrato respectivo, se contemplen recepciones parciales para el cumplimiento del objeto del contrato, se podrá ajustar la garantía de cumplimiento conforme se establezca en dichos instrumentos y siempre que se cuente con la constancia a que se refiere el presente artículo.

3. **FIANZA DE ANTICIPO:** Previo a recibir cualquier suma por concepto de anticipo, el contratista constituirá garantía mediante fianza o hipoteca por el monto de un cien por ciento (100%) del mismo. La garantía podrá reducirse en la medida que se amortice el valor del anticipo cubriendo siempre el máximo del saldo deudor y estará vigente hasta su total amortización. El reglamento establecerá el procedimiento de reducción y lo concerniente en los casos de rescisión, resolución y terminación de contrato.

4. **FIANZA DE CONSERVACION DE LA OBRA O DE LA CALIDAD DE FUNCIONAMIENTO:** El contratista responderá por la conservación de la obra, mediante depósito en efectivo, fianza, hipoteca o prenda, a su elección, que cubra el valor de las reparaciones de las fallas o desperfectos que le sean imputables y que aparecieren durante el tiempo de responsabilidad de dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha de recepción de la obra. Tratándose de bienes y suministros, deberá otorgarse garantía de calidad y/o funcionamiento, cuando proceda. La garantía de conservación de obra, o de calidad y/o funcionamiento, deberá otorgarse por el equivalente al quince por ciento (15%) del valor original del contrato, como requisito previo para la recepción de la obra, bien o suministro. El vencimiento del tiempo de responsabilidad previsto en el párrafo anterior, no exime al contratista de las responsabilidades por destrucción o deterioro de la obra debido a dolo o culpa de su parte, por el plazo de cinco (5) años, a partir de la recepción definitiva de la obra.

Garantía de Conservación de obra, calidad o funcionamiento. El contratista dentro de los veinte (20) días calendario previo a la finalización de la vigencia de la garantía de cumplimiento de contrato, deberá presentar la garantía de conservación de obra, calidad o funcionamiento, según corresponde de conformidad con lo siguiente:

- a) Para el caso de obras, la garantía de conservación de obras.
- b) Para el caso de maquinaria, medios de transporte, equipos instalados u otros equipos cuyo funcionamiento deba garantizarse por el contratista en el tiempo que determina La Ley o el contrato, la garantía de funcionamiento.
- c) Para el caso de bienes que no se incluyen en los indicados en la literal anterior, corresponderá a la entidad contratante determinar la procedencia de la presentación de la garantía de calidad.

Para las adquisiciones de suministros e insumos consumibles que por su naturaleza sean de alta rotación y a los servicios, no les será aplicable la presentación de la garantía de calidad o funcionamiento, en virtud de su fungibilidad y la intangibilidad de determinados servicios; debiendo en todo caso, sujetar su plazo en el contrato respectivo, siendo responsabilidad de la entidad contratante establecer en las bases y en el contrato, los medios u otras garantías que aseguren el cumplimiento del contratista respecto al objeto del contrato.

5. **FIANZA DE SALDOS DEUDORES** Para garantizar el pago de saldos deudores que pudieran resultar a favor del Estado, de la entidad correspondiente o de terceros en la liquidación, el contratista deberá prestar fianza, depósito en efectivo; constituir hipoteca o prenda, a su elección, por el cinco por ciento (5%) del valor original del contrato. Esta garantía deberá otorgarse simultáneamente con la de conservación de obra como requisito previo para la recepción de la obra, bien o suministro. Aprobada la liquidación, si no hubiere saldos deudores, se cancelará esta garantía.

Las fianzas descritas en el presente contrato, deberán formalizarse mediante póliza emitida por instituciones autorizadas para operar en Guatemala, de conformidad con las siguientes disposiciones: La vigencia de las fianzas será exactamente igual al plazo contractual y deberá ajustarse ante cualquier ampliación o variación del contrato, manteniendo las condiciones de cobertura que aplicaron al contrato original. Lo anterior no es aplicable a las fianzas de conservación.

MUNICIPALIDAD
DE GUASTATOYA



de obra, de calidad, de funcionamiento o de saldos deudores. a) Las fianzas garantizarán exacta y fielmente las obligaciones a cargo del contratista o proveedor. Estas obligaciones deben estar estipuladas en el contrato original y en cada una de las modificaciones documentadas. b) El funcionario que corresponda será responsable de exigir la actualización de las fianzas otorgadas por el contratista o proveedor. De omitirlo, el funcionario incurrirá en incumplimiento de deberes. c) El contratista o proveedor que omita actualizar la fianza otorgada ante modificaciones del contrato original, se hará acreedor a una multa y a la suspensión inmediata de los pagos a que tenga derecho. d) Cuando la garantía consistiere en depósitos, deberá hacerse en Quetzales o por medio de cheque certificado. Cuando la garantía sea hipotecaria o prendaria, se formalizará a través de escritura pública debidamente registrada. En todo caso, quedará a criterio del contratista o proveedor la garantía a proporcionar. Las fianzas deberán publicarse en el sistema GUATECOMPRAS. Las juntas a las que se refiere el artículo 10 de esta Ley, serán responsables de verificar la autenticidad de las fianzas de sostenimiento de oferta, y las autoridades suscriptoras de los contratos serán responsables de verificar la autenticidad de las demás fianzas a las que se refiere este capítulo. El sistema GUATECOMPRAS llevará un registro de las fianzas presentadas, así como de las solicitudes de ejecución, ejecución de fianzas y pago de las mismas. Con fundamento en el artículo 69 de la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas

DECIMA SEGUNDA: FORMA DE EFECTUAR LOS TRABAJOS DEL CONSTRUCTOR: El constructor efectuará los trabajos bajo estricta responsabilidad bajo la supervisión de un Profesional del Ramo, colegiado activo de quién deberá presentar la certificación o constancia correspondiente; asimismo incluirá los materiales, mano de obra, equipo y demás elementos necesarios para la correcta aplicación y ejecución del proyecto, mismas que se estarán supervisando por el Ingeniero Supervisor de Obras Municipales, quien cuenta con el aval y aprobación de la Corporación Municipal, así como de la comisión de recepción de la citada obra. El Constructor se compromete a dejar limpias las áreas donde se ejecute el proyecto.


DECIMA TERCERA: CONTROVERSIAS: Toda controversia que pudiera surgir entre los contrayentes en lo que se refiere a la interpretación cumplimiento, aplicación y ejecución de este contrato será resuelto en el menor tiempo posible en forma conciliatoria entre ambas partes y en última instancia de no ponerse de acuerdo en el Tribunal correspondiente de lo contencioso administrativo de conformidad con el Artículo 102 de la citada ley; asimismo que se acepta los procedimientos señalados en el Código Procesal Civil y Mercantil, renunciando el constructor al fuero de su domicilio y señalando como lugar para recibir notificaciones y citaciones BARRIO EL CALVARIO, GUASTATOYA, EL PROGRESO.

DECIMA CUARTA: TERMINACION DEL CONTRATO: La Municipalidad puede dar por terminado, resuelto y/o rescindido el presente contrato en forma unilateral y sin responsabilidad de su parte en los siguientes casos: a). Por vencimiento del plazo pactado, siempre que no haya ocurrido prórroga, b). Si el constructor incumple con sus obligaciones, c). Si paraliza sin causa justificada los trabajos por más de diez días consecutivos, d). Por rescisión de mutuo acuerdo, e). Si el constructor le fueren embargado bienes y que evidentemente afecten el cumplimiento del contrato.

DECIMA QUINTA: PROHIBICIONES: EL CONSTRUCTOR: declara bajo juramento de ley y bien enterados de las penas relativas al delito de perjurio que no se encuentra comprendido dentro de las limitaciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Y que, si en el transcurso del proceso de adquisición o en la ejecución de un contrato se presenta alguna de las prohibiciones definidas en el artículo 80 de la Ley, el contratista o proveedor deberá hacerlo de conocimiento de la autoridad competente dentro de los dos días siguientes al conocimiento del acaecimiento de la prohibición, para que ésta analice la situación planteada y resuelva sobre el proceso del contrato.

La falta de aviso sobre el acaecimiento de alguna de las prohibiciones definida en la Ley, será causal suficiente para la inhabilitación del contratista o proveedor, quien de conformidad con la ley será responsable de compensar a la entidad contratante por los daños y perjuicios ocasionados.



MUNICIPALIDAD
DE GUASTATOYA



El trámite de la inhabilitación y de la rehabilitación es responsabilidad de la entidad contratante o ejecutora, quien deberá cumplir con el procedimiento, plazos y condiciones que definan las Normas de Uso del Sistema GUATECOMPRAS y, en todo caso, debe respetarse el derecho de defensa.

La inhabilitación y la rehabilitación en el Sistema GUATECOMPRAS implica la correspondiente inhabilitación o rehabilitación en el Registro General de Adquisiciones del Estado.

DECIMA SEXTA: INSPECCION, RECEPCION Y LIQUIDACION FINAL: 1. El constructor deberá de permitir en cualquier momento que las personas autorizadas por la Municipalidad Inspeccionen las instalaciones, actividades y trabajos que realicen e instruirá a su personal para que atiendan a las personas nombradas proporcionándoles toda información requerida. 2. La Municipalidad nombrará una comisión receptora de los trabajos y harán la inspección correspondiente ante la presencia del constructor su representante legal y posteriormente informarán al Concejo Municipal si se puede faccionar el acta de recepción respectiva para que la Dirección de Administración Financiera efectúe la liquidación final o en su defecto si hay que corregir algunos trabajos o complementar otros, en este último caso deberá indicar cuales son los trabajos a efectuar y el tiempo a emplear y si el plazo es necesario se incluye dentro del tiempo contractual o le concede o no algún tiempo adicional.

DECIMA SEPTIMA: APROBACION: Para que el presente contrato surta sus efectos legales y obligue a las partes al cumplimiento de las cláusulas contenidas deberá ser aprobado de conformidad con el artículo 42 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas.

DECIMA OCTAVA: ACEPTACION DEL CONTRATO: En todos los términos y condiciones estipuladas LA MUNICIPALIDAD Y EL CONSTRUCTOR aceptan para si el presente contrato el que se encuentra contenido en ocho (8), hojas membretadas impresas de un solo lado, leemos íntegramente lo escrito y bien enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo aceptamos, ratificamos y firmamos. Damos Fe.

LIC. JORGE ANTONIO ORELLANA PINTO
ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD
DE GUASTATOYA,



PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION Y
REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD DESARROLLOS DE PROYECTOS
E INVERSIONES DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANÓNIMA


DESARROLLOS DE PROYECTOS
E INVERSIONES DE
CENTROAMERICA, SOCIEDAD
ANONIMA
NIT. 100670547

WILLIAM ARCHILA GARCIA
BARRIO EL PORVENTUR
EL PROGRESO



¡GUASTATOYA seguirá cambiando!



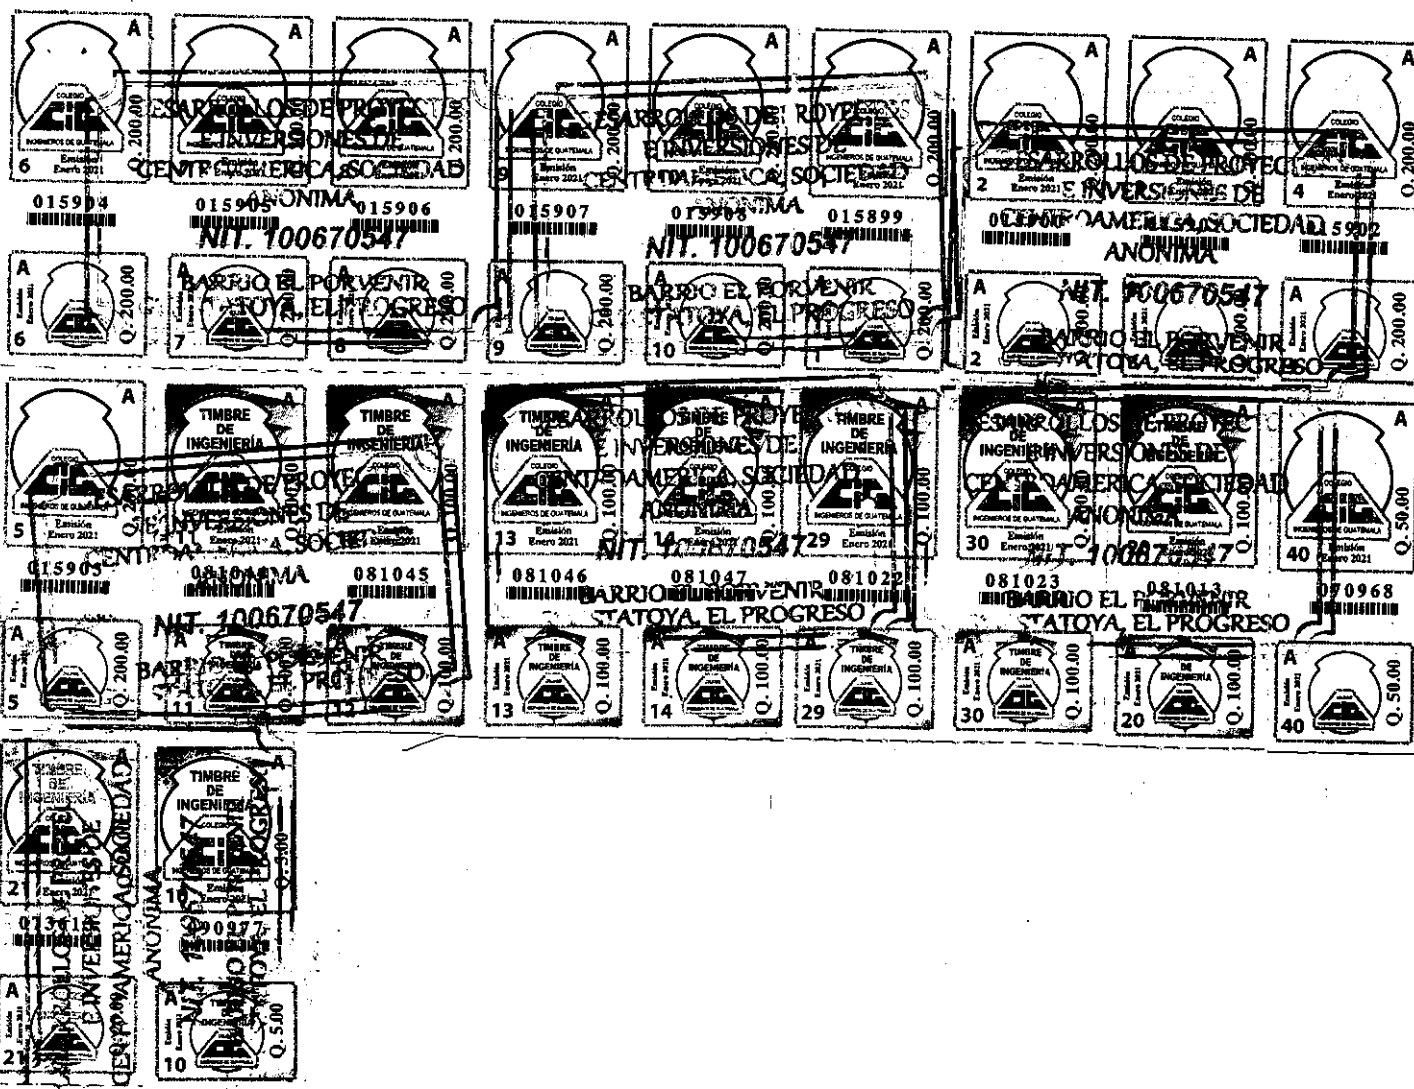



Municipalidad de GUASTATOYA

Departamento de El Progreso, Guatemala, C.A.

info@muniguasta.com

www.muniguastatoya.com

Telefax: 7945-1594, 7945-1602, 7945-1603



Guastatoya, lunes, 12 de junio de 2023

SEÑOR(es):

ALCALDE MUNICIPAL Y
HONORABLE CORPORACION
GUASTATOYA, EL PROGRESO

Respetables señor(es):

El motivo del presente es para informar los resultados de la siguiente estimacion de pago:

No. De Supervision de Avance Físico:	ESTIMACION No.2		
Nombre del Proyecto:	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO.		
No. De Contrato del Proyecto:	12-2023	Fecha del Contrato:	18/04/2023
NOG.	19112149		
Estimacion del Avance Físico:	89.9822403%		
Monto de Estimacion del Avance Físico:	Q256,563.91	en letras:	DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES QUETZALES CON 91/100 CENTAVOS
Amorización del Anticipo:	Q51,312.78	en letras:	CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DOCE QUETZALES CON 78/100 CENTAVOS
Cantidad Líquida a Recibir:	Q205,251.13	en letras:	DOSCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN QUETZALES CON 13/100 CENTAVOS

Se adjunta anexo que contiene el detalle de la presente estimacion para que se continúe con lo procedente.

Agradeciendo desde ya, me suscribo.

Atentamente,

ING. CARLOS RAMIRO ORTEGA LIMA

COLEGIADO: 7118

SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

Carlos Ramiro Ortega Lima
Ingeniero Civil
Col. 7118

[illegible]

James M. Smith

Carlos Ramiro Ortega Lima
Ingeniero Civil
Col. 7118



Municipalidad de **GUASTATOYA**

Departamento de El Progreso, Guatemala, C.A.

info@muniguasta.com

www.muniguastatoya.com

Telefax: 7945-1594, 7945-1602, 7945-1603



Guastatoya, lunes, 12 de junio de 2023

SEÑOR(es):

ALCALDE MUNICIPAL Y
HONORABLE CORPORACION
GUASTATOYA, EL PROGRESO

Respetables señor(es):

Respetuosamente me dirijo a usted, con el proposito de REMITIR el INFORME
DE SUPERVISION que acontinuacion se describe:

Nombre del Proyecto:	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO.		
No. De Contrato del Proyecto:	12-2023	Fecha del Contrato:	18/04/2023
NOG.	19112149		
Empres constructura:	PROYECTOS E INVERSIONES DE CENTRO AMERICA, SO		

Se realizo la visita al proyecto antes en mencion para hacer constar los avances de los renglones contratados en su avance fisico notificado por la empresa Constructora los cuales se describen a continuacion:

GUASTATOYA esta cambiando



Municipalidad de GUASTATOYA

Departamento de El Progreso, Guatemala, C.A.

info@muniguasta.com

www.muniguastatoya.com

Telefax: 7945-1594, 7945-1602, 7945-1603



16 ml DE Suministro e instalación de alcantarilla metálica de 30" de diámetro
9.8 m3 DE Cajas y cabezales de concreto ciclópeo
117.01 m3 DE Corte de cajuela + excavación no clasificada y acarreo de material
890 ml DE Corte y sello de junta
610 ml DE Cuneta tipo L (e=0.07m) 3000psi

TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR

614.4 m3 DE Corte en roca
8.6 m3 DE Cajas y cabezales de concreto ciclópeo
380.39 m3 DE Corte de cajuela + excavación no clasificada y acarreo de material
2 Unidad DE Demolición de estructuras existentes

Estimacion del Avance Fisico:	89.9822403%
-------------------------------	-------------

Se adjunta anexo que contiene el detalle de la presente estimacion para que se continúe con lo procedente.

Agradeciendo desde ya, me suscribo.

Atentamente,

ING. CARLOS RAMIRO ORTEGA LIMA

COLEGIADO: 7118

SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

Carlos Ramiro Ortega Lima
Ingeniero Civil
Col. 7118

GUASTATOYA esta cambiando



Municipalidad de **GUASTATOYA**

Departamento de El Progreso, Guatemala, C.A.

info@muniguasta.com

www.muniguastatoya.com

Telefax: 7945-1594, 7945-1602, 7945-1603



INFORME
FOTOGRAFICO


MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TIERRA
BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO.



GUASTATOYA esta cambiando

**“DESARROLLOS DE PROYECTOS E INVERSIONES DE
CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA”**

BARRIO EL PORVENIR GUASTATOYA, EL PROGRESO



Guastatoya 12 de junio del 2023

Señor

Jorge Antonio Orellana Pinto
Alcalde Municipal
Guastatoya El Progreso.

Señor Alcalde:


Es un gusto poder saludarle, deseándole éxitos al frente de sus importantes labores edilicias. El motivo de la presente es para informar que con base al artículo 59 del Decreto Numero 57-92 “Ley de Contrataciones del Estado”. Solicitamos el respectivo avance físico para el proyecto denominado: **MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO**. Con contrato administrativo número **12-2023** de fecha 18 de abril del año 2023.

Como empresa estimamos los avances en la ejecución de la obra en un 89.9822403% ,
Dicho pago será de utilidad para la buena ejecución de la obra.

Agradeciendo de antemano su atención a esta solicitud, me suscribo de usted, muy atentamente,



William Archila Orellana
Representante Legal
Deproinca, S.A.



“DESARROLLOS DE PROYECTOS E INVERSIONES DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA”

BARRIO EL PORVENIR GUASTATOYA, EL PROGRESO



NOMBRE DEL PROYECTO
NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA
REPRESENTANTE LEGAL EMPRESA CONSTRUCTORA
NOMBRE DEL PROYECTO, RESIDENTE DE OBRAS
NIT DE LA EMPRESA
NÚMERO DE CONTRATO
MONTO DE CONTRATO
FECHA DE CONTRATO

MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO.
DESARROLLOS DE PROYECTOS E INVERSIONES DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA.
WILLIAM ARCHILA ORELLANA
ING. LUIS LEONEL URIZAR MUÑOZ (COL. No. 4001)
10067054-7
12-2023
2.770.144,20
18/04/2023

ESTIMACION DE TRABAJO No. 02-2023

NO.	Description	Cantidad	Unidad	Cantidad contratada	Orden de trabajo Supervisado	Acuerdo trabajo extra	Cantidad Actual	Precio unitario	Costo total estimado	Este periodo	Acumulado anterior	Total a la fecha	%	Este periodo	Acumulado anterior	Total a la fecha	%	Por estimar	%
1	Limpia dique y desbaste	4.392,00	m2				4.392,00	Q 10,00	Q 43.920,00		4.392,00	4.392,00	100,00%	Q -	Q 43.920,00	Q 43.920,00	100%	Q -	0%
2	Trazo y replanteo Topográfico	610,00	m				610,00	Q 17,02	Q 10.382,20		610,00	610,00	100,00%	Q -	Q 10.382,20	Q 10.382,20	100%	Q -	0%
3	Corte en roca	614,40	m3				614,40	Q 323,00	Q 198.451,20		-	0,00	0,00%	Q -	Q -	Q -	0%	Q 198.451,20	100%
4	Suministro e instalación de alcantarilla metálica de 30" de diámetro	16,00	m				16,00	Q 3.280,00	Q 52.480,00	16,00	-	16,00	100,00%	Q 52.480,00	Q -	Q 52.480,00	100%	Q -	0%
5	Cajete y cabezales de concreto ciclopeo	18,40	m3				18,40	Q 2.350,00	Q 43.295,20	9,80	-	9,80	53,26%	Q 23.059,40	Q -	Q 23.059,40	53,26%	Q 20.235,80	46,74%
6	Corte de cajete + Escanador no clasificado y acarreo de material	1.815,00	m3				1.815,00	Q 141,09	Q 255.915,00	117,01	1.317,60	1424,61	79,04%	Q 16.468,44	Q 186.781,60	Q 202.250,04	79,04%	Q 53.634,99	20,95%
7	Demolición de estructuras existentes	2,00	Unidad				2,00	Q 2.592,28	Q 5.184,40		0	0,00	0,00%	Q -	Q -	Q -	0%	Q 5.184,40	100%
8	Reconstrucción de la subrasante	4.392,00	m2				4.392,00	Q 27,00	Q 118.584,00		4.392,00	4.392,00	100,00%	Q -	Q 118.584,00	Q 118.584,00	100%	Q -	0%
9	Baso Granular (e = 0,15 m)	3.660,00	m2				3.660,00	Q 91,00	Q 333.060,00		3.660,00	3.660,00	100,00%	Q -	Q 333.060,00	Q 333.060,00	100%	Q -	0%
10	Pavimento de concreto hidráulico (e = 0,15m) 4.000 PSI	3.660,00	m2				3.660,00	Q 37,00	Q 1.379.820,00		3.660,00	3.660,00	100,00%	Q -	Q 1.379.820,00	Q 1.379.820,00	100%	Q -	0%
11	Corte y sello de junta	1.780,00	m				1.780,00	Q 30,99	Q 55.162,20	880,00	880,00	1.780,00	100,00%	Q 27.581,10	Q 27.581,10	Q 55.162,20	100%	Q -	0%
12	Cuneta tipo L (e = 0,07 m) 3.000 PSI	1.220,00	m				1.220,00	Q 224,50	Q 273.890,00	610,00	610,00	1.220,00	100,00%	Q 136.945,00	Q 136.945,00	Q 273.890,00	100%	Q -	0%
Total Contratado									2.770.144,20										

William Archila Orellana
Representante Legal
Depronea S.A.

DESARROLLOS DE PROYECTOS
E INVERSIONES DE
CENTROAMERICA, SOCIEDAD
ANONIMA
NIT: 100670547
BARRIO EL PORVENIR
GUASTATOYA, EL PROGRESO

Luis Leonel Urizar Muñoz
(COL. No. 4001)

Luis Leonel Urizar Muñoz
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO NO 4001

AVANCE

89,9822403%

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN Y PRECALIFICACIÓN COMO PROVEEDOR DEL ESTADO

Fecha de emisión de esta constancia: Guatemala, 20 de enero de 2023.

Estatus: **HABILITADO**

202356252

**EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS**

Hace constar

Que a la presente fecha **DESARROLLOS DE PROYECTOS E INVERSIONES DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA** con NIT 100670547 se encuentra INSCRITO en el REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO, en el folio 91260 del LIBRO DE INSCRIPCIONES y registro número 10018 del LIBRO DE REGISTRO DE PROVEEDORES.

Esta constancia le habilita para proveer: **OBRAS** A ENTIDADES DEL ESTADO, HASTA UN MONTO MÁXIMO DE CONTRATACIÓN DE CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO QUETZALES CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS (Q. 139,979,625.75). Como resultado de la evaluación de la capacidad técnica y financiera del proveedor.

Asimismo, precalificado en la especialidad o especialidades siguientes: (Si no se listan especialidades, se debe a que el proveedor no acreditó documentación de respaldo requerida).

- 4101 - Construcción de edificios
- 4312 - Preparación del terreno
- 4211 - Carreteras pavimentadas
- 4313 - Movimientos de tierra y/o excavaciones
- 7116 - Asesorías y/o estudios de diseño y supervisión en el área de ingeniería civil
- 4226 - Sistemas de saneamiento y drenaje
- 4298 - Adoquinado y empedrado
- 5210 - Almacenamiento y depósito
- 7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles
- 2511 - Fabricación de productos metálicos para uso estructural
- 4224 - Sistemas de captación, conducción y distribución de agua

Información comercial de la Entidad*:

- DEPROINCA - BARRIO EL PORVENIR GUASTATOYA, EL PROGRESO

Información de los representantes legales de la Entidad*:

- NIT: 10164022 - WILLIAM ARCHILA ORELLANA

ESTE DOCUMENTO ES VÁLIDO SIN FIRMA, SU AUTENTICIDAD PUEDE SER VERIFICADA INGRESANDO EL NÚMERO DE LA CONSTANCIA EN LA OPCIÓN VALIDAR CONSTANCIAS EN EL PORTAL www.rgae.gob.gt O A TRAVÉS DEL CÓDIGO QR DE ESTE DOCUMENTO.

NOTA:

- Los términos de la presente constancia se basan en la información y documentación presentada por el interesado bajo los términos y condiciones establecidos por el Registro General de Adquisiciones del Estado en el que declara que dicha información y documentación corresponden a la persona individual o jurídica identificada en esta constancia y sabiendo de la pena relativa al delito que establece el artículo 459 del Código Penal. No asumiendo el Registro responsabilidad alguna por omisión o actos previos o posteriores, realizados por los proveedores que transgredan el marco legal.

- El Registro General de Adquisiciones del Estado no prejuzga sobre procesos, procedimientos administrativos o requisitos que para una eventual contratación establezcan las entidades reguladas en el artículo 1 de la Ley de Contrataciones del Estado, ni sobre los procesos de ejecución o imputación de los renglones que para cada tipo de

PBX: 2374-2822 ext. 10290

Ministerio de Finanzas Públicas, Registro General de Adquisiciones del Estado.
8a. Avenida 20-59 Zona 1, Centro Cívico, Guatemala

Página 1 de 2

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN Y PRECALIFICACIÓN COMO PROVEEDOR DEL ESTADO

Fecha de emisión de esta constancia: Guatemala, 20 de enero de 2023.

Estatus: **HABILITADO**

202356252



*Conforme a lo establecido en el artículo 71 el Registro es el responsable del control, actualización, vigencia, seguridad, certeza y publicidad de la información, por lo que a partir del 09 de julio de 2021, se refleja en las constancias la información comercial y la información de los representantes legales de las entidades con el fin de facilitar el proceso de revisión a las entidades reguladas por el artículo 1 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Vigencia de esta precalificación, hasta:

26 de abril de 2024 ✓

Fecha de última actualización:

20 de enero de 2023

Fecha de última modificación:

08 de junio de 2022

Resolución número:

202355909

Fecha de Resolución:

20 de enero de 2023

ESTE DOCUMENTO ES VÁLIDO SIN FIRMA, SU AUTENTICIDAD PUEDE SER VERIFICADA INGRESANDO EL NÚMERO DE LA CONSTANCIA EN LA OPCIÓN VALIDAR CONSTANCIAS EN EL PORTAL www.rgae.gob.gt O A TRAVÉS DEL CÓDIGO QR DE ESTE DOCUMENTO.


NOTA:

- Los términos de la presente constancia se basan en la información y documentación presentada por el interesado bajo los términos y condiciones establecidos por el Registro General de Adquisiciones del Estado en el que declara que dicha información y documentación corresponden a la persona individual o jurídica identificada en esta constancia y sabiendo de la pena relativa al delito que establece el artículo 459 del Código Penal. No asumiendo el Registro responsabilidad alguna por omisión o actos previos o posteriores, realizados por los proveedores que transgredan el marco legal.

-El Registro General de Adquisiciones del Estado no prejuzga sobre procesos, procedimientos administrativos o requisitos que para una eventual contratación establezcan las entidades reguladas en el artículo 1 de la Ley de Contrataciones del Estado, ni sobre los procesos de ejecución o imputación de los renglones que para cada tipo de

PBX: 2374-2822 ext. 10290

Ministerio de Finanzas Públicas, Registro General de Adquisiciones del Estado
8a. Avenida 20-59 Zona 1, Centro Cívico, Guatemala



IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO:
Nombre del proyecto: Forma Capital Fijo

MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TIERRA BLANCA, GUASTATOYA, EL PROGRESO
Institución responsable: CONSEJOS DE DESARROLLO

Unidad ejecutora responsable: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

Modalidad de planificación : Planificación Institucional

Modalidad específica: Planificación Institucional

Finalidad-Función-Division:
Función anterior:

TRANSPORTE

5 - ASUNTOS ECONOMICOS

Sub-función anterior :

TRANSPORTE

5 - TRANSPORTE

1 - TRANSPORTE POR CARRETERA

Ubicación geográfica:

EL PROGRESO	GUASTATOYA
-------------	------------

Área de influencia: Municipal

Responsables:
Responsable del proyecto:
Formulador del proyecto:

Nombre: JORGE ANTONIO ORELLANA PINTO

Nombre: EDGAR ANIBAL CHAVEZ PALENCIA

Cargo: ALCALDE MUNICIPAL

Cargo: DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION

Teléfono: 79451594

Teléfono: 79450031

Email: dmp.guastatoya@gmail.com

Email: dmp.guastatoya@gmail.com

Modalidad de ejecución del Proyecto : CONTRATO

DIAGNÓSTICO:
Antecedentes:

En la Aldea Tierra Blanca Municipio de Guastatoya, se encuentra situado a 2 kilómetros del Parque Central de Guastatoya. El sector donde se necesita mejorar el Camino Rural está ubicado a 0.39 kilómetros del edificio municipal. Actualmente residen más de 24,821 habitantes aproximadamente 6,205 familias.

Desde hace muchos años vienen gestionando por medio de los diferentes COCODES el proyecto de Mejoramiento Camino Rural Aldea Tierra Blanca, Guastatoya, El Progreso. Por tal motivo fue así como en Asamblea Comunitaria se decidió facultar al Consejo Comunitario de Desarrollo COCODE para gestionar el proyecto, quienes se dirigieron a la Municipalidad para el apoyo técnico en la realización de los estudios y asesorar todos los trámites ante una institución que pudiera ejecutar el proyecto satisfaciendo así su necesidad de acceso a la calle.

Problemática / Arbol del Problema:
Efectos Indirectos

Estancaderos de Agua, No Existe Personal

Efectos Directos

Aumento de Vertederos de Trasmisión de Enfermedades, Servicios Viales Deficientes,

PROBLEMA CENTRAL:

Difícil Movilización Peatonal y Vehicular

Causas Indirectas

Falta de Mejoramiento en el camino rural, Mayor posibilidad de accidentes

Causas Directas

No se le da Mantenimiento, Enfermedades

ALTERNATIVAS DE SOLUCION

Alternativa 01 : La alternativa seleccionada es el mejoramiento del camino Rural ya que permite mayor facilidad para el tráfico de vehículos de todo tipo y de las personas que transita por la calle

TIR : 12.00 **VAN :** 3,113,142.27 **CAE :** 417,161.06

Alternativa 02 : Con el mejoramiento Camino Rural se pretende mejorar tanto peatonal como vehicular

TIR : 12.00 **VAN :** 3,113,142.27 **CAE :** 417,161.06

Alternativa 03 : Contar con un proyecto que ayude al buen desarrollo del municipio de Guastatoya, El progreso.

TIR : 12.00 **VAN :** 3,113,142.27 **CAE :** 417,161.06

Justificación:

Actualmente los vecinos de la Aldea Tierra Blanca Municipio de Guastatoya Departamento de El Progreso se ven obligados a transitar por calles totalmente deterioradas; lo que ocasiona pérdida de tiempo en los trabajos de comercio; así como la movilización y transporte de productos

Descripción AJUSTADA:

EL PROYECTO CONSISTE EN EL MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL DE LA ALDEA TIERRA BLANCA COLOCANDO CARPETA DE RODADURA DE PAVIMENTO

Objetivos:

General:

Contribuir al desarrollo integral de los vecinos de la Aldea Tierra Blanca, Guastatoya El Progreso; a través del mejoramiento de Camino Rural y así que permita la mejor circulación de los vehículos y peatones y así la calle sea más transitada y no presente ya problemas en los tiempos de invierno

Específicos:

Mejorar las condiciones del tránsito vehicular y de personas a través del mejoramiento del camino

Facilitar la comercialización entre los habitantes beneficiados del sector.

Mejorar las condiciones de vida de las familias a través de la urbanización del sector.

Actual: Actualmente los habitantes de la Aldea Tierra Blanca, utilizan un camino en malas condiciones y para movilizarse y transportar sus productos. Debido a las lluvias este tramo se ha deteriorado y existen baches y aguas estancadas

Resultados esperados:

Con el Mejoramiento del Camino contribuirá a mejorar el flujo vehicular por la comunidad; lo que permitirá la apertura de nuevos negocios por la facilidad para ingreso de comerciantes con sus mercaderías

Beneficiarios :

Tipificación de la población :

Población Afectada	27,407
Población Objetivo	6,852
Población Proyectada	24,821

Caracterización de la población por EDAD :

	Hombres :	Mujeres :
Menores de 4 años	480	720
De 5 a 13 años	1,360	2,040
De 14 a 18 años	1,920	2,880

De 19 a 28 años	2,643	3,964
De 29 a 50 años	1,960	2,940
De 51 a 60 años	1,520	2,280
De 61 en adelante	1,080	1,620

Clasificación por ETNIA :

Ladino / Mestizo	26,584
Otro	823

Clasificación por ZONA :

Urbana	16,444
Rural	10,963

Costo/eficiencia:

TIR:

%

VAN:

Empleo a requerir:

	Durante la ejecución en hombre/mes	Durante la operación en hombre/mes
Calificada		
No calificada		

Situación del terreno:

Ninguno

Diseños (especificaciones):

Vida útil del proyecto:

20 años

Fecha de inicio de la operación:

01-JAN-23

Institución responsable de operación:

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

Costo anual de operación:

Información Técnica AJUSTADA:

Duración del proyecto: Inicio: 01/01/2023 Finalización: 31/12/2023 Duración: 12 meses.

Meta GLOBAL del proyecto: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 3,480.00 Metro cuadrado

Costo TOTAL del proyecto Q.: 2,769,159.00

Metas ANUALES del proyecto :

Año	Descripción de la meta	Unidad de medida	Vigente	% Ejec.
2,022	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL	Metro cuadrado	3,480.00	.00
2,023	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL	Metro cuadrado	3,480.00	.00

Programación FISICA Multianual

Rubro	Unidad de medida	Program.
-------	------------------	----------

2,023

base	m²	3,480
Construcciones complementarias	m²	850
Trabajos preliminares	m²	3,480
Superficie de rodadura	m²	3,480
Sub bases	m²	3,480

Programación FISICA Mensual

Rubro	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
-------	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------

2,023

base	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290
Construcciones compleme	70	70	70	70	74	73	72	71	70	70	70	70
Trabajos preliminares	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290
Superficie de rodadura	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290
Sub bases	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290

Información FINANCIERA del Proyecto:
RESUMEN AJUSTE DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS

Ejercicio	Solicitado	Asignado	Ejecutado	% Financiero	% Físico
2023	2,770,159.00	2,769,159.00	.00	.00	.00%
			.00		

Avance Financiero: .00%

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2023	Monto Vigente	Desembolsado MINFIN	Ejecutado 2023
TOTAL :	2,770,159	2,769,159		
Recursos internos :	2,770,159	2,769,159		
Gobierno central :	2,769,159	2,769,159		
Comunidad :	500			
Aporte municipal :	500			
Otros aportes :				

Otras fuentes :				


PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL

Fuente de Financiamiento	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2023												
TOTAL	230,843	230,843	230,849	230,849	230,849	230,848	230,845	230,849	230,849	230,849	230,843	230,843
Recursos internos	230,843	230,843	230,849	230,849	230,849	230,848	230,845	230,849	230,849	230,849	230,843	230,843
Gobierno central :	230,763	230,763	230,763	230,763	230,763	230,766	230,763	230,763	230,763	230,763	230,763	230,763
Comunidad :	41	41	41	41	41	41	41	45	45	45	39	39
Aporte municipal :	39	39	45	45	45	41	41	41	41	41	41	41
Otros aportes :												
Otras fuentes:												



CONSTANCIA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA



MONTO RESERVADO VIGENTE (Q):

Q 2,770,159.00

CDP No. 10

MONTO EN LETRAS:

DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE 00/100

Ejercicio Fiscal: 2023

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

FECHA DE EMISION:

lunes, 06 de febrero de 2023

MODALIDAD DE COMPRA O CONTRATACION:

LICITACION

NUMERO DE OPERACIÓN GUATECOMPRAS:

DESCRIPCION DEL PROCESO:

MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TIERRA BLANCA GUASTATOYA, EL PROGRESO

NIT:

NOMBRE O RAZON SOCIAL:

CORREO ELECTRONICO:

PROGRAMCION No.:

ESTRUCTURA (S) PRESUPUESTARIA (S) ASIGNADA (S):

Q 2,770,159.00

23-00-001-000-013

REGLON # 331

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

21-0101-0001 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA-PAZ


31-0101-0004 CONCEJO DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

31-3101-0002 APOORTE DE LA COMUNIDAD PARA INVERCION

MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TIERRA BLANCA GUASTATOYA, EL PROGRESO

Q 2,770,159.00

DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE 00/100


Edgar Ivan Monterroso Gonzalez
Encargado de Presupuesto



ULTIMA LINEA



06/02/2023
