


CONTRATO DE EJECUCION DE PROYECTOS VEINTIDOS GUION DOS MIL VEINTITRES (22-2023)

**CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN COLONIA NUEVA VIDA, BARRIO EL PORVENIR,
GUASTATOYA, EL PROGRESO
NOG. 20031939**

En el Municipio de Guastatoya, del departamento de El Progreso, el día **DOCE (12) DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS (2023)**. **NOSOTROS:** Por una parte comparezco Yo, **JORGE ANTONIO ORELLANA PINTO**, de cincuenta y un años de edad, casado, guatemalteco, Licenciado en Administración de Empresas, domiciliado en el departamento de El Progreso, me identifico con el documento personal de identificación -DPI-, Código Único de Identificación -CUI-, dos mil quinientos setenta espacio cincuenta y tres mil novecientos sesenta y cuatro espacio cero dos cero uno, (2570 53964 0201), extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala; DE LA CALIDAD CON QUE ACTUO. Actúo en calidad de **Alcalde Municipal**, de la ciudad de Guastatoya, del departamento de El Progreso, calidad que acredito, con la certificación del acta de toma de posesión, dos guion dos mil veinte (2-2020), de fecha quince de enero de dos mil veinte, contenida en el libro número dos mil seiscientos cuarenta y siete (2647), de sesiones extraordinarias del Concejo Municipal, debidamente autorizado por la Contraloría General de Cuentas, y el Acuerdo número cero cero uno guion dos mil diecinueve (001-2019), de la Junta Electoral Departamental de El Progreso, con el número de **CUENTADANCIA: Gestión dos mil veintidós guion doscientos guion doscientos uno guion veintidós guion cero cero uno (2022-200-201-22-001)**; y por la otra parte comparezco Yo, **EDDIE ERLY DANNIERY PORTILLO LIMA**, de veintiséis años de edad, soltero, Guatemalteco, Constructor, domiciliado en el departamento de El Progreso, se identifica con el Documento Personal de Identificación -DPI- tres mil cincuenta y uno espacio veinticuatro mil seiscientos veinticinco espacio cero doscientos uno (3051 24625 0201), extendido por el Registro Nacional de las Personas, actúo en calidad de **PROPIETARIO** de la Empresa Mercantil denominada **MULTISERVICIOS PL**, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de la República de Guatemala, con Registro 876678, folio 768 del libro 1091 de Empresas Mercantiles, con dirección del propietario Aldea El Barreal, Guastatoya, El Progreso, y con el número de identificación tributaria ochenta y nueve millones, trescientos sesenta mil, ciento cuarenta y uno 89360141; con Registro de actualización del Registro General de Adquisiciones del Estado Expediente 202392499 RGAE-2023, Resolución 202398444 y constancia de inscripción y precalificación como proveedor del Estado, resolución 202399552, constancia con vigencia hasta el 27 de septiembre de 2024, con el cual hace constar la capacidad económica y las especialidades de la sociedad referida, constancias emitidas por el Registro General de Adquisiciones del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas. Ambos comparecientes manifestamos encontrarnos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles y que las representaciones que acreditamos son suficientes de conformidad con la ley y a nuestro juicio para celebrar el presente contrato, toda la documentación indicada se tiene a la vista y en lo sucesivo simplemente se denominará LA MUNICIPALIDAD y "EL CONSTRUCTOR", sujetándonos a las cláusulas siguientes.

PRIMERA: El Licenciado **JORGE ANTONIO ORELLANA PINTO**, Alcalde Municipal, manifiesto que actúo en representación de la Municipalidad de Guastatoya del departamento de El Progreso, y expongo que de conformidad con el Punto Resolutivo emitido por la Autoridad Superior, contenido en el **ACUERDO 54-2023, de fecha doce de junio de dos mil veintitrés, del libro de Acuerdos de la Alcaldía Municipal**, libro debidamente autorizado por la Contraloría General de Cuentas, en la cual la Autoridad Superior aprueba la adjudicación realizada por la Junta de Licitación, para la ejecución del



¡GUASTATOYA seguirá cambiando!





proyecto denominado **CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN COLONIA NUEVA VIDA, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO**, de conformidad con las bases técnicas, especificaciones generales y planos presentados. El presente contrato se suscribe con fundamento en los artículos 9, numeral 6) literal b), artículo 47, 49, del a Ley de Contrataciones del Estado y sus Reformas y Artículo 42 del Reglamento de la misma ley, 53 literal I del Decreto 12-2002 Código Municipal y sus reformas; se tienen incorporados al instrumento contractual el proceso establecido en la Ley de Contrataciones del Estado, la oferta presentada por el constructor y la adjudicación correspondiente.

SEGUNDA: El Constructor se compromete a ejecutar para la Municipalidad de Guastatoya, el proyecto denominado **CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN COLONIA NUEVA VIDA, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO**, obra que se encuentra en el sector urbano, de este municipio el que se ejecutará de conformidad con el presupuesto presentado por la Empresa Constructora.

Región No.	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario (Q)	Precio Total (Q)
1.00	LIMPIEZA DE MURO Y CARPETA EXISTENTE	26.00	ML	1,825.45	47,461.70
2.00	EXCAVACION	180.00	M3	207.10	37,278.00
3.00	CIMIENTO CORRIDO PARA MURO	26.00	ML	6,554.00	170,404.00
4.00	FUNDICION DE MURO DE CONCRETO CICLOPEO	122.00	M3	3,172.05	386,990.10
5.00	RELLENO CONTROLADO LADO ACTIVO DE MURO	70.00	M3	551.30	38,591.00
6.00	LEVANTADO DE MURO DE BLOCK Y MALLA SOBRE MURO DE CONTENCIÓN	26.00	ML	1,343.06	34,919.56
7.00	PREPARACION DE SUB BASE DE PAVIMENTO	252.00	M2	78.72	19,837.44
8.00	PREPARACION DE BASE DE PAVIMENTO	252.00	M2	124.85	31,462.20
9.00	PAVIMENTO 0.12M + ELECTROMALLA	252.00	M2	477.00	120,204.00
10.00	BORDILLO	70.00	M	180.00	12,600.00
TOTAL					899,748.00

El tiempo de entrega de la obra es de **SEIS (6) MESES CALENDARIO**, de conformidad con el cronograma de ejecución presentado por el constructor, el plazo referido se computará a partir de la aprobación del contrato a la fecha de aprobación de la liquidación del mismo.

TERCERA: EL CONSTRUCTOR: Por su parte manifiesta que respecto a la ejecución del proyecto reitera que se compromete a lo siguiente: a) entregar totalmente terminada la obra a satisfacción de



¡GUASTATOYA seguirá cambiando!





la Municipalidad de Guastatoya. b) a contratar un Profesional quien será el Supervisor de Proyectos Residente, quien conjuntamente con el Ingeniero Supervisor de la Municipalidad informarán en forma simultánea a la Autoridad Administrativa, al Concejo Municipal y a la Contraloría General de Cuentas de la Nación cuando lo requiera, de los avances físicos del proyecto y las estimaciones de pago, para el efecto deberán presentar las fotocopias de la bitácora del Proyecto, autorizada por la Contraloría General de Cuentas.

CUARTA: El señor Alcalde Municipal en representación de la Municipalidad de Guastatoya, manifiesta que está de acuerdo en las condiciones del constructor, especialmente en lo que respecta al total del proyecto; así como en el tiempo de entregar la obra, ambos de común acuerdo llegaron a establecer la forma de pago de la manera siguiente:

QUINTA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato pactado entre la Municipalidad y la Empresa Mercantil **MULTISERVICIOS PL**, asciende a la cantidad de **OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO QUETZALES (Q. 899,748.00)**, incluido el impuesto al valor agregado -IVA-, los que se pagarán con fondos de -INVERSION- de conformidad con la constancia de disponibilidad presupuestaria, de conformidad con la estructura presupuestaria 23-000-001-000-012 RENGLON # 331, FUENTE DE FINANCIAMIENTO 32-0101-0014 y 32-0101-0017. Los pagos se efectuarán de conformidad con el artículo 58 de la Ley de Contrataciones del Estado, de la manera siguiente: a). Un anticipo del veinte por ciento (20%) equivalente a la cantidad de **CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE QUETZALES CON SESENTA CENTAVOS (Q. 179,949.60)**, el que se entregará previo a cumplir con los siguientes requisitos: I). Otorgar a la Municipalidad **PLAN DE INVERSIÓN, FIANZA DE ANTICIPO, FIANZA DE CUMPLIMIENTO**, las cuales garantizarán la correcta aplicación del mismo con fundamento en Artículos 64, 65, 66, de la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas y los artículos 53, 54, 55, 56, 58 Y 59 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y, II). Los **PAGOS SIGUIENTES, se efectuarán de conformidad con las estimaciones de pago de conformidad con el artículo 59 de la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas, en el cual la Municipalidad de Guastatoya, hará los pagos contra las estimaciones periódicas de trabajo ejecutado y aceptado, las que podrán efectuarse mensualmente, trabajos debidamente comprobados, con los informes presentados por el Supervisor del Proyecto Residente juntamente con el Supervisor de Proyectos de la Municipalidad de Guastatoya.** III). El último pago equivalente al 100% de avance físico del proyecto, presentando para el efecto, **GARANTIA DE CONSERVACION DE OBRA, CALIDAD O FUNCIONAMIENTO, FIANZA DE SALDOS DEUDORES, ACTA DE RECEPCIÓN DEL PROYECTO POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD E INFORME FINAL DE LOS SUPERVISORES PROFESIONALES DEL PROYECTO.**

SEXTA: SANCIONES: El constructor se compromete a entregar los trabajos conforme el contrato suscrito. Y en caso de atraso por parte del Constructor en la entrega de los trabajos, se determinará el atraso en la entrega de la obra con base en las fechas de terminación, parciales o total, fijadas en el programa de ejecución convenido, debiendo aplicarse las multas sin perjuicio de la facultad que tiene la entidad contratante para exigir el cumplimiento del contrato para rescindirlo. Para efecto de la multa, se tomará en cuenta solo la parte proporcional del atraso, por lo que su aplicación no debe afectar la parte del cumplimiento parcial. Se sancionará con el pago de una multa que se aplique al contratista entre el uno al cinco por millar del monto de los trabajos, que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente, por cada día de atraso en que incurra el contratista desde la fecha de terminación pactada hasta la total conclusión de los mismos, en ningún caso podrán ser superiores en su conjunto al monto de la garantía de cumplimiento. Asimismo, el Constructor deberá cumplir con los trabajos estipulados en el presente contrato y la Municipalidad no concederá ningún plazo de prórroga a excepción de los siguientes casos: a). si se trata de órdenes de trabajo extra u otros convenios, b). Indicar claramente el plazo improrrogable que se le otorgue al constructor para el trabajo correspondiente y deberá solicitarlo dentro del plazo que indica el Artículo 43, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas.

En relación a lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas, el atraso de la entrega de la obra, por causa imputable al contratista será sancionado del 1 al 5 por millar del monto de las obras que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente, calculando a





partir de las fechas pactadas de la entrega parcial o total con respecto a la ejecución convenida con la entidad contratante. Dicha multa solamente se tomará de la parte proporcional del atraso, sin afectar el cumplimiento parcial.

Tasa cálculo	de	Días
1o/oo		1 a 20
2o/oo		21 a 30
3o/oo		31 a 60
4o/oo		61 a 120
5o/oo		121 hasta su cumplimiento

La entidad ejecutora será la que emita las sanciones correspondientes.

SEPTIMA: OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR: El constructor se obliga a presentar informes periódicos, cronograma de ejecución de la obra, bitácora de los trabajos de conformidad con el Artículo 37 inciso a). del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, deben de autorizar los libros en la Dirección de Infraestructura Pública de la Contraloría General de Cuentas, así como permitir en cualquier momento que las personas autorizadas por la Municipalidad supervisen las actividades que se desarrollan, asimismo instruirá a su personal para que se le preste la debida colaboración a las personas que supervisan y que son parte de esta Municipalidad, el Constructor deberá de revisar cuidadosamente los documentos contractuales y señalará cualquier omisión o error, contradicción o incongruencia que observe a este respecto, deberá formular la consulta y observación del caso antes de los quince días de ejecutar el proyecto, el constructor previamente a la adquisición de materiales deberá proporcionar a la Municipalidad cuando esto lo requiere muestras de materiales para analizarlos y aprobarlos. El Constructor queda facultado para retirar de la obra a cualquier trabajador que considere incompetente, negligente insubordinado o perjudicial a la buena marcha de dichos trabajos. El constructor deberá de aprobar las herramientas, materiales, mano de obra, transporte y demás elementos necesarios.

OCTAVA: CLAUSULA RELATIVA AL COHECHO: Yo el Contratista, bajo juramento de Ley, manifiesto que conozco las penas relativas al delito de cohecho así como las disposiciones contenida en el Capítulo III del Título XIII del Decreto 17-73 del Congreso de la República, Código Penal. Adicionalmente, conozco las normas jurídicas que facultan a la Autoridad Superior de la entidad afectada para aplicar las sanciones administrativas que pudieren corresponderme, incluyendo la inhabilitación en el sistema GUATECOMPRAS".

NOVENA: OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD: a) La Municipalidad se obliga a efectuar el pago en tiempo y en formas convenidas, b). Faccionar el acta de inicio y avances físicos y actas de recepción para realizar la liquidación final de los trabajos a ejecutar y prestar la colaboración necesaria para el constructor para realizar los mismos, c). Designar a la persona o Personas que supervisen los trabajos del proyecto citado anteriormente previa inspección final.

DECIMA: OTRAS OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR: a). Se compromete a sostener el precio de la oferta, b). Entregar la obra en el tiempo y lugar indicado, c). Ejecutar la obra con material de buena calidad y garantizados de conformidad con lo que estipula la ley de contrataciones del estado, d). Contratar mano de obra necesaria y suficiente para la realización del proyecto, y se compromete a obtener en este municipio el cual será calificado por el constructor, e). Es responsable por el trabajo ejecutado por las personas que contrate así como de los daños y perjuicios que causen a terceras personas como consecuencia de la realización de la obra contratada. f). De conformidad con el artículo 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, se podrá ampliar el monto del contrato, previo que sean aprobadas las ordenes de cambio, ordenes de trabajo suplementario o acuerdo de trabajo extra, y se suscribirá un contrato adicional de conformidad con el contenido relativo a la Ley de la materia.

DECIMA PRIMERA: FIANZAS: 1. El constructor se obliga a presentar:





1. **FIANZA DE SOSTENIMIENTO DE OFERTA** no menor del uno por ciento (1%) ni mayor del cinco por ciento (5%) del valor del contrato, que cubrirá el periodo comprendido desde la recepción y apertura de pliegos hasta la aprobación de las adjudicaciones, y, en todo caso, tendrá una vigencia de ciento veinte (120) días, como lo establece el artículo 64 de la Ley de Contrataciones.

2. **FIANZA DE CUMPLIMIENTO:** Como requisito previo para la aprobación del presente contrato de conformidad con el Artículo 65 de la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas, que garantizara el cumplimiento de todas las obligaciones estipuladas en el contrato, el contratista deberá prestar fianza, depósito en efectivo o constituir hipoteca en los porcentajes y condiciones que señale el reglamento. Para el caso de obras, además esta garantía cubrirá las fallas o desperfectos que aparecieran durante la ejecución del contrato, antes que se constituya la garantía de conservación. **Por un valor del diez por ciento (10%) del monto del contrato respectivo.**

La Garantía de Cumplimiento deberá estar vigente, según el caso:

1. Cuando se trate de la adquisición de bienes, suministros y servicios hasta que la entidad interesada extienda la constancia de haber recibido a su entera satisfacción la garantía de calidad o de funcionamiento, o haberse prestado el servicio en su caso;
2. Cuando se trate de construcción de obras, hasta que la entidad interesada extienda la constancia de haber recibido a su satisfacción la garantía de conservación de obra.

Para los casos en que las bases del contrato respectivo, se contemplen recepciones parciales para el cumplimiento del objeto del contrato, se podrá ajustar la garantía de cumplimiento conforme se establezca en dichos instrumentos y siempre que se cuente con la constancia a que se refiere el presente artículo.


3. **FIANZA DE ANTICIPO:** Previo a recibir cualquier suma por concepto de anticipo, el contratista constituirá garantía mediante fianza o hipoteca por el monto de un cien por ciento (100%) del mismo. La garantía podrá reducirse en la medida que se amortice el valor del anticipo cubriendo siempre el máximo del saldo deudor y estará vigente hasta su total amortización. El reglamento establecerá el procedimiento de reducción y lo concerniente en los casos de rescisión, resolución y terminación de contrato.

4. **FIANZA DE CONSERVACION DE LA OBRA O DE LA CALIDAD DE FUNCIONAMIENTO:** El contratista responderá por la conservación de la obra, mediante depósito en efectivo, fianza, hipoteca o prenda, a su elección, que cubra el valor de las reparaciones de las fallas o desperfectos que le sean imputables y que aparecieran durante el tiempo de responsabilidad de dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha de recepción de la obra. Tratándose de bienes y suministros, deberá otorgarse garantía de calidad y/o funcionamiento, cuando proceda. La garantía de conservación de obra, o de calidad y/o funcionamiento, deberá otorgarse por el equivalente al quince por ciento (15%) del valor original del contrato, como requisito previo para la recepción de la obra, bien o suministro. El vencimiento del tiempo de responsabilidad previsto en el párrafo anterior, no exime al contratista de las responsabilidades por destrucción o deterioro de la obra debido a dolo o culpa de su parte, por el plazo de cinco (5) años, a partir de la recepción definitiva de la obra.

Garantía de Conservación de obra, calidad o funcionamiento. El contratista dentro de los veinte (20) días calendario previo a la finalización de la vigencia de la garantía de cumplimiento de contrato, deberá presentar la garantía de conservación de obra, calidad o funcionamiento, según corresponde de conformidad con lo siguiente:

- a) Para el caso de obras, la garantía de conservación de obras.
- b) Para el caso de maquinaria, medios de transporte, equipos instalados u otros equipos cuyo funcionamiento deba garantizarse por el contratista en el tiempo que determina La Ley o el contrato, la garantía de funcionamiento.
- c) Para el caso de bienes que no se incluyen en los indicados en la literal anterior, corresponderá a la entidad contratante determinar la procedencia de la presentación de la garantía de calidad.

Para las adquisiciones de suministros e insumos consumibles que por su naturaleza sean de alta rotación y a los servicios, no les será aplicable la presentación de la garantía de calidad o funcionamiento, en virtud de su fungibilidad y la intangibilidad de determinados servicios; debiendo en todo caso, sujetar su plazo en el contrato respectivo, siendo responsabilidad de la entidad contratante establecer en las bases y en el contrato, los medios u otras garantías que aseguren el cumplimiento del contratista respecto al objeto del contrato.






5. FIANZA DE SALDOS DEUDORES Para garantizar el pago de saldos deudores que pudieran resultar a favor del Estado, de la entidad correspondiente o de terceros en la liquidación, el contratista deberá prestar fianza, depósito en efectivo; constituir hipoteca o prenda, a su elección, por el cinco por ciento (5%) del valor original del contrato. Esta garantía deberá otorgarse simultáneamente con la de conservación de obra como requisito previo para la recepción de la obra, bien o suministro. Aprobada la liquidación, si no hubiere saldos deudores, se cancelará esta garantía.

Las fianzas descritas en el presente contrato, deberán formalizarse mediante póliza emitida por instituciones autorizadas para operar en Guatemala, de conformidad con las siguientes disposiciones: La vigencia de las fianzas será exactamente igual al plazo contractual y deberá ajustarse ante cualquier ampliación o variación del contrato, manteniendo las condiciones de cobertura que aplicaron al contrato original. Lo anterior no es aplicable a las fianzas de conservación de obra, de calidad, de funcionamiento o de saldos deudores. a) Las fianzas garantizarán exacta y fielmente las obligaciones a cargo del contratista o proveedor. Estas obligaciones deben estar estipuladas en el contrato original y en cada una de las modificaciones documentadas. b) El funcionario que corresponda será responsable de exigir la actualización de las fianzas otorgadas por el contratista o proveedor. De omitirlo, el funcionario incurrirá en incumplimiento de deberes. c) El contratista o proveedor que omita actualizar la fianza otorgada ante modificaciones del contrato original, se hará acreedor a una multa y a la suspensión inmediata de los pagos a que tenga derecho. d) Cuando la garantía consistiere en depósitos, deberá hacerse en Quetzales o por medio de cheque certificado. Cuando la garantía sea hipotecaria o prendaria, se formalizará a través de escritura pública debidamente registrada. En todo caso, quedará a criterio del contratista o proveedor la garantía a proporcionar. Las fianzas deberán publicarse en el sistema GUATECOMPRAS. Las juntas a las que se refiere el artículo 10 de esta Ley, serán responsables de verificar la autenticidad de las fianzas de sostenimiento de oferta, y las autoridades suscriptoras de los contratos serán responsables de verificar la autenticidad de las demás fianzas a las que se refiere este capítulo. El sistema GUATECOMPRAS llevará un registro de las fianzas presentadas, así como de las solicitudes de ejecución, ejecución de fianzas y pago de las mismas. Con fundamento en el artículo 69 de la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas

DECIMA SEGUNDA: FORMA DE EFECTUAR LOS TRABAJOS DEL CONSTRUCTOR: El constructor efectuará los trabajos bajo estricta responsabilidad bajo la supervisión de un Profesional del Ramo, colegiado activo de quién deberá presentar la certificación o constancia correspondiente; asimismo incluirá los materiales, mano de obra, equipo y demás elementos necesarios para la correcta aplicación y ejecución del proyecto, mismas que se estarán supervisando por el Ingeniero Supervisor de Obras Municipales, quien cuenta con el aval y aprobación de la Corporación Municipal, así como de la comisión de recepción de la citada obra. El Constructor se compromete a dejar limpias las áreas donde se ejecute el proyecto.

DECIMA TERCERA: CONTROVERSIAS: Toda controversia que pudiera surgir entre los contrayentes en lo que se refiere a la interpretación cumplimiento, aplicación y ejecución de este contrato será resuelto en el menor tiempo posible en forma conciliatoria entre ambas partes y en última instancia de no ponerse de acuerdo en el Tribunal correspondiente de lo contencioso administrativo de conformidad con el Artículo 102 de la citada ley; asimismo que se acepta los procedimientos señalados en el Código Procesal Civil y Mercantil, renunciando el constructor al fuero de su domicilio y señalando como lugar para recibir notificaciones y citaciones BARRIO EL CALVARIO, GUASTATOYA, EL PROGRESO.

DECIMA CUARTA: TERMINACION DEL CONTRATO: La Municipalidad puede dar por terminado, resuelto y/o rescindido el presente contrato en forma unilateral y sin responsabilidad de su parte en los siguientes casos: a). Por vencimiento del plazo pactado, siempre que no haya ocurrido prórroga, b). Si el constructor incumple con sus obligaciones, c). Si paraliza sin causa justificada los trabajos por más de diez días consecutivos, d). Por rescisión de mutuo acuerdo, e). Si el constructor le fueren embargado bienes y que evidentemente afecten el cumplimiento del contrato.





DECIMA QUINTA: PROHIBICIONES: EL CONSTRUCTOR: declara bajo juramento de ley y bien enterados de las penas relativas al delito de perjurio que no se encuentra comprendido dentro de las limitaciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Y que, si en el transcurso del proceso de adquisición o en la ejecución de un contrato se presenta alguna de las prohibiciones definidas en el artículo 80 de la Ley, el contratista o proveedor deberá hacerlo de conocimiento de la autoridad competente dentro de los dos días siguientes al conocimiento del acaecimiento de la prohibición, para que ésta analice la situación planteada y resuelva sobre el proceso del contrato.

La falta de aviso sobre el acaecimiento de alguna de las prohibiciones definida en la Ley, será causal suficiente para la inhabilitación del contratista o proveedor, quien de conformidad con la ley será responsable de compensar a la entidad contratante por los daños y perjuicios ocasionados.

El trámite de la inhabilitación y de la rehabilitación es responsabilidad de la entidad contratante o ejecutora, quien deberá cumplir con el procedimiento, plazos y condiciones que definan las Normas de Uso del Sistema GUATECOMPRAS y, en todo caso, debe respetarse el derecho de defensa.

La inhabilitación y la rehabilitación en el Sistema GUATECOMPRAS implica la correspondiente inhabilitación o rehabilitación en el Registro General de Adquisiciones del Estado.

DECIMA SEXTA: INSPECCION, RECEPCION Y LIQUIDACION FINAL: 1. El constructor deberá de permitir en cualquier momento que las personas autorizadas por la Municipalidad Inspeccionen las instalaciones, actividades y trabajos que realicen e instruirá a su personal para que atiendan a las personas nombradas proporcionándoles toda información requerida. 2. La Municipalidad nombrará una comisión receptora de los trabajos y harán la inspección correspondiente ante la presencia del constructor su representante legal y posteriormente informarán al Concejo Municipal si se puede faccionar el acta de recepción respectiva para que la Dirección de Administración Financiera efectúe la liquidación final o en su defecto si hay que corregir algunos trabajos o complementar otros, en este último caso deberá indicar cuales son los trabajos a efectuar y el tiempo a emplear y si el plazo es necesario se incluye dentro del tiempo contractual o le concede o no algún tiempo adicional.

DECIMA SEPTIMA: APROBACION: Para que el presente contrato surta sus efectos legales y obligue a las partes al cumplimiento de las cláusulas contenidas deberá ser aprobado de conformidad con el artículo 42 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas.

DECIMA OCTAVA: ACEPTACION DEL CONTRATO: En todos los términos y condiciones estipuladas LA MUNICIPALIDAD Y EL CONSTRUCTOR aceptan para si el presente contrato el que se encuentra contenido en siete (7), hojas membretadas impresas de un solo lado, leemos íntegramente lo escrito y bien enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo aceptamos, ratificamos y firmamos. Damos Fe.

LIC. JORGE ANTONIO ORELLANA PINTO
ALCALDE MUNICIPAL

EDDIE ERLY DANNIERY PORTILLO LIMA
PROPIETARIO MULTISERVICIOS PL





CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN Y PRECALIFICACIÓN COMO PROVEEDOR DEL ESTADO

Fecha de emisión de esta constancia: Guatemala, 27 de abril de 2023.

Estatus: HABILITADO

202399552



EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Hace constar

Que a la presente fecha EDDIE ERLY DANNIERY PORTILLO LIMA con NIT 89360141 se encuentra INSCRITO en el REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO, en el folio 114962 del Libro de INSCRIPCIONES y registro número 11893 del LIBRO DE REGISTRO DE PROVEEDORES.

Esta constancia le habilita para proveer: OBRAS A ENTIDADES DEL ESTADO, HASTA UN MONTO MÁXIMO DE CONTRATACIÓN DE OCHENTA MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE QUETZALES CON VEINTICUATRO CENTAVOS (Q. 80,603,439.24). Como resultado de la evaluación de la capacidad técnica y financiera del proveedor.

Asimismo, precalificado en la especialidad o especialidades siguientes: (Si no se listan especialidades, se debe a que el proveedor no acreditó documentación de respaldo requerida).

- 4101 - Construcción de edificios
- 4216 - Carreteras de terracería ✓✓
- 4312 - Preparación del terreno
- 7117 - Asesoría y/o estudios de diseño y supervisión en otras áreas especializadas de ingenierías, avalúos
- 4211 - Carreteras pavimentadas ✓✓
- 4311 - Demoliciones
- 4313 - Movimientos de tierra y/o excavaciones ✓✓
- 4321 - Instalaciones eléctricas
- 4219 - Muros de contención ✓✓
- 4663 - Venta de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción
- 4103 - Mantenimiento y remodelación de edificios
- 4226 - Sistemas de saneamiento y drenaje
- 4217 - Mantenimiento de carreteras
- 4224 - Sistemas de captación, conducción y distribución de agua
- 4330 - Terminación y acabado de edificios

Información comercial de la Entidad*:

- MULTISERVICIOS PL - ALDEA EL BARREAL GUASTATOYA, EL PROGRESO

ESTE DOCUMENTO ES VÁLIDO SIN FIRMA, SU AUTENTICIDAD PUEDE SER VERIFICADA INGRESANDO EL NÚMERO DE LA CONSTANCIA EN LA OPCIÓN VALIDAR CONSTANCIAS EN EL PORTAL www.rgae.gob.gt O A TRAVÉS DEL CÓDIGO QR DE ESTE DOCUMENTO.

NOTA:

- Los términos de la presente constancia se basan en la información y documentación presentada por el interesado bajo los términos y condiciones establecidos por el Registro General de Adquisiciones del Estado en el que declara que dicha información y documentación corresponden a la persona individual o jurídica identificada en esta constancia y sabiendo de la pena relativa al delito que establece el artículo 459 del Código Penal. No asumiendo el Registro responsabilidad alguna por omisión o actos previos o posteriores, realizados por los proveedores que transgredan el marco legal.

- El Registro General de Adquisiciones del Estado no prejuzga sobre procesos, procedimientos administrativos o requisitos que para una eventual contratación establezcan las entidades reguladas en el artículo 1 de la Ley de Contrataciones del Estado, ni sobre los procesos de ejecución o imputación de los renglones que para cada tipo de gasto corresponda, de acuerdo a la normativa aplicable.



CONSTANCIA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA



MONTO RESERVADO VIGENTE (Q):
MONTO EN LETRAS:

Q 900,000.00
NOVECIENTOS MIL 00/100

CDP No. 25
Ejercicio Fiscal: 2023

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
FECHA DE EMISION: miércoles, 12 de abril de 2023
MODALIDAD DE COMPRA O CONTRATACION: COTIZACION
NUMERO DE OPERACIÓN GUATECOMPRAS:

DESCRIPCION DEL PROCESO:

CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN COLONIA NUEVA VIDA BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO

NIT:
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
CORREO ELECTRONICO:

PROGRAMCION No.:

ESTRUCTURA (S) PRESUPUESTARIA (S) ASIGNADA (S):
23-000-001-000-0012 RENGLON # 331
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
32-0101-0014 SC-INGRESOS TRIBUTARIOS IVA-PAZ
32-0101-0017 SC-IMPUESTO DE CIRCULACION DE VEHICULOS

Q 900,000.00

CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN COLONIA NUEVA VIDA BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO

Q 900,000.00

NOVECIENTOS MIL 00/100


Edgar Ivan Monterroso Gonzalez
Encargado de Presupuesto



ULTIMA LINEA





Sistema Nacional de Inversión Pública -SINIP-

Fecha Emisión: 24/01/20
Hora: 12:48 P

0312709 - CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN COLONIA NUEVA VIDA,
BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO

Información General del Proyecto

SNIPgt

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO:

Nombre del proyecto: Forma Capital Fijo

CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN COLONIA NUEVA VIDA, BARRIO EL PORVENIR,
GUASTATOYA, EL PROGRESO

Institución responsable: GOBIERNOS LOCALES

Unidad ejecutora responsable: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

Modalidad de planificación : Planificación Institucional

Modalidad específica: Planificación Institucional

Finalidad-Función-Division:

Función:	DESARROLLO URBANO Y RURAL
Sub-función anterior :	DESARROLLO URBANO Y RURAL
	GUASTATOYA

Area de influencia: Municipal

Responsables:

Responsable del proyecto:

Nombre: JORGE ANTONIO ORELLANA PINTO
Cargo: ALCALDE MUNICIPAL
Teléfono: 79451594
Email: info@muniguastatoya.com

Formulador del proyecto:

Nombre: EDGAR ANIBAL CHAVEZ PALENCIA
Cargo: DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
Teléfono: 79451594
Email: dmp.guastatoya@gmail.com

Modalidad de ejecución del Proyecto : CONTRATO

DIAGNÓSTICO:

Antecedentes:

En la COLONIA NUEVA VIDA, BARRIO EL PORVENIR del municipio de Guastatoya del departamento de El Progreso, donde se necesita realizar el proyecto en mención se encuentra situado a 2,000 metros del Parque Central de Guastatoya. En la actualidad residen un aproximado de 11,190 habitantes, de los cuales el 98% son de origen ladino y el 2% de origen indígena, haciendo un total de 2,798 familias aproximadamente.

Las familias hace varios años, han tenido la necesidad de un muro de contención adobe. Por tal motivo fue así como en Asamblea Comunitaria se decidió facultar al Consejo Comunitario de Desarrollo (COCODE) para gestionar dicho proyecto quienes se dirigieron a la Municipalidad para solicitar el apoyo técnico en la realización de los estudios correspondientes y asesorar todos los trámites ante una institución que pudiera ejecutar el proyecto satisfaciendo así su necesidad.

Problemática / Arbol del Problema:

Efectos Indirectos

Efectos Directos

PROBLEMA CENTRAL:

Causas Indirectas

Causas Directas



Sistema Nacional de Inversión Publica -SINIP-

Fecha Emisión: 24/01/20
Hora: 12:48 P

0312709 - CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN COLONIA NUEVA VIDA,
BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO

Información General del Proyecto

SNIPgt

ALTERNATIVAS DE SOLUCION

Alternativa 01 :	TIR :	.00	VAN :	.00	CAE :	.00
Alternativa 02 :	TIR :		VAN :		CAE :	
Alternativa 03 :	TIR :		VAN :		CAE :	

Justificación:

Con la ejecución del Proyecto se contribuirá a brindar una calle adecuada para transitar, se fortalecer el ornato del municipio, un ambiente agradable, se mejora la calidad de vida de las personas, se reduce el riesgo de enfermedades generadas por accidentes e incidentes, así como reducir el riesgo de contraindicaciones en la salud física y mental

Descripción AJUSTADA:

EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN LA COLONIA NUEVA VIDA

Objetivos:

General:

Contribuir al ornato de la Colonia y así mejorar la calidad de vida de los habitantes.

Específicos:

- Mejorar las condiciones de vida de la población.
- Contribuir a la integración social de los habitantes.
- Mejorar el ornato.

Resultados esperados:

El mejoramiento de 80 metros cuadrados de Construcción de Muro de Contención

Beneficiarios :

Tipificación de la población :

Población Afectada	11,190
Población Objetivo	9,000
Población Proyectada	11,190

Caracterización de la población por EDAD :

	Hombres :	Mujeres :
Menores de 4 años	281	315
De 5 a 13 años	710	796
De 14 a 18 años	778	1,123
De 19 a 28 años	1,134	1,546
De 29 a 50 años	825	1,147
De 51 a 60 años	593	889
De 61 en adelante	421	632

Clasificación por ETNIA :

Ladino / Mestizo	10,966
Otro	223

Clasificación por ZONA :

Urbana	11,189
Rural	17,501



Sistema Nacional de Inversión Pública -SINIP-

Fecha Emisión: 24/01/20
Hora: 12:48 P

0312709 - CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN COLONIA NUEVA VIDA,
BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO

Información General del Proyecto

SNIPgt

Costo/eficiencia: TIR: % VAN:

Empleo a requerir:

	Durante la ejecución en hombre/mes	Durante la operación en hombre/mes
Calificada		
No calificada		

Situación del terreno: Ninguno

Diseños (especificaciones):

Vida útil del proyecto: 20 años

Fecha de inicio de la operación: 01-JAN-23

Institución responsable de operación: GOBIERNOS LOCALES

Costo anual de operación:

Información Técnica AJUSTADA:

Duración del proyecto: Inicio: 01/01/2023 Finalización : 31/12/2023 Duración : 12 meses.

Meta GLOBAL del proyecto : CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN 80.00 Metro cuadrado

Costo TOTAL del proyecto Q.: 900,000.00

Metas ANUALES del proyecto :

Año	Descripción de la meta	Unidad de medida	Vigente	% Ejec.
2,023	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN	Metro cuadrado	80.00	.00

Programación FISICA Multianual

Rubro	Unidad de medida	Program.
2,023		
Trabajos preliminares	m²	80
Cimentación	m²	80

Programación FISICA Mensual

Rubro	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2,023												
Trabajos preliminares	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
Cimentación	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	


Información FINANCIERA del Proyecto:

RESUMEN AJUSTE DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS

Ejercicio	Solicitado	Asignado	Ejecutado	% Financiero	% Fisico
2023	900,000.00	.00	.00	.00	.00%
			.00		

Avance Financiero: .00%

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2023	Monto Vigente	Desembolsado MINFIN	Ejecutado 2023
TOTAL :	900,000			
Recursos internos :	900,000			
Gobierno central :				
Comunidad :				
Aporte municipal :	900,000			
Otros aportes :				
Otras fuentes :				

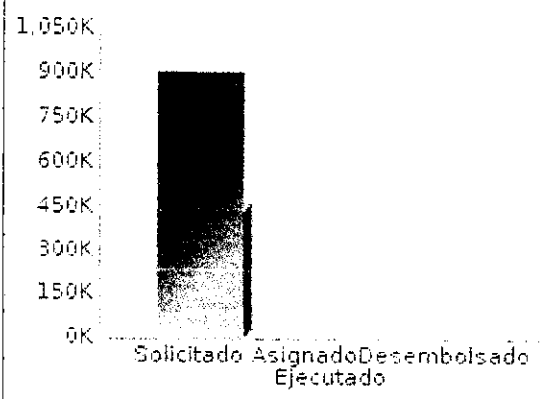

PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL

Fuente de Financiamiento	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2023												
TOTAL	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000



Sistema Nacional de Inversión Pública -SINIP-

0312709 - CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN COLONIA NUEVA VIDA,
BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO

Información General del Proyecto

Fecha Emisión: 24/01/20
Hora: 12:48 P

SNIPgt

Recursos internos	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000
Gobierno central :												
Comunidad :												
Aporte municipal :	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000
Otros aportes :												
Otras fuentes:												



Municipalidad de GUASTATOYA

Departamento de El Progreso, Guatemala, C.A.

info@muniguasta.com

www.muniguastatoya.com

Telefax: 7945-1594, 7945-1602, 7945-1603



Guastatoya, lunes, 31 de julio de 2023

SEÑOR(es):

ALCALDE MUNICIPAL Y
HONORABLE CORPORACION
GUASTATOYA, EL PROGRESO

Respetables señor(es):

El motivo del presente es para informar los resultados de la siguiente estimacion de pago:

No. De Supervision de Avance Físico:	ESTIMACION No.1		
Nombre del Proyecto:	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN COLONIA NUEVA VIDA, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO.		
No. De Contrato del Proyecto:	22-2023	Fecha del Contrato:	12/06/2023
NOG.	20031939		
Estimacion del Avance Físico:	56.0046480%		
Monto de Estimacion del Avance Físico:	Q503,900.70	en letras:	QUINIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS QUETZALES CON 70/100 CENTAVOS
Amorización del Anticipo:	Q100,780.14	en letras:	CIEN MIL SETECIENTOS OCHENTA QUETZALES CON 14/100 CENTAVOS
Cantidad Líquida a Recibir:	Q403,120.56	en letras:	CUATROCIENTOS TRES MIL CIENTO VEINTE QUETZALES CON 56/100 CENTAVOS

Se adjunta anexo que contiene el detalle de la presente estimacion para que se continúe con lo procedente.

Agradeciendo desde ya, me suscribo.

Atentamente,

ING. CARLOS RAMIRO ORTEGA LIMA

COLEGIADO: 7118

SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

Carlos Ramiro Ortega Lima
Ingeniero Civil
Col. 7118

ESTIMACION No.1

NOMBRE DEL PROYECTO:										CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN COLONIA NUEVA VIDA, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO.										PERIODO DEL:		AL		31-07-23	
FECHA INICIO DEL PROYECTO:										16 de Junio de 2023										Fecha Solicitud:		31 de Julio de 2023			
TIEMPO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO:										6 MESES															
FECHA DE ENTREGA:										15 de diciembre de 2023															
NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA:										MUTISERVICIOS PL															
REPRESENTANTE LEGAL EMPRESA CONSTRUCTORA:										RODRI ENY DANNIERY PORTELO LIMA															
CONCEPTO										CONTRATO										NUMERO		FECHA			
CONTRATO										22-2023												12-06-23			
MONEDERA DE CONTRATO										Q												899,748.00			
SIN																						312,709			
NO																						2003,939			
TRABAJO FÍSICO																									
CANTIDAD CONTRATADA										CANTIDAD EJECUTADA															
CANTIDAD CONTRATADA										CANTIDAD EJECUTADA															
CANTIDAD CONTRATADA										CANTIDAD EJECUTADA															
CANTIDAD CONTRATADA										CANTIDAD EJECUTADA															
CANTIDAD CONTRATADA										CANTIDAD EJECUTADA															
CANTIDAD CONTRATADA										CANTIDAD EJECUTADA															
CANTIDAD CONTRATADA										CANTIDAD EJECUTADA															
CANTIDAD CONTRATADA										CANTIDAD EJECUTADA															
CANTIDAD CONTRATADA										CANTIDAD EJECUTADA															
CANTIDAD CONTRATADA										CANTIDAD EJECUTADA															
CANTIDAD CONTRATADA										CANTIDAD EJECUTADA															
CANTIDAD CONTRATADA										CANTIDAD EJECUTADA															
CANTIDAD CONTRATADA										CANTIDAD EJECUTADA															
CANTIDAD CONTRATADA										CANTIDAD EJECUTADA															
CANTIDAD CONTRATADA										CANTIDAD EJECUTADA															
CANTIDAD CONTRATADA										CANTIDAD EJECUTADA															
CANTIDAD CONTRATADA										CANTIDAD EJECUTADA															
CANTIDAD CONTRATADA										CANTIDAD EJECUTADA															
CANTIDAD CONTRATADA										CANTIDAD EJECUTADA															
CANTIDAD CONTRATADA										CANTIDAD EJECUTADA															
CANTIDAD CONTRATADA										CANTIDAD EJECUTADA															
CANTIDAD CONTRATADA										CANTIDAD EJECUTADA															
CANTIDAD CONTRATADA										CANTIDAD EJECUTADA															
CANTIDAD CONTRATADA										CANTIDAD EJECUTADA															
CANTIDAD CONTRATADA										CANTIDAD EJECUTADA															
CANTIDAD CONTRATADA										CANTIDAD EJECUTADA															
CANTIDAD CONTRATADA										CANTIDAD EJECUTADA															
CANTIDAD CONTRATADA										CANTIDAD EJECUTADA															
CANTIDAD CONTRATADA										CANTIDAD EJECUTADA															
CANTIDAD CONTRATADA										CANTIDAD EJECUTADA															
CANTIDAD CONTRATADA										CANTIDAD EJECUTADA															
CANTIDAD CONTRATADA										CANTIDAD EJECUTADA															
CANTIDAD CONTRATADA										CANTIDAD EJECUTADA															
CANTIDAD CONTRATADA										CANTIDAD EJECUTADA															
CANTIDAD CONTRATADA										CANTIDAD EJECUTADA															
CANTIDAD CONTRATADA										CANTIDAD EJECUTADA															
CANTIDAD CONTRATADA										CANTIDAD EJECUTADA															
CANTIDAD CONTRATADA										CANTIDAD EJECUTADA															
CANTIDAD CONTRATADA										CANTIDAD EJECUTADA															
CANTIDAD CONTRATADA										CANTIDAD EJECUTADA															
CANTIDAD CONTRATADA										CANTIDAD EJECUTADA															
CANTIDAD CONTRATADA										CANTIDAD EJECUTADA															
CANTIDAD CONTRATADA										CANTIDAD EJECUTADA															
CANTIDAD CONTRATADA										CANTIDAD EJECUTADA															
CANTIDAD CONTRATADA										CANTIDAD EJECUTADA															
CANTIDAD CONTRATADA										CANTIDAD EJECUTADA															
CANTIDAD CONTRATADA										CANTIDAD EJECUTADA															
CANTIDAD CONTRATADA										CANTIDAD EJECUTADA															
CANTIDAD CONTRATADA										CANTIDAD EJECUTADA															
CANTIDAD CONTRATADA										CANTIDAD EJECUTADA															
CANTIDAD CONTRATADA										CANTIDAD EJECUTADA															
CANTIDAD CONTRATADA										CANTIDAD EJECUTADA															
CANTIDAD CONTRATADA										CANTIDAD EJECUTADA															
CANTIDAD CONTRATADA										CANTIDAD EJECUTADA															
CANTIDAD CONTRATADA										CANTIDAD EJECUTADA															
CANTIDAD CONTRATADA										CANTIDAD EJECUTADA															
CANTIDAD CONTRATADA										CANTIDAD EJECUTADA															
CANTIDAD CONTRATADA										CANTIDAD EJECUTADA															
CANTIDAD CONTRATADA										CANTIDAD EJECUTADA															
CANTIDAD CONTRATADA										CANTIDAD EJECUTADA															
CANTIDAD CONTRATADA										CANTIDAD EJECUTADA															
CANTIDAD CONTRATADA										CANTIDAD EJECUTADA															
CANTIDAD CONTRATADA										CANTIDAD EJECUTADA															
CANTIDAD CONTRATADA										CANTIDAD EJECUTADA															
CANTIDAD CONTRATADA										CANTIDAD EJECUTADA															
CANTIDAD CONTRATADA										CANTIDAD EJECUTADA															
CANTIDAD CONTRATADA										CANTIDAD EJECUTADA															
CANTIDAD CONTRATADA										CANTIDAD EJECUTADA															
CANTIDAD CONTRATADA										CANTIDAD EJECUTADA															
CANTIDAD CONTRATADA										CANTIDAD EJECUTADA															



Municipalidad de **GUASTATOYA**

Departamento de El Progreso, Guatemala, C.A.

info@muniguasta.com

www.muniguastatoya.com

Telefax: 7945-1594, 7945-1602, 7945-1603



Guastatoya, lunes, 31 de julio de 2023

SEÑOR(es):

ALCALDE MUNICIPAL Y
HONORABLE CORPORACION
GUASTATOYA, EL PROGRESO

Respetables señor(es):

Respetuosamente me dirijo a usted, con el proposito de REMITIR el INFORME
DE SUPERVISION que acontinuacion se describe:

Nombre del Proyecto:	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN COLONIA NUEVA VIDA, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO.		
No. De Contrato del Proyecto:	22-2023	Fecha del Contrato:	12/06/2023
NOG.	20031939		
Empres constructura:	MULTISERVICIOS PL		

Se realizo la visita al proyecto antes en mencion para hacer constar los avances
de los renglones contratados en su avance fisico notificado por la empresa
Constructora los cuales se describen a continuacion:

GUASTATOYA esta cambiando



Municipalidad de GUASTATOYA

Departamento de El Progreso, Guatemala, C.A.

info@muniguasta.com

www.muniguastatoya.com

Telefax: 7945-1594, 7945-1602, 7945-1603



26 ML DE LIMPIEZA DE MURO Y CARPETA EXISTENTE
149 M3 DE EXCAVACION
122 M3 DE FUNDICION DE MURO DE CONCRETO CICLOPEO
70 M3 DE RELLENO CONTROLADO LADO ACTIVO DE MURO

TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR

0 ML DE LIMPIEZA DE MURO Y CARPETA EXISTENTE
31 M3 DE EXCAVACION
26 ML DE CIMIENTO CORRIDO PARA MURO
0 M3 DE FUNDICION DE MURO DE CONCRETO CICLOPEO
0 M3 DE RELLENO CONTROLADO LADO ACTIVO DE MURO
26 ML DE LEVANTADO DE MURO DE BLOCK Y MALLA SOBRE MURO DE CONTENCIÓN
252 M2 DE PREPARACION DE SUB BASE DE PAVIMENTO
252 M2 DE PREPARACION DE BASE DE PAVIMENTO
252 M2 DE PAVIMENTO 0.12M + ELECTROMALLA
70 M DE BORDILLO

Estimacion del Avance Fisico:	56.0046480%
--------------------------------------	--------------------

Se adjunta anexo que contiene el detalle de la presente estimacion para que se continúe con lo procedente.

Agradeciendo desde ya, me suscribo.

Atentamente,

ING. CARLOS RAMIRO ORTEGA LIMA

COLEGIADO: 7118

SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

Carlos Ramiro Ortega Lima
Ingeniero Civil
Col. 7118

GUASTATOYA esta cambiando



Municipalidad de **GUASTATOYA**

Departamento de El Progreso, Guatemala, C.A.

info@muniguasta.com



www.muniguastatoya.com

Telefax: 7945-1594, 7945-1602, 7945-1603



INFORME
FOTOGRAFICO

CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN COLONIA
NUEVA VIDA, BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL
PROGRESO.

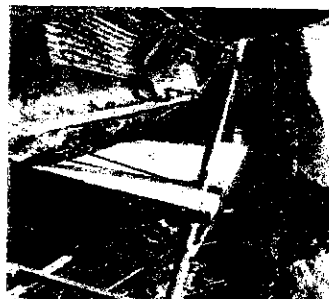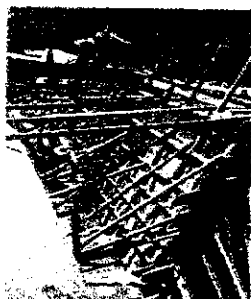

GUASTATOYA esta cambiando



MULTISERVICIOS PL
ALDEA EL BARREAL, GUASTATOYA EL PROGRESO
PROP. EDDIE ERLY DANNIERY PORTILLO LIMA
CEL. 5994-8581

Guastatoya, 31 de julio del 2023

SEÑOR
ALCALDE MUNICIPAL Y
HONORABLE CORPORACION
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA,
GUASTATOYA, EL PROGRESO.

Es un honor para mi, poderles expresar un profundo y respetuoso saludo, y a la vez comunicarles que en el proyecto denominado: **"CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN COLONIA NUEVA VIDA BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO."** El cual está respaldado con el contrato de obra No. 22-2023 de fecha 12 de junio 2023 y que mi empresa MULTISERVICIOS PL realiza para dicha municipalidad, cuenta ya con un avance físico del 56.0046480%, por lo que presento a ustedes el cuadro de estimación sobre dicho avance físico, y solicito a la vez la cancelación de dicho avance reportado.

Sin otro particular, me suscribo.

ATENTAMENTE:

EDDIE ERLY DANNIERY PORTILLO LIMA
MULTISERVICIOS PL

EDDIE ERLY DANNIERY PORTILLO LIMA
Aldea El Barreal, Guastatoya
Cel. 5994-8581

MULTISERVICIOS PL
ESTIMACION DE TRABAJO NO.1

Nombre del proyecto: Construcción Muro de Contención Colonia Nueva Vida Barrio El Porvenir Guastatoya, El Progreso.
Contrato No. 22-2023 Fecha: 12/06/2023

REGLONES DE TRABAJO/CANTIDADES		Monto Original del Contrato:				Q 899,748.00			
Renglón	DESCRIPCION	Cantidad Contratada		Cantidad EJEUTADA		Cantidad pendiente de EJEUTAR			
		Unidad	Cantidad	Precio	Costo total	Este	Acumulado	Q	%
1	LIMPIEZA DE MURO Y CARPETA EXISTENTE	ML	26.00	Q 1,825.45	Q 47,461.70	26.00		Q 47,461.70	100%
2	EXCAVACION	M3	180.00	Q 207.10	Q 37,278.00	149.00		Q 30,857.90	83%
3	CIMIENTO CORRIDO PARA MURO	ML	26.00	Q 6,554.00	Q 170,404.00			Q -	0%
4	FUNDICION DE MURO DE CONCRETO CICLOPEO	M3	122.00	Q 3,172.05	Q 386,990.10	122.00		Q 386,990.10	100%
5	RELLENO CONTROLADO LADO ACTIVO DE MURO	M3	70.00	Q 551.30	Q 38,591.00	70.00		Q 38,591.00	100%
6	LEVANTADO DE MURO DE BLOCK Y MALLA SOBRE MURO DE CONTENCIÓN	ML	26.00	Q 1,343.06	Q 34,919.56			Q -	0%
7	PREPARACION DE SUB BASE DE PAVIMENTO	M2	252.00	Q 78.72	Q 19,837.44			Q -	0%
8	PREPARACION DE BASE DE PAVIMENTO	M2	252.00	Q 124.85	Q 31,462.20			Q -	0%
9	PAVIMENTO 0.12M + ELECTROMALLA	M2	252.00	Q 477.00	Q 120,204.00			Q -	0%
10	BORDILLO	M	70.00	Q 180.00	Q 12,600.00			Q -	0%
Total cantidad contratada					Q 899,748.00			Q 503,900.70	56.0046480%
								Q 395,847.30	43.995355%


EDDIE ERLY DANBERRY PORTILLO
MUL.TISERVICIOS PL
Cel. 5994-8581
Aldea El Barreal, Guastatoya

Monto bruto de esta Estimación		Q	503,900.70
Anticipos		Q	179,949.60
Amortización de Anticipos 20%		Q	100,780.14
Monto neto de esta Estimación		Q	403,120.56
Menos 1er. Pago			
Menos 2do Pago			
Menos 3er. Pago			
Menos 4to. Pago			

Guastatoya 31 de julio del 2023



Liquido a Recibir		Q	403,120.56
-------------------	--	---	------------



MULTISERVICIOS PL
ALDEA EL BARREAL, GUASTATOYA EL PROGRESO
PROP. EDDIE ERLY DANNIERY PORTILLO LIMA
CEL. 5994-8581

INFORME FOTOGRAFICO

CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION COLONIA NUEVA VIDA BARRIO EL
PORVENIR GUASTATOYA, EL PROGRESO

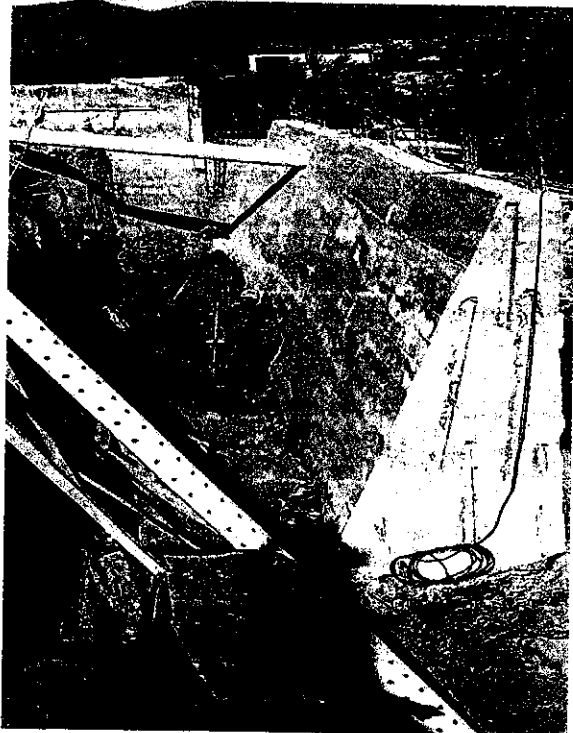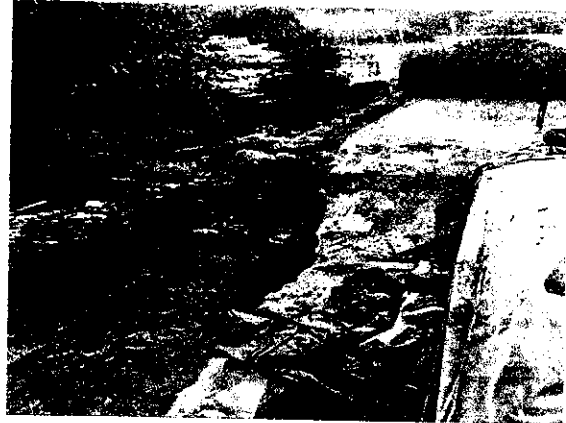

EDDIE ERLY DANNIERY PORTILLO LIMA
Aldea El Barreal, Guastatoya
CEL. 5994-8581
P.L.

