



**CONTRATO DE EJECUCION DE PROYECTOS VEINTIMUEVE GUION DOS MIL VEINTITRES  
(29-2023)**

**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN LOTIFICACION VISTA HERMOSA, GUASTATOYA, EL  
PROGRESO  
NOG. 20821832**

En el Municipio de Guastatoya, del departamento de El Progreso, el día **CATORCE (14) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS (2023)**. NOSOTROS: Por una parte comparezco Yo, **JORGE ANTONIO ORELLANA PINTO**, de cincuenta y dos años de edad, casado, guatemalteco, Licenciado en Administración de Empresas, domiciliado en el departamento de El Progreso, me identifico con el documento personal de identificación -DPI-, Código Único de Identificación -CUI-, dos mil quinientos setenta espacio cincuenta y tres mil novecientos sesenta y cuatro espacio cero dos cero uno, (2570 53964 0201), extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala; DE LA CALIDAD CON QUE ACTUO. Actúo en calidad de **Alcalde Municipal**, de la ciudad de Guastatoya, del departamento de El Progreso, calidad que acredito, con la certificación del acta de toma de posesión, dos guion dos mil veinte (2-2020), de fecha quince de enero de dos mil veinte, contenida en el libro número dos mil seiscientos cuarenta y siete (2647), de sesiones extraordinarias del Concejo Municipal, debidamente autorizado por la Contraloría General de Cuentas, y el Acuerdo número cero cero uno guión dos mil diecinueve (001-2019), de la Junta Electoral Departamental de El Progreso, con el número de **CUENTADANCIA: Gestión dos mil veintidós guion doscientos guion doscientos uno guion veintidós guion cero cero uno (2022-200-201-22-001)**; y por la otra parte comparezco Yo, **KELIAN GUILLERMO SOLARES ORELLANA**, de treinta y siete años de edad, casado, Guatemalteco, Constructor, domiciliado en el departamento de El Progreso, se identifica con el Documento Personal de Identificación -DPI- dos mil quinientos noventa y tres espacio noventa y cinco mil doscientos cincuenta espacio cero doscientos uno (2593 95250 0201), extendido por el Registro Nacional de las Personas, actúo en calidad de **Propietario** de la Empresa Mercantil denominada **"CONSTRUCTORA SOLAR"**, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de la República de Guatemala, con Patente de Comercio de Empresa, inscrita bajo el número de Registro **SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS DIECISEIS (661716)**, folio **OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE (879)**, del libro **SEISCIENTOS VEINTITRES (623)**, de Empresas Mercantiles, y con el número de identificación tributaria **33541728**; con Registro de actualización del Registro General de Adquisiciones del Estado Expediente **202362705** RGAE-2023 Resolución **202381325**, y constancia de Inscripción y precalificación como proveedor del estado, número **202381918**, con vigencia hasta el 5 de octubre de 2024, con el cual hace constar la capacidad económica y las especialidades de la empresa referida, constancias emitidas por el Registro General de Adquisiciones del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas. Ambos comparecientes manifestamos encontrarnos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles y que las representaciones que acreditamos son suficientes de conformidad con la ley y a nuestro juicio para celebrar el presente contrato, toda la documentación indicada se tiene a la vista y en lo sucesivo simplemente se denominará **LA MUNICIPALIDAD** y **"EL CONSTRUCTOR"**, sujetándonos a las cláusulas siguientes.

**PRIMERA:** El Licenciado **JORGE ANTONIO ORELLANA PINTO**, Alcalde Municipal, manifiesto que actúo en representación de la Municipalidad de Guastatoya del departamento de El Progreso, y



expongo que de conformidad con el Punto Resolutivo emitido por la Autoridad Superior, contenido en el **ACUERDO 96-2023, de fecha veintidós de mayo de dos mil veintitrés, del libro de Acuerdos de la Alcaldía Municipal**, libro debidamente autorizado por la Contraloría General de Cuentas, en la cual la Autoridad Superior aprueba la adjudicación realizada por la Junta de Licitación, para la ejecución del proyecto denominado **MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN LOTIFICACION VISTA HERMOSA, GUASTATOYA, EL PROGRESO**, de conformidad con las bases técnicas, especificaciones generales y planos presentados. El presente contrato se suscribe con fundamento en los artículos 9, numeral 6) literal b), artículo 47, 49, del a Ley de Contrataciones del Estado y sus Reformas y Artículo 42 del Reglamento de la misma ley, 53 literal I del Decreto 12-2002 Código Municipal y sus reformas; se tienen incorporados al instrumento contractual el proceso establecido en la Ley de Contrataciones del Estado, la oferta presentada por el constructor y la adjudicación correspondiente.

**SEGUNDA:** El Constructor se compromete a ejecutar para la Municipalidad de Guastatoya, el proyecto denominado **MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN LOTIFICACION VISTA HERMOSA, GUASTATOYA, EL PROGRESO**, obra que se encuentra en el sector urbano, de este municipio el que se ejecutará de conformidad con el presupuesto presentado por la Empresa Constructora.

| Ítem  | Descripción                                                                | Cantidad | Unidad de Medida | Precio Unitario | Precio Total |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-----------------|--------------|
| 1.00  | TRAZO Y ESTAQUEADO                                                         | 180.56   | M                | 10.00           | 1,805.60     |
| 2.00  | NIVELACION DE SUBBASE                                                      | 975.00   | M2               | 76.00           | 74,100.00    |
| 3.00  | COLOCACION +<br>COMPACTACION DE BASE<br>GRANULAR DE ESPESOR<br>DE 0.10 MTS | 938.00   | M2               | 110.00          | 103,180.00   |
| 4.00  | COLOCACION DE ADOQUIN<br>TRAFICO LIVIANO                                   | 916.00   | M2               | 226.50          | 207,474.00   |
| 5.00  | CAMA DE ASIENTO DE<br>ARENA                                                | 920.00   | M2               | 38.50           | 35,420.00    |
| 6.00  | LLAVES DE<br>CONFINAMIENTO                                                 | 183.60   | M                | 191.50          | 35,159.40    |
| 7.00  | BORDILLO PREFABRICADO                                                      | 361.00   | M                | 210.00          | 75,810.00    |
| 8.00  | LIMPIEZA FINAL                                                             | 1.00     | UNIDAD           | 6,851.00        | 6,851.00     |
| TOTAL |                                                                            |          |                  |                 | 539,800.00   |

El tiempo de entrega de la obra es de **CINCO (5) MESES CALENDARIO**, de conformidad con el cronograma de ejecución presentado por el constructor, el plazo referido se computará a partir de la aprobación del contrato a la fecha de aprobación de la liquidación del mismo.



**TERCERA: EL CONSTRUCTOR:** Por su parte manifiesta que respecto a la ejecución del proyecto reitera que se compromete a lo siguiente: a) entregar totalmente terminada la obra a satisfacción de la Municipalidad de Guastatoya. b) a contratar un Profesional quien será el Supervisor de Proyectos Residente, quien conjuntamente con el Ingeniero Supervisor de la Municipalidad informarán en forma simultánea a la Autoridad Administrativa, al Concejo Municipal y a la Contraloría General de Cuentas de la Nación cuando lo requiera, de los avances físicos del proyecto y las estimaciones de pago, para el efecto deberán presentar las fotocopias de la bitácora del Proyecto, autorizada por la Contraloría General de Cuentas.

**CUARTA:** El señor Alcalde Municipal en representación de la Municipalidad de Guastatoya, manifiesta que está de acuerdo en las condiciones del constructor, especialmente en lo que respecta al total del proyecto; así como en el tiempo de entregar la obra, ambos de común acuerdo llegaron a establecer la forma de pago de la manera siguiente:

**QUINTA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:** El valor del presente contrato pactado entre la Municipalidad y la Empresa Mercantil **CONSTRUCTORA SOLAR**, asciende a la cantidad de **QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS QUETZALES (Q. 539,800.00)**, incluido el impuesto al valor agregado -IVA-, los que se pagarán con fondos de -INVERSION- de conformidad con la constancia de disponibilidad presupuestaria, de conformidad con la estructura presupuestaria 23-00-001-000-016 RENGLON # 331, FUENTE DE FINANCIAMIENTO 32-0101-0014. Los pagos se efectuarán de conformidad con el artículo 58 de la Ley de Contrataciones del Estado, de la manera siguiente: a). Un anticipo del veinte por ciento (20%) equivalente a la cantidad de **CIENTO SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA QUETZALES (Q. 107,960.00)**, el que se entregará previo a cumplir con los siguientes requisitos: I). Otorgar a la Municipalidad **PLAN DE INVERSIÓN, FIANZA DE ANTICIPO, FIANZA DE CUMPLIMIENTO**, las cuales garantizarán la correcta aplicación del mismo con fundamento en Artículos 64, 65, 66, de la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas y los artículos 53, 54, 55, 56, 58 Y 59 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y, II). Los **PAGOS SIGUIENTES, se efectuarán de conformidad con las estimaciones de pago de conformidad con el artículo 59 de la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas, en el cual la Municipalidad de Guastatoya, hará los pagos contra las estimaciones periódicas de trabajo ejecutado y aceptado, las que podrán efectuarse mensualmente, trabajos debidamente comprobados, con los informes presentados por el Supervisor del Proyecto Residente juntamente con el Supervisor de Proyectos de la Municipalidad de Guastatoya.** III). El último pago equivalente al 100% de avance físico del proyecto, presentando para el efecto, **GARANTIA DE CONSERVACION DE OBRA, CALIDAD O FUNCIONAMIENTO, FIANZA DE SALDOS DEUDORES, ACTA DE RECEPCIÓN DEL PROYECTO POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD E INFORME FINAL DE LOS SUPERVISORES PROFESIONALES DEL PROYECTO.**

**SEXTA: SANCIONES:** El constructor se compromete a entregar los trabajos conforme el contrato suscrito. Y en caso de atraso por parte del Constructor en la entrega de los trabajos, se determinará el atraso en la entrega de la obra con base en las fechas de terminación, parciales o total, fijadas en el programa de ejecución convenido, debiendo aplicarse las multas sin perjuicio de la facultad que tiene la entidad contratante para exigir el cumplimiento del contrato para rescindirlo. Para efecto de la multa, se tomará en cuenta solo la parte proporcional del atraso, por lo que su aplicación no debe afectar la parte del cumplimiento parcial. Se sancionará con el pago de una multa que se aplique al contratista entre el uno al cinco por millar del monto de los trabajos, que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente, por cada día de atraso en que incurra el contratista desde la fecha de terminación pactada hasta la total conclusión de los mismos, en ningún caso podrán ser superiores en su conjunto al monto de la garantía de cumplimiento. Asimismo, el Constructor deberá cumplir con los trabajos estipulados en el presente contrato y la Municipalidad no concederá ningún plazo de prórroga a excepción de los siguientes casos: a). si se trata de órdenes de trabajo extra u otros convenios, b). Indicar claramente el plazo improrrogable que se le otorgue al constructor para el





trabajo correspondiente y deberá solicitarlo dentro del plazo que indica el Artículo 43, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas.

En relación a lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas, el atraso de la entrega de la obra, por causa imputable al contratista será sancionado del 1 al 5 por millar del monto de las obras que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente, calculando a partir de las fechas pactadas de la entrega parcial o total con respecto a la ejecución convenida con la entidad contratante. Dicha multa solamente se tomará de la parte proporcional del atraso, sin afectar el cumplimiento parcial.

| Tasa de cálculo | Días                      |
|-----------------|---------------------------|
| 1o/oo           | 1 a 20                    |
| 2o/oo           | 21 a 30                   |
| 3o/oo           | 31 a 60                   |
| 4o/oo           | 61 a 120                  |
| 5o/oo           | 121 hasta su cumplimiento |

La entidad ejecutora será la que emita las sanciones correspondientes.

**SEPTIMA: OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR:** El constructor se obliga a presentar informes periódicos, cronograma de ejecución de la obra, bitácora de los trabajos de conformidad con el Artículo 37 inciso a). del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, deben de autorizar los libros en la Dirección de Infraestructura Pública de la Contraloría General de Cuentas, así como permitir en cualquier momento que las personas autorizadas por la Municipalidad supervisen las actividades que se desarrollan, asimismo instruirá a su personal para que se le preste la debida colaboración a las personas que supervisan y que son parte de esta Municipalidad, el Constructor deberá de revisar cuidadosamente los documentos contractuales y señalará cualquier omisión o error, contradicción o incongruencia que observe a este respecto, deberá formular la consulta y observación del caso antes de los quince días de ejecutar el proyecto, el constructor previamente a la adquisición de materiales deberá proporcionar a la Municipalidad cuando esto lo requiere muestras de materiales para analizarlos y aprobarlos. El Constructor queda facultado para retirar de la obra a cualquier trabajador que considere incompetente, negligente insubordinado o perjudicial a la buena marcha de dichos trabajos. El constructor deberá de aprobar las herramientas, materiales, mano de obra, transporte y demás elementos necesarios.

**OCTAVA: CLAUSULA RELATIVA AL COHECHO:** Yo el Contratista, bajo juramento de Ley, manifiesto que conozco las penas relativas al delito de cohecho así como las disposiciones contenida en el Capítulo III del Título XIII del Decreto 17-73 del Congreso de la República, Código Penal. Adicionalmente, conozco las normas jurídicas que facultan a la Autoridad Superior de la entidad afectada para aplicar las sanciones administrativas que pudieren corresponderme, incluyendo la inhabilitación en el sistema GUATECOMPRAS".

**NOVENA: OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD:** a) La Municipalidad se obliga a efectuar el pago en tiempo y en formas convenidas, b). Faccionar el acta de inicio y avances físicos y actas de recepción para realizar la liquidación final de los trabajos a ejecutar y prestar la colaboración necesaria para el constructor para realizar los mismos, c). Designar a la persona o Personas que supervisen los trabajos del proyecto citado anteriormente previa inspección final.

**DECIMA: OTRAS OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR:** a). Se compromete a sostener el precio de la oferta, b). Entregar la obra en el tiempo y lugar indicado, c). Ejecutar la obra con material de buena





calidad y garantizados de conformidad con lo que estipula la ley de contrataciones del estado, d). Contratar mano de obra necesaria y suficiente para la realización del proyecto, y se compromete a obtener en este municipio el cual será calificado por el constructor, e). Es responsable por el trabajo ejecutado por las personas que contrate así como de los daños y perjuicios que causen a Terceras personas como consecuencia de la realización de la obra contratada. f). De conformidad con el artículo 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, se podrá ampliar el monto del contrato, previo que sean aprobadas las ordenes de cambio, ordenes de trabajo suplementario o acuerdo de trabajo extra, y se suscribirá un contrato adicional de conformidad con el contenido relativo a la Ley de la materia.

**DECIMA PRIMERA: FIANZAS:** 1. El constructor se obliga a presentar:

1. **FIANZA DE SOSTENIMIENTO DE OFERTA** no menor del uno por ciento (1%) ni mayor del cinco por ciento (5%) del valor del contrato, que cubrirá el periodo comprendido desde la recepción y apertura de plicas hasta la aprobación de las adjudicaciones, y, en todo caso, tendrá una vigencia de ciento veinte (120) días, como lo establece el artículo 64 de la Ley de Contrataciones.

2. **FIANZA DE CUMPLIMIENTO:** Como requisito previo para la aprobación del presente contrato de conformidad con el Artículo 65 de la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas, que garantizara el cumplimiento de todas las obligaciones estipuladas en el contrato, el contratista deberá prestar fianza, deposito en efectivo o constituir hipoteca en los porcentajes y condiciones que señale el reglamento. Para el caso de obras, además esta garantía cubrirá las fallas o desperfectos que aparecieren durante la ejecución del contrato, antes que se constituya la garantía de conservación. **Por un valor del diez por ciento (10%) del monto del contrato respectivo.**

**La Garantía de Cumplimiento** deberá estar vigente, según el caso:

1. Cuando se trate de la adquisición de bienes, suministros y servicios hasta que la entidad interesada extienda la constancia de haber recibido a su entera satisfacción la garantía de calidad o de funcionamiento, o haberse prestado el servicio en su caso;
2. Cuando se trate de construcción de obras, hasta que la entidad interesada extienda la constancia de haber recibido a su satisfacción la garantía de conservación de obra.

Para los casos en que las bases el contrato respectivo, se contemplen recepciones parciales para el cumplimiento del objeto del contrato, se podrá ajustar la garantía de cumplimiento conforme se establezca en dichos instrumentos y siempre que se cuente con la constancia a que se refiere el presente artículo.

3. **FIANZA DE ANTICIPO:** Previo a recibir cualquier suma por concepto de anticipo, el contratista constituirá garantía mediante fianza o hipoteca por el monto de un cien por ciento (100%) del mismo. La garantía podrá reducirse en la medida que se amortice el valor del anticipo cubriendo siempre el máximo del saldo deudor y estará vigente hasta su total amortización. El reglamento establecerá el procedimiento de reducción y lo concerniente en los casos de rescisión, resolución y terminación de contrato.

4. **FIANZA DE CONSERVACION DE LA OBRA O DE LA CALIDAD DE FUNCIONAMIENTO:** El contratista responderá por la conservación de la obra, mediante depósito en efectivo, fianza, hipoteca o prenda, a su elección, que cubra el valor de las reparaciones de las fallas o desperfectos que le sean imputables y que aparecieren durante el tiempo de responsabilidad de dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha de recepción de la obra. Tratándose de bienes y suministros, deberá otorgarse garantía de calidad y/o funcionamiento, cuando proceda. La garantía de conservación de obra, o de calidad y/o funcionamiento, deberá otorgarse por el equivalente al quince por ciento (15%) del valor original del contrato, como requisito previo para la recepción de la obra, bien o suministro. El vencimiento del tiempo de responsabilidad previsto en el párrafo anterior, no exime al contratista de las responsabilidades por destrucción o deterioro de la obra debido a dolo o culpa de su parte, por el plazo de cinco (5) años, a partir de la recepción definitiva de la obra.

**Garantía de Conservación de obra, calidad o funcionamiento.** El contratista dentro de los veinte (20) días calendario previo a la finalización de la vigencia de la garantía de cumplimiento de contrato,

CONSTRUIR  
SOLAR  
Construimos lo mejor





deberá presentar la garantía de conservación de obra, calidad o funcionamiento, según corresponda de conformidad con lo siguiente:

- Para el caso de obras, la garantía de conservación de obras.
- Para el caso de maquinaria, medios de transporte, equipos instalados u otros equipos cuyo funcionamiento deba garantizarse por el contratista en el tiempo que determina La Ley o el contrato, la garantía de funcionamiento.
- Para el caso de bienes que no se incluyen en los indicados en la literal anterior, corresponderá a la entidad contratante determinar la procedencia de la presentación de la garantía de calidad.

Para las adquisiciones de suministros e insumos consumibles que por su naturaleza sean de alta rotación y a los servicios, no les será aplicable la presentación de la garantía de calidad o funcionamiento, en virtud de su fungibilidad y la intangibilidad de determinados servicios; debiendo en todo caso, sujetar su plazo en el contrato respectivo, siendo responsabilidad de la entidad contratante establecer en las bases y en el contrato, los medios u otras garantías que aseguren el cumplimiento del contratista respecto al objeto del contrato.

**5. FIANZA DE SALDOS DEUDORES** Para garantizar el pago de saldos deudores que pudieran resultar a favor del Estado, de la entidad correspondiente o de terceros en la liquidación, el contratista deberá prestar fianza, depósito en efectivo; constituir hipoteca o prenda, a su elección, por el cinco por ciento (5%) del valor original del contrato. Esta garantía deberá otorgarse simultáneamente con la de conservación de obra como requisito previo para la recepción de la obra, bien o suministro. Aprobada la liquidación, si no hubiere saldos deudores, se cancelará esta garantía.

Las fianzas descritas en el presente contrato, deberán formalizarse mediante póliza emitida por instituciones autorizadas para operar en Guatemala, de conformidad con las siguientes disposiciones: La vigencia de las fianzas será exactamente igual al plazo contractual y deberá ajustarse ante cualquier ampliación o variación del contrato, manteniendo las condiciones de cobertura que aplicaron al contrato original. Lo anterior no es aplicable a las fianzas de conservación de obra, de calidad, de funcionamiento o de saldos deudores. a) Las fianzas garantizarán exacta y fielmente las obligaciones a cargo del contratista o proveedor. Estas obligaciones deben estar estipuladas en el contrato original y en cada una de las modificaciones documentadas. b) El funcionario que corresponda será responsable de exigir la actualización de las fianzas otorgadas por el contratista o proveedor. De omitirlo, el funcionario incurrirá en incumplimiento de deberes. c) El contratista o proveedor que omita actualizar la fianza otorgada ante modificaciones del contrato original, se hará acreedor a una multa y a la suspensión inmediata de los pagos a que tenga derecho. d) Cuando la garantía consistiere en depósitos, deberá hacerse en Quetzales o por medio de cheque certificado. Cuando la garantía sea hipotecaria o prendaria, se formalizará a través de escritura pública debidamente registrada. En todo caso, quedará a criterio del contratista o proveedor la garantía a proporcionar. Las fianzas deberán publicarse en el sistema GUATECOMPRAS. Las juntas a las que se refiere el artículo 10 de esta Ley, serán responsables de verificar la autenticidad de las fianzas de sostenimiento de oferta, y las autoridades suscriptoras de los contratos serán responsables de verificar la autenticidad de las demás fianzas a las que se refiere este capítulo. El sistema GUATECOMPRAS llevará un registro de las fianzas presentadas, así como de las solicitudes de ejecución, ejecución de fianzas y pago de las mismas. Con fundamento en el artículo 69 de la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas

**DECIMA SEGUNDA: FORMA DE EFECTUAR LOS TRABAJOS DEL CONSTRUCTOR:** El constructor efectuará los trabajos bajo estricta responsabilidad bajo la supervisión de un Profesional del Ramo, colegiado activo de quién deberá presentar la certificación o constancia correspondiente; asimismo incluirá los materiales, mano de obra, equipo y demás elementos necesarios para la correcta aplicación y ejecución del proyecto, mismas que se estarán supervisando por el Ingeniero





Supervisor de Obras Municipales, quien cuenta con el aval y aprobación de la Corporación Municipal, así como de la comisión de recepción de la citada obra. El Constructor se compromete a dejar limpias las áreas donde se ejecute el proyecto.

**DECIMA TERCERA: CONTROVERSIAS:** Toda controversia que pudiera surgir entre los contrayentes en lo que se refiere a la interpretación cumplimiento, aplicación y ejecución de este contrato será resuelto en el menor tiempo posible en forma conciliatoria entre ambas partes y en última instancia de no ponerse de acuerdo en el Tribunal correspondiente de lo contencioso administrativo de conformidad con el Artículo 102 de la citada ley; asimismo que se acepta los procedimientos señalados en el Código Procesal Civil y Mercantil, renunciando el constructor al fuero de su domicilio y señalando como lugar para recibir notificaciones y citaciones BARRIO EL CALVARIO, GUASTATOYA, EL PROGRESO.

**DECIMA CUARTA: TERMINACION DEL CONTRATO:** La Municipalidad puede dar por terminado, resuelto y/o rescindido el presente contrato en forma unilateral y sin responsabilidad de su parte en los siguientes casos: a). Por vencimiento del plazo pactado, siempre que no haya ocurrido prórroga, b). Si el constructor incumple con sus obligaciones, c). Si paraliza sin causa justificada los trabajos por más de diez días consecutivos, d). Por rescisión de mutuo acuerdo, e). Si el constructor le fueren embargado bienes y que evidentemente afecten el cumplimiento del contrato.

**DECIMA QUINTA: PROHIBICIONES: EL CONSTRUCTOR:** declara bajo juramento de ley y bien enterados de las penas relativas al delito de perjurio que no se encuentra comprendido dentro de las limitaciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.


Y que, si en el transcurso del proceso de adquisición o en la ejecución de un contrato se presenta alguna de las prohibiciones definidas en el artículo 80 de la Ley, el contratista o proveedor deberá hacerlo de conocimiento de la autoridad competente dentro de los dos días siguientes al conocimiento del acaecimiento de la prohibición, para que ésta analice la situación planteada y resuelva sobre el proceso del contrato.

La falta de aviso sobre el acaecimiento de alguna de las prohibiciones definida en la Ley, será causal suficiente para la inhabilitación del contratista o proveedor, quien de conformidad con la ley será responsable de compensar a la entidad contratante por los daños y perjuicios ocasionados.

El trámite de la inhabilitación y de la rehabilitación es responsabilidad de la entidad contratante o ejecutora, quien deberá cumplir con el procedimiento, plazos y condiciones que definen las Normas de Uso del Sistema GUATECOMPRAS y, en todo caso, debe respetarse el derecho de defensa.

La inhabilitación y la rehabilitación en el Sistema GUATECOMPRAS implica la correspondiente inhabilitación o rehabilitación en el Registro General de Adquisiciones del Estado.

**DECIMA SEXTA: INSPECCION, RECEPCION Y LIQUIDACION FINAL:** 1. El constructor deberá de permitir en cualquier momento que las personas autorizadas por la Municipalidad Inspeccionen las instalaciones, actividades y trabajos que realicen e instruirá a su personal para que atiendan a las personas nombradas proporcionándoles toda información requerida. 2. La Municipalidad nombrará una comisión receptora de los trabajos y harán la inspección correspondiente ante la presencia del constructor su representante legal y posteriormente informarán al Concejo Municipal si se puede faccionar el acta de recepción respectiva para que la Dirección de Administración Financiera efectúe la liquidación final o en su defecto si hay que corregir algunos trabajos o complementar otros, en este último caso deberá indicar cuales son los trabajos a efectuar y el tiempo a emplear y si el plazo es necesario se incluye dentro del tiempo contractual o le concede o no algún tiempo adicional.





**DECIMA SEPTIMA: APROBACION:** Para que el presente contrato surta sus efectos legales y obligue a las partes al cumplimiento de las cláusulas contenidas deberá ser aprobado de conformidad con el artículo 42 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas.

**DECIMA OCTAVA: ACEPTACION DEL CONTRATO:** En todos los términos y condiciones estipuladas LA MUNICIPALIDAD Y EL CONSTRUCTOR aceptan para si el presente contrato el que se encuentra contenido en ocho (8), hojas membretadas impresas de un solo lado, leemos íntegramente lo escrito y bien enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo aceptamos, ratificamos y firmamos. Damos Fe.

LIC. JORGE ANTONIO ORELLANA PINTO  
ALCALDE MUNICIPAL




KELIAN GUILLERMO SOLARES ORELLANA  
PROPIETARIO CONSTRUCTORA SOLAR

CONSTRUCTORA  
**SOLAR**  
Construimos lo mejor



¡GUASTATOYA seguirá cambiando!





# Municipalidad de GUASTATOYA

Departamento de El Progreso, Guatemala, C.A.

info@muniguasta.com

www.muniguastatoya.com

Telefax: 7945-1594, 7945-1602, 7945-1603



Guastatoya, martes, 31 de octubre de 2023

SEÑOR(es):

ALCALDE MUNICIPAL Y  
HONORABLE CORPORACION  
GUASTATOYA, EL PROGRESO

Respetables señor(es):

El motivo del presente es para informar los resultados de la siguiente estimacion de pago:

|                                        |                                                                                     |                     |                                                                               |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| No. De Supervision de Avance Fisico:   | ESTIMACION No.1                                                                     |                     |                                                                               |
| Nombre del Proyecto:                   | MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN LOTIFICACION VISTA HERMOSA, GUASTATOYA, EL PROGRESO. |                     |                                                                               |
| No. De Contrato del Proyecto:          | 29-2023                                                                             | Fecha del Contrato: | 14/09/2023                                                                    |
| NOG.                                   | 20821832                                                                            |                     |                                                                               |
| Estimacion del Avance Fisico:          | 60.0000000%                                                                         |                     |                                                                               |
| Monto de Estimacion del Avance Fisico: | Q323,880.00                                                                         | en letras:          | TRESCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA QUETZALES CON 00/100 CENTAVOS  |
| Amorización del Anticipo:              | Q64,776.00                                                                          | en letras:          | SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS QUETZALES CON 00/100 CENTAVOS |
| Cantidad Líquida a Recibir:            | Q259,104.00                                                                         | en letras:          | DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUATRO QUETZALES CON 00/100 CENTAVOS  |

Se adjunta anexo que contiene el detalle de la presente estimacion para que se continúe con lo procedente.

Agradeciendo desde ya, me suscribo.

Atentamente,

ING. CARLOS RAMIRO ORTEGA LIMA  
COLEGIADO: 7118

SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES  
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA


Carlos Ramiro Ortega Lima  
Ingeniero Civil  
Col. 7118

**GUASTATOYA esta cambiando**

ESTIMACION No.1

|                                           |  |                                                                                     |  |  |  |                       |  |             |  |                                                                                                 |  |
|-------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|-------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| NOMBRE DEL PROYECTO:                      |  | MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN LOTIFICACION VISTA HERMOSA, GUASTATOYA, EL PROGRESO, |  |  |  | PERIODO DEL: 18-09-23 |  | AL 31-10-23 |  | <br>GUASTATOYA |  |
| FECHA INICIO DEL PROYECTO:                |  | 18 de septiembre de 2023                                                            |  |  |  | CONTRATO              |  | 29-2023     |  | FECHA 14-09-23                                                                                  |  |
| TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO:           |  | 5 MESES                                                                             |  |  |  | MONTO DE CONTRATO     |  | Q           |  | 539,800.00                                                                                      |  |
| FECHA DE FINALIZACION                     |  | 18 de mayo de 2024                                                                  |  |  |  | SNIP                  |  | 318610      |  | 20821832                                                                                        |  |
| NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA:        |  | CONSTRUCTORA SOLAR                                                                  |  |  |  | NOG                   |  |             |  | 60.00000000%                                                                                    |  |
| REPRESENTANTE LEGAL EMPRESA CONSTRUCTORA: |  | FELIAN GUILLERMO SOLARES ORELLANA                                                   |  |  |  |                       |  |             |  |                                                                                                 |  |
| COSTO FINANCIERO                          |  |                                                                                     |  |  |  |                       |  |             |  |                                                                                                 |  |
| COSTO DE EJECUCION                        |  |                                                                                     |  |  |  |                       |  |             |  |                                                                                                 |  |
| Monto por ejecutar                        |  |                                                                                     |  |  |  |                       |  |             |  |                                                                                                 |  |
| Este Periodo                              |  |                                                                                     |  |  |  |                       |  |             |  |                                                                                                 |  |
| Acumulado Anterior                        |  |                                                                                     |  |  |  |                       |  |             |  |                                                                                                 |  |
| TOTAL A LA FECHA                          |  |                                                                                     |  |  |  |                       |  |             |  |                                                                                                 |  |
| %                                         |  |                                                                                     |  |  |  |                       |  |             |  |                                                                                                 |  |
| Por Estimar                               |  |                                                                                     |  |  |  |                       |  |             |  |                                                                                                 |  |
| %                                         |  |                                                                                     |  |  |  |                       |  |             |  |                                                                                                 |  |
| COSTO FINANCIERO                          |  |                                                                                     |  |  |  |                       |  |             |  |                                                                                                 |  |
| COSTO DE EJECUCION                        |  |                                                                                     |  |  |  |                       |  |             |  |                                                                                                 |  |
| Este Periodo                              |  |                                                                                     |  |  |  |                       |  |             |  |                                                                                                 |  |
| Acumulado Anterior                        |  |                                                                                     |  |  |  |                       |  |             |  |                                                                                                 |  |
| TOTAL A LA FECHA                          |  |                                                                                     |  |  |  |                       |  |             |  |                                                                                                 |  |
| %                                         |  |                                                                                     |  |  |  |                       |  |             |  |                                                                                                 |  |
| Por Estimar                               |  |                                                                                     |  |  |  |                       |  |             |  |                                                                                                 |  |
| %                                         |  |                                                                                     |  |  |  |                       |  |             |  |                                                                                                 |  |

|                           |                                                                   |        |                     |                 |                      |                       |                 |           |          |              |              |                    |                  |        |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|-----------------|-----------|----------|--------------|--------------|--------------------|------------------|--------|
| No.                       | DESCRIPCION DEL RENGLOON DE TRABAJO                               | Unidad | Cantidad Contratada | Orden de Cambio | Orden de Trabajo Sup | Asiento Trabajo Extra | Cantidad Actual | Unidad Q. | Precio   | Costo Total  | Este Periodo | Acumulado Anterior | Total a la fecha | %      |
| 1                         | Trazo y estaqueado                                                | ML     | 180.56              |                 |                      |                       | 180.56          | Q         | 10.00    | 1,805.60     | 182.5        |                    | 182.5            | 90.00% |
| 2                         | Nivelación de subbase                                             | M2     | 975.00              |                 |                      |                       | 975.00          | Q         | 76.00    | 74,100.00    | 877.5        |                    | 877.5            | 90.00% |
| 3                         | Colocación + compactación de base granular de espesor de 0.10mts. | M2     | 938.00              |                 |                      |                       | 938.00          | Q         | 110.00   | 103,180.00   | 844.5384     |                    | 844.5384         | 90.04% |
| 4                         | Colocación de adoquín tráfico liviano                             | M2     | 916.00              |                 |                      |                       | 916.00          | Q         | 226.50   | 207,474.00   | 420          |                    | 420              | 45.85% |
| 5                         | Cama de asiento de arena                                          | M2     | 920.00              |                 |                      |                       | 920.00          | Q         | 38.50    | 35,420.00    | 420          |                    | 420              | 45.65% |
| 6                         | Llaves de confinamiento                                           | ML     | 183.60              |                 |                      |                       | 183.60          | Q         | 191.50   | 35,158.40    | 84           |                    | 84               | 46.75% |
| 7                         | Bordillo prefabricado                                             | ML     | 361.00              |                 |                      |                       | 361.00          | Q         | 210.00   | 75,810.00    | 168          |                    | 168              | 46.54% |
| 8                         | Limpieza final                                                    | UNIDAD | 1.00                |                 |                      |                       | 1.00            | Q         | 6,851.00 | 6,851.00     |              |                    | 0                | 0.00%  |
| TOTAL CONTRATADO          |                                                                   |        |                     |                 |                      |                       |                 |           |          | Q359,800.00  |              |                    |                  |        |
| VALOR DE LA ESTIMACION    |                                                                   |        |                     |                 |                      |                       |                 |           |          | Q 323,880.00 | Q            |                    |                  |        |
| AMORTIZACION DEL ANTICIPO |                                                                   |        |                     |                 |                      |                       |                 |           |          | Q 64,775.00  | Q            |                    |                  |        |
| TOTAL LIQUIDO A RECIBIR   |                                                                   |        |                     |                 |                      |                       |                 |           |          | Q 259,104.00 | Q            |                    |                  |        |



Carlos Ramiro Ortega Lima  
Ingeniero Civil  
Caf. 7118



# Municipalidad de GUASTATOYA

Departamento de El Progreso, Guatemala, C.A.

info@muniguasta.com

www.muniguastatoya.com

Telefax: 7945-1594, 7945-1602, 7945-1603



Guastatoya, martes, 31 de octubre de 2023

**SEÑOR(es):**

ALCALDE MUNICIPAL Y  
HONORABLE CORPORACION  
GUASTATOYA, EL PROGRESO

**Respetables señor(es):**

Respetuosamente me dirijo a usted, con el proposito de REMITIR el INFORME  
DE SUPERVISION que acontinuacion se describe:

|                               |                                                                                        |                     |            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| Nombre del Proyecto:          | MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN LOTIFICACION<br>VISTA HERMOSA, GUASTATOYA, EL PROGRESO. |                     |            |
| No. De Contrato del Proyecto: | 29-2023                                                                                | Fecha del Contrato: | 14/09/2023 |
| NOG.                          | 20821832                                                                               |                     |            |
| Empres constructura:          | CONSTRUCTORA SOLAR                                                                     |                     |            |

Se realizo la visita al proyecto antes en mencion para hacer constar los avances de los renglones contratados en su avance fisico notificado por la empresa Constructora los cuales se describen a continuacion:

**GUASTATOYA esta cambiando**



# Municipalidad de GUASTATOYA

Departamento de El Progreso, Guatemala, C.A.

info@muniguasta.com

www.muniguastatoya.com

Telefax: 7945-1594, 7945-1602, 7945-1603



162.5 ML DE Trazo y estaqueado  
877.5 M2 DE Nivelación de subbase  
844.5364 M2 DE Colocación + compactación de base granular de espesor de 0.10mts.  
420 M2 DE Colocación de adoquín tráfico liviano  
420 M2 DE Cama de asiento de arena  
84 ML DE Llaves de confinamiento  
168 ML DE Bordillo prefabricado

## TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR

18.06 ML DE Trazo y estaqueado  
97.5 M2 DE Nivelación de subbase  
93.46 M2 DE Colocación + compactación de base granular de espesor de 0.10mts.  
496 M2 DE Colocación de adoquín tráfico liviano  
500 M2 DE Cama de asiento de arena  
99.6 ML DE Llaves de confinamiento  
193 ML DE Bordillo prefabricado  
1 UNIDAD DE Limpieza final

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| <b>Estimación del Avance</b> |             |
| <b>Físico:</b>               | 60.0000000% |

Se adjunta anexo que contiene el detalle de la presente estimación para que se continúe con lo procedente.

Agradeciendo desde ya, me suscribo.

Atentamente,

ING. CARLOS RAMIRO ORTEGA LIMA

COLEGIADO: 7118

SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES  
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

*Carlos Ramiro Ortega Lima*  
Ingeniero Civil  
Col. 7118

**GUASTATOYA esta cambiando**



# Municipalidad de **GUASTATOYA**

Departamento de El Progreso, Guatemala, C.A.

[info@muniguasta.com](mailto:info@muniguasta.com)


[www.muniguastatoya.com](http://www.muniguastatoya.com)

Telefax: 7945-1594, 7945-1602, 7945-1603



**INFORME  
FOTOGRAFICO**

**MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN LOTIFICACION  
VISTA HERMOSA, GUASTATOYA, EL PROGRESO.**

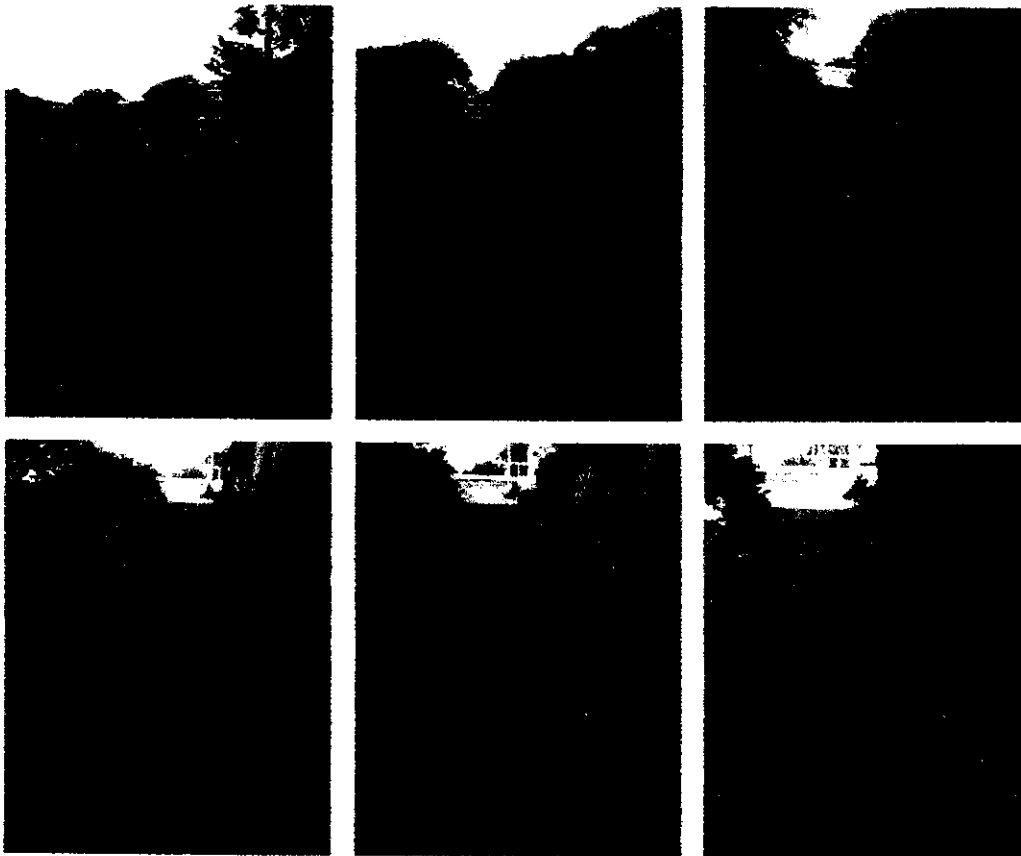

**GUASTATOYA esta cambiando**



Guastatoya, 31 de Octubre del 2023

HONORABLE  
ALCALDE MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA,  
EL PROGRESO

Por medio de la presente, me dirijo a usted con el fin de saludarlo, y a la vez solicitarle el pago de la presente estimación correspondiente al 60.00% sobre los trabajos del proyecto denominado: **MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN LOTIFICACION VISTA HERMOSA, GUASTATOYA, EL PROGRESO**. El cual se encuentra estipulado en contrato No.29-2023 de Fecha 19 de septiembre del 2023. Ya que dicho pago es necesario para dar seguimiento a los renglones de trabajos restantes del proyecto antes mencionado.

Sin otro particular, agradecido con usted, me suscribo.

ATENTAMENTE:

  
\_\_\_\_\_  
**KELIAN GUILLERMO SOLARES ORELLANA**  
**PROPIETARIO DE LA EMPRESA**  
**CONSTRUCTORA SOLAR**





CONSTRUCTORA  
SOLAR  
Especialistas en Construcción

CONSTRUCTORA SOLAR  
ESTIMACION No. 1

Nombre del proyecto: MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN LOTIFICACION VISTA HERMOSA, GUASTATOYA, EL PROGRESO  
Contrato No.28-2023 Fecha: 14 de Septiembre 2023

Monto Original del Contrato: Q.539,800.00

| Región                    | REGLONES DE TRABAJOS/CANTIDADES                                 | Cantidad Contratada |          |          | Costo total |            |   | Cantidad EJECUTADA |           |   | Cantidad pendiente de EJECUTAR |        |   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------|------------|---|--------------------|-----------|---|--------------------------------|--------|---|
|                           |                                                                 | Unidad              | Cantidad | Precio   | Q           | Q          | Q | Este               | Acumulado | Q | %                              | Este   | Q |
| 1                         | Trazo y Estaqueado                                              | M                   | 180.56   | 10.00    | Q           | 1,805.60   | Q | 182.50             | 0.00      | Q | 1,925.00                       | 18.06  | Q |
| 2                         | Nivelación de Sub Base                                          | M2                  | 975.00   | 78.00    | Q           | 74,100.00  | Q | 877.50             | 0.00      | Q | 88,080.00                      | 97.50  | Q |
| 3                         | Colocación y Compacción de Base Granular de Espesor de 0.10 MTS | M2                  | 938.00   | 110.00   | Q           | 103,180.00 | Q | 844.5384           | 0.00      | Q | 92,898.00                      | 93.46  | Q |
| 4                         | Colocación de Adoquín Tráfico Liviano                           | M2                  | 916.00   | 228.50   | Q           | 207,474.00 | Q | 420.00             | 0.00      | Q | 95,130.00                      | 486.00 | Q |
| 5                         | Cama de Asfalto de Arena                                        | M2                  | 920.00   | 38.50    | Q           | 35,420.00  | Q | 420.00             | 0.00      | Q | 16,170.00                      | 500.00 | Q |
| 6                         | Llaves de Confinamiento                                         | M                   | 183.60   | 191.50   | Q           | 35,159.40  | Q | 84.00              | 0.00      | Q | 18,088.00                      | 99.60  | Q |
| 7                         | Bordillo Prefabricado                                           | M                   | 361.00   | 210.00   | Q           | 75,810.00  | Q | 188.00             | 0.00      | Q | 35,280.00                      | 183.00 | Q |
| 8                         | Maneja Final                                                    | UNIDAD              | 1.00     | 8,851.00 | Q           | 8,851.00   | Q | 0.00               | 0.00      | Q | 0.00                           | 1.00   | Q |
| Total cantidad contratada |                                                                 |                     |          |          | Q           | 539,800.00 | Q | Cantidad ejecutada |           | Q | 60.0000007%                    |        | Q |

CONSTRUCTORA  
SOLAR  
Construimos lo mejor y más eficiente

LUIS LEONEL URIZAR MUÑOZ  
ING. CIVIL

KELIAN GUILLERMO SOCORRES ORELLANA  
CONSTRUCTORA SOLAR  
PROPIETARIO


|                                |   |            |
|--------------------------------|---|------------|
| Monto bruto de esta Estimación | Q | 323,840.00 |
| Anticipo                       | Q | 107,960.00 |
| Amortización                   | Q | 64,776.00  |
| Monto neto de esta Estimación  | Q | 259,104.00 |
| Monto Primer Pago              | Q | -          |
| Monto Segundo Pago             | Q | -          |

Guastatoya, 31 de Octubre del 2023

|                     |   |            |
|---------------------|---|------------|
| Liquidado a Recibir | Q | 259,104.00 |
|---------------------|---|------------|



**CONSTRUCTORA  
SOLAR**  
Especialistas en Construcción

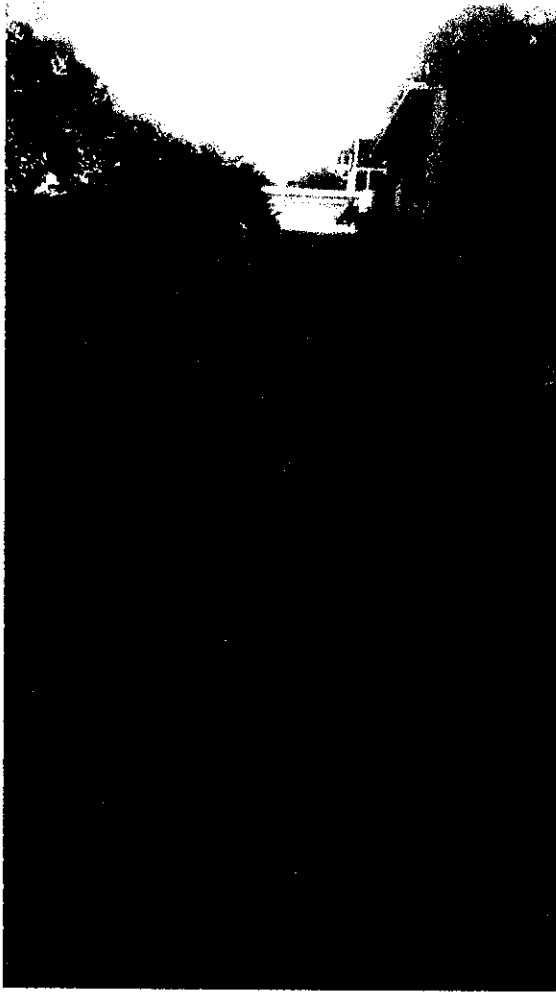

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO:

1. Nombre del proyecto: Forma Capital Fijo  
MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN LOTIFICACION VISTA HERMOSA, GUASTATOYA, EL PROGRESO
2. Institución responsable: GOBIERNOS LOCALES
3. Unidad ejecutora responsable: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA  
Planificación Institucional
4. Modalidad de planificación : Planificación Institucional
- 4.1. Modalidad específica: Finalidad-Función-Division:
5. Función anterior: TRANSPORTE  
Sub-función anterior : TRANSPORTE
6. Ubicación geográfica:

| Departamento | Municipio  |
|--------------|------------|
| EL PROGRESO  | GUASTATOYA |

7. Área de influencia: Municipal
- Responsable del proyecto:
- Nombre: JORGE ANTONIO ORELLANA PINTO
- Cargo: ALCALDE MUNICIPAL
- Teléfono: 79451602
- Email: dmp.guastatoya.@gmail.com

DIAGNÓSTICO:

8. Antecedentes:
- En la Colonia Villa Hermosa, Guastatoya, El Progreso se encuentra situado a 2 kilómetros del Parque Central de Guastatoya. El sector donde se necesita mejorar la calle está ubicado a 2 kilómetros del edificio municipal. Actualmente residen más de 215 habitantes aproximadamente 54 familias de los cuales el 98% son de origen ladino y el 2% indígenas.
- Desde hace muchos años vienen gestionando por medio de los diferentes COCODES el proyecto de MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN COLONIA VILLA HERMOSA, GUASTATOYA, EL PROGRESO. Por tal motivo fue así como en Asamblea Comunitaria se decidió facultar al Consejo Comunitario de Desarrollo COCODE para gestionar el proyecto, quienes se dirigieron a la Municipalidad para el apoyo técnico en la realización de los estudios y asesorar todos los trámites ante una institución que pudiera ejecutar el proyecto satisfaciendo así su necesidad de acceso a la calle

9. Problemática:
10. Justificación:
- Actualmente los vecinos de la Colonia Villa Hermosa, Guastatoya, El Progreso, se ven obligados a transitar por calles totalmente deterioradas; lo que ocasiona pérdida de tiempo en los trabajos de comercio, así como la movilización y transporte de productos.
11. Descripción:
- EL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN COLONIA VILLA HERMOSA GUASTATOYA EL PROGRESO CONSISTE EN 180 56 M TRAZO Y ESTAQUEADO 975 M2 DE NIVELACION DE SUB-BASE 938 M2 DE COLOCACION



## Información General de iniciativa de Inversión

Fecha Emisión: 12/07/2023  
Hora: 11:23 AM

0318610 - MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN LOTIFICACION VISTA HERMOSA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

SNIP - SEGEPLAN

Solicitud de Financiamiento, ejercicio 2,023

MAS COMPACTACION DE BASE GRANULAR DE ESPESOR DE 0 10 MTS 920 M2 COLOCACION DE ADOQUIN TRAFICO LIVIANO 920 M2 CAMA DE ASIENTO DE ARENA 183 M LLAVES DE CONFINAMIENTO 361 M BORDILLO PREFABRICADO 1 UNIDAD DE LIMPIEZA FINAL

### 12. Objetivos:

#### 12.1 General:

Contribuir al desarrollo integral de los vecinos del Aldea Patache, Guastatoya, El Progreso, a través del MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN COLONIA VILLA HERMOSA, GUASTATOYA, EL PROGRESO y así que permita la mejor circulación de los vehículos y peatones y así la calle sea más transitada y no presente ya problemas en los tiempos de invierno

#### 12.2 Específicos:


- Mejorar las condiciones del tránsito vehicular y de personas a través del mejoramiento de la calle con adoquín.
- Facilitar la comercialización entre los habitantes beneficiados del sector.
- Mejorar las condiciones de vida de las familias a través de la urbanización del sector.

### 13. Resultados esperados:

RESULTADOS DE LA FASE ACTUAL :

1. Fase actual: EJECUCION

2. Beneficiarios directos:

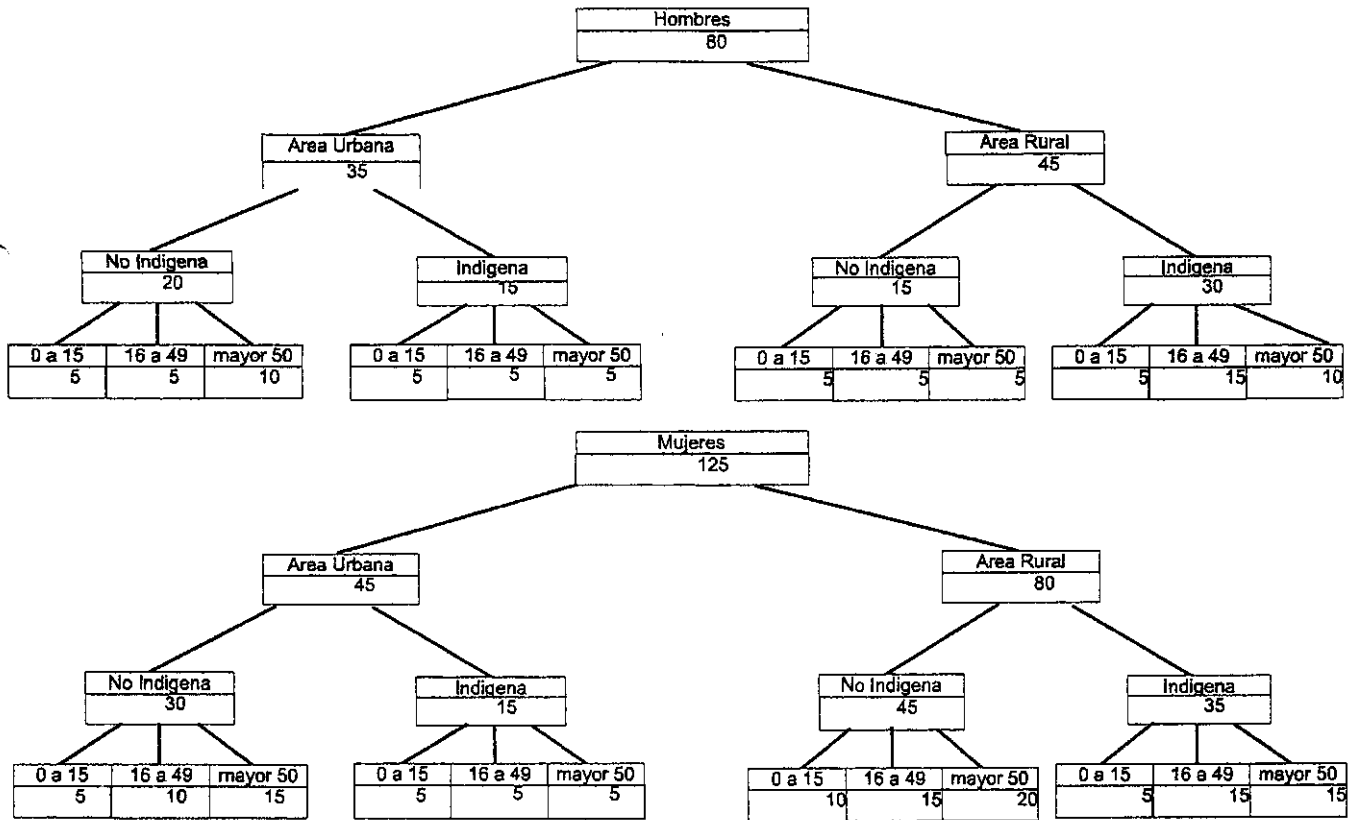

Costo/eficiencia:

4. TIR:

5. VAN:

6. Empleo a requerir:

Calificada  
No calificada

| Durante la ejecución<br>en hombre/mes | Durante la operación<br>en hombre/mes |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                       |                                       |
|                                       |                                       |

7. Situación del terreno:

Ninguno

8. Diseños (especificaciones):

9. Vida útil del proyecto: 20 años

10. Fecha de inicio de la operación: 31-JAN-23

11. Institución responsable de operación: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

12. Costo anual de operación:

Fecha Emisión: 12/07/2023  
Hora: 11:23 AM

**Meta GLOBAL del proyecto :**

MEJORAMIENTO CALLE

920,00 Metro cuadrado

**Meta ANUAL del proyecto :**

MEJORAMIENTO CALLE

920.00 Metro cuadrado

**PROGRAMACION FINANCIERA MULTIANUAL:**

**Fase: Ejecución**

**Fecha de inicio de la fase:** 01/01/2023

**Decreto 2021:**

**Fecha de finalización:** 31/12/2023

**Decreto 2022:**

**Descripción de la fase a financiar:**

**Decreto 2023:**

**DESCRIPCION****Situación presupuestaria:** Nuevo

**Estructura programática:—**

Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad

| Fuente de<br>Financiamiento | Solicitado<br>2023 | Programado<br>2024 | Programado<br>2025 | Programado<br>2026 | Total      |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| <b>TOTAL :</b>              | 540,000.00         | 0.00               | 0.00               | 0.00               | 540,000.00 |
| <b>Recursos internos :</b>  | 540,000.00         | 0.00               | 0.00               | 0.00               | 540,000.00 |
| Gobierno central :          | 0.00               | 0.00               | 0.00               | 0.00               | 0.00       |
| Comunidad :                 | 0.00               | 0.00               | 0.00               | 0.00               | 0.00       |
| Aporte municipal :          | 540,000.00         | 0.00               | 0.00               | 0.00               | 540,000.00 |
| Otros aportes :             | 0.00               | 0.00               | 0.00               | 0.00               | 0.00       |
| <b>Otras fuentes :</b>      | 0.00               | 0.00               | 0.00               | 0.00               | 0.00       |

**PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL 2023**

[illegible]

## PROGRAMACION FISICA MULTIANUAL

| Rubro                  | Unidad de medida | Programado<br>2,023 | Programado<br>2024 | Programado<br>2025 | Programado<br>2026 |
|------------------------|------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Trabajos preliminares  | m²               | 460                 |                    |                    |                    |
| Superficie de rodadura | m²               | 460                 |                    |                    |                    |

**2,023**

| Rubro                  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| Trabajos preliminares  | 39    | 39      | 38    | 39    | 38   | 38    | 38    | 38     | 38         | 38      | 39        | 38        |
| Superficie de rodadura | 38    | 38      | 38    | 38    | 38   | 38    | 38    | 38     | 39         | 39      | 39        | 39        |



CONSTANCIA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA



CDP No. 36  
Ejercicio Fiscal: 2023

MONTO RESERVADO VIGENTE (Q): Q 540,000.00  
MONTO EN LETRAS: QUINIENTOS CUARENTA MIL QUETZALES EXACTOS

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA  
UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA  
FECHA DE EMISION: martes, 12 de septiembre de 2023  
MODALIDAD DE COMPRA O CONTRATACION: COTIZACION  
NUMERO DE OPERACIÓN GUATECOMPRAS:

DESCRIPCION DEL PROCESO:

MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN LOTIFICACION VISTA HERMOSA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

NIT:  
NOMBRE O RAZON SOCIAL:  
CORREO ELECTRONICO:


PROGRAMCION No.:

ESTRUCTURA (S) PRESUPUESTARIA (S) ASIGNADA (S): Q 540,000.00  
23-00-001-000-016 RENGLON # 331  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
32-0101-0014 SC-INGRESOS TRIBUTARIOS IVA-PAZ

MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN LOTIFICACION VISTA HERMOSA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

Q 540,000.00

QUINIENTOS CUARENTA MIL QUETZALES EXACTOS



Brenda Roxana Lima de León  
Encargada de Presupuesto

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA  
MUNI  
ENCARGADA DE PRESUPUESTO  
Brenda Roxana Lima de León

ULTIMA LINEA



**CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN Y PRECALIFICACIÓN COMO PROVEEDOR DEL ESTADO**

Fecha de emisión de esta constancia: Guatemala, 20 de febrero de 2023.

Estatus: HABILITADO

202381918



**EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS  
PÚBLICAS**

Hace constar

Que a la presente fecha KELIAN GUILLERMO SOLARES ORELLANA con NIT 33541728 se encuentra INSCRITO en el REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO, en el folio 76553 del Libro de INSCRIPCIONES y registro número 11522 del LIBRO DE REGISTRO DE PROVEEDORES.

Esta constancia le habilita para proveer: OBRAS A ENTIDADES DEL ESTADO, HASTA UN MONTO MÁXIMO DE CONTRATACIÓN DE TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UNO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE QUETZALES CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS (Q. 343,561,199.53). Como resultado de la evaluación de la capacidad técnica y financiera del proveedor.

Asimismo, precalificado en la especialidad o especialidades siguientes: (Si no se listan especialidades, se debe a que el proveedor no acreditó documentación de respaldo requerida).

- 4101 - Construcción de edificios ✓
- 4211 - Carreteras pavimentadas ✓
- 4295 - Construcción de instalaciones deportivas ✓
- 4313 - Movimientos de tierra y/o excavaciones ✓
- 4219 - Muros de contención
- 8130 - Paisajismo y servicios de mantenimiento conexos
- 4103 - Mantenimiento y remodelación de edificios
- 4226 - Sistemas de saneamiento y drenaje
- 4298 - Adoquinado y empedrado ✓
- 2511 - Fabricación de productos metálicos para uso estructural
- 4217 - Mantenimiento de carreteras
- 4224 - Sistemas de captación, conducción y distribución de agua
- 4322 - Instalaciones de agua potable, calefacción y aire acondicionado
- 4330 - Terminación y acabado de edificios
- 4659 - Venta de otros tipos de maquinaria y equipo
- 4212 - Puentes
- 4223 - Líneas de transmisión eléctrica



ESTE DOCUMENTO ES VÁLIDO SIN FIRMA, SU AUTENTICIDAD PUEDE SER VERIFICADA INGRESANDO EL NÚMERO DE LA CONSTANCIA EN LA OPCIÓN VALIDAR CONSTANCIAS EN EL PORTAL [www.rgae.gob.gt](http://www.rgae.gob.gt) O A TRAVÉS DEL CÓDIGO QR DE ESTE DOCUMENTO.

**NOTA:**

- Los términos de la presente constancia se basan en la información y documentación presentada por el interesado bajo los términos y condiciones establecidos por el Registro General de Adquisiciones del Estado en el que declara que dicha información y documentación corresponden a la persona individual o jurídica identificada en esta constancia y sabiendo de la pena relativa al delito que establece el artículo 459 del Código Penal. No asumiendo el Registro responsabilidad alguna por omisión o actos previos o posteriores, realizados por los proveedores que transgredan el marco legal.
- El Registro General de Adquisiciones del Estado no prejuzga sobre procesos, procedimientos administrativos o requisitos que para una eventual contratación establezcan las entidades reguladas en el artículo 1 de la Ley de Contrataciones del Estado, ni sobre los procesos de ejecución o imputación de los renglones que para cada tipo de gasto corresponda, de acuerdo a la normativa aplicable.



**CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN Y PRECALIFICACIÓN COMO PROVEEDOR DEL ESTADO**

Fecha de emisión de esta constancia: Guatemala, 20 de febrero de 2023.

Estatus: **HABILITADO**

202381918



Información comercial de la Entidad\*:

- CONSTRUCTORA SOLAR - EL PORVENIR GUASTATOYA, EL PROGRESO

\*Conforme a lo establecido en el artículo 71 el Registro es el responsable del control, actualización, vigencia, seguridad, certeza y publicidad de la información, por lo que a partir del 09 de julio de 2021, se refleja en las constancias la información comercial y la información de copropietario(s) de las entidades con el fin de facilitar el proceso de revisión a las entidades reguladas por el artículo 1 de la Ley de Contrataciones del Estado.

**Vigencia de esta precalificación, hasta:**

05 de octubre de 2024.

**Fecha de última actualización:**

18 de enero de 2023

**Fecha de última modificación:**

20 de febrero de 2023

**Resolución número:**

202381325

**Fecha de Resolución:**

20 de febrero de 2023

**ESTE DOCUMENTO ES VÁLIDO SIN FIRMA, SU AUTENTICIDAD PUEDE SER VERIFICADA INGRESANDO EL NÚMERO DE LA CONSTANCIA EN LA OPCIÓN VALIDAR CONSTANCIAS EN EL PORTAL [www.rgae.gob.gt](http://www.rgae.gob.gt) O A TRAVÉS DEL CÓDIGO QR DE ESTE DOCUMENTO.**

**NOTA:**

- Los términos de la presente constancia se basan en la información y documentación presentada por el interesado bajo los términos y condiciones establecidos por el Registro General de Adquisiciones del Estado en el que declara que dicha información y documentación corresponden a la persona individual o jurídica identificada en esta constancia y sabiendo de la pena relativa al delito que establece el artículo 459 del Código Penal. No asumiendo el Registro responsabilidad alguna por omisión o actos previos o posteriores, realizados por los proveedores que transgredan el marco legal.
- El Registro General de Adquisiciones del Estado no prejuzga sobre procesos, procedimientos administrativos o requisitos que para una eventual contratación establezcan las entidades reguladas en el artículo 1 de la Ley de Contrataciones del Estado, ni sobre los procesos de ejecución o imputación de los renglones que para cada tipo de gasto corresponda, de acuerdo a la normativa aplicable.

PBX: 2374-2822 ext. 10290

Ministerio de Finanzas Públicas, Registro General de Adquisiciones del Estado.  
8a. Avenida 20-59 Zona 1, Centro Cívico, Guatemala
