




**CONTRATO DE EJECUCION DE PROYECTOS TREINTA Y CUATRO GUION DOS MIL
VEINTITRES (34-2023)**


**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL
PROGRESO
NOG. 20671520**

En el Municipio de Guastatoya, del departamento de El Progreso, el día **NUEVE (9) DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS (2023)**. **NOSOTROS:** Por una parte comparezco Yo, **JORGE ANTONIO ORELLANA PINTO**, de cincuenta y dos años de edad, casado, guatemalteco, Licenciado en Administración de Empresas, domiciliado en el departamento de El Progreso, me identifico con el documento personal de identificación -DPI-, Código Único de Identificación -CUI-, dos mil quinientos setenta espacio cincuenta y tres mil novecientos sesenta y cuatro espacio cero dos cero uno, (2570 53964 0201), extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala; DE LA CALIDAD CON QUE ACTUO. Actúo en calidad de **Alcalde Municipal**, de la ciudad de Guastatoya, del departamento de El Progreso, calidad que acredito, con la certificación del acta de toma de posesión, dos guion dos mil veinte (2-2020), de fecha quince de enero de dos mil veinte, contenida en el libro número dos mil seiscientos cuarenta y siete (2647), de sesiones extraordinarias del Concejo Municipal, debidamente autorizado por la Contraloría General de Cuentas, y el Acuerdo número cero cero uno guión dos mil diecinueve (001-2019), de la Junta Electoral Departamental de El Progreso, con el número de **CUENTADANCIA: Gestión dos mil veintidós guion doscientos guion doscientos uno guion veintidós guion cero cero uno (2022-200-201-22-001)**; y por la otra parte comparezco Yo, **MARIAM FRANCINY ARAGÓN FLORES**, de treinta y cuatro años de edad, soltera, Guatemalteca, Empresaria, domiciliado en el departamento de Zacapa, me identifico con el Documento Personal de Identificación -DPI- dos mil setecientos setenta y siete espacio diez mil cuatrocientos ochenta espacio mil novecientos seis (2777 10480 1906), extendido por el Registro Nacional de las Personas, actúo en calidad de **PROPIETARIO** de la Empresa Mercantil denominada **CONSTRUSU**, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de la República de Guatemala, con Registro 597102, folio 201 del libro 559 de Empresas Mercantiles, con dirección del propietario Segunda avenida dos guion treinta y dos zona dos, Usumatlán, Zacapa, y con el número de identificación tributaria cuarenta y siete millones quinientos cincuenta y cinco seiscientos veintinueve 47555629; con Registro de actualización del Registro General de Adquisiciones del Estado Expediente 202356611 RGAE-2023, Resolución 202373588 y constancia de inscripción y precalificación como proveedor del Estado, resolución 202374071, con el cual hace constar la capacidad económica y las especialidades de la sociedad referida, constancias emitidas por el Registro General de Adquisiciones del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas. Ambos comparecientes manifestamos encontrarnos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles y que las representaciones que acreditamos son suficientes de conformidad con la ley y a nuestro juicio para celebrar el presente contrato, toda la documentación indicada se tiene a la vista y en lo sucesivo simplemente se denominará LA MUNICIPALIDAD y "EL CONSTRUCTOR", sujetándonos a las cláusulas siguientes.

PRIMERA: El Licenciado **JORGE ANTONIO ORELLANA PINTO**, Alcalde Municipal, manifiesto que actúo en representación de la Municipalidad de Guastatoya del departamento de El Progreso, y expongo que de conformidad con el Punto Resolutivo emitido por la Autoridad Superior, contenido en el **PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO, del acta 77-2023, de fecha veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, del libro 3,277 de sesiones ordinarias del Concejo Municipal**, libro debidamente autorizado por la Contraloría General de Cuentas, en la cual la Autoridad Superior aprueba la adjudicación realizada por la Junta de Licitación, para la ejecución del proyecto denominado



¡GUASTATOYA seguirá cambiando!






AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO, de conformidad con las bases técnicas, especificaciones generales y planos presentados. El presente contrato se suscribe con fundamento en los artículos 9, numeral 6) literal b), artículo 47, 49, del a Ley de Contrataciones del Estado y sus Reformas y Artículo 42 del Reglamento de la misma ley, 53 literal I del Decreto 12-2002 Código Municipal y sus reformas; se tienen incorporados al instrumento contractual el proceso establecido en la Ley de Contrataciones del Estado, la oferta presentada por el constructor y la adjudicación correspondiente.

SEGUNDA: El Constructor se compromete a ejecutar para la Municipalidad de Guastatoya, el proyecto **AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO**, obra que se encuentra en el sector urbano, de este municipio el que se ejecutará de conformidad con el presupuesto presentado por la Empresa Constructora.


Renglón No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario (Q)	Precio Total (Q)
TRABAJOS PRELIMINARES					
1.0	RETIRO Y DEMOLICION DE CARPETA DE ADOQUIN EXISTENTE	M2	700.00	112.00	78,400.00
2.0	LEVANTAMIENTO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	M2	700.00	24.00	16,800.00
COLECTOR DE AGUA PLUVIAL					
3.0	CONSTRUCCION CAJA PLUVIAL COLECTORA DE CONCRETO ARMADO	UNIDAD	2.00	73,880.00	147,760.00
4.0	CONSTRUCCION REJILLA METALICA	UNIDAD	2.00	37,206.00	74,412.00
5.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 48 PULGADAS AASHTO M-294	ML	132.00	7,369.00	972,708.00
6.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 30 PULGADAS AASHTO M-294	ML	132.00	4,782.00	631,224.00
DRENAJE SANITARIO					
7.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 15 PULGADAS ASTM F-949	ML	142.00	1,710.00	242,820.00
8.00	FABRICACION DE POZOS DE VISITA	UNIDAD	2.00	13,201.00	26,402.00


CONSTRUSU
"El camino al éxito siempre está en construcción"
Prop. Marian Kuzán

2



¡GUASTATOYA seguirá cambiando!





9.00	REPOSICION DE BROCAL + TAPADERA DE POZO DE VISITA	UNIDAD	1.00	5,504.00	5,504.00
				TOTAL	2,196,030.00

El tiempo de entrega de la obra es de **SEIS (6) MESES CALENDARIO**, de conformidad con el cronograma de ejecución presentado por el constructor, el plazo referido se computará a partir de la aprobación del contrato a la fecha de aprobación de la liquidación del mismo.

TERCERA: EL CONSTRUCTOR: Por su parte manifiesta que respecto a la ejecución del proyecto reitera que se compromete a lo siguiente: a) entregar totalmente terminada la obra a satisfacción de la Municipalidad de Guastatoya. b) a contratar un Profesional quien será el Supervisor de Proyectos Residente, quien conjuntamente con el Ingeniero Supervisor de la Municipalidad informarán en forma simultánea a la Autoridad Administrativa, al Concejo Municipal y a la Contraloría General de Cuentas de la Nación cuando lo requiera, de los avances físicos del proyecto y las estimaciones de pago, para el efecto deberán presentar las fotocopias de la bitácora del Proyecto, autorizada por la Contraloría General de Cuentas.


CUARTA: El señor Alcalde Municipal en representación de la Municipalidad de Guastatoya, manifiesta que está de acuerdo en las condiciones del constructor, especialmente en lo que respecta al total del proyecto; así como en el tiempo de entregar la obra, ambos de común acuerdo llegaron a establecer la forma de pago de la manera siguiente:

QUINTA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato pactado entre la Municipalidad y la Empresa Mercantil, **CONSTRUSU** asciende a la cantidad de **DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL TREINTA QUETZALES (Q. 2,196,030.00)**, incluido el impuesto al valor agregado -IVA-, los que se pagarán con fondos tripartitos, descritos de la manera siguiente:


INSTITUCION	MONTO
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO DE EL PROGRESO	Q.2,000,000.00
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA	Q. 195,530.00
CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO	Q. 500.00
TOTAL	Q.2,196,030.00

Aportes definitivos aprobados de conformidad con el Acuerdo del Concejo Municipal contenido en el punto **VIGESIMO SEGUNDO** del acta **78-2023** de fecha **29 de septiembre de 2,023**, libro de sesiones ordinarias número **3277**, del Concejo Municipal, y de conformidad con la constancia de disponibilidad presupuestaria que obra en el expediente administrativo para el presente proyecto; la estructura presupuestaria queda integrada de la manera siguiente: **12-002-002-000-001, FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21-0101-0001 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA-PAZ, 31-0101-0004 CONSEJO DE DESARROLLO URBANO Y RURAL, 31-3101-0002 APOORTE DE LA COMUNIDAD PARA INVERSION.**

PAGOS: Los cuales se efectuarán de conformidad con el artículo 58 de la Ley de Contrataciones del Estado, de la manera siguiente: a). Un anticipo del veinte por ciento (20%) equivalente a la cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SEIS QUETZALES (Q. 439,206.00), el que se entregará previo a cumplir con los siguientes requisitos: **I). Otorgar a la Municipalidad PLAN DE INVERSIÓN, FIANZA DE ANTICIPO, FIANZA DE CUMPLIMIENTO**, las cuales garantizarán la correcta aplicación del mismo con fundamento en Artículos 64, 65, 66, de la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas y los artículos 53, 54, 55, 56, 58 Y 59 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y, **II). Los PAGOS SIGUIENTES, se efectuarán de conformidad con las estimaciones de pago de conformidad con el artículo 59 de la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas, en el cual la Municipalidad de Guastatoya, hará los pagos contra las estimaciones periódicas de trabajo ejecutado y aceptado, las que podrán efectuarse mensualmente, trabajos debidamente comprobados, con los informes presentados por el Supervisor del Proyecto Residente juntamente con el Supervisor de**



¡GUASTATOYA seguirá cambiando!



3
CONSTRUSU
"El camino al éxito siempre está en construcción"
Prop. Marian Arce

Proyectos de la Municipalidad de Guastatoya. III). El último pago equivalente al 100% de avance físico del proyecto, presentando para el efecto, **GARANTIA DE CONSERVACION DE OBRA, CALIDAD O FUNCIONAMIENTO, FIANZA DE SALDOS DEUDORES, ACTA DE RECEPCIÓN DEL PROYECTO POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD E INFORME FINAL DE LOS SUPERVISORES PROFESIONALES DEL PROYECTO.**

SEXTA: SANCIONES: El constructor se compromete a entregar los trabajos conforme el contrato suscrito. Y en caso de atraso por parte del Constructor en la entrega de los trabajos, se determinará el atraso en la entrega de la obra con base en las fechas de terminación, parciales o total, fijadas en el programa de ejecución convenido, debiendo aplicarse las multas sin perjuicio de la facultad que tiene la entidad contratante para exigir el cumplimiento del contrato para rescindirlo. Para efecto de la multa, se tomará en cuenta solo la parte proporcional del atraso, por lo que su aplicación no debe afectar la parte del cumplimiento parcial. Se sancionará con el pago de una multa que se aplique al contratista entre el uno al cinco por millar del monto de los trabajos, que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente, por cada día de atraso en que incurra el contratista desde la fecha de terminación pactada hasta la total conclusión de los mismos, en ningún caso podrán ser superiores en su conjunto al monto de la garantía de cumplimiento. Asimismo, el Constructor deberá cumplir con los trabajos estipulados en el presente contrato y la Municipalidad no concederá ningún plazo de prórroga a excepción de los siguientes casos: a). si se trata de órdenes de trabajo extra u otros convenios, b). Indicar claramente el plazo improrrogable que se le otorgue al constructor para el trabajo correspondiente y deberá solicitarlo dentro del plazo que indica el Artículo 43, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas.


En relación a lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas, el atraso de la entrega de la obra, por causa imputable al contratista será sancionado del 1 al 5 por millar del monto de las obras que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente, calculando a partir de las fechas pactadas de la entrega parcial o total con respecto a la ejecución convenida con la entidad contratante. Dicha multa solamente se tomará de la parte proporcional del atraso, sin afectar el cumplimiento parcial.

Tasa de cálculo	Días
10/00	1 a 20
20/00	21 a 30
30/00	31 a 60
40/00	61 a 120
50/00	121 hasta su cumplimiento

La entidad ejecutora será la que emita las sanciones correspondientes.

SEPTIMA: OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR: El constructor se obliga a presentar informes periódicos, cronograma de ejecución de la obra, bitácora de los trabajos de conformidad con el Artículo 37 inciso a). del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, deben de autorizar los libros en la Dirección de Infraestructura Pública de la Contraloría General de Cuentas, así como permitir en cualquier momento que las personas autorizadas por la Municipalidad supervisen las actividades que se desarrollan, asimismo instruirá a su personal para que se le preste la debida colaboración a las personas que supervisan y que son parte de esta Municipalidad, el Constructor deberá de revisar cuidadosamente los documentos contractuales y señalará cualquier omisión o error, contradicción o incongruencia que observe a este respecto, deberá formular la consulta y observación del caso antes de los quince días de ejecutar el proyecto, el constructor previamente a la adquisición de materiales deberá proporcionar a la Municipalidad cuando esto lo requiere muestras de materiales para analizarlos y aprobarlos. El Constructor queda facultado para retirar de la obra a cualquier trabajador que considere incompetente, negligente insubordinado o perjudicial a la buena marcha de dichos trabajos. El constructor deberá de aprobar las herramientas, materiales, mano de obra, transporte y demás elementos necesarios.

El Constructor se obliga al cumplimiento del artículo 82 de la LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, por medio de cual obliga al





constructor a colocar y mantener en pleno funcionamiento dispositivos de grabación digital para visualizar en línea el desarrollo integral de las obras a través de internet, para realizar monitoreo y seguimiento que permita a la población observar el avance físico de las mismas.

El Constructor queda obligado a solicitar la publicación en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (GUATECOMPRAS) de la dirección de la página de internet que permita consultar en línea el avance físico de la obra, el cual es obligatorio en proyectos mayores de novecientos mil quetzales (Q. 900,000.00), y deberá de contar con un archivo electrónico que contenga el historial de ejecución de los proyectos, el cual deberá ser actualizado mensualmente.

OCTAVA: CLAUSULA RELATIVA AL COHECHO: Yo el Contratista, bajo juramento de Ley, manifiesto que conozco las penas relativas al delito de cohecho así como las disposiciones contenida en el Capítulo III del Título XIII del Decreto 17-73 del Congreso de la República, Código Penal. Adicionalmente, conozco las normas jurídicas que facultan a la Autoridad Superior de la entidad afectada para aplicar las sanciones administrativas que pudieren corresponderme, incluyendo la inhabilitación en el sistema GUATECOMPRAS".

NOVENA: OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD: a) La Municipalidad se obliga a efectuar el pago en tiempo y en formas convenidas, b). Faccionar el acta de inicio y avances físicos y actas de recepción para realizar la liquidación final de los trabajos a ejecutar y prestar la colaboración necesaria para el constructor para realizar los mismos, c). Designar a la persona o Personas que supervisen los trabajos del proyecto citado anteriormente previa inspección final.

DECIMA: OTRAS OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR: a). Se compromete a sostener el precio de la oferta, b). Entregar la obra en el tiempo y lugar indicado, c). Ejecutar la obra con material de buena calidad y garantizados de conformidad con lo que estipula la ley de contrataciones del estado, d) Contratar mano de obra necesaria y suficiente para la realización del proyecto, y se compromete a obtener en este municipio el cual será calificado por el constructor, e). Es responsable por el trabajo ejecutado por las personas que contrate así como de los daños y perjuicios que causen a terceras personas como consecuencia de la realización de la obra contratada. f). De conformidad con el artículo 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, se podrá ampliar el monto del contrato, previo que sean aprobadas las ordenes de cambio, ordenes de trabajo suplementario o acuerdo de trabajo extra, y se suscribirá un contrato adicional de conformidad con el contenido relativo a la Ley de la materia.

DECIMA PRIMERA: FIANZAS: 1. El constructor se obliga a presentar:


1. **FIANZA DE SOSTENIMIENTO DE OFERTA** no menor del uno por ciento (1%) ni mayor del cinco por ciento (5%) del valor del contrato, que cubrirá el periodo comprendido desde la recepción y apertura de plicas hasta la aprobación de las adjudicaciones, y, en todo caso, tendrá una vigencia de ciento veinte (120) días, como lo establece el artículo 64 de la Ley de Contrataciones.

2. **FIANZA DE CUMPLIMIENTO:** Como requisito previo para la aprobación del presente contrato de conformidad con el Artículo 65 de la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas, que garantizara el cumplimiento de todas las obligaciones estipuladas en el contrato, el contratista deberá prestar fianza, deposito en efectivo o constituir hipoteca en los porcentajes y condiciones que señale el reglamento. Para el caso de obras, además esta garantía cubrirá las fallas o desperfectos que aparecieren durante la ejecución del contrato, antes que se constituya la garantía de conservación. **Por un valor del diez por ciento (10%) del monto del contrato respectivo.**


La Garantía de Cumplimiento deberá estar vigente, según el caso:

1. Cuando se trate de la adquisición de bienes, suministros y servicios hasta que la entidad interesada extienda la constancia de haber recibido a su entera satisfacción la garantía de calidad o de funcionamiento, o haberse prestado el servicio en su caso;
2. Cuando se trate de construcción de obras, hasta que la entidad interesada extienda la constancia de haber recibido a su satisfacción la garantía de conservación de obra.

CONSTRUSU
"El camino al éxito siempre está en construcción"
Prop. Marimar Aragón



¡GUASTATOYA seguirá cambiando!





Para los casos en que las bases el contrato respectivo, se contemplen recepciones parciales para el cumplimiento del objeto del contrato, se podrá ajustar la garantía de cumplimiento conforme se establezca en dichos instrumentos y siempre que se cuente con la constancia a que se refiere el presente artículo.

3. FIANZA DE ANTICIPO: Previo a recibir cualquier suma por concepto de anticipo, el contratista constituirá garantía mediante fianza o hipoteca por el monto de un cien por ciento (100%) del mismo. La garantía podrá reducirse en la medida que se amortice el valor del anticipo cubriendo siempre el máximo del saldo deudor y estará vigente hasta su total amortización. El reglamento establecerá el procedimiento de reducción y lo concerniente en los casos de rescisión, resolución y terminación de contrato.

4. FIANZA DE CONSERVACION DE LA OBRA O DE LA CALIDAD DE FUNCIONAMIENTO: El contratista responderá por la conservación de la obra, mediante depósito en efectivo, fianza, hipoteca o prenda, a su elección, que cubra el valor de las reparaciones de las fallas o desperfectos que le sean imputables y que aparecieren durante el tiempo de responsabilidad de dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha de recepción de la obra. Tratándose de bienes y suministros, deberá otorgarse garantía de calidad y/o funcionamiento, cuando proceda. La garantía de conservación de obra, o de calidad y/o funcionamiento, deberá otorgarse por el equivalente al quince por ciento (15%) del valor original del contrato, como requisito previo para la recepción de la obra, bien o suministro. El vencimiento del tiempo de responsabilidad previsto en el párrafo anterior, no exime al contratista de las responsabilidades por destrucción o deterioro de la obra debido a dolo o culpa de su parte, por el plazo de cinco (5) años, a partir de la recepción definitiva de la obra.


Garantía de Conservación de obra, calidad o funcionamiento. El contratista dentro de los veinte (20) días calendario previo a la finalización de la vigencia de la garantía de cumplimiento de contrato, deberá presentar la garantía de conservación de obra, calidad o funcionamiento, según corresponde de conformidad con lo siguiente:

- Para el caso de obras, la garantía de conservación de obras.
- Para el caso de maquinaria, medios de transporte, equipos instalados u otros equipos cuyo funcionamiento deba garantizarse por el contratista en el tiempo que determina La Ley o el contrato, la garantía de funcionamiento.
- Para el caso de bienes que no se incluyen en los indicados en la literal anterior, corresponderá a la entidad contratante determinar la procedencia de la presentación de la garantía de calidad.

Para las adquisiciones de suministros e insumos consumibles que por su naturaleza sean de alta rotación y a los servicios, no les será aplicable la presentación de la garantía de calidad o funcionamiento, en virtud de su fungibilidad y la intangibilidad de determinados servicios; debiendo en todo caso, sujetar su plazo en el contrato respectivo, siendo responsabilidad de la entidad contratante establecer en las bases y en el contrato, los medios u otras garantías que aseguren el cumplimiento del contratista respecto al objeto del contrato.

5. FIANZA DE SALDOS DEUDORES Para garantizar el pago de saldos deudores que pudieran resultar a favor del Estado, de la entidad correspondiente o de terceros en la liquidación, el contratista deberá prestar fianza, depósito en efectivo; constituir hipoteca o prenda, a su elección, por el cinco por ciento (5%) del valor original del contrato. Esta garantía deberá otorgarse simultáneamente con la de conservación de obra como requisito previo para la recepción de la obra, bien o suministro. Aprobada la liquidación, si no hubiere saldos deudores, se cancelará esta garantía.

Las fianzas descritas en el presente contrato, deberán formalizarse mediante póliza emitida por instituciones autorizadas para operar en Guatemala, de conformidad con las siguientes disposiciones: La vigencia de las fianzas será exactamente igual al plazo contractual y deberá ajustarse ante cualquier ampliación o variación del contrato, manteniendo las condiciones de cobertura que aplicaron al contrato original. Lo anterior no es aplicable a las fianzas de conservación de obra, de calidad, de funcionamiento o de saldos deudores. a) Las fianzas garantizarán exacta y fielmente las obligaciones a cargo del contratista o proveedor. Estas obligaciones deben estar estipuladas en el contrato original y en cada una de las modificaciones documentadas. b) El funcionario que corresponda será responsable de exigir la actualización de las fianzas otorgadas por el contratista o proveedor. De omitirlo, el funcionario incurrirá en incumplimiento de deberes. c) El





contratista o proveedor que omita actualizar la fianza otorgada ante modificaciones del contrato original, se hará acreedor a una multa y a la suspensión inmediata de los pagos a que tenga derecho. d) Cuando la garantía consistiere en depósitos, deberá hacerse en Quetzales o por medio de cheque certificado. Cuando la garantía sea hipotecaria o prendaria, se formalizará a través de escritura pública debidamente registrada. En todo caso, quedará a criterio del contratista o proveedor la garantía a proporcionar. Las fianzas deberán publicarse en el sistema GUATECOMPRAS. Las juntas a las que se refiere el artículo 10 de esta Ley, serán responsables de verificar la autenticidad de las fianzas de sostenimiento de oferta, y las autoridades suscriptoras de los contratos serán responsables de verificar la autenticidad de las demás fianzas a las que se refiere este capítulo. El sistema GUATECOMPRAS llevará un registro de las fianzas presentadas, así como de las solicitudes de ejecución, ejecución de fianzas y pago de las mismas. Con fundamento en el artículo 69 de la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas

DECIMA SEGUNDA: FORMA DE EFECTUAR LOS TRABAJOS DEL CONSTRUCTOR: El constructor efectuará los trabajos bajo estricta responsabilidad bajo la supervisión de un Profesional del Ramo, colegiado activo de quién deberá presentar la certificación o constancia correspondiente; asimismo incluirá los materiales, mano de obra, equipo y demás elementos necesarios para la correcta aplicación y ejecución del proyecto, mismas que se estarán supervisando por el Ingeniero Supervisor de Obras Municipales, quien cuenta con el aval y aprobación de la Corporación Municipal, así como de la comisión de recepción de la citada obra. El Constructor se compromete a dejar limpias las áreas donde se ejecute el proyecto.

DECIMA TERCERA: CONTROVERSIAS: Toda controversia que pudiera surgir entre los contrayentes en lo que se refiere a la interpretación cumplimiento, aplicación y ejecución de este contrato será resuelto en el menor tiempo posible en forma conciliatoria entre ambas partes y en última instancia de no ponerse de acuerdo en el Tribunal correspondiente de lo contencioso administrativo de conformidad con el Artículo 102 de la citada ley; asimismo que se acepta los procedimientos señalados en el Código Procesal Civil y Mercantil, renunciando el constructor al fuero de su domicilio y señalando como lugar para recibir notificaciones y citaciones BARRIO EL CALVARIO, GUASTATOYA, EL PROGRESO.

DECIMA CUARTA: TERMINACION DEL CONTRATO: La Municipalidad puede dar por terminado, resuelto y/o rescindido el presente contrato en forma unilateral y sin responsabilidad de su parte en los siguientes casos: a). Por vencimiento del plazo pactado, siempre que no haya ocurrido prórroga, b). Si el constructor incumple con sus obligaciones, c). Si paraliza sin causa justificada los trabajos por más de diez días consecutivos, d). Por rescisión de mutuo acuerdo, e). Si el constructor le fueren embargado bienes y que evidentemente afecten el cumplimiento del contrato.



DECIMA QUINTA: PROHIBICIONES: EL CONSTRUCTOR: declara bajo juramento de ley y bien enterados de las penas relativas al delito de perjurio que no se encuentra comprendido dentro de las limitaciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Y que, si en el transcurso del proceso de adquisición o en la ejecución de un contrato se presenta alguna de las prohibiciones definidas en el artículo 80 de la Ley, el contratista o proveedor deberá hacerlo de conocimiento de la autoridad competente dentro de los dos días siguientes al conocimiento del acaecimiento de la prohibición, para que ésta analice la situación planteada y resuelva sobre el proceso del contrato.

La falta de aviso sobre el acaecimiento de alguna de las prohibiciones definida en la Ley, será causal suficiente para la inhabilitación del contratista o proveedor, quien de conformidad con la ley será responsable de compensar a la entidad contratante por los daños y perjuicios ocasionados.

El trámite de la inhabilitación y de la rehabilitación es responsabilidad de la entidad contratante o ejecutora, quien deberá cumplir con el procedimiento, plazos y condiciones que definan las Normas de Uso del Sistema GUATECOMPRAS y, en todo caso, debe respetarse el derecho de defensa.

La inhabilitación y la rehabilitación en el Sistema GUATECOMPRAS implica la correspondiente inhabilitación o rehabilitación en el Registro General de Adquisiciones del Estado.







DECIMA SEXTA: INSPECCION, RECEPCION Y LIQUIDACION FINAL: 1. El constructor deberá de permitir en cualquier momento que las personas autorizadas por la Municipalidad Inspeccionen las instalaciones, actividades y trabajos que realicen e instruirá a su personal para que atiendan a las personas nombradas proporcionándoles toda información requerida. 2. La Municipalidad nombrará una comisión receptora de los trabajos y harán la inspección correspondiente ante la presencia del constructor su representante legal y posteriormente informarán al Concejo Municipal si se puede faccionar el acta de recepción respectiva para que la Dirección de Administración Financiera efectúe la liquidación final o en su defecto si hay que corregir algunos trabajos o complementar otros, en este último caso deberá indicar cuales son los trabajos a efectuar y el tiempo a emplear y si el plazo es necesario se incluye dentro del tiempo contractual o le concede o no algún tiempo adicional.

DECIMA SEPTIMA: APROBACION: Para que el presente contrato surta sus efectos legales y obligue a las partes al cumplimiento de las cláusulas contenidas deberá ser aprobado de conformidad con el artículo 42 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas.

DECIMA OCTAVA: ACEPTACION DEL CONTRATO: En todos los términos y condiciones estipuladas LA MUNICIPALIDAD Y EL CONSTRUCTOR aceptan para si el presente contrato el que se encuentra contenido en nueve (9), hojas membretadas impresas de un solo lado, leemos íntegramente lo escrito y bien enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo aceptamos, ratificamos y firmamos. Damos Fe.

MUNICIPALIDAD
DE GUASTATOYA,
LIC. JORGE ANTONIO ORELLANA PINTO
ALCALDE MUNICIPAL
ALCALDE

CONSTRUSU
"El camino al éxito siempre está en construcción"
Prop. Mariam Aragón
MARIAM FRANCINY ARAGON FLORES
PROPIETARIA CONSTRUSU





Municipalidad de GUASTATOYA

Departamento de El Progreso, Guatemala, C.A.

info@muniguasta.com

www.muniguastatoya.com

Telefax: 7945-1594, 7945-1602, 7945-1603



Guastatoya, miércoles, 13 de diciembre de 2023

SEÑOR(es):

ALCALDE MUNICIPAL Y
HONORABLE CORPORACION
GUASTATOYA, EL PROGRESO

Respetables señor(es):

El motivo del presente es para informar los resultados de la siguiente estimacion de pago:

No. De Supervision de Avance Fisico:	ESTIMACION No.1		
Nombre del Proyecto:	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO.		
No. De Contrato del Proyecto:	34-2023	Fecha del Contrato:	9/10/2023
NOG.	20671520		
Estimacion del Avance Fisico:	4.3350956%		
Monto de Estimacion del Avance Fisico:	Q95,200.00	en letras:	NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS QUETZALES CON 00/100 CENTAVOS
Amorización del Anticipo:	Q19,040.00	en letras:	DIECINUEVE MIL CUARENTA QUETZALES CON 00/100 CENTAVOS
Cantidad Liquida a Recibir:	Q76,160.00	en letras:	SETENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA QUETZALES CON 00/100 CENTAVOS

Se adjunta anexo que contiene el detalle de la presente estimacion para que se continúe con lo procedente.

Agradeciendo desde ya, me suscribo.

Atentamente,

ING. CARLOS RAMIRO ORTEGA LIMA

COLEGIADO: 7118

SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

Carlos Ramiro Ortega Lima
Ingeniero Civil
Col. 7118

ESTIMACION No.1

NOMBRE DEL PROYECTO:										AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO.										PERIODO DEL:		16-10-23		AL		13-12-23																							
FECHA INICIO DEL PROYECTO:										16 de octubre de 2023										CONCEPTO										FECHA																			
TIEMPO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO:										6 MESES										CONTRATO										34-2023																			
FECHA DE FINALIZACION										15 de abril de 2024										MONTO DE CONTRATO										Q										2,196,030.00									
NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA:										CONSTRUSU										SNIP										306671																			
REPRESENTANTE LEGAL EMPRESA CONSTRUCTORA:										MIRIAM FRANCINY ARAGON FLORES										NOG										20671520																			



Municipalidad de GUASTATOYA

Departamento de El Progreso, Guatemala, C.A.

info@muniguasta.com

www.muniguastatoya.com

Telefax: 7945-1594, 7945-1602, 7945-1603



Guastatoya, miércoles, 13 de diciembre de 2023

SEÑOR(es):

ALCALDE MUNICIPAL Y
HONORABLE CORPORACION
GUASTATOYA, EL PROGRESO

Respetables señor(es):

Respetuosamente me dirijo a usted, con el proposito de REMITIR el INFORME
DE SUPERVISION que acontinuacion se describe:

Nombre del Proyecto:	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO.		
No. De Contrato del Proyecto:	34-2023	Fecha del Contrato:	9/10/2023
NOG.	20671520		
Empres constructura:	CONSTRUSU		

Se realizo la visita al proyecto antes en mencion para hacer constar los avances de los renglones contratados en su avance fisico notificado por la empresa Constructora los cuales se describen a continuacion:

GUASTATOYA esta cambiando



Municipalidad de GUASTATOYA

Departamento de El Progreso, Guatemala, C.A.

info@muniguasta.com

www.muniguastatoya.com

Telefax: 7945-1594, 7945-1602, 7945-1603



700 M2 DE RETIRO Y DEMOLICION DE CARPETA DE ADOQUIN EXISTENTE

700 M2 DE LEVANTADO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO

TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR

2 Unidad DE CONSTRUCCION CAJA PLUVIAL COLECTORA DE CONCRETO ARMADO

2 Unidad DE CONSTRUCCION REJILLA METALICA

132 ML DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 48 PULGADAS AASHTO M-294

132 ML DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 30 PULGADAS AASHTO M-294

142 ML DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 15 PULGADAS ASTM F-949

2 Unidad DE FABRICACION DE POZOS DE VISITA

1 Unidad DE REPOSICION DE BROCAL + TAPADERA DE POZO DE VISITA

Estimacion del Avance	
Fisico:	4.3350956%

Se adjunta anexo que contiene el detalle de la presente estimacion para que se continúe con lo procedente.

Agradeciendo desde ya, me suscribo.

Atentamente,

ING. CARLOS RAMIRO ORTEGA-LIMA

COLEGIADO: 7118

SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

Carlos Ramiro Ortega Lima
Ingeniero Civil
Col. 7118

GUASTATOYA esta cambiando



Municipalidad de **GUASTATOYA**

Departamento de El Progreso, Guatemala, C.A.

info@muniguasta.com

www.muniguastatoya.com

Telefax: 7945-1594, 7945-1602, 7945-1603




**INFORME
FOTOGRAFICO**

**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL
BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO.**




GUASTATOYA esta cambiando



CONSTRUSU

"El camino al éxito siempre está en construcción"



Usumatlán, Zacapa 13 de diciembre de 2023

Señor:

Jorge Antonio Orellana Pinto
Alcalde Municipal
Municipalidad de Guastatoya, El Progreso

Respetable señor:

Me dirijo a usted de manera respetuosa deseándole éxitos en sus labores cotidianas y así mismo expresar lo siguiente:

La empresa "**CONSTRUSU**" solicita que a través de su despacho sea posible realizar la supervisión del proyecto **AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO**, mismo que cuenta con un avance del **4.3350956%** por lo que se solicita realizar los trámites correspondientes para el pago de este.

Adjunto a esta solicitud:

- Estimación al **4.3350956%**
- Informe Fotográfico

Esperando su pronta respuesta me suscribo de usted.

Atentamente,


Mariam Franciny Aragón Flores
Propietaria
CONSTRUSU



CONSTRUSU

“El camino al éxito siempre está en construcción”


ESTIMACION No. 1																			
NOMBRE DEL PROYECTO:				AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO EL PORVENIR, GUASTATUYA, EL PROGRESO						PERIODO DEL:		16-10-23		AL		13-dic-23			
FECHA INICIO DEL PROYECTO:				16/10/2023		FECHA		9/10/2023		Fecha Solicitud:									
TIEMPO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO:				6 MESES		CONTRATO		34-2023											
NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA:				CONSTRUSU		MONTO DE CONTRATO		Q		2,196,030.00									
REPRESENTANTE LEGAL EMPRESA CONSTRUCTORA:				MARIAM FRANCINY ARAGON FLORES		NOG				Q		20671520				4.3350956%			
				TRABAJO FISICO						COSTO FINANCIERO									
No. RENGLO	DESCRIPCION DEL RENGLO	Cantidad Contratada				Cantidad Ejecutada				Costo de Ejecución				Monto por ejecutar					
		Unidad de Medida	Cantidad Contratada	Orden de Cambio	Orden de Trabajo Sup	Acuerdo Trabajo Extra	Cantidad Actual	Precio Unitario Q.	Costo Total Estimado	Este Periodo	Anterior	Total a LA FECHA	%	Por Estimar	%				
TRABAJOS PRELIMINARES																			
1.00	RETIRO Y DEMOLICION DE CARPETA DE ADOQUIN EXISTENTE	m2	700.00				700.00	Q 112.00	Q 78,400.00	700.00		Q 78,400.00	100.00%	Q -	0.00%				
2.00	LEVANTAMIENTO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	m2	700.00				700.00	Q 24.00	Q 16,800.00	700.00		Q 16,800.00	100.00%	Q -	0.00%				
COLECTOR DE AGUA PLUVIAL																			
3.00	CONSTRUCCION CAJA PLUVIAL COLECTORA DE CONCRETO ARMADO	unidad	2.00					Q 73,880.00	Q 147,760.00			Q -	0.00%	Q 147,760.00	100.00%				
4.00	CONSTRUCCION REJILLA METALICA	unidad	2.00					Q 37,206.00	Q 74,412.00			Q -	0.00%	Q 74,412.00	100.00%				
5.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 48 PULGADAS AASHTO M-294	ml	132.00					Q 7,369.00	Q 972,708.00			Q -	0.00%	Q 972,708.00	100.00%				
6.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 30 PULGADAS AASHTO M-294	ml	132.00					Q 4,782.00	Q 631,224.00			Q -	0.00%	Q 631,224.00	100.00%				
DRENAJE SANITARIO																			
7.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 15 PULGADAS ASTM F-949	ml	142.00					Q 1,710.00	Q 242,820.00			Q -	0.00%	Q 242,820.00	100.00%				
8.00	FABRICACION DE POZOS DE VISITA	unidad	2.00					Q 13,201.00	Q 26,402.00			Q -	0.00%	Q 26,402.00	100.00%				
9.00	REPOSICION DE BROCAL + TAPADERA DE POZO DE VISITA	unidad	1.00					Q 5,504.00	Q 5,504.00			Q -	0.00%	Q 5,504.00	100.00%				
TOTAL CONTRATADO									Q 2,196,030.00	VALOR DE LA ESTIMACION				Q 95,200.00	Q -	Q 95,200.00	4.3350956%	Q 2,100,830.00	95.66490%
										AMORTIZACION DEL ANTICIPO				Q 19,040.00					
										TOTAL LIQUIDO A RECIBIR				Q 76,160.00					


MARIAM FRANCINY ARAGON FLORES
Propietaria
CONSTRUSU


ING. Marco Leonel Rodriguez Flores
Supervisor de Obras
Ingeniero Civil
Col. 12,670



Marco Leonel Rodriguez Flores
Ingeniero Civil
Col. 12,670

“El camino al éxito siempre está en construcción”




CONSTRUSU


"El camino al éxito siempre está en construcción"



INFORME FOTOGRAFICO ESTIMACION #1


AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO

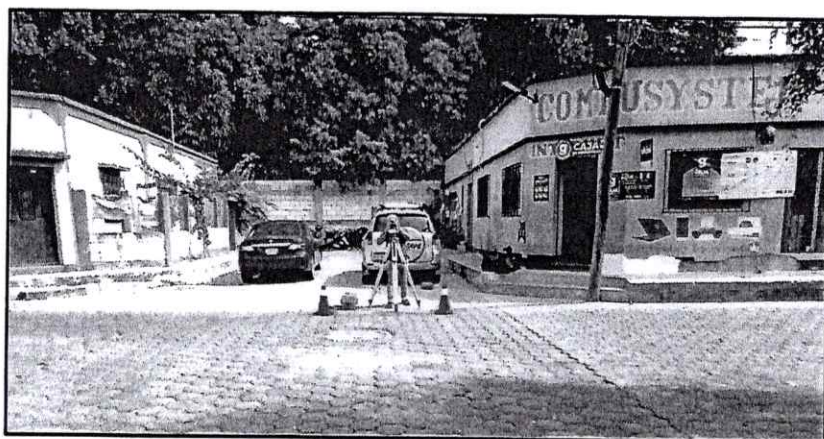




CONSTRUSU





"El camino al éxito siempre está en construcción"






CONSTRUSU



"El camino al éxito siempre está en construcción"

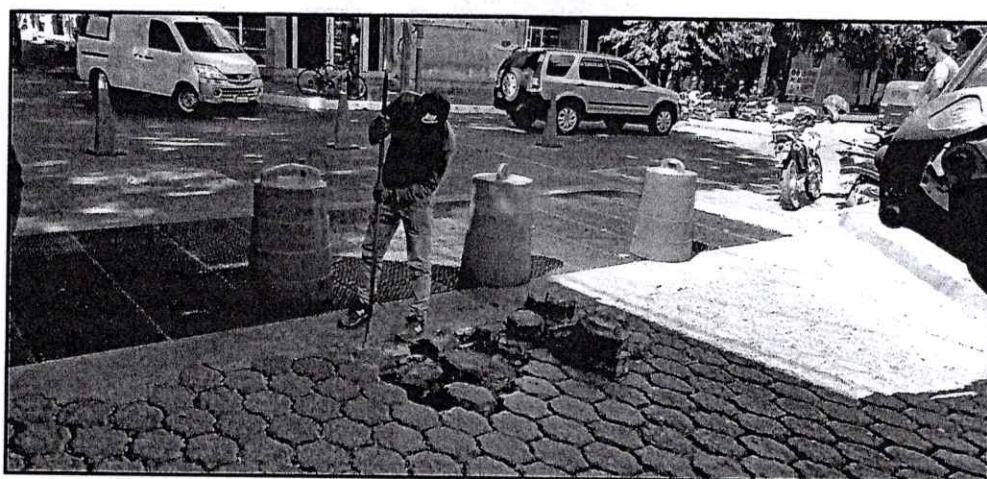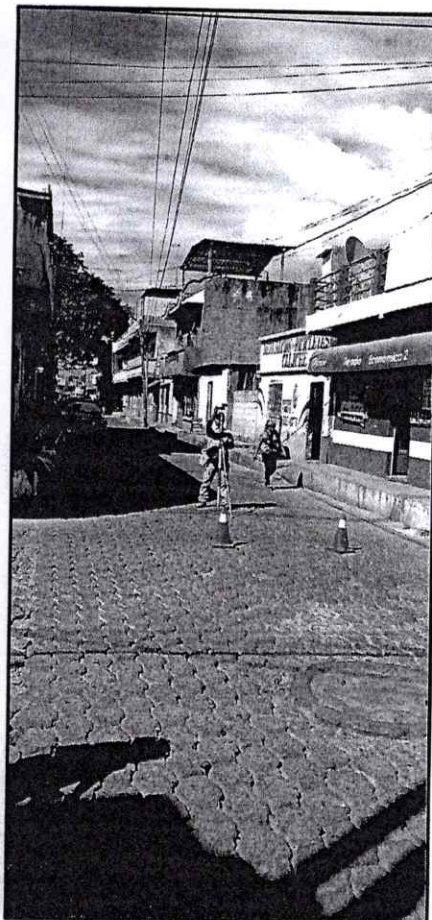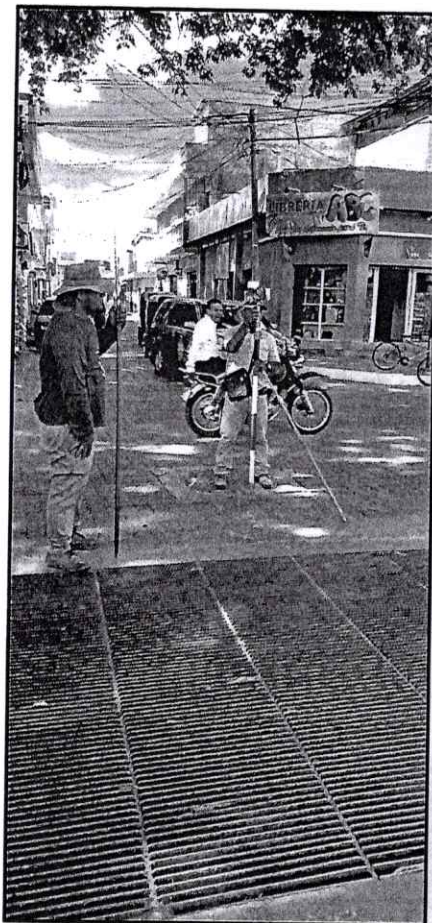




CONSTRUSU


"El camino al éxito siempre está en construcción"

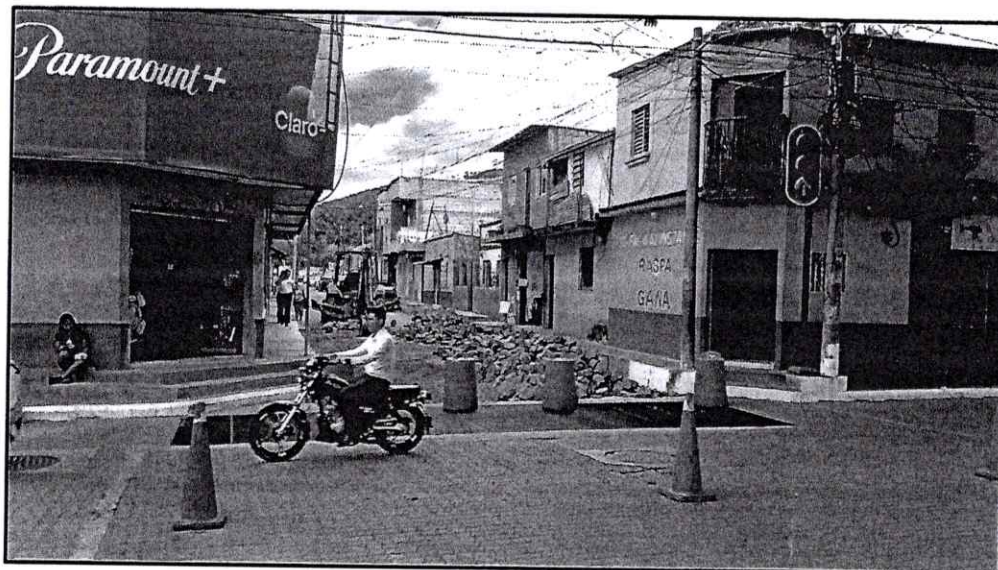




CONSTRUSU

"El camino al éxito siempre está en construcción"



Mariam Franciny Aragón Flores
Propietaria
CONSTRUSU



ING. Marco Leonel Rodríguez Flores
Supervisor de Obras



MINISTERIO
DE FINANZAS
PÚBLICAS



CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN Y PRECALIFICACIÓN COMO PROVEEDOR DEL ESTADO

Fecha de emisión de esta constancia: Guatemala, 03 de febrero de 2023.

Estatus: HABILITADO

202374071



EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Hace constar

Que a la presente fecha MARIAM FRANCINY ARAGÓN FLORES con NIT 47555629 se encuentra INSCRITO en el REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO, en el folio 79491 del LIBRO DE INSCRIPCIONES y registro número 8454 del LIBRO DE REGISTRO DE PROVEEDORES.

Esta constancia le habilita para proveer: **OBRAS** A ENTIDADES DEL ESTADO, HASTA UN MONTO MÁXIMO DE CONTRATACIÓN DE CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE QUETZALES CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS (Q. 145,767,187.42). Como resultado de la evaluación de la capacidad técnica y financiera del proveedor.

Asimismo, precalificado en la especialidad o especialidades siguientes: (Si no se listan especialidades, se debe a que el proveedor no acreditó documentación de respaldo requerida).

- 4101 - Construcción de edificios
- * 4312 - Preparación del terreno ✓
- 4216 - Carreteras de terracería
- 4311 - Demoliciones
- * 4313 - Movimientos de tierra y/o excavaciones ✓
- 4321 - Instalaciones eléctricas
- 4211 - Carreteras pavimentadas
- 4103 - Mantenimiento y remodelación de edificios
- * 4226 - Sistemas de saneamiento y drenaje ✓
- 4298 - Adoquinado y empedrado
- 4330 - Terminación y acabado de edificios
- 4224 - Sistemas de captación, conducción y distribución de agua
- 2511 - Fabricación de productos metálicos para uso estructural
- 4217 - Mantenimiento de carreteras



Información comercial de la Entidad*:

- CONSTRUSU - 2 CALLE 2-32 ZONA 2 USUMATLAN, ZACAPA

*Conforme a lo establecido en el artículo 71 el Registro es el responsable del control, actualización, vigencia, seguridad, certeza y publicidad de la información, por lo que a partir del 09 de julio de 2021, se refleja en las constancias la información comercial y la información

ESTE DOCUMENTO ES VÁLIDO SIN FIRMA, SU AUTENTICIDAD PUEDE SER VERIFICADA INGRESANDO EL NÚMERO DE LA CONSTANCIA EN LA OPCIÓN VALIDAR CONSTANCIAS EN EL PORTAL www.rgae.gob.gt O A TRAVÉS DEL CÓDIGO QR DE ESTE DOCUMENTO.

NOTA:

- Los términos de la presente constancia se basan en la información y documentación presentada por el interesado bajo los términos y condiciones establecidos por el Registro General de Adquisiciones del Estado en el que declara que dicha información y documentación corresponden a la persona individual o jurídica identificada en esta constancia y sabiendo de la pena relativa al delito que establece el artículo 459 del Código Penal. No asumiendo el Registro responsabilidad alguna por omisión o actos previos o posteriores, realizados por los proveedores que transgredan el marco legal.

-El Registro General de Adquisiciones del Estado no prejuzga sobre procesos, procedimientos administrativos o requisitos que para una eventual contratación establezcan las entidades reguladas en el artículo 1 de la Ley de Contrataciones del Estado, ni sobre los procesos de ejecución o imputación de los renglones que para cada tipo de

PBX: 2374-2822 ext. 10290

Ministerio de Finanzas Públicas, Registro General de Adquisiciones del Estado.

8a. Avenida 20-59 Zona 1, Centro Cívico, Guatemala

Página 1 de 2

44



GOBIERNO de
GUATEMALA

MINISTERIO
DE FINANZAS
PÚBLICAS



CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN Y PRECALIFICACIÓN COMO PROVEEDOR DEL ESTADO

Fecha de emisión de esta constancia: Guatemala, 03 de febrero de 2023. ✓

Estatus: HABILITADO

202374071



de copropietario(s) de las entidades con el fin de facilitar el proceso de revisión a las entidades reguladas por el artículo 1 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Vigencia de esta precalificación, hasta:	07 de septiembre de 2023 ✓
Fecha de última actualización:	03 de febrero de 2023
Fecha de última modificación:	07 de septiembre de 2021
Resolución número:	202373588
Fecha de Resolución:	03 de febrero de 2023

ESTE DOCUMENTO ES VÁLIDO SIN FIRMA, SU AUTENTICIDAD PUEDE SER VERIFICADA INGRESANDO EL NÚMERO DE LA CONSTANCIA EN LA OPCIÓN VALIDAR CONSTANCIAS EN EL PORTAL www.rgae.gob.gt O A TRAVÉS DEL CÓDIGO QR DE ESTE DOCUMENTO.

NOTA:

- Los términos de la presente constancia se basan en la información y documentación presentada por el interesado bajo los términos y condiciones establecidos por el Registro General de Adquisiciones del Estado en el que declara que dicha información y documentación corresponden a la persona individual o jurídica identificada en esta constancia y sabiendo de la pena relativa al delito que establece el artículo 459 del Código Penal. No asumiendo el Registro responsabilidad alguna por omisión o actos previos o posteriores, realizados por los proveedores que transgredan el marco legal.
- El Registro General de Adquisiciones del Estado no prejuzga sobre procesos, procedimientos administrativos o requisitos que para una eventual contratación establezcan las entidades reguladas en el artículo 1 de la Ley de Contrataciones del Estado, ni sobre los procesos de ejecución o imputación de los renglones que para cada tipo de

PBX: 2374-2822 ext. 10290

Ministerio de Finanzas Públicas, Registro General de Adquisiciones del Estado.
8a. Avenida 20-59 Zona 1, Centro Cívico, Guatemala



CONSTANCIA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA



MONTO RESERVADO VIGENTE (Q):
MONTO EN LETRAS:

Q 2,001,000.00
DOS MILLONES UN MIL 00/100

CDP No. 21
Ejercicio Fiscal: 2023

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
FECHA DE EMISION: martes, 28 de marzo de 2023
MODALIDAD DE COMPRA O CONTRATACION: LICITACION
NUMERO DE OPERACIÓN GUATECOMPRAS:

DESCRIPCION DEL PROCESO:

AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO

NIT:
NOMBRE O RAZON SOCIAL:
CORREO ELECTRONICO:

PROGRAMCION No.:

ESTRUCTURA (S) PRESUPUESTARIA (S) ASIGNADA (S):
12-002-002-000-001 RENGLO # 331
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
21-0101-0001 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA-PAZ
31-0101-0004 CONCEJO DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
31-3101-0002 APORTE DE LA COMUNIDAD PARA INVERCION

Q 2,001,000.00

AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO

Q 2,001,000.00

DOS MILLONES UN MIL 00/100


Edgar Ivan Monterroso Gonzalez
Encargado de Presupuesto



ULTIMA LINEA



IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO:

Nombre del proyecto: Forma Capital Fijo
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO

Institución responsable: CONSEJOS DE DESARROLLO

Unidad ejecutora responsable: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

Modalidad de planificación : Planificación Institucional

Modalidad específica: Planificación Institucional

Finalidad-Función-Division:

Función anterior: 6 - PROTECCION AMBIENTAL
AGUA Y SANEAMIENTO

Sub-función anterior : 2 - ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES
AGUA Y SANEAMIENTO

1 - ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES

Ubicación geográfica:

Departamento	Municipio
EL PROGRESO	GUASTATOYA

Área de influencia: Municipal

Responsables:

Responsable del proyecto:	Formulador del proyecto:
Nombre: JORGE ANTONIO ORELLANA PINTO	Nombre: EDGAR ANIBAL CHAVEZ PALENCIA
Cargo: ALCALDE MUNICIPAL	Cargo: DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
Teléfono: 79451606	Teléfono: 79451606
Email: eachavez@muniguastatoya.gob.gt	Email: eachavez@muniguastatoya.gob.gt

Modalidad de ejecucion del Proyecto : CONTRATO

DIAGNÓSTICO:

Antecedentes:

En el Barrio El Porvenir, Guastatoya, El Progreso, se necesita realizar la Ampliacion Sistema de Alcantarillado Pluvial Barrio El Porvenir, Guastatoya, El Progreso. Actualmente residen más de 9000 habitantes de los cuales el 98% son de origen ladino y el 2% indígenas. Desde hace dos años vienen gestionando por medio de los diferentes COCODES el proyecto de Ampliacion Sistema de Alcantarillado Pluvial Barrio El Porvenir, Guastatoya, El Progreso. Por tal motivo fue así como en Asamblea Comunitaria se decidió facultar al Consejo Comunitario de Desarrollo COCODE para gestionar el proyecto, quienes se dirigieron a la Municipalidad para el apoyo técnico en la realización de los estudios y asesorar todos los trámites ante una institución que pudiera ejecutar el proyecto

Problemática / Arbol del Problema:

Efectos Indirectos

FALTA DE RECURSOS, FALTA DE DRENAJE PLUVIAL, CRECIMIENTO DE URBANIZACION.

Efectos Directos

FALTA DE GESTION ADMINISTRATIVA, PROBLEMA DE INUNDAQCION, PERSONAS EMIGRAN AL MUNICIPIO.

PROBLEMA CENTRAL:

FALTA DE DRENAJE PLUVIAL

Causas Indirectas

INCREMENTO DE AGUAS PLUVIALES, INCREMENTO DE BASURA, PROBLEMAS PLUVIALES

Causas Directas

AUMENTO DE PROBLACION, FALTA DE CONCIENCIA DE LOS HABITANTES, FALTA DE DRENAJE.

ALTERNATIVAS DE SOLUCION

Alternativa 01 :

TIR : .00 VAN : .00 CAE : .00

Alternativa 02 :

TIR : VAN : CAE :

Alternativa 03 :

TIR : VAN : CAE :

Justificación:

Actualmente los vecinos del Barrio El Porvenir, se ven obligados a solicitar el sistema de aguas pluviales para satisfacer sus necesidades que no cumplen con las condiciones adecuadas; lo que ocasiona riesgo para la población en general e inconformidad.

Descripción:

EL PROYECTO CONSISTE EN LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUA PLUVIAL DE LA CABECERA DE GUASTATATOYA EL CUAL CUBRIRA DEL SECTOR DE LA CEIBA MOSHA HASTA LA ESQUINA DE LA FAMILIA RODRIGUEZ, ESTE PROYECTO BENEFICIARA A 9000 FAMILIAS DEL CASO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUASTTAOYA, EL PROGRESO.

Objetivos:

General:

CONTRIBUIR CON EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO POR ELLO SE ESTBALECIO EL PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO.

Específicos:

- MEJORAR LAS CONSIDICIONES DE VIDA DE LOS VECINOS CON LA AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO.
- MEJORAR CON LA AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO, Y MEJORAR LAS AGUAS PLUVIALES DEL SECTOR DE LA CEIBA MOSHA HASTA LA ESQUINA DE LA FAMILIA RODRIGUEZ.

Resultados esperados:

- CONTAR CON EL PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO EL PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO.

Beneficiarios :

Tipificacion de la población :

Población Afectada	9,000
Población Objetivo	2,250
Población Proyectada	9,000

Caracterización de la poblacion por EDAD :

	Hombres :	Mujeres :
Menores de 4 años	550	850
De 5 a 13 años	200	300
De 14 a 18 años	350	450
De 19 a 28 años	500	550
De 29 a 50 años	450	650
De 51 a 60 años	600	1,750



0306671 - AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO EL
PORVENIR, GUASTATOYA, EL PROGRESO

Información General del Proyecto

SNIPgt

De 61 en adelante 800 1,000

Clasificación por ETNIA :

Ladino / Mestizo 6,000
Otro 3,000

Clasificación por ZONA :

Urbana 9,000

Costo/eficiencia: TIR: % VAN:

Empleo a requerir:



Calificada
No calificada

Durante la ejecución en hombre/mes	Durante la operación en hombre/mes

Situación del terreno: Ninguno

Diseños (especificaciones):

Vida útil del proyecto: 20 años

Fecha de inicio de la operación: 01-JAN-23

Institución responsable de operación: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

Costo anual de operación:

Información Técnica:

Tiempo de ejecucion del proyecto: Inicio: 01/01/2023 Finalización : 31/12/2023 Duración : 12 meses.

Meta GLOBAL del proyecto : AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 132.00 Metro

Costo TOTAL del proyecto Q.: 2,001,000.00

Metas ANUALES del proyecto :

Año	Descripción de la meta	Unidad de medida	Original	Vigente	% Ejec.
2,023	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL	Metro	132.00	132.00	.00

Programación FISICA Multianual

Rubro	Unidad de medida	Program.
2,023		
Trabajos preliminares	Metro	44
Cajas para alcantarillado	Metro	66
Pozos de visita	Metro	44

Programación FISICA Mensual

Rubro	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2,023												
Trabajos preliminares	3	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4
Cajas para alcantarillado	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6
Pozos de visita	4	3	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4

Información FINANCIERA del Proyecto:

RESUMEN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS

Ejercicio	Asignado	Ejecutado	% Financiero	% Fisico
2023	2,000,000.00	.00	.00%	.00%
		.00		

Avance Financiero: .00%

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2023	Monto Vigente	Desembolsado MINFIN	Ejecutado 2023
TOTAL :	2,001,000	2,000,000		
Recursos internos :	2,001,000	2,000,000		
Gobierno central :	2,000,000	2,000,000		
Comunidad :	500			
Aporte municipal :	500			
Otros aportes :				
Otras fuentes :				



PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL

Fuente de Financiamiento	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
--------------------------	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------

2023

TOTAL	166,745	166,745	166,745	166,745	166,750	166,750	166,750	166,770	166,750	166,750	166,750	166,750
Recursos internos	166,745	166,745	166,745	166,745	166,750	166,750	166,750	166,770	166,750	166,750	166,750	166,750
Gobierno central :	166,665	166,665	166,665	166,665	166,665	166,665	166,665	166,685	166,665	166,665	166,665	166,665
Comunidad :	40	40	40	40	45	45	45	45	40	40	40	40
Aporte municipal :	40	40	40	40	40	40	40	40	45	45	45	45
Otros aportes :												
fuentes:												
