CONTRATO DE EJECUCION DE PROYECTOS VEINTINUEVE GUION DOS MIL VEINTE (29-2020)
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA PIEDRA PARADA, GUASTATOYA, EL PROGRESO.
NOG. 13327461

En el Municipio de Guastatoya, del departamento de El Progreso, el día **NUEVE (9) DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE (2,020). NOSOTROS:** Por una parte comparezco Yo, **JORGE ANTONIO ORELLANA PINTO,** de cuarenta y nueve años de edad, casado, guatemalteco, Licenciado en Administración de Empresas, domiciliado en el departamento de El Progreso, me identifico con el documento personal de identificación –DPI-, Código Único de Identificación –CUI-, dos mil quinientos setenta espacio cincuenta y tres mil novecientos sesenta y cuatro espacio cero dos cero uno, (2570 53964 0201), extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala; DE LA CALIDAD CON QUE ACTUO. Actúo en calidad de **Alcalde Municipal,** de la ciudad de Guastatoya, del departamento de El Progreso, calidad que acredito, con la certificación del acta de toma de posesión, dos guion dos mil veinte (2-2020), de fecha quince de enero de dos mil veinte, contenida en el libro número dos mil seiscientos cuarenta y siete (2647), de sesiones extraordinarias del Concejo Municipal, debidamente autorizado por la Contraloría General de Cuentas, y el Acuerdo número cero cero uno guión dos mil diecinueve (001-2019), de la Junta Electoral Departamental de El Progreso, con el número de **CUENTADANCIA Te tres guion dos guion uno (T3-2-1);** y por la otra parte comparezco Yo, **SYNTHIA MAYTÉ ASENCIO OLIVA,** de treinta años de edad, soltera, Guatemalteca, Licenciada en Trabajo Social con Énfasis en Gerencia de Desarrollo, domiciliada en el departamento de Zacapa, se identifica con el Documento Personal de Identificación –DPI- mil ochocientos ochenta y dos espacio, treinta y cinco mil novecientos seis espacio, mil novecientos tres (1882 35906 1903), extendido por el Registro Nacional de las Personas, actúo en calidad de **MANDATARIA GENERAL JUDICIAL CON REPRESENTACION CON CLAUSULA ESPECIAL,** de **SERGIO DAVID ASENCIO OLIVA,** de treinta y siete años de edad, soltero, guatemalteco, Constructor, quien se identifica con el documento personal de identificación -DPI- mil ochocientos sesenta y dos espacio, treinta y cinco mil quinientos ochenta y cinco espacio, mil novecientos tres (1862 35585 1903), extendido por el Registro Nacional de las Personas; con número de identificación tributaria del mandante: cuarenta y seis millones noventa y cuatro mil ciento cinco (46094105), extendido por la Superintendencia de Administración Tributaria, y propietario de la Empresa Mercantil denominada **"CONSTRUCTORA ASENCIO",** debidamente inscrita en el Registro Mercantil de la República de Guatemala, con Patente de Comercio de Empresa, inscrita bajo el número de Registro quinientos noventa y siete mil cien (597100), folio ciento noventa y nueve (199), del libro quinientos cincuenta y nueve (559), de Empresas Mercantiles, con dirección del propietario séptima calle dos guion cuarenta zona uno, Río Hondo, Zacapa, con Registro de actualización del Registro General de Adquisiciones del Estado Expediente No. 202054177 RGAE-2020, Resolución 202051098, inscrito al folio número setenta y tres mil seiscientos cuarenta y nueve (73649); constancia de inscripción y precalificación como proveedor del Estado, número 202051480, con el cual hace constar la capacidad económica y las especialidades de la empresa referida, ambas constancias emitidas por el Registro General de Adquisiciones del Estado del Ministerio de Finanzas Púbicas; la Licenciada **SYNTHIA MAYTÉ ASENCIO OLIVA,** acredita la calidad con que actúa con el Primer Testimonio de la Escritura Pública Ciento cincuenta y dos (152), de fecha diecinueve de junio de dos mil diecinueve, autorizada en el Municipio de Río Hondo, departamento de Zacapa, por la Notaria Ligia María Cabrera Urzúa, la cual contiene el MANDATO GENERAL JUDICIAL CON REPRESENTACION CON CLAUSULA ESPECIAL, el cual está debidamente inscrito en el Registro de Poderes del Archivo General de Protocolos, bajo la inscripción número uno, del Poder cuatrocientos ochenta y seis mil seiscientos setenta y

uno guion E (486671-E), de fecha veinticuatro de junio del año dos mil diecinueve. Ambos comparecientes manifestamos encontrarnos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles y que las representaciones que acreditamos son suficientes de conformidad con la ley y a nuestro juicio para celebrar el presente contrato, toda la documentación indicada se tiene a la vista y en lo sucesivo simplemente se denominará LA MUNICIPALIDAD y "EL CONSTRUCTOR", sujetándonos a las cláusulas siguientes.

PRIMERA: El Licenciado JORGE ANTONIO ORELLANA PINTO, Alcalde Municipal, manifiesto que actúo en representación de la Municipalidad de Guastatoya del departamento de El Progreso, y expongo que de conformidad con el Acuerdo emitido por el Alcalde Municipal, contenido en el **ACUERDO 73-2020,de fecha nueve de octubre de dos mil veinte**, del libro 2778 de Acuerdos de la Alcaldía Municipal, debidamente autorizado por la Contraloría General de Cuentas, en la cual la Autoridad Superior aprueba la adjudicación realizada por la Junta de Cotización, para la ejecución del proyecto denominado en la cual la Autoridad Administrativa Superior aprueba la adjudicación realizada por la Junta de Licitación, para la ejecución del proyecto denominado **CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA PIEDRA PARADA, GUASTATOYA, EL PROGRESO,** de conformidad con las bases técnicas, especificaciones generales y planos presentados. El presente contrato se suscribe con fundamento en los artículos 9, numeral 6) literal b), artículo 47, 49, del a Ley de Contrataciones del Estado y sus Reformas y Artículo 42 del Reglamento de la misma ley, 53 literal I del Decreto 12-2002 Código Municipal y sus reformas; se tienen incorporados al instrumento contractual el proceso establecido en la Ley de Contrataciones del Estado, la oferta presentada por el constructor y la adjudicación correspondiente.

SEGUNDA: El Constructor se compromete a ejecutar para la Municipalidad de Guastatoya, el proyecto **CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA PIEDRA PARADA, GUASTATOYA, EL PROGRESO,** obra que se encuentra en el sector rural de este municipio el que se ejecutará de conformidad con el presupuesto presentado por la Empresa Constructora.

Renglón No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario (Q)	Precio Total (Q)
1	TRABAJOS PRELIMINARES	UNIDAD	1.00	30,693.60	30,693.60
2	REPLANTEO TOPOGRAFICO	UNIDAD	1.00	16,656.30	16,656.30
3	RELLENO Y COMPACTACION DE APROCHE	M3	780.00	198.83	155,087.40
4	FUNDICION DE CONCRETO CICLOPEO	M3	292.00	1,941.32	566,865.44
5	ARCO DE TUBERIA DE ACERO CORRUGADA	ML	6.00	15,315.30	91,891.80
6	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO	M2	24.00	419.63	10,071.12
7	BARANDAL DE CONCRETO	UNIDAD	2.00	7,688.25	15,376.50
8	LIMPIEZA FINAL	UNIDAD	1.00	2,176.64	2,176.64
				TOTAL	**888,818.80**

El tiempo de entrega de la obra es de **CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIO,** de conformidad con el cronograma de ejecución presentado por el constructor, el plazo referido se computará a partir del acta de inicio suscrita por el Director de la Oficina Municipal de Planificación, en el lugar de ejecución.

TERCERA: EL CONSTRUCTOR: Por su parte manifiesta que respecto a la ejecución del proyecto reitera que se compromete a lo siguiente: a) entregar totalmente terminada la obra a satisfacción de la Municipalidad de

CONSTRUCTOR ASENCIO PROP. SERGIO ASENCIO

Guastatoya. b) a contratar un Profesional quien será el Supervisor de Proyectos Residente, quien conjuntamente con el Ingeniero Supervisor de la Municipalidad informarán en forma simultánea a la Autoridad Administrativa, al Concejo Municipal y a la Contraloría General de Cuentas de la Nación cuando lo requiera, de los avances físicos del proyecto y las estimaciones de pago, para el efecto deberán presentar las fotocopias de la bitácora del Proyecto, autorizada por la Contraloría General de Cuentas.

CUARTA: El señor Alcalde Municipal en representación de la Municipalidad de Guastatoya, manifiesta que está de acuerdo en las condiciones del constructor, especialmente en lo que respecta al total del proyecto; así como en el tiempo de entregar la obra, ambos de común acuerdo llegaron a establecer la forma de pago de la manera siguiente:

QUINTA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato pactado entre la Municipalidad y la Empresa **CONSTRUCTORA ASENCIO,** asciende a la cantidad de **OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENETOS DIECIOCHO QUEETZALES CON OCHENTA CENTAVOS (Q. 888,818.80), incluido el impuesto al valor agregado –IVA-,** los que se pagarán con fondos de –INVERSION- de conformidad con la constancia de disponibilidad presupuestaria, de conformidad con la estructura presupuestaria 23-000-001-000-006, RENGLON # 331, FUENTE DE FINANCIAMIENTO 32-0101-0015, 320101-0017, 32-0101-0018. Los pagos se efectuarán de conformidad con el artículo 58 de la Ley de Contrataciones del Estado, de la manera siguiente: a). Un anticipo del veinte por ciento (20%) equivalente a la cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES QUETZALES CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS (Q. 177,763.76), el que se entregará previo a cumplir con los siguientes requisitos: **I).** Otorgar a la Municipalidad **PLAN DE INVERSIÓN, FIANZA DE ANTICIPO, FIANZA DE CUMPLIMIENTO,** las cuales garantizarán la correcta aplicación del mismo con fundamento en Artículos 64, 65, 66, de la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas y los artículos 53, 54, 55, 56, 58 Y 59 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y, **II).** Los **PAGOS SIGUIENTES**, ***se efectuarán de conformidad con las estimaciones de pago de conformidad con el artículo 59 de la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas, en el cual la Municipalidad de Guastatoya, hará los pagos contra las estimaciones periódicas de trabajo ejecutado y aceptado, las que podrán efectuarse mensualmente, trabajos debidamente comprobados, con los informes presentados por el Supervisor del Proyecto Residente juntamente con el Supervisor de Proyectos de la Municipalidad de Guastatoya***. **III).** El último pago equivalente al 100% de avance físico del proyecto, presentando para el efecto, **FIANZA DE CONSERVACIÓN DE OBRA O DE CALIDAD DE FUNCIONAMIENTO, FIANZA DE SALDOS DEUDORES, ACTA DE RECEPCIÓN DEL PROYECTO POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD E INFORME FINAL DE LOS SUPERVISORES PROFESIONALES DEL PROYECTO.**

SEXTA: SANCIONES: El constructor se compromete a entregar los trabajos conforme el contrato suscrito. Y en caso de atraso por parte del Constructor en la entrega de los trabajos, se determinará el atraso en la entrega de la obra con base en las fechas de terminación, parciales o total, fijadas en el programa de ejecución convenido, debiendo aplicarse las multas sin perjuicio de la facultad que tiene la entidad contratante para exigir el cumplimiento del contrato para rescindirlo. Para efecto de la multa, se tomará en cuenta solo la parte proporcional del atraso, por lo que su aplicación no debe afectar la parte del cumplimiento parcial. Se sancionará con el pago de una multa que se aplique al contratista entre el uno al cinco por millar del monto de los trabajos, que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente, por cada día de atraso en que incurra el contratista desde la fecha de terminación pactada hasta la total conclusión de los mismos, en ningún caso podrán ser superiores en su conjunto al monto de la garantía de cumplimiento. Asimismo, el Constructor deberá cumplir con los trabajos estipulados en el presente contrato y la Municipalidad no concederá ningún plazo de prórroga

a excepción de los siguientes casos: a). si se trata de órdenes de trabajo extra u otros convenios, b). Indicar claramente el plazo improrrogable que se le otorgue al constructor para el trabajo correspondiente y deberá solicitarlo dentro del plazo que indica el Artículo 43, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas.

En relación a lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas, el atraso de la entrega de la obra, por causa imputable al contratista será sancionado del 1 al 5 por millar del monto de las obras que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente, calculando a partir de las fechas pactadas de la entrega parcial o total con respecto a la ejecución convenida con la entidad contratante. Dicha multa solamente se tomará de la parte proporcional del atraso, sin afectar el cumplimiento parcial.

Tasa de cálculo	Días
1o/oo	1 a 20
2o/oo	21 a 30
3o/oo	31 a 60
4o/oo	61 a 120
5o/oo	121 hasta su cumplimiento

La entidad ejecutora será la que emita las sanciones correspondientes.

SEPTIMA: OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR: El constructor se obliga a presentar informes periódicos, cronograma de ejecución de la obra, bitácora de los trabajos de conformidad con el Artículo 37 inciso a). del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, deben de autorizar los libros en la Dirección de Infraestructura Pública de la Contraloría General de Cuentas, así como permitir en cualquier momento que las personas autorizadas por la Municipalidad supervisen las actividades que se desarrollan, asimismo instruirá a su personal para que se le preste la debida colaboración a las personas que supervisan y que son parte de esta Municipalidad, el Constructor deberá de revisar cuidadosamente los documentos contractuales y señalará cualquier omisión o error, contradicción o incongruencia que observe a este respecto, deberá formular la consulta y observación del caso antes de los quince días de ejecutar el proyecto, el constructor previamente a la adquisición de materiales deberá proporcionar a la Municipalidad cuando esto lo requiere muestras de materiales para analizarlos y aprobarlos. El Constructor queda facultado para retirar de la obra a cualquier trabajador que considere incompetente, negligente insubordinado o perjudicial a la buena marcha de dichos trabajos. El constructor deberá de aprobar las herramientas, materiales, mano de obra, transporte y demás elementos necesarios.

OCTAVA: CLAUSULA RELATIVA AL COHECHO: Yo el Contratista, manifiesto que conozco las penas relativas al delito de cohecho así como las disposiciones contenida en el Capítulo III del Título XIII del Decreto 17-73 del Congreso de la República, Código Penal. Adicionalmente, conozco las normas jurídicas que facultan a la Autoridad Superior de la entidad afectada para aplicar las sanciones administrativas que pudieren corresponderme, incluyendo la inhabilitación en el sistema GUATECOMPRAS".

NOVENA: OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD: a) La Municipalidad se obliga a efectuar el pago en tiempo y en formas convenidas, b). Faccionar el acta de inicio y avances físicos y actas de recepción para realizar la liquidación final de los trabajos a ejecutar y prestar la colaboración necesaria para el constructor para realizar los mismos, c). Designar a la persona o Personas que supervisen los trabajos del proyecto citado anteriormente previa inspección final.

DECIMA: OTRAS OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR: a). Se compromete a sostener el precio de la oferta, b). Entregar la obra en el tiempo y lugar indicado, c). Ejecutar la obra con material de buena calidad y garantizados de conformidad con lo que estipula la ley de contrataciones del estado, d). Contratar mano de obra necesaria y suficiente para la realización del proyecto, y se compromete a obtener en este municipio el cual será calificado por el constructor, e). Es responsable por el trabajo ejecutado por las personas que contrate así como de los daños y perjuicios que causen a terceras personas como consecuencia de la realización de la obra contratada. f). De conformidad con el artículo 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, se podrá ampliar el monto del contrato, previo que sean aprobadas las ordenes de cambio, ordenes de trabajo suplementario o acuerdo de trabajo extra, y se suscribirá un contrato adicional de conformidad con el contenido relativo a la Ley de la materia.

DECIMA PRIMERA: FIANZAS: 1. El constructor se obliga a presentar:

1. **FIANZA DE SOSTENIMIENTO DE OFERTA** no menor del uno por ciento (1%) ni mayor del cinco por ciento (5%) del valor del contrato, que cubrirá el periodo comprendido desde la recepción y apertura de plicas hasta la aprobación de las adjudicaciones, y, en todo caso, tendrá una vigencia de ciento veinte (120) días, como lo establece el artículo 64 de la Ley de Contrataciones.

2. **FIANZA DE CUMPLIMIENTO:** Como requisito previo para la aprobación del presente contrato de conformidad con el Artículo 65 de la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas, que garantizara el cumplimiento de todas las obligaciones estipuladas en el contrato, el contratista deberá prestar fianza, deposito en efectivo o constituir hipoteca en los porcentajes y condiciones que señale el reglamento. Para el caso de obras, además esta garantía cubrirá las fallas o desperfectos que aparecieren durante la ejecución del contrato, antes que se constituya la garantía de conservación. **Por un valor del diez por ciento (10%) del monto del contrato respectivo.**

3. **FIANZA DE ANTICIPO:** Previo a recibir cualquier suma por concepto de anticipo, el contratista constituirá garantía mediante fianza o hipoteca por el monto de un cien por ciento (100%) del mismo. La garantía podrá reducirse en la medida que se amortice el valor del anticipo cubriendo siempre el máximo del saldo deudor y estará vigente hasta su total amortización. El reglamento establecerá el procedimiento de reducción y lo concerniente en los casos de rescisión, resolución y terminación de contrato.

4. **FIANZA DE CONSERVACION DE LA OBRA O DE LA CALIDAD DE FUNCIONAMIENTO:** El contratista responderá por la conservación de la obra, mediante depósito en efectivo, fianza, hipoteca o prenda, a su elección, que cubra el valor de las reparaciones de las fallas o desperfectos que le sean imputables y que aparecieren durante el tiempo de responsabilidad de dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha de recepción de la obra. Tratándose de bienes y suministros, deberá otorgarse garantía de calidad y/o funcionamiento, cuando proceda. La garantía de conservación de obra, o de calidad y/o funcionamiento, deberá otorgarse por el equivalente al quince por ciento (15%) del valor original del contrato, como requisito previo para la recepción de la obra, bien o suministro. El vencimiento del tiempo de responsabilidad previsto en el párrafo anterior, no exime al contratista de las responsabilidades por destrucción o deterioro de la obra debido a dolo o culpa de su parte, por el plazo de cinco (5) años, a partir de la recepción definitiva de la obra.

5. **FIANZA DE SALDOS DEUDORES** Para garantizar el pago de saldos deudores que pudieran resultar a favor del Estado, de la entidad correspondiente o de terceros en la liquidación, el contratista deberá prestar fianza, depósito en efectivo; constituir hipoteca o prenda, a su elección, por el cinco por ciento (5%) del valor original del contrato. Esta garantía deberá otorgarse simultáneamente con la de conservación de obra como requisito

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
15 DE SEPTIEMBRE DE 1908
ALCALDE

previo para la recepción de la obra, bien o suministro. Aprobada la liquidación, si no hubiere saldos deudores, se cancelará esta garantía.

Las fianzas descritas en el presente contrato, deberán formalizarse mediante póliza emitida por instituciones autorizadas para operar en Guatemala, de conformidad con las siguientes disposiciones: La vigencia de las fianzas será exactamente igual al plazo contractual y deberá ajustarse ante cualquier ampliación o variación del contrato, manteniendo las condiciones de cobertura que aplicaron al contrato original. Lo anterior no es aplicable a las fianzas de conservación de obra, de calidad, de funcionamiento o de saldos deudores. a) Las fianzas garantizarán exacta y fielmente las obligaciones a cargo del contratista o proveedor. Estas obligaciones deben estar estipuladas en el contrato original y en cada una de las modificaciones documentadas. b) El funcionario que corresponda será responsable de exigir la actualización de las fianzas otorgadas por el contratista o proveedor. De omitirlo, el funcionario incurrirá en incumplimiento de deberes. c) El contratista o proveedor que omita actualizar la fianza otorgada ante modificaciones del contrato original, se hará acreedor a una multa y a la suspensión inmediata de los pagos a que tenga derecho. d) Cuando la garantía consistiere en depósitos, deberá hacerse en Quetzales o por medio de cheque certificado. Cuando la garantía sea hipotecaria o prendaria, se formalizará a través de escritura pública debidamente registrada. En todo caso, quedará a criterio del contratista o proveedor la garantía a proporcionar. Las fianzas deberán publicarse en el sistema GUATECOMPRAS. Las juntas a las que se refiere el artículo 10 de esta Ley, serán responsables de verificar la autenticidad de las fianzas de sostenimiento de oferta, y las autoridades suscriptoras de los contratos serán responsables de verificar la autenticidad de las demás fianzas a las que se refiere este capítulo. El sistema GUATECOMPRAS llevará un registro de las fianzas presentadas, así como de las solicitudes de ejecución, ejecución de fianzas y pago de las mismas. Con fundamento en el artículo 69 de la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas

DECIMA SEGUNDA: FORMA DE EFECTUAR LOS TRABAJOS DEL CONSTRUCTOR: El constructor efectuará los trabajos bajo estricta responsabilidad bajo la supervisión de un Profesional del Ramo, colegiado activo de quién deberá presentar la certificación o constancia correspondiente; asimismo incluirá los materiales, mano de obra, equipo y demás elementos necesarios para la correcta aplicación y ejecución del proyecto, mismas que se estarán supervisando por el Ingeniero Supervisor de Obras Municipales, quien cuenta con el aval y aprobación de la Corporación Municipal, así como de la comisión de recepción de la citada obra. El Constructor se compromete a dejar limpias las áreas donde se ejecute el proyecto.

CONSTRU ASENCIO PROFESIONAL

DECIMA TERCERA: CONTROVERSIAS: Toda controversia que pudiera surgir entre los contrayentes en lo que se refiere a la interpretación cumplimiento, aplicación y ejecución de este contrato será resuelto en el menor tiempo posible en forma conciliatoria entre ambas partes y en última instancia de no ponerse de acuerdo en el Tribunal correspondiente de lo contencioso administrativo de conformidad con el Artículo 102 de la citada ley; asimismo que se acepta los procedimientos señalados en el Código Procesal Civil y Mercantil, renunciando el constructor al fuero de su domicilio y señalando como lugar para recibir notificaciones y citaciones BARRIO EL CALVARIO, GUASTATOYA, EL PROGRESO.

DECIMA CUARTA: TERMINACION DEL CONTRATO: La Municipalidad puede dar por terminado, resuelto y/o rescindido el presente contrato en forma unilateral y sin responsabilidad de su parte en los siguientes casos: a). Por vencimiento del plazo pactado, siempre que no haya ocurrido prórroga, b). Si el constructor incumple con sus obligaciones, c). Si paraliza sin causa justificada los trabajos por más de diez días consecutivos, d).

Por rescisión de mutuo acuerdo, e). Si el constructor le fueren embargado bienes y que evidentemente afecten el cumplimiento del contrato.

DECIMA QUINTA: PROHIBICIONES: EL CONSTRUCTOR: declara bajo juramento de ley y bien enterados de las penas relativas al delito de perjurio que no se encuentra comprendido dentro de las limitaciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Y que, si en el transcurso del proceso de adquisición o en la ejecución de un contrato se presenta alguna de las prohibiciones definidas en el artículo 80 de la Ley, el contratista o proveedor deberá hacerlo de conocimiento de la autoridad competente dentro de los dos días siguientes al conocimiento del acaecimiento de la prohibición, para que ésta analice la situación planteada y resuelva sobre el proceso del contrato.

La falta de aviso sobre el acaecimiento de alguna de las prohibiciones definida en la Ley, será causal suficiente para la inhabilitación del contratista o proveedor, quien de conformidad con la ley será responsable de compensar a la entidad contratante por los daños y perjuicios ocasionados.

El trámite de la inhabilitación y de la rehabilitación es responsabilidad de la entidad contratante o ejecutora, quien deberá cumplir con el procedimiento, plazos y condiciones que definan las Normas de Uso del Sistema GUATECOMPRAS y, en todo caso, debe respetarse el derecho de defensa.

La inhabilitación y la rehabilitación en el Sistema GUATECOMPRAS implica la correspondiente inhabilitación o rehabilitación en el Registro General de Adquisiciones del Estado.

DECIMA SEXTA: INSPECCION, RECEPCION Y LIQUIDACION FINAL: 1. El constructor deberá de permitir en cualquier momento que las personas autorizadas por la Municipalidad Inspeccionen las instalaciones, actividades y trabajos que realicen e instruirá a su personal para que atiendan a las personas nombradas proporcionándoles toda información requerida. 2. La Municipalidad nombrará una comisión receptora de los trabajos y harán la inspección correspondiente ante la presencia del constructor su representante legal y posteriormente informarán al Concejo Municipal si se puede faccionar el acta de recepción respectiva para que la Dirección de Administración Financiera efectúe la liquidación final o en su defecto si hay que corregir algunos trabajos o complementar otros, en este último caso deberá indicar cuales son los trabajos a efectuar y el tiempo a emplear y si el plazo es necesario se incluye dentro del tiempo contractual o le concede o no algún tiempo adicional.

DECIMA SEPTIMA: APROBACION: Para que el presente contrato surta sus efectos legales y obligue a las partes al cumplimiento de las cláusulas contenidas deberá ser aprobado de conformidad con el artículo 42 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas.


DECIMA OCTAVA: ACEPTACION DEL CONTRATO: En todos los términos y condiciones estipuladas LA MUNICIPALIDAD Y EL CONSTRUCTOR aceptan para si el presente contrato el que se encuentra contenido en ocho (8), hojas membretadas impresas de un solo lado, leemos íntegramente lo escrito y bien enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo aceptamos, ratificamos y firmamos. Damos Fe.

MUNICIPALIDAD GUASTATOYA

LIC. JORGE ANTONIO ORELLANA PINTO
ALCALDE MUNICIPAL

CONSTRU ASENCIO
ING. SERGIO ASENCIO

SYNTHIA MAYTÉ ASENCIO OLIVA
MANDATARIA GENERAL JUDICIAL CON CLAUSULA ESPECIAL, CONSTRUCTORA ASENCIO

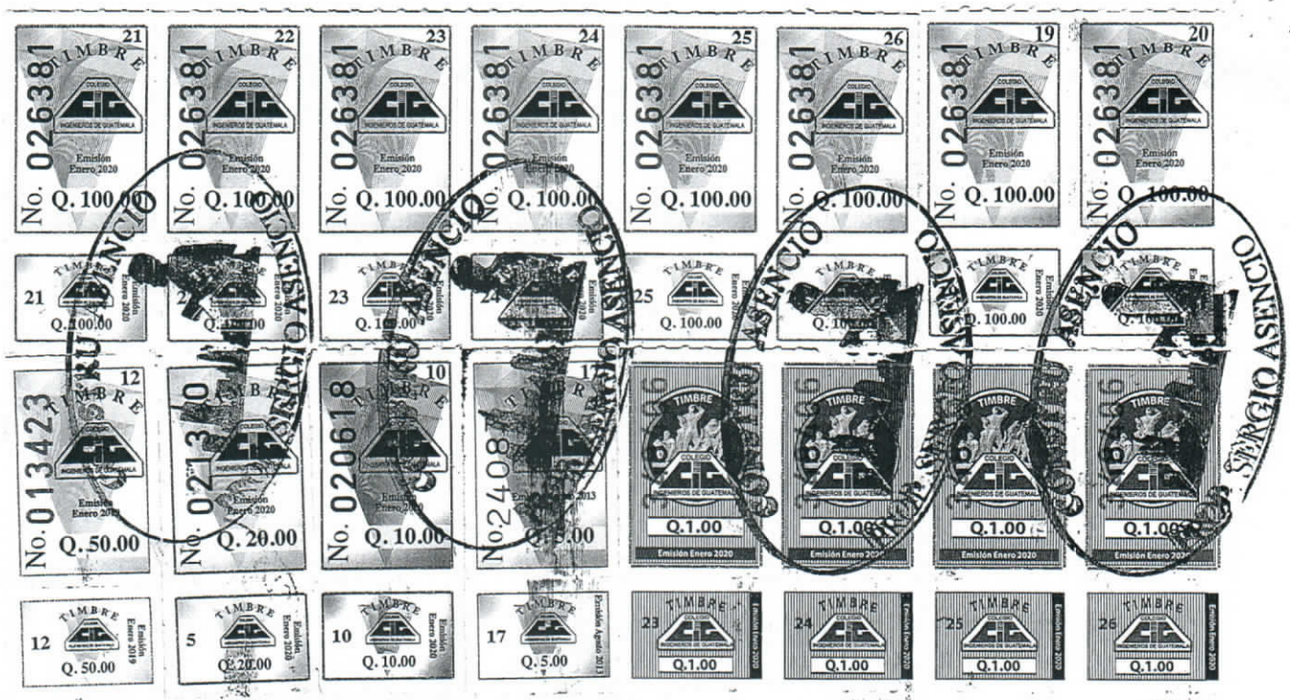
TIMBRE
No. 026381
Q. 100.00
No. 013423
Q. 50.00
No. 021340
Q. 20.00
No. 020618
Q. 10.00
No. 24087
Q. 5.00
Q.1.00
Emisión Enero 2020
SERGIO ASENCIO

Información General de iniciativa de Inversión

0257503 - CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA PIEDRA PARADA, GUASTATOYA, EL PROGGRESO

SNIP - SEGEPLAN

Solicitud de Financiamiento, ejercicio 2,020

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO:

1. Nombre del proyecto: Forma Capital Fijo
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA PIEDRA PARADA, GUASTATOYA, EL PROGGRESO

2. Institución responsable: GOBIERNOS LOCALES

3. Unidad ejecutora responsable: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

Coejecutora: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

4. Modalidad de planificación : Planifición Institucional

4.1. Modalidad especifica: Planificación Institucional

5. Función anterior:
TRANSPORTE

Sub-función anterior :
TRANSPORTE

Finalidad-Función-Division:
7-URBANIZACION Y SERVICIOS COMUNITARIOS
6-URBANIZACION Y SERVICIOS COMUNITARIOS N.C.D.
1-URBANIZACION Y SERVICOS COMUNITARIOS N.C.D.

6. Ubicación geográfica:

Departamento	Municipio
EL PROGRESO	GUASTATOYA

7. Área de influencia: Local

Responsable del proyecto:

Nombre: JORGE ANTONIO ORELLANA PINTO
Cargo: ALCALDE MUNICIPAL
Teléfono: 79451594
Email: DMP.GUASTATOYA@GMAIL.COM

DIAGNÓSTICO:

8. Antecedentes:
Desde hace muchos años vienen gestionando por medio de los diferentes COCODES el proyecto de Construccion Puente Vehicular Aldea Piedra Parada.

9. Problemática:
La población de Aldea Piedra Parada, se ha incrementado considerablemente en los últimos años y con ello también el comercio, proliferando así la construcción de viviendas y el número de familias que residen en el lugar; así mismo el uso de la carretera de acceso se ve afectada derivado que ha aumentado su transitar, por lo cual han existido incidentes viales que ponen en riesgo la seguridad de las personas que transitan en dicho lugar.

10. Justificación:
Actualmente los vecinos de la Aldea Piedra Parada, se ven obligados a transitar por la vía de acceso principal en condiciones no adecuadas; lo que ocasiona la inseguridad y riesgos en la seguridad vial.

11. Descripción:
EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR PARA UNA MEJOR CIRCULACION DE VEHICULOS Y PERSONAS

12. Objetivos:

12.1 General:
Contribuir al desarrollo integral de los vecinos de aldea Piedra Parada; a través de la Construccion Puente Vehicular, que permita reducir los riesgos de accidentes e incidentes, mejorando el acceso a la comunidad.

12.2 Específicos:

Mejorar el acceso a la comunidad.
Reducir el riesgo de incidentes.
Minimizar los accidentes del lugar.


13. Resultados esperados:

Construccion de un puente Vehicular de acceso a la comunidad

RESULTADOS DE LA FASE ACTUAL :

1. Fase actual: EJECUCION

2. Beneficiarios directos:

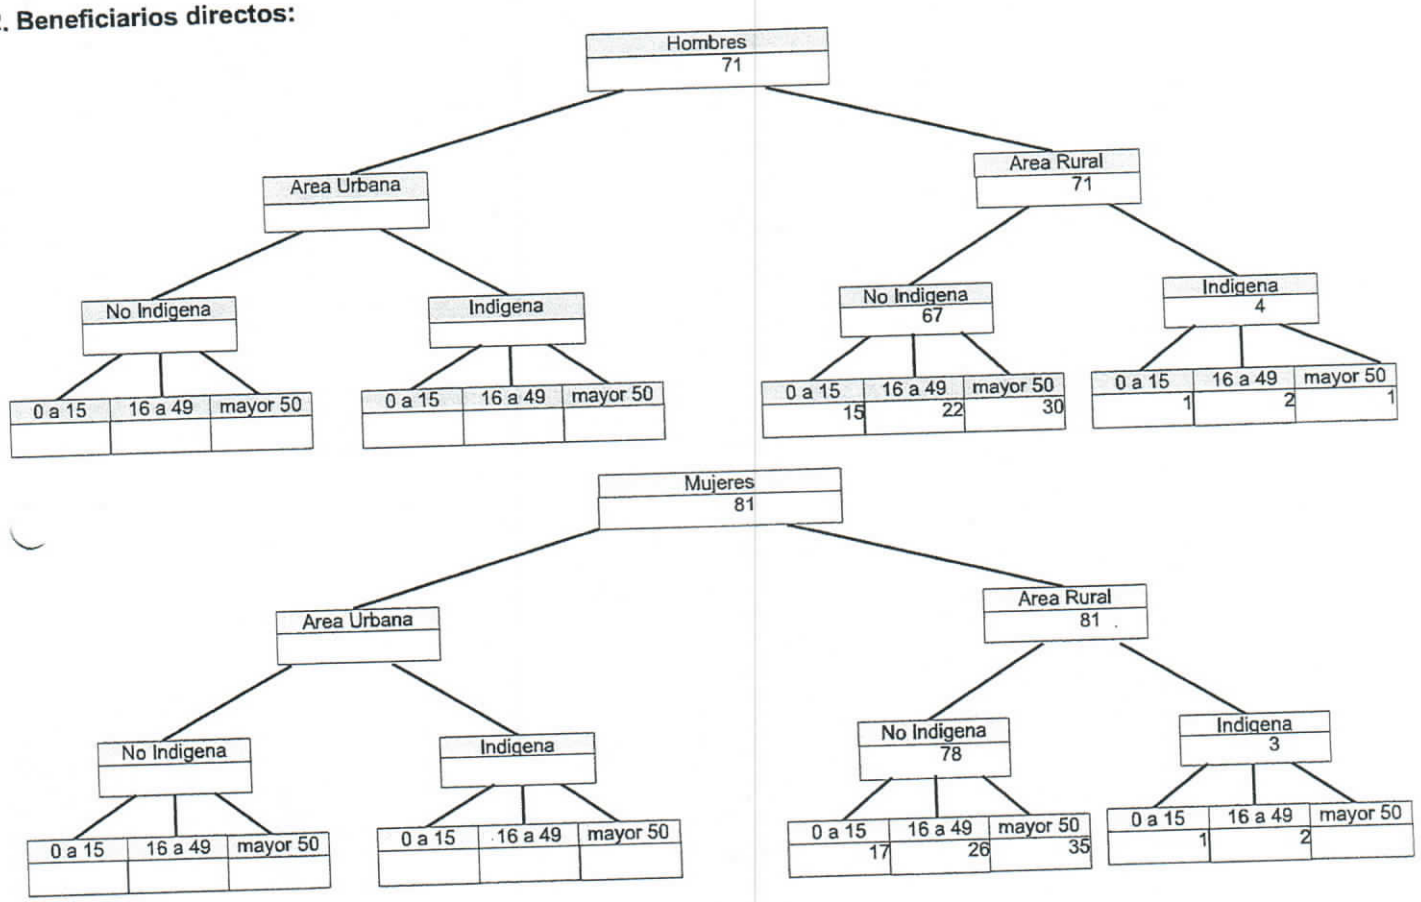

3. Costo/eficiencia:

4. TIR: %

5. VAN:

6. Empleo a requerir:

Durante la ejecución en hombre/mes	Durante la operación en hombre/mes

Calificada		
No calificada		

7. Situación del terreno: Ninguno

8. Diseños (especificaciones):

9. Vida útil del proyecto: 20 años

10. Fecha de inicio de la operación: 01-APR-20

11. Institución responsable de operación: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

12. Costo anual de operación:

Información General de iniciativa de Inversión

0257503 - CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA PIEDRA PARADA, GUASTATOYA, EL PROGGRESO

SNIP - SEGEPLAN

Solicitud de Financiamiento, ejercicio 2,020

Meta GLOBAL del proyecto :
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR — 90.00 Metro cuadrado

Meta ANUAL del proyecto :
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR — 90.00 Metro cuadrado

PROGRAMACION FINANCIERA MULTIANUAL:

Fase: Ejecución

Fecha de inicio de la fase: 01/01/2020
Fecha de finalización: 31/12/2020

Decreto 2017:
Decreto 2018:
Decreto 2019:

Descripción de la fase a financiar:

CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR

Situación presupuestaria: Nuevo

Estructura programática:---
Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2020	Programado 2021	Programado 2022	Progamado 2023	Total
TOTAL :	890,000.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00
Recursos internos :	890,000.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00
Gobierno central :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunidad :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aporte municipal :	890,000.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00
Otros aportes :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras fuentes :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL 2020

Fuente de Financiamiento	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
TOTAL				98,890	98,890	98,890	98,890	98,890	98,890	98,890	98,890	98,880
Recursos internos				98,890	98,890	98,890	98,890	98,890	98,890	98,890	98,890	98,880
Gobierno central :												
Comunidad :												
Aporte municipal :				98,890	98,890	98,890	98,890	98,890	98,890	98,890	98,890	98,880
Otros aportes :												
Otras fuentes:												

PROGRAMACION FISICA MULTIANUAL

Rubro	Unidad de medida	Programado 2,020	Programado 2021	Programado 2022	Programado 2023
Renglones varios	m²	90			

2,020

Rubro	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Renglones varios				10	10	10	10	10	10	10	10	10

PROGRAMACION FISICA ANUAL

GUASTATOYA

Municipalidad de
GUASTATOYA
info@muniguastatoya.com
www.muniguastatoya.com
Telefax: 7945-1594
Teléfonos: 7945-0031, 7945-1602, 7945-1603

LA INFRASCRITA SECRETARIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO

CERTIFICA

Que para su cumplimiento y efectos consiguientes se transcribe la **EL ACUERDO MUNICIPAL No. 044-2021** el que copiada literalmente establece:

ACUERDO MUNICIPAL 044-2021

Guastatoya, 15 de marzo de 2,021

DESPACHO DEL ALCALDE MUNICIPAL

La Autoridad Administrativa Superior

Se tiene a la vista el oficio remitido por Synthia Mayté Asencio Oliva, Mandataria General Judicial con Cláusula Especial de la Empresa CONSTRUCTORA ASENCIO, por medio del cual hace del conocimiento de esta autoridad, que el proyecto denominado **CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA PIEDRA PARADA, GUASTATOYA, EL PROGRESO,** el que se ejecuta por la modalidad de contrato, identificado como 29-2020, se encuentra en su fase de ejecución del 72.8908457%, por lo cual solicita la supervisión para establecer dicho avance y en consecuencia el pago que corresponde para dicho avance fisico.

El Ingeniero Carlos Ramiro Ortega Lima, Supervisor de Obras Municipales, por medio de oficio informa que de conformidad con el cuadro de ESTIMACION No. 2, el proyecto en referencia se encuentra en un avance fisico del 72.8908457%, dicha estimación se establece de la manera siguiente

Monto de Estimación del Avance Físico	Q. 291,198.00
Amortización del anticipo	Q. 58,239.60
Cantidad Líquida a Recibir	**Q. 232,958.40**

Por lo que es necesario emitir la disposición legal para los efectos legales consiguientes.

CONSIDERANDO:

Que el Alcalde Municipal, es la autoridad administrativa superior de la dependencia y en consecuencia le corresponde la aprobación de las políticas administrativas, financiera y la dirección de la misma de conformidad con su jerarquía.

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el Numeral Romano II, de la cláusula Quinta, del contrato **CONTRATO DE EJECUCION DE PROYECTOS SIETE GUION DOS MIL VEINTE (29-2020), CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA PIEDRA PARADA, GUASTATOYA, EL PROGRESO,** la cual establece **II).** Los **PAGOS SIGUIENTES**, ***se efectuarán de conformidad con las estimaciones de pago de conformidad con el artículo 59 de la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas, en el cual la Municipalidad de Guastatoya, hará los pagos contra las estimaciones periódicas de trabajo ejecutado y aceptado, las que podrán efectuarse mensualmente, trabajos debidamente comprobados, con los informes presentados por el Supervisor del Proyecto Residente juntamente con el Supervisor de Proyectos de la Municipalidad de Guastatoya***.

POR TANTO:

La Autoridad Administrativa Superior, con las facultades que le confiere el Código Municipal, la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento y la cláusula descrita en la presente resolución

RESUELVE:

I) Se tiene por recibido los oficios, ordenándose para el efecto agregar a los antecedentes que obran en el expediente de mérito.
II) **APROBAR,** el pago a favor de la Empresa Constructora, Constructora Asencio, en concepto de avance fisico del 72.8908457%, del proyecto **CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA PIEDRA PARADA, GUASTATOYA, EL PROGRESO,** el que se ejecuta por la modalidad de contrato, identificado como 29-2020, por un monto de doscientos treinta y dos mil novecientos cincuenta y ocho quetzales con cuarenta centavos (Q. 232,958.40), ordenándose para el efecto al Director de la DAFIM, emitir los documentos contables correspondientes y efectuar el pago correspondiente.

Cúmplase. (fs llegible) Alcalde Municipal.

DADO EN EL PALACIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE GUASTATOYA, DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, A QUINCE DIAS DEL MES DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO.

Licda. Elena Ermely Calderón Fajardo
SECRETARIA MUNICIPAL.

SECRETARIA

Municipalidad de
GUASTATOYA
Departamento de El Progreso, Guatemala, C.A.
info@muniguasta.com
www.muniguastatoya.com
Telefax: 7945-1594, 7945-1602, 7945-1603

Guastatoya, martes, 9 de marzo de 2021

SEÑOR(es):
ALCALDE MUNICIPAL Y
HONORABLE CORPORACION
GUASTATOYA, EL PROGRESO

Respetables señor(es):

El motivo del presente es para informar los resultados de la siguiente estimacion de pago:

No. De Supervision de Avance Físico:	**ESTIMACION No.2**		
Nombre del Proyecto:	**CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA PIEDRA PARADA, GUASTATOYA, EL PROGRESO.**		
No. De Contrato del Proyecto:	29-2020	**Fecha del Contrato:**	9/10/2020
NOG.	13327461		
Estimacion del Avance Fisico:	72.8908457%		
Monto de Estimacion del Avance Físico:	Q291,198.00	**en letras:**	DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO QUETZALES CON 00/100 CENTAVOS
Amorización del Anticipo:	Q58,239.60	**en letras:**	CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE QUETZALES CON 60/100 CENTAVOS
Cantidad Líquida a Recibir:	Q232,958.40	**en letras:**	DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO QUETZALES CON 40/100 CENTAVOS

Se adjunta anexo que contiene el detalle de la presente estimacion para que se continúe con lo procedente.

Agradeciendo desde ya, me suscribo.

Atentamente,

ING. CARLOS RAMIRO ORTEGA LIMA
COLEGIADO: 7118
SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

Carlos Ramiro Ortega Lima
Ingeniero Civil
Col. 7118

GUASTATOYA esta cambiando

ESTIMACION No.2

NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA PIEDRA PARADA, GUASTATOYA, EL PROGRESO.				
FECHA INICIO DEL PROYECTO:	30 de octubre de 2021	CONCEPTO	NUMERO	FECHA	
TIEMPO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO EN DIAS:	120	CONTRATO	29-2020	09-10-20	
		MONTO DE CONTRATO		Q 888,818.80	
NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA:	CONSTRUCTORA ASENCIO	SNIP		257503	
REPRESENTANTE LEGAL EMPRESA CONSTRUCTORA:	SYNTHIA MAYTÉ ASENCIO OLIVA	NOG		13327461	

		TRABAJO FISICO																					
		Cantidad Contratada							Cantidad Ejecutada														
No.	DESCRIPCION DEL RENGLON DE TRABAJO	Unidad	Cantidad Contratada	Orden de Cambio	Orden de Trabajo Sup	Acuerdo Trabajo Extra	Cantidad Actual	Precio Unitario Q.	Costo Total Estimado	Este Periodo	Acumulado Anterior	Total a la fecha	%	Este Periodo	Acumulado Anterior	TOTAL A LA FECHA	%	Por Estimar	%
1	TRABAJOS PRELIMINARES	UNIDAD	1.00				1.00	Q 30,693.60	Q 30,693.60		1	1.00	100.00%	Q -	Q 30,693.60	Q 30,693.60	100.00%	Q -	0.00%
2	REPLANTEO TOPOGRAFICO	UNIDAD	1.00				1.00	Q 16,656.30	Q 16,656.30		1	1.00	100.00%	Q -	Q 16,656.30	Q 16,656.30	100.00%	Q -	0.00%
3	RELLENO Y COMPACTACION DE APROCHE	M3	780.00				780.00	Q 198.83	Q 155,087.40		0	0.00	0.00%	Q -	Q -	Q -	0.00%	Q 155,087.40	100.00%
4	FUNDICION DE CONCRETO CICLOPEO	M3	292.00				292.00	Q 1,941.32	Q 566,865.44	150.00	112	262.00	89.73%	Q 291,198.00	Q 217,427.84	Q 508,625.84	89.73%	Q 58,239.60	10.27%
5	ARCO DE TUBERIA DE ACERO CORRUGADA	ML	6.00				6.00	Q 15,315.30	Q 91,891.80		6	6.00	100.00%	Q -	Q 91,891.80	Q 91,891.80	100.00%	Q -	0.00%
6	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	M2	24.00				24.00	Q 419.63	Q 10,071.12		0	0.00	0.00%	Q -	Q -	Q -	0.00%	Q 10,071.12	100.00%
7	BARANDAL DEL PROYECTO	UNIDAD	2.00				2.00	Q 7,688.25	Q 15,376.50		0	0.00	0.00%	Q -	Q -	Q -	0.00%	Q 15,376.50	100.00%
8	LIMPIEZA FINAL	UNIDAD	1.00				1.00	Q 2,176.64	Q 2,176.64		0	0.00	0.00%	Q -	Q -	Q -	0.00%	Q 2,176.64	100.00%
								TOTAL CONTRATADO	Q 888,818.80										
														Q 291,198.00	Q 356,669.54	Q 647,867.54	72.8908457%	Q 240,951.26	27.10915%
										VALOR DE LA ESTIMACION				Q 291,198.00					
										AMORTIZACION DEL ANTICIPO				Q 58,239.60					
										TOTAL LIQUIDO A RECIBIR				Q 232,958.40					

PERIODO DEL:	23-01-21	AL	09-03-21
Fecha Solcitud:	9 de marzo de 2021		

AVANCE AUTORIZADO POR LA UNIDAD EJECUTORA A LA EMPRESA CONSTRUCTORA:

72.8908457%

GUASTATOYA

COSTO FINANCIERO

SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES
CARLOS RAMIRO ORTEGA LIMA

Carlos Ramiro Ortega Lima
Ingeniero Civil
Col. 7118

JORGE ANTONIO ORELLANA PINTO
ALCALDE MUNICIPAL

Municipalidad de
GUASTATOYA
Departamento de El Progreso, Guatemala, C.A.
info@muniguasta.com
www.muniguastatoya.com
Telefax: 7945-1594, 7945-1602, 7945-1603

Guastatoya, martes, 9 de marzo de 2021

SEÑOR(es):
ALCALDE MUNICIPAL Y
HONORABLE CORPORACION
GUASTATOYA, EL PROGRESO

Respetables señor(es):

Respetuosamente me dirijo a usted, con el proposito de REMITIR el INFORME DE SUPERVISION que acontinuacion se describe:

Nombre del Proyecto:	**CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA PIEDRA PARADA, GUASTATOYA, EL PROGRESO.**		
No. De Contrato del Proyecto:	29-2020	**Fecha del Contrato:**	9/10/2020
NOG.	13327461		
Empres constructura:	CONSTRUCTORA ASENCIO		

Se realizo la visita al proyecto antes en mencion para hacer constar los avances de los renglones contratados en su avance fisico notificado por la empresa Constructora los cuales se describen a continuacion:

150 M3 DE FUNDICION DE CONCRETO CICLOPEO

TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR

780 M3 DE RELLENO Y COMPACTACION DE APROCHE
30 M3 DE FUNDICION DE CONCRETO CICLOPEO
24 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
2 UNIDAD DE BARANDAL DEL PROYECTO
1 UNIDAD DE LIMPIEZA FINAL

Municipalidad de
GUASTATOYA
Departamento de El Progreso, Guatemala, C.A.
info@muniguasta.com
www.muniguastatoya.com
Telefax: 7945-1594, 7945-1602, 7945-1603

Estimacion del Avance Fisico:	72.8908457%

Se adjunta anexo que contiene el detalle de la presente estimacion para que se continúe con lo procedente.

Agradeciendo desde ya, me suscribo.

Atentamente,

ING. CARLOS RAMIRO ORTEGA LIMA
COLEGIADO: 7118
SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA


Carlos Ramiro Ortega Lima
Ingeniero Civil
Col. 7118

Municipalidad de
GUASTATOYA
Departamento de El Progreso, Guatemala, C.A.
info@muniguasta.com
www.muniguastatoya.com
Telefax: 7945-1594, 7945-1602, 7945-1603

INFORME FOTOGRAFICO	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA PIEDRA PARADA, GUASTATOYA, EL PROGRESO.







CONSTRUCTORA ASENCIO

Río Hondo, Zacapa, 08 de marzo de 2021

JORGE ANTONIO ORELLANA
ALCALDE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO

De la manera más atenta y respetuosa me dirijo a su persona, para hacer de su conocimento que el proyecto: **"CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA PIEDRA PARADA, GUASTATOYA, EL PROGRESO"**, suscrito por medio del contrato No. **29-2020**, de fecha **09 de octubre de 2020**; cuenta con un avance físico correspondiente al **72.8908457%**.
Por lo cual agradecemos efectuar el trámite correspondiente para dicho pago.


Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente.

CONSTRU ASENCIO
PROP. SERGIO ASENCIO

SYNTHIA MAYTÉ ASENCIO OLIVA
MANDATARIA GENERAL JUDICIAL CON CLÁUSULA ESPECIAL
CONSTRUCTORA ASENCIO

7A. CALLE 2-40 ZONA 1, RÍO HONDO, ZACAPA. TELÉFONOS: 7934-0483 / 3043-5438
construasencio04@gmail.com



CONSTRUCTORA ASENCIO

ESTIMACION No.2

NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA PIEDRA PARADA, GUASTATOYA, EL PROGRESO			FECHA	
FECHA INICIO DEL PROYECTO:	30/10/2020	CONCEPTO	NUMERO	9/10/2020	
TIEMPO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO EN DIAS:	120	CONTRATO	29-2020	Q	888,818.80
NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA:	CONSTRUCTORA ASENCIO	MONTO DE CONTRATO		257503	
REPRESENTANTE LEGAL EMPRESA CONSTRUCTORA:	SYNTHIA MAYTÉ ASENCIO OLIVA	SNIP		13327461	
		NOG			

PERIODO DEL:	23-01-21	AL	08-03-21
Fecha Solcitud:			8-mar-21

AVANCE AUTORIZADO POR LA UNIDAD EJECUTORA A LA EMPRESA CONSTRUCTORA:

72.89085%

TRABAJO FISICO

No. RENGLON	DESCRIPCION DEL RENGLON DE TRBAJO	Cantidad Contratada								Cantidad Ejecutada				COSTO FINANCIERO					
		Unidad	Cantidad Contratada	Orden de Cambio	Orden de Trabajo Sup	Acuerdo Trabajo Extra	Cantidad Actual	Precio Unitario Q.	Costo Total Estimado	Este Periodo	Acumulado Anterior	Total a la fecha	%	Costo de Ejecución Este Periodo	Costo de Ejecución Acumulado Anterior	Costo de Ejecución TOTAL A LA FECHA	%	Monto por ejecutar Por Estimar	Monto por ejecutar %
1	TRABAJOS PRELIMINARES	UNIDAD	1.00				1.00	Q 30,693.60	Q 30,693.60		1.00	1.00	100.00%	Q -	Q 30,693.60	Q 30,693.60	100.00%	Q -	0.00%
2	REPLANTEO TOPOGRAFICO	UNIDAD	1.00				1.00	Q 16,656.30	Q 16,656.30		1.00	1.00	100.00%	Q -	Q 16,656.30	Q 16,656.30	100.00%	Q -	0.00%
3	RELLENO Y COMPACTACION DE APROCHE	M3	780.00				780.00	Q 198.83	Q 155,087.40			-	0.00%	Q -	Q -	Q -	0.00%	Q 155,087.40	100.00%
4	FUNDICION DE CONCRETO CICLOPEO	M3	292.00				292.00	Q 1,941.32	Q 566,865.44	150.00	112.00	262.00	89.73%	Q 291,198.00	Q 217,427.84	Q 508,625.84	89.73%	Q 58,239.60	10.27%
5	ARCO DE TUBERIA DE ACERO CORRUGADA	ML	6.00				6.00	Q 15,315.30	Q 91,891.80		6.00	6.00	100.00%	Q -	Q 91,891.80	Q 91,891.80	100.00%	Q -	0.00%
6	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	M2	24.00				24.00	Q 419.63	Q 10,071.12			-	0.00%	Q -	Q -	Q -	0.00%	Q 10,071.12	100.00%
7	BARANDAL DE CONCRETO	UNIDAD	2.00				2.00	Q 7,688.25	Q 15,376.50			-	0.00%	Q -	Q -	Q -	0.00%	Q 15,376.50	100.00%
8	LIMPIEZA FINAL	UNIDAD	1.00				1.00	Q 2,176.64	Q 2,176.64			-	0.00%	Q -	Q -	Q -	0.00%	Q 2,176.64	100.00%
								TOTAL CONTRATADO	Q 888,818.80					Q 291,198.00	Q 356,669.54	Q 647,867.54	72.89046%	Q 240,951.26	27.10915%

VALOR DE LA ESTIMACION	Q 291,198.00
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	Q 58,239.60
TOTAL LIQUIDO A RECIBIR	Q 232,958.40

Synthia Mayté Asencio Oliva
Mandataria General Judicial con Cláusula Especial
CONSTRUCTORA ASENCIO


CONSTRU ASENCIO
PROP. SERGIO ASENCIO


7A. CALLE 2-40 ZONA 1, RÍO HONDO, ZACAPA.
construasencio04@gmail.com
TELÉFONOS: 7934-0483 / 3043-5438


CONSTRUCTORA ASENCIO

INFORME FOTOGRÁFICO DE TRABAJOS REALIZADOS
ESTIMACIÓN DE TRABAJO FÍSICO No.2

"CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA PIEDRA PARADA, GUASTATOYA, EL PROGRESO"

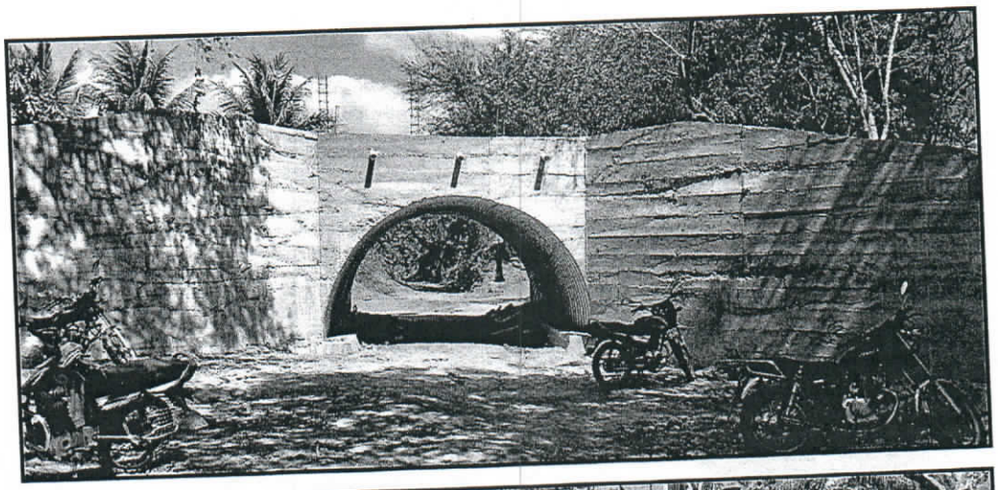

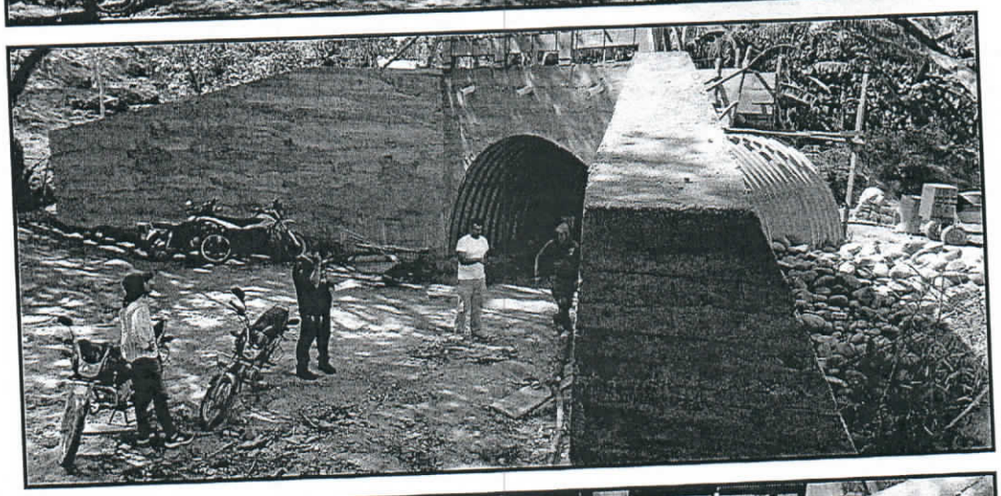


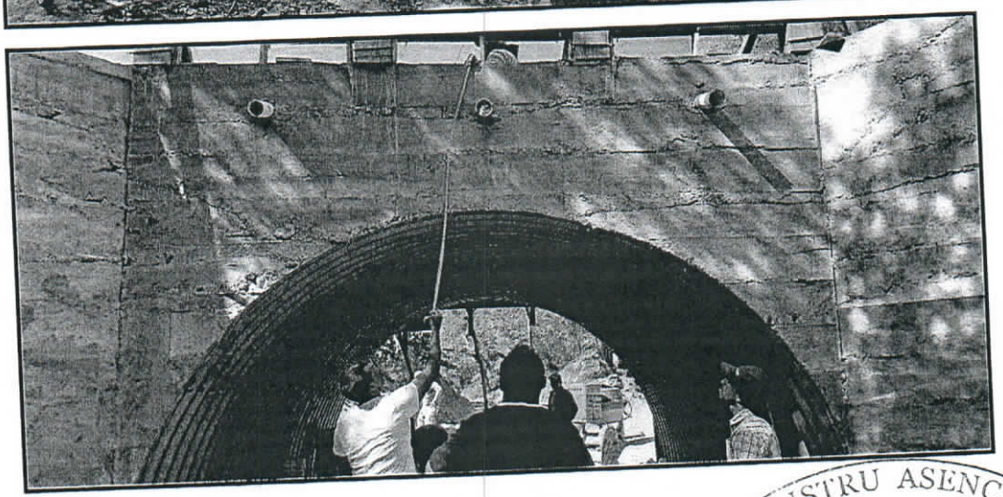


CONSTRU ASENCIO
PROP. SERGIO ASENCIO

7A. CALLE 2-40 ZONA 1, RÍO HONDO, ZACAPA.
TELÉFONOS: 7934-0483 / 3043-5438
construasencio04@gmail.com

CONSTRUCTORA ASENCIO

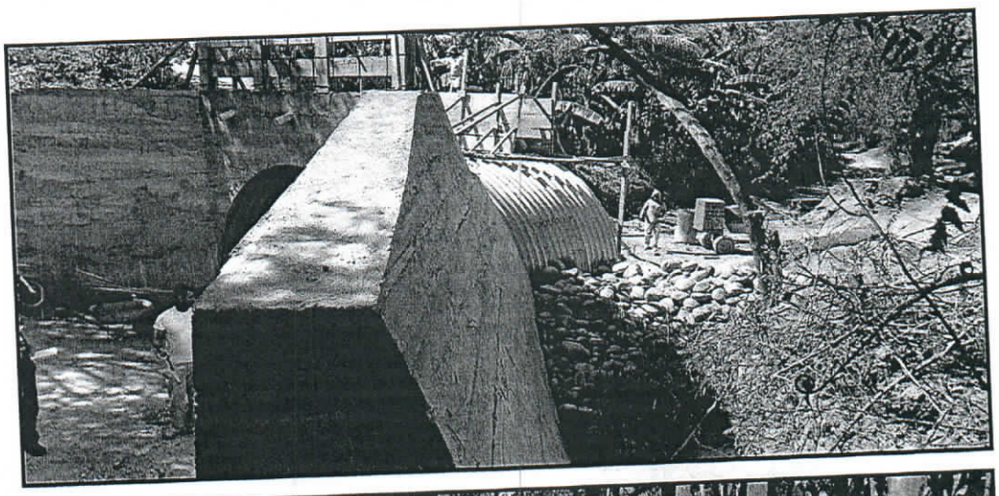

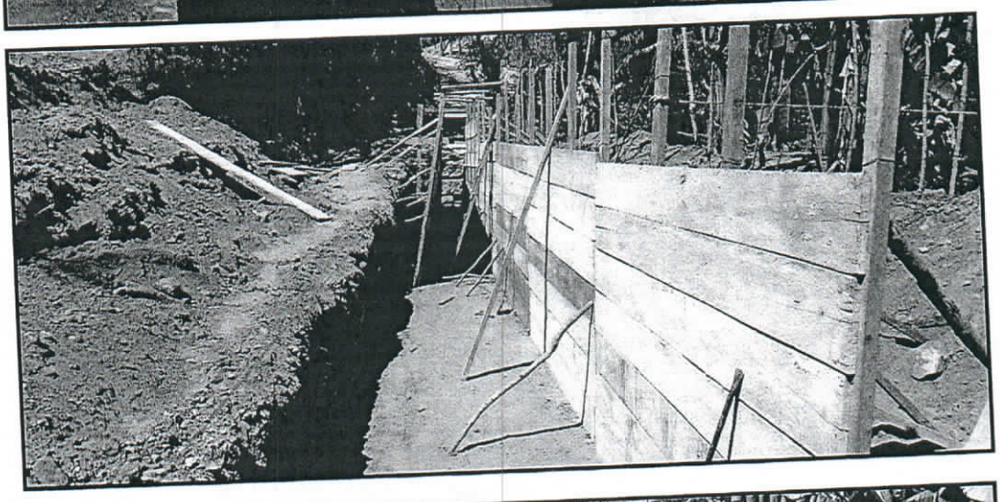







PROP. SERGIO ASENCIO

7A. CALLE 2-40 ZONA 1, RÍO HONDO, ZACAPA.
TELÉFONOS: 7934-0483 / 3043-5438
construasencio04@gmail.com

CONSTRUCTORA ASENCIO

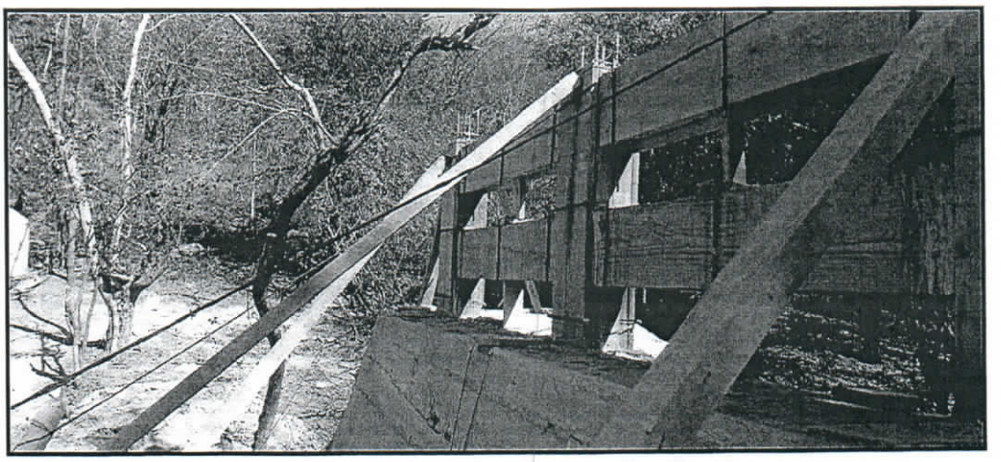

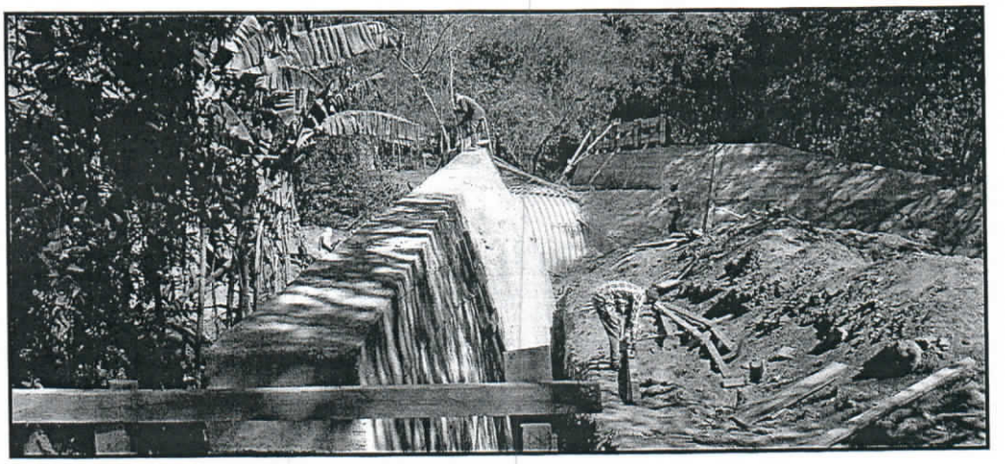

CONSTRU ASENCIO

PROP. SERGIO ASENCIO

7A. CALLE 2-40 ZONA 1, RÍO HONDO, ZACAPA. TELÉFONOS: 7934-0483 / 3043-5438

construasencio04@gmail.com

GUASTATOYA

CONSTANCIA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

016

MONTO RESERVADO VIGENTE (Q): Q 890,000.00 Ejercicio Fiscal: 2020

MONTO EN LETRAS:

OCHOCIENTOS NOVENTA MIL QUETZALES CON CON 00/100

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

FECHA DE EMISION: lunes, 22 de junio de 2020

MODALIDAD DE COMPRA O CONTRATACION: COTIZACION

NUMERO DE OPERACIÓN GUATECOMPRAS:

DESCRIPCION DEL PROCESO:

CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR, ALDEA PIEDRA PARADA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

NIT:

NOMBRE O RAZON SOCIAL:

CORREO ELECTRONICO:

PROGRAMCION No.: 23 Q 890,000.00

ESTUCTURA (S) PRESUPUESTARIA (S) ASIGNADA (S) ES 23-000-001-000-006 RENGLON # 331

UNA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 32-0101-0015, 32-0101-0017, 32-0101-0018

CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR, ALDEA PIEDRA PARADA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

OCHOCIENTOS NOVENTA MIL QUETZALES CON CON 00/100 Q 890,000.00

Edgar Ivan Monterroso Gonzalez
Encargado del Presupuesto

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO
ENCARGADO DE PRESUPUESTO
EDGAR IVAN MONTERROSO GONZALEZ
- TU NUEVA MUNI -

ULTIMA LINEA
