GOBIERNO DE GUATEMALA
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

RGAE
Registro General de Adquisiciones del Estado

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN Y PRECALIFICACIÓN COMO PROVEEDOR DEL ESTADO

Última fecha de actualización: 22 de enero de 2021

202190076

EL INFRASCRITO REGISTRADOR DEL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Hace constar

Que a la presente fecha KELIAN GUILLERMO SOLARES ORELLANA con NIT 33541728 se encuentra INSCRITO en el REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO, al folio 76553 del Libro de INSCRIPCIONES y en el registro número 7318 del LIBRO DE PROVEEDORES, en estatus **HABILITADO**.

Esta constancia le habilita para proveer: OBRAS A ENTIDADES DEL ESTADO, HASTA UN MONTO MAXIMO DE CONTRATACIÓN DE CIENTO VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS UNO QUETZALES CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS (Q. 126,974,301.48). Como resultado de la evaluación de la capacidad técnica y financiera del proveedor.

Asimismo, precalificado en la especialidad o especialidades siguientes: (Si no se listan especialidades, se debe a que el proveedor no acreditó documentación de respaldo requerida).

- 4312 Preparación del terreno
- 4321 Instalaciones eléctricas
- 8130 Paisajismo y servicios de mantenimiento conexos
- 4103 Mantenimiento y remodelación de edificios
- 4219 Muros de contención
- 4224 Sistemas de captación, conducción y distribución de agua
- 4297 Perforaciones
- 7730 Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles
- 2511 Fabricación de productos metálicos para uso estructural
- 3312 Reparación de maquinaria
- 4298 Adoquinado y empedrado
- 4212 Puentes
- 4295 Construcción de instalaciones deportivas
- 4101 Construcción de edificios
- 4217 Mantenimiento de carreteras
- 4311 Demoliciones
- 7118 Cartografía, catastro, agrimensura, topografía y sistemas de información geográfica
- 3700 Evacuación de aguas residuales
- 4226 Sistemas de saneamiento y drenaje

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO SIN FIRMA, SU AUTENTICIDAD PUEDE SER VERIFICADA INGRESANDO EL NUMERO DE LA CONSTANCIA EN LA OPCIÓN VALIDAR CONSTANCIAS EN EL PORTAL www.rgae.gob.gt **O A TRAVÉS DEL CODIGO QR DE ESTE DOCUMENTO.**

Notas: Los términos de la presente constancia se basan en la información y documentación presentada por el interesado bajo los términos y condiciones establecidos por el Registro General de Adquisiciones del Estado en el que declara que dicha información y documentación corresponden a la persona individual o jurídica identificada en esta constancia y sabiendo de la pena relativa al delito que establece el artículo 459 del Código Penal. No asumiendo el Registro responsabilidad alguna por omisión o actos previos posteriores, realizados por los proveedores que transgredan el marco legal.

La presente constancia no sustituye, reemplaza o releva el marco normativo aplicable a la recepción de ofertas, la calificación y adjudicación del negocio conforme lo establecido en el artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado -LCE-, así como el cumplimiento de los procedimientos de suscripción y aprobación del contrato, y lo relativo a las garantías y seguros relacionados al cumplimiento contractual regulados en la -LCE-.

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO
TU NUEVA MUNI
JUNTA DE COTIZACION

Fecha de Impresión 25 de mayo de 2021

- 4313 Movimientos de tierra y/o excavaciones
- 4322 Instalaciones de agua potable, calefacción y aire acondicionado
- 4211 Carreteras pavimentadas
- 4330 Terminación y acabado de edificios

A partir del 6 de junio de 2019, las constancias emitidas por el RGAE, reflejarán además del nombre de las especialidades el código de cada una de ellas, esto con el fin de facilitar el proceso de revisión a las entidades reguladas por el artículo 1 de la ley de Contrataciones del Estado.

Última fecha de modificación: 29 de mayo de 2021.

Plazo de vigencia: La precalificación operada tiene vigencia hasta el 30 de septiembre de 2021.

Resolución: 202188886, de fecha 29 de mayo de 2021.

Lugar y fecha de emisión: Guatemala, 29 de mayo de 2021.

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO
-TU NUEVA MUNI-
JUNTA DE COTIZACION

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO SIN FIRMA, SU AUTENTICIDAD PUEDE SER VERIFICADA INGRESANDO EL NUMERO DE LA CONSTANCIA EN LA OPCIÓN VALIDAR CONSTANCIAS EN EL PORTAL www.rgae.gob.gt **O A TRAVÉS DEL CODIGO QR DE ESTE DOCUMENTO.**

Notas: Los términos de la presente constancia se basan en la información y documentación presentada por el interesado bajo los términos y condiciones establecidos por el Registro General de Adquisiciones del Estado en el que declara que dicha información y documentación corresponden a la persona individual o jurídica identificada en esta constancia y sabiendo de la pena relativa al delito que establece el artículo 459 del Código Penal. No asumiendo el Registro responsabilidad alguna por omisión o actos previos posteriores, realizados por los proveedores que transgredan el marco legal.

La presente constancia no sustituye, reemplaza o releva el marco normativo aplicable a la recepción de ofertas, la calificación y adjudicación del negocio conforme lo establecido en el artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado -LCE-, así como el cumplimiento de los procedimientos de suscripción y aprobación del contrato, y lo relativo a las garantías y seguros relacionados al cumplimiento contractual regulados en la -LCE-.

Página de impresión 29 de mayo de 2021.

CONTRATO DE EJECUCION DE PROYECTOS VEINTICINCO GUION DOS MIL VEINTIUNO (25-2021)

MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO BARRIO LA DEMOCRACIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

NOG. 14877120

En el Municipio de Guastatoya, del departamento de El Progreso, el día **OCHO (8) DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO (2021). NOSOTROS:** Por una parte comparezco Yo, **JORGE ANTONIO ORELLANA PINTO,** de cuarenta y nueve años de edad, casado, guatemalteco, Licenciado en Administración de Empresas, domiciliado en el departamento de El Progreso, me identifico con el documento personal de identificación –DPI-, Código Único de Identificación –CUI-, dos mil quinientos setenta espacio cincuenta y tres mil novecientos sesenta y cuatro espacio cero dos cero uno, (2570 53964 0201), extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala; DE LA CALIDAD CON QUE ACTUO. Actúo en calidad de **Alcalde Municipal,** de la ciudad de Guastatoya, del departamento de El Progreso, calidad que acredito, con la certificación del acta de toma de posesión, dos guion dos mil veinte (2-2020), de fecha quince de enero de dos mil veinte, contenida en el libro número dos mil seiscientos cuarenta y siete (2647), de sesiones extraordinarias del Concejo Municipal, debidamente autorizado por la Contraloría General de Cuentas, y el Acuerdo número cero cero uno guión dos mil diecinueve (001-2019), de la Junta Electoral Departamental de El Progreso, con el número de **CUENTADANCIA Te tres guion dos guion uno (T3-2-1);** y por la otra parte comparezco Yo, **KELIAN GUILLERMO SOLARES ORELLANA,** de treinta y cinco años de edad, soltero, guatemalteco, Constructor, de éste Domicilio, me identifico con el documento personal de identificación, código único de identificación, dos mil quinientos noventa y tres, noventa y cinco mil doscientos cincuenta, cero dos cero uno (2593 95250 0201), extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, actúo en calidad de Propietario de la Empresa denominada **"CONSTRUCTORA SOLAR",** Empresa debidamente registrada en el Registro Mercantil de la República, Guatemala, Patente de Comercio número de registro seiscientos sesenta y un mil setecientos dieciséis (661716), folio ochocientos setenta y nueve (879), libro seiscientos veintitrés (623), de Empresas Mercantiles, número de expediente treinta y siete mil cincuenta y siete guion dos mil catorce (37057-2014), categoría única; con dirección del propietario Barrio El Porvenir, Guastatoya, El Progreso, con número de Identificación Tributaria treinta y tres millones quinientos cuarenta y un mil setecientos veintiocho (33541728), con Registro de actualización del Registro General de Adquisiciones del Estado 202190076, resolución número 202188886, expediente: 20211008699 RGAE-2021, con vigencia hasta el treinta de septiembre de dos mil veintiuno, con el cual hace constar la capacidad económica y las especialidades de la empresa referida, ambas constancias emitidas por el Registro General de Adquisiciones del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas. Ambos comparecientes manifestamos encontrarnos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles y que las representaciones que acreditamos son suficientes de conformidad con la ley y a nuestro juicio para celebrar el presente contrato, toda la documentación indicada se tiene a la vista y en lo sucesivo simplemente se denominará LA MUNICIPALIDAD y "EL CONSTRUCTOR", sujetándonos a las cláusulas siguientes.

PRIMERA: El Licenciado JORGE ANTONIO ORELLANA PINTO, Alcalde Municipal, manifiesto que actúo en representación de la Municipalidad de Guastatoya del departamento de El Progreso, y expongo que de conformidad con el Acuerdo emitido por el Despacho Municipal, contenido en el **ACUERDO MUNICIPAL 88-**

2021, de fecha ocho de julio de dos mil veintiuno, del libro de acuerdos de la Alcaldía Municipal, debidamente autorizado por la Contraloría General de Cuentas, en la cual la Autoridad Superior aprueba la adjudicación realizada por la Junta de Cotización, para la ejecución del proyecto denominado **MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO BARRIO LA DEMOCRACIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO,** de conformidad con las bases técnicas, especificaciones generales y planos presentados. El presente contrato se suscribe con fundamento en los artículos 9, numeral 6) literal b), artículo 47, 49, del a Ley de Contrataciones del Estado y sus Reformas y Artículo 42 del Reglamento de la misma ley, 53 literal I del Decreto 12-2002 Código Municipal y sus reformas; se tienen incorporados al instrumento contractual el proceso establecido en la Ley de Contrataciones del Estado, la oferta presentada por el constructor y la adjudicación correspondiente.

SEGUNDA: El Constructor se compromete a ejecutar para la Municipalidad de Guastatoya, el proyecto **MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO BARRIO LA DEMOCRACIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO,** obra que se encuentra en el sector urbano, de este municipio el que se ejecutará de conformidad con el presupuesto presentado por la Empresa Constructora.

Renglón No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario (Q)	Precio Total (Q)
1	PRELIMINARES	UNIDAD	1.00	5,115.70	5,115.70
2	DEMOLICION Y RETIRO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE	UNIDAD	1.00	65,411.50	65,411.50
3	BASE DE PARQUE (NIVELACION RELLENO Y COMPACTACION)	M2	324.70	203.50	66,076.45
4	MURO DE JARDIN	ML	41.60	364.85	15,177.76
5	JARDINIZACION	M2	75.15	298.00	22,394.70
6	ALFOMBRA IMITACION GRAMA	M2	122.00	357.90	43,663.80
7	MURO DE CIRCULACION	ML	24.75	1,871.00	46,307.25
8	BANCAS DE CONCRETO	UNIDAD	7.00	3,613.00	25,291.00
9	PISO DE PATIO	M2	127.55	369.00	47,065.95
10	ACOMETIDA Y SISTEMA ELECTRICO	UNIDAD	1.00	5,967.71	5,967.71
11	RAMPA DE ACCESO	M2	2.60	416.00	1,081.60
12	BORDILLO	ML	71.20	221.50	15,770.80
13	JUEGOS INFANTILES	UNIDAD	2.00	9,422.70	18,845.40
14	REJILLA	ML	19.35	623.00	12,055.05
15	JUEGOS INFANTILES GRANDE	UNIDAD	1.00	59,543.09	59,543.09
16	MAQUINAS DE EJERCICIO	UNIDAD	5.00	34,229.40	171,147.00
17	PERGOLA	UNIDAD	1.00	37,844.64	37,844.64
18	SISTEMA DE DRENAJE Y AGUA	UNIDAD	1.00	8,390.60	8,390.60
19	POSTES Y FAROLES	UNIDAD	10.00	13,140.50	131,405.00
				TOTAL	**798,555.00**

El tiempo de entrega de la obra es de **SEIS (6) MESES CALENDARIO,** de conformidad con el cronograma de ejecución presentado por el constructor, el plazo referido se computará a partir del acta de inicio suscrita por el Director de la Oficina Municipal de Planificación, en el lugar de ejecución.

TERCERA: EL CONSTRUCTOR: Por su parte manifiesta que respecto a la ejecución del proyecto refiere que se compromete a lo siguiente: a) entregar totalmente terminada la obra a satisfacción de la Municipalidad de Guastatoya. b) a contratar un Profesional quien será el Supervisor de Proyectos Residente, quien conjuntamente con el Ingeniero Supervisor de la Municipalidad informarán en forma simultánea a la Autoridad Administrativa, al Concejo Municipal y a la Contraloría General de Cuentas de la Nación cuando lo requiera, de los avances físicos del proyecto y las estimaciones de pago, para el efecto deberán presentar las fotocopias de la bitácora del Proyecto, autorizada por la Contraloría General de Cuentas.

CUARTA: El señor Alcalde Municipal en representación de la Municipalidad de Guastatoya, manifiesta que está de acuerdo en las condiciones del constructor, especialmente en lo que respecta al total del proyecto; así como en el tiempo de entregar la obra, ambos de común acuerdo llegaron a establecer la forma de pago de la manera siguiente:

QUINTA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato pactado entre la Municipalidad y la Empresa **CONSTRUCTORA SOLAR,** asciende a la cantidad de **SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO QUETZALES (Q. 798,555.00), incluido el impuesto al valor agregado –IVA-,** los que se pagarán con fondos de –INVERSION- de conformidad con la constancia de disponibilidad presupuestaria emitida por el Encargado del Presupuesto, de conformidad con la estructura presupuestaria 15-00-001-000-002, RENGLON # 331, FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21-0101-0001. Los pagos se efectuarán de conformidad con el artículo 58 de la Ley de Contrataciones del Estado, de la manera siguiente: a). Un anticipo del veinte por ciento (20%) equivalente a la cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS ONCE QUETZALES (Q. 159,711.00), el que se entregará previo a cumplir con los siguientes requisitos: **I).** Otorgar a la Municipalidad **PLAN DE INVERSIÓN, FIANZA DE ANTICIPO, FIANZA DE CUMPLIMIENTO,** las cuales garantizarán la correcta aplicación del mismo con fundamento en Artículos 64, 65, 66, de la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas y los artículos 53, 54, 55, 56, 58 Y 59 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y, **II).** Los **PAGOS SIGUIENTES**, ***se efectuarán de conformidad con las estimaciones de pago de conformidad con el artículo 59 de la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas, en el cual la Municipalidad de Guastatoya, hará los pagos contra las estimaciones periódicas de trabajo ejecutado y aceptado, las que podrán efectuarse mensualmente, trabajos debidamente comprobados, con los informes presentados por el Supervisor del Proyecto Residente juntamente con el Supervisor de Proyectos de la Municipalidad de Guastatoya***. **III).** El último pago equivalente al 100% de avance físico del proyecto, presentando para el efecto, **FIANZA DE CONSERVACIÓN DE OBRA O DE CALIDAD DE FUNCIONAMIENTO, FIANZA DE SALDOS DEUDORES, ACTA DE RECEPCIÓN DEL PROYECTO POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD E INFORME FINAL DE LOS SUPERVISORES PROFESIONALES DEL PROYECTO.**

SEXTA: SANCIONES: El constructor se compromete a entregar los trabajos conforme el contrato suscrito. Y en caso de atraso por parte del Constructor en la entrega de los trabajos, se determinará el atraso en la entrega de la obra con base en las fechas de terminación, parciales o total, fijadas en el programa de ejecución convenido, debiendo aplicarse las multas sin perjuicio de la facultad que tiene la entidad contratante para exigir el cumplimiento del contrato para rescindirlo. Para efecto de la multa, se tomará en cuenta solo la parte proporcional del atraso, por lo que su aplicación no debe afectar la parte del cumplimiento parcial. Se sancionará con el pago de una multa que se aplique al contratista entre el uno al cinco por millar del monto de los trabajos, que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente, por cada día de atraso en que incurra el contratista

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, ALCALDE

CONSTRUCTORA SOLAR Construimos lo mejor

desde la fecha de terminación pactada hasta la total conclusión de los mismos, en ningún caso podrán ser superiores en su conjunto al monto de la garantía de cumplimiento. Asimismo, el Constructor deberá cumplir con los trabajos estipulados en el presente contrato y la Municipalidad no concederá ningún plazo de prórroga a excepción de los siguientes casos: a). si se trata de órdenes de trabajo extra u otros convenios, b). Indicar claramente el plazo improrrogable que se le otorgue al constructor para el trabajo correspondiente y deberá solicitarlo dentro del plazo que indica el Artículo 43, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas.

En relación a lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas, el atraso de la entrega de la obra, por causa imputable al contratista será sancionado del 1 al 5 por millar del monto de las obras que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente, calculando a partir de las fechas pactadas de la entrega parcial o total con respecto a la ejecución convenida con la entidad contratante. Dicha multa solamente se tomará de la parte proporcional del atraso, sin afectar el cumplimiento parcial.

Tasa de cálculo	Días
1o/oo	1 a 20
2o/oo	21 a 30
3o/oo	31 a 60
4o/oo	61 a 120
5o/oo	121 hasta su cumplimiento

La entidad ejecutora será la que emita las sanciones correspondientes.

SEPTIMA: OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR: El constructor se obliga a presentar informes periódicos, cronograma de ejecución de la obra, bitácora de los trabajos de conformidad con el Artículo 37 inciso a). del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, deben de autorizar los libros en la Dirección de Infraestructura Pública de la Contraloría General de Cuentas, así como permitir en cualquier momento que las personas autorizadas por la Municipalidad supervisen las actividades que se desarrollan, asimismo instruirá a su personal para que se le preste la debida colaboración a las personas que supervisan y que son parte de esta Municipalidad, el Constructor deberá de revisar cuidadosamente los documentos contractuales y señalará cualquier omisión o error, contradicción o incongruencia que observe a este respecto, deberá formular la consulta y observación del caso antes de los quince días de ejecutar el proyecto, el constructor previamente a la adquisición de materiales deberá proporcionar a la Municipalidad cuando esto lo requiere muestras de materiales para analizarlos y aprobarlos. El Constructor queda facultado para retirar de la obra a cualquier trabajador que considere incompetente, negligente insubordinado o perjudicial a la buena marcha de dichos trabajos. El constructor deberá de aprobar las herramientas, materiales, mano de obra, transporte y demás elementos necesarios.

OCTAVA: CLAUSULA RELATIVA AL COHECHO: Yo el Contratista, manifiesto que conozco las penas relativas al delito de cohecho así como las disposiciones contenida en el Capítulo III del Título XIII del Decreto 17-73 del Congreso de la República, Código Penal. Adicionalmente, conozco las normas jurídicas que facultan a la Autoridad Superior de la entidad afectada para aplicar las sanciones administrativas que pudieren corresponderme, incluyendo la inhabilitación en el sistema GUATECOMPRAS".

NOVENA: OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD: a) La Municipalidad se obliga a efectuar el pago en tiempo y en formas convenidas, b). Faccionar el acta de inicio y avances físicos y actas de recepción para realizar la liquidación final de los trabajos a ejecutar y prestar la colaboración necesaria para el constructor para

realizar los mismos, c). Designar a la persona o Personas que supervisen los trabajos del proyecto citado anteriormente previa inspección final.

DECIMA: OTRAS OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR: a). Se compromete a sostener el precio de la oferta, b). Entregar la obra en el tiempo y lugar indicado, c). Ejecutar la obra con material de buena calidad y garantizados de conformidad con lo que estipula la ley de contrataciones del estado, d). Contratar mano de obra necesaria y suficiente para la realización del proyecto, y se compromete a obtener en este municipio el cual será calificado por el constructor, e). Es responsable por el trabajo ejecutado por las personas que contrate así como de los daños y perjuicios que causen a terceras personas como consecuencia de la realización de la obra contratada. f). De conformidad con el artículo 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, se podrá ampliar el monto del contrato, previo que sean aprobadas las ordenes de cambio, ordenes de trabajo suplementario o acuerdo de trabajo extra, y se suscribirá un contrato adicional de conformidad con el contenido relativo a la Ley de la materia.

DECIMA PRIMERA: FIANZAS: 1. El constructor se obliga a presentar:

1. **FIANZA DE SOSTENIMIENTO DE OFERTA** no menor del uno por ciento (1%) ni mayor del cinco por ciento (5%) del valor del contrato, que cubrirá el periodo comprendido desde la recepción y apertura de plicas hasta la aprobación de las adjudicaciones, y, en todo caso, tendrá una vigencia de ciento veinte (120) días, como lo establece el artículo 64 de la Ley de Contrataciones.

2. **FIANZA DE CUMPLIMIENTO:** Como requisito previo para la aprobación del presente contrato de conformidad con el Artículo 65 de la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas, que garantizara el cumplimiento de todas las obligaciones estipuladas en el contrato, el contratista deberá prestar fianza, deposito en efectivo o constituir hipoteca en los porcentajes y condiciones que señale el reglamento. Para el caso de obras, además esta garantía cubrirá las fallas o desperfectos que aparecieren durante la ejecución del contrato, antes que se constituya la garantía de conservación. **Por un valor del diez por ciento (10%) del monto del contrato respectivo.**

3. **FIANZA DE ANTICIPO:** Previo a recibir cualquier suma por concepto de anticipo, el contratista constituirá garantía mediante fianza o hipoteca por el monto de un cien por ciento (100%) del mismo. La garantía podrá reducirse en la medida que se amortice el valor del anticipo cubriendo siempre el máximo del saldo deudor y estará vigente hasta su total amortización. El reglamento establecerá el procedimiento de reducción y lo concerniente en los casos de rescisión, resolución y terminación de contrato.

4. **FIANZA DE CONSERVACION DE LA OBRA O DE LA CALIDAD DE FUNCIONAMIENTO:** El contratista responderá por la conservación de la obra, mediante depósito en efectivo, fianza, hipoteca o prenda, a su elección, que cubra el valor de las reparaciones de las fallas o desperfectos que le sean imputables y que aparecieren durante el tiempo de responsabilidad de dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha de recepción de la obra. Tratándose de bienes y suministros, deberá otorgarse garantía de calidad y/o funcionamiento, cuando proceda. La garantía de conservación de obra, o de calidad y/o funcionamiento, deberá otorgarse por el equivalente al quince por ciento (15%) del valor original del contrato, como requisito previo para la recepción de la obra, bien o suministro. El vencimiento del tiempo de responsabilidad previsto en el párrafo anterior, no exime al contratista de las responsabilidades por destrucción o deterioro de la obra debido a dolo o culpa de su parte, por el plazo de cinco (5) años, a partir de la recepción definitiva de la obra.

5. **FIANZA DE SALDOS DEUDORES** Para garantizar el pago de saldos deudores que pudieran resultar a favor del Estado, de la entidad correspondiente o de terceros en la liquidación, el contratista deberá prestar fianza,

depósito en efectivo; constituir hipoteca o prenda, a su elección, por el cinco por ciento (5%) del valor original del contrato. Esta garantía deberá otorgarse simultáneamente con la de conservación de obra como requisito previo para la recepción de la obra, bien o suministro. Aprobada la liquidación, si no hubiere saldos deudores, se cancelará esta garantía.

Las fianzas descritas en el presente contrato, deberán formalizarse mediante póliza emitida por instituciones autorizadas para operar en Guatemala, de conformidad con las siguientes disposiciones: La vigencia de las fianzas será exactamente igual al plazo contractual y deberá ajustarse ante cualquier ampliación o variación del contrato, manteniendo las condiciones de cobertura que aplicaron al contrato original. Lo anterior no es aplicable a las fianzas de conservación de obra, de calidad, de funcionamiento o de saldos deudores. a) Las fianzas garantizarán exacta y fielmente las obligaciones a cargo del contratista o proveedor. Estas obligaciones deben estar estipuladas en el contrato original y en cada una de las modificaciones documentadas. b) El funcionario que corresponda será responsable de exigir la actualización de las fianzas otorgadas por el contratista o proveedor. De omitirlo, el funcionario incurrirá en incumplimiento de deberes. c) El contratista o proveedor que omita actualizar la fianza otorgada ante modificaciones del contrato original, se hará acreedor a una multa y a la suspensión inmediata de los pagos a que tenga derecho. d) Cuando la garantía consistiere en depósitos, deberá hacerse en Quetzales o por medio de cheque certificado. Cuando la garantía sea hipotecaria o prendaria, se formalizará a través de escritura pública debidamente registrada. En todo caso, quedará a criterio del contratista o proveedor la garantía a proporcionar. Las fianzas deberán publicarse en el sistema GUATECOMPRAS. Las juntas a las que se refiere el artículo 10 de esta Ley, serán responsables de verificar la autenticidad de las fianzas de sostenimiento de oferta, y las autoridades suscriptoras de los contratos serán responsables de verificar la autenticidad de las demás fianzas a las que se refiere este capítulo. El sistema GUATECOMPRAS llevará un registro de las fianzas presentadas, así como de las solicitudes de ejecución, ejecución de fianzas y pago de las mismas. Con fundamento en el artículo 69 de la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas

DECIMA SEGUNDA: <u>FORMA DE EFECTUAR LOS TRABAJOS DEL CONSTRUCTOR:</u> El constructor efectuará los trabajos bajo estricta responsabilidad bajo la supervisión de un Profesional del Ramo, colegiado activo de quién deberá presentar la certificación o constancia correspondiente; asimismo incluirá los materiales, mano de obra, equipo y demás elementos necesarios para la correcta aplicación y ejecución del proyecto, mismas que se estarán supervisando por el Ingeniero Supervisor de Obras Municipales, quien cuenta con el aval y aprobación de la Corporación Municipal, así como de la comisión de recepción de la citada obra. El Constructor se compromete a dejar limpias las áreas donde se ejecute el proyecto.

DECIMA TERCERA: <u>CONTROVERSIAS:</u> Toda controversia que pudiera surgir entre los contrayentes en lo que se refiere a la interpretación cumplimiento, aplicación y ejecución de este contrato será resuelto en el menor tiempo posible en forma conciliatoria entre ambas partes y en última instancia de no ponerse de acuerdo en el Tribunal correspondiente de lo contencioso administrativo de conformidad con el Artículo 102 de la citada ley; asimismo que se acepta los procedimientos señalados en el Código Procesal Civil y Mercantil, renunciando el constructor al fuero de su domicilio y señalando como lugar para recibir notificaciones y citaciones BARRIO EL CALVARIO, GUASTATOYA, EL PROGRESO.

DECIMA CUARTA: <u>TERMINACION DEL CONTRATO:</u> La Municipalidad puede dar por terminado, resuelto y/o rescindido el presente contrato en forma unilateral y sin responsabilidad de su parte en los siguientes casos:

a). Por vencimiento del plazo pactado, siempre que no haya ocurrido prórroga, b). Si el constructor incumple con sus obligaciones, c). Si paraliza sin causa justificada los trabajos por más de diez días consecutivos, d). Por rescisión de mutuo acuerdo, e). Si el constructor le fueren embargado bienes y que evidentemente afecten el cumplimiento del contrato.

DECIMA QUINTA: PROHIBICIONES: EL CONSTRUCTOR: declara bajo juramento de ley y bien enterados de las penas relativas al delito de perjurio que no se encuentra comprendido dentro de las limitaciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Y que, si en el transcurso del proceso de adquisición o en la ejecución de un contrato se presenta alguna de las prohibiciones definidas en el artículo 80 de la Ley, el contratista o proveedor deberá hacerlo de conocimiento de la autoridad competente dentro de los dos días siguientes al conocimiento del acaecimiento de la prohibición, para que ésta analice la situación planteada y resuelva sobre el proceso del contrato.

La falta de aviso sobre el acaecimiento de alguna de las prohibiciones definida en la Ley, será causal suficiente para la inhabilitación del contratista o proveedor, quien de conformidad con la ley será responsable de compensar a la entidad contratante por los daños y perjuicios ocasionados.

El trámite de la inhabilitación y de la rehabilitación es responsabilidad de la entidad contratante o ejecutora, quien deberá cumplir con el procedimiento, plazos y condiciones que definan las Normas de Uso del Sistema GUATECOMPRAS y, en todo caso, debe respetarse el derecho de defensa.

La inhabilitación y la rehabilitación en el Sistema GUATECOMPRAS implica la correspondiente inhabilitación o rehabilitación en el Registro General de Adquisiciones del Estado.

DECIMA SEXTA: INSPECCION, RECEPCION Y LIQUIDACION FINAL: 1. El constructor deberá de permitir en cualquier momento que las personas autorizadas por la Municipalidad Inspeccionen las instalaciones, actividades y trabajos que realicen e instruirá a su personal para que atiendan a las personas nombradas proporcionándoles toda información requerida. 2. La Municipalidad nombrará una comisión receptora de los trabajos y harán la inspección correspondiente ante la presencia del constructor su representante legal y posteriormente informarán al Concejo Municipal si se puede faccionar el acta de recepción respectiva para que la Dirección de Administración Financiera efectúe la liquidación final o en su defecto si hay que corregir algunos trabajos o complementar otros, en este último caso deberá indicar cuales son los trabajos a efectuar y el tiempo a emplear y si el plazo es necesario se incluye dentro del tiempo contractual o le concede o no algún tiempo adicional.

DECIMA SEPTIMA: APROBACION: Para que el presente contrato surta sus efectos legales y obligue a las partes al cumplimiento de las cláusulas contenidas deberá ser aprobado de conformidad con el artículo 42 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas.


DECIMA OCTAVA: ACEPTACION DEL CONTRATO: En todos los términos y condiciones estipuladas LA MUNICIPALIDAD Y EL CONSTRUCTOR aceptan para si el presente contrato el que se encuentra contenido en siete (7), hojas membretadas impresas de un solo lado, leemos íntegramente lo escrito y bien enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo aceptamos, ratificamos y firmamos. Damos Fe.

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, ALCALDE

LIC. JORGE ANTONIO ORELLANA PINTO
ALCALDE MUNICIPAL

CONSTRUCTORA SOLAR
Construimos lo mejor!!!!!!!!!!

KELIAN GUILLERMO SOLARES ORELLANA
CONSTRUCTORA SOLAR


TIMBRE DE INGENIERÍA
COLEGIO DE INGENIEROS DE GUATEMALA
Emisión Junio 2020
Q. 100.00
22
42296
24
42298
23
25
26
42300
27
28
42324
11

0269705 - MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO BARRIO LA DEMOCRACIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

SNIP - SEGEPLAN

Solicitud de Financiamiento, ejercicio 2,021 SMIP 877

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO:

1. Nombre del proyecto: Forma Capital Fijo

MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO BARRIO LA DEMOCRACIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

2. Institución responsable: GOBIERNOS LOCALES

3. Unidad ejecutora responsable: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
Planifición Institucional

4. Modalidad de planificación : Planificación Institucional

4.1. Modalidad especifica:

Finalidad-Función-Division:

5. Función anterior:
CULTURA Y DEPORTES
Sub-función anterior :
[redacted]LTURA Y DEPORTES

6. Ubicación geográfica:

Departamento	Municipio
EL PROGRESO	GUASTATOYA

7. Área de influencia: Municipal

Responsable del proyecto:

Nombre: JORGE ANTONIO ORELLANA PINTO
Cargo: ALCALDE MUNICIPAL
Teléfono: 79451594
Email: dmp.guastattoya@gmail.com

DIAGNÓSTICO:

8. Antecedentes:

En el Barrio la Democracia, del Municipio de Guastatoya, se encuentra situada a 400 metros del Parque Central de [redacted]astatoya. El sector donde se necesita hacer la Mejoramiento Parque Deportivo y Recreativo, está ubicado a 2.06 metros [redacted] edificio municipal. Actualmente residen más de 24,821 habitantes de los cuales el 98¬on de origen ladino y el 2•e indígenas, para un total de 80 familias aproximadamente.

Desde hace muchos años vienen gestionando por medio de los diferentes COCODES el proyecto de Mejoramiento Parque Deportivo y Recreativo, Barrio La Democracia. Por tal motivo fue así como en Asamblea Comunitaria se decidió facultar al Consejo Comunitario de Desarrollo COCODE para gestionar el proyecto, quienes se dirigieron a la Municipalidad para el apoyo técnico en la realización de los estudios y asesorar todos los trámites ante una institución que pudiera ejecutar el proyecto satisfaciendo así su necesidad

9. Problemática:

10. Justificación:

Actualmente los vecinos y sobre todo la población en general que utiliza el camino para llevar a cabo momentos de recreación, se ven obligados a la recreación por tramos que no cumplen con las condiciones, ambientes agradables y seguras; lo que ocasiona riesgo para la población e inconformidad por lo que las instalaciones ya existentes necesitan ser mejorados por lo que se tiene contemplado el Mejoramiento Parque Deportivo y Recreativo, Barrio La Democracia.

11. Descripción:

EL PROYECTO CONSISTE EN EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL BARRIO LA DEMOCRACIA DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA EL PROGRESO

12. Objetivos:

12.1 General:

Llevar a cabo la ejecución del proyecto Mejoramiento Parque Deportivo y Recreativo, Barrio La Democracia Guastatoya, El Progreso, para que los habitantes cuenten con las instalaciones adecuadas para su recreación por ello es que se necesita ser mejoradas

12.2 Específicos:

-Contribuir al buen desarrollo con el Mejoramiento Parque Deportivo y Recreativo Barrio la Democracia, Guastatoya, El Progreso.

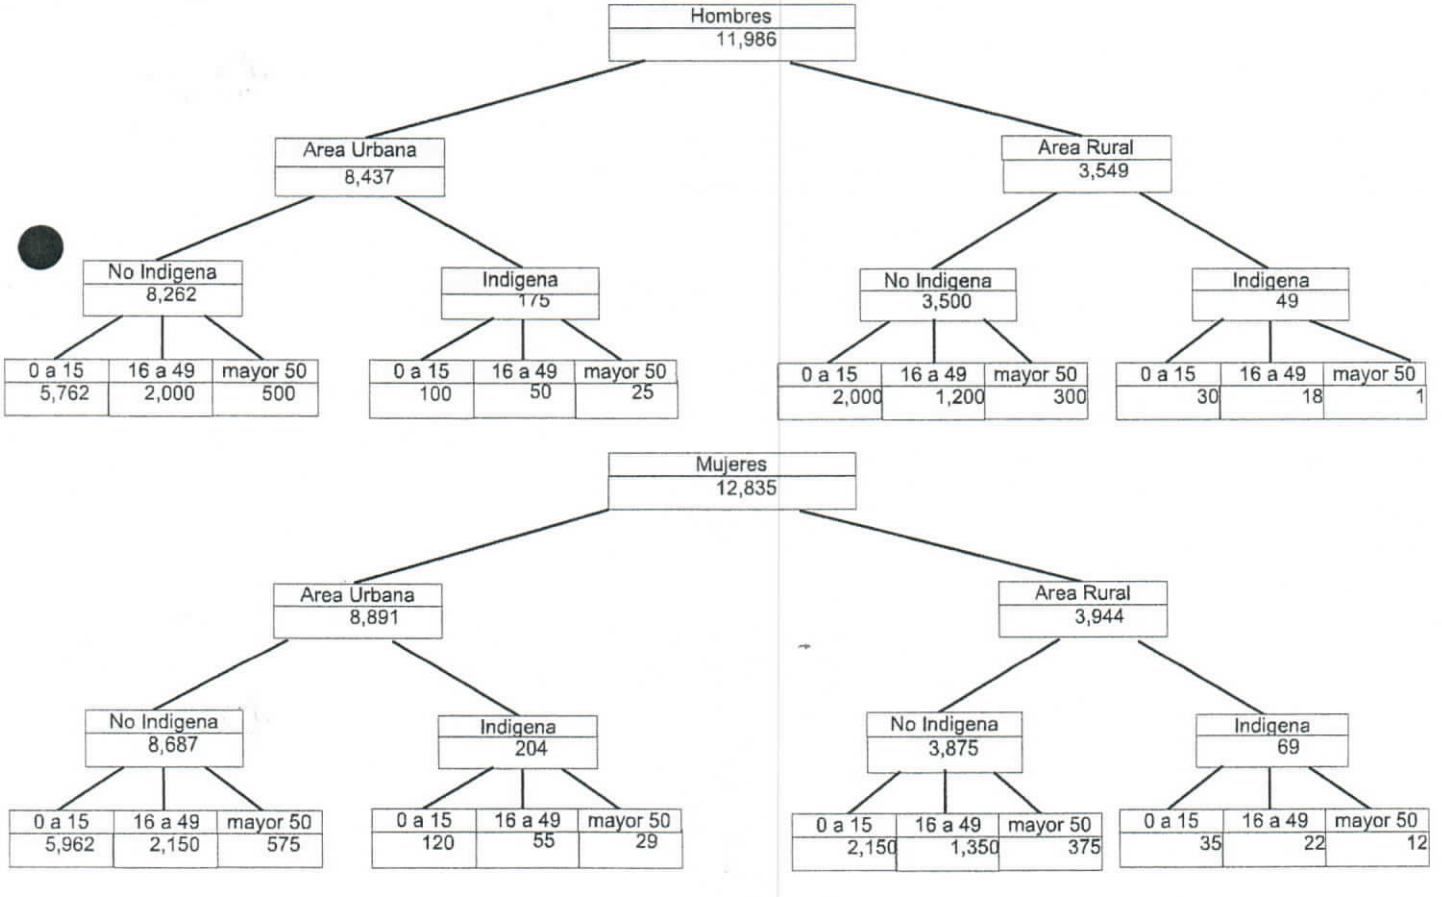
-Beneficiar a los vecinos del Barrio la Democracia, a través del Proyecto Mejoramiento Parque Deportivo y Recreativo.

13. Resultados esperados:

RESULTADOS DE LA FASE ACTUAL :

1. Fase actual: **EJECUCION**

2. Beneficiarios directos:



3. Costo/eficiencia:

4. TIR: %

5. VAN:

6. Empleo a requerir:

	Durante la ejecución en hombre/mes	Durante la operación en hombre/mes
Calificada		
No calificada		

7. Situación del terreno: Ninguno

8. Diseños (especificaciones):

9. Vida útil del proyecto: 20 años

10. Fecha de inicio de la operación: 01-JAN-21

11. Institución responsable de operación: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

12. Costo anual de operación:

0269705 - MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO BARRIO LA DEMOCRACIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

SNIP - SEGEPLAN

Solicitud de Financiamiento, ejercicio 2,021

Meta GLOBAL del proyecto :

MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO 325.00 Metro cuadrado

Meta ANUAL del proyecto :

MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO 325.00 Metro cuadrado

PROGRAMACION FINANCIERA MULTIANUAL:

Fase: Ejecución

Fecha de inicio de la fase: 01/01/2021

Fecha de finalización: 31/12/2021

Decreto 2018:

Decreto 2019:

Decreto 2020:

Descripción de la fase a financiar:

DESCRIPCION

Situación presupuestaria: Nuevo **Estructura programática:---**

Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2021	Programado 2022	Programado 2023	Progamado 2024	Total
TOTAL :	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
Recursos internos :	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
Gobierno central :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunidad :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aporte municipal :	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
Otros aportes :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras fuentes :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL 2021

Fuente de Financiamiento	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
TOTAL	66,667	66,667	66,667	66,667	66,667	66,667	66,667	66,667	66,667	66,667	66,667	66,667
Recursos internos	66,667	66,667	66,667	66,667	66,667	66,667	66,667	66,667	66,667	66,667	66,667	66,667
Gobierno central :												
Comunidad :												
Aporte municipal :	66,667	66,667	66,667	66,667	66,667	66,667	66,667	66,667	66,667	66,667	66,667	66,667
Otros aportes :												
Otras fuentes:												

PROGRAMACION FISICA MULTIANUAL

Rubro	Unidad de medida	Programado 2,021	Programado 2022	Programado 2023	Programado 2024
Limpieza y detalles finales	m²	325			
Area de deportes y recreación	m²	325			
Trabajos preliminares	m²	325			

2,021

Rubro	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Limpieza y detalles finales	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	28
Area de deportes y recrea	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	28

Trabajos preliminares	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	28

Municipalidad de
GUASTATOYA
Departamento de El Progreso, Guatemala, C.A.
info@muniguasta.com
www.muniguastatoya.com
Telefax: 7945-1594, 7945-1602, 7945-1603

Guastatoya, miércoles, 15 de diciembre de 2021

SEÑOR(es):
ALCALDE MUNICIPAL Y
HONORABLE CORPORACION
GUASTATOYA, EL PROGRESO

Respetables señor(es):

El motivo del presente es para informar los resultados de la siguiente estimacion de pago:

No. De Supervision de Avance Físico:	**ESTIMACION No.2**		
Nombre del Proyecto:	**MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO BARRIO LA DEMOCRACIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO**		
No. De Contrato del Proyecto:	25-2021	**Fecha del Contrato:**	8/07/2021
NOG.	14877120		
Estimacion del Avance Fisico:	49.8274170%		
Monto de Estimacion del Avance Físico:	Q142,681.25	**en letras:**	CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN QUETZALES CON 25/100 CENTAVOS
Amorización del Anticipo:	Q28,536.25	**en letras:**	VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS QUETZALES CON 25/100 CENTAVOS
Cantidad Líquida a Recibir:	Q114,145.00	**en letras:**	CIENTO CATORCE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO QUETZALES CON 00/100 CENTAVOS

Se adjunta anexo que contiene el detalle de la presente estimacion para que se continúe con lo procedente.

Agradeciendo desde ya, me suscribo.

Atentamente,

ING. CARLOS RAMIRO ORTEGA LIMA
COLEGIADO: 7118
SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

Carlos Ramiro Ortega Lima
Ingeniero Civil
Col. 7118

ESTIMACION No.2

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO BARRIO LA DEMOCRACIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO			PERIODO DEL: 10-09-07	AL 15-12-21
				Fecha Solicitud:	15 de diciembre de 2021
FECHA INICIO DEL PROYECTO:	19 de julio de 2021	CONCEPTO	NUMERO	FECHA	
TIEMPO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO EN MESES:	6	CONTRATO	25-2021	08-07-21	AVANCE AUTORIZADO POR LA UNIDAD EJECUTORA A LA EMPRESA CONSTRUCTORA:
FECHA DE FINALIZACION	18 de enero de 2022	MONTO DE CONTRATO		Q 798,555.00	
NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA:	CONSTRUCTORA SOLAR	SNIP		269705	49.8274170%
REPRESENTANTE LEGAL EMPRESA CONSTRUCTORA:	KELLIAN GUILLERMO SOLARES ORELLANA	NOG		14877120	

No.	DESCRIPCION DEL RENGLON DE TRABAJO	TRABAJO FISICO												COSTO FINANCIERO					
		Cantidad Contratada								Cantidad Ejecutada				Costo de Ejecución				Monto por ejecutar	
		Unidad	Cantidad Contratada	Orden de Cambio	Orden de Trabajo Sup	Acuerdo Trabajo Extra	Cantidad Actual	Precio Unitario Q.	Costo Total Estimado	Este Periodo	Acumulado Anterior	Total a la fecha	%	Este Periodo	Acumulado Anterior	TOTAL A LA FECHA	%	Por Estimar	%
1	Preliminares	Unidad	1.00				1.00	Q 5,115.70	Q 5,115.70		1	1	100.00%	Q -	Q 5,115.70	Q 5,115.70	100.00%	Q -	0.00%
2	DEMOLICION Y RETIRO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE	Unidad	1.00				1.00	Q 65,411.50	Q 65,411.50		1	1	100.00%	Q -	Q 65,411.50	Q 65,411.50	100.00%	Q -	0.00%
3	BASE DE PARQUE (NIVELACION RELLENO Y COMPACTADO)	M2	324.70				324.70	Q 203.50	Q 66,076.45		324.7	324.7	100.00%	Q -	Q 66,076.45	Q 66,076.45	100.00%	Q -	0.00%
4	MURO DE JARDIN	ML	41.60				41.60	Q 364.85	Q 15,177.76		41.6	41.6	100.00%	Q -	Q 15,177.76	Q 15,177.76	100.00%	Q -	0.00%
5	JARDINIZACION	M2	75.15				75.15	Q 298.00	Q 22,394.70	3	0	3	3.99%	Q 894.00	Q -	Q 894.00	3.99%	Q 21,500.70	96.01%
6	ALFOMBRA IMITACION GRAMA	M2	122.00				122.00	Q 357.90	Q 43,663.80	110	0	110	90.16%	Q 39,369.00	Q -	Q 39,369.00	90.16%	Q 4,294.80	9.84%
7	MURO DE CIRCULACION	ML	24.75				24.75	Q 1,871.00	Q 46,307.25		24.75	24.75	100.00%	Q -	Q 46,307.25	Q 46,307.25	100.00%	Q -	0.00%
8	BANCAS DE CONCRETO	Unidad	7.00				7.00	Q 3,613.00	Q 25,291.00		7	7	100.00%	Q -	Q 25,291.00	Q 25,291.00	100.00%	Q -	0.00%
9	PISO DE PATIO	M2	127.55				127.55	Q 369.00	Q 47,065.95	118.00	0	118	92.51%	Q 43,542.00	Q -	Q 43,542.00	92.51%	Q 3,523.95	7.49%
10	ACOMETIDA Y SISTEMA ELECTRICO	Unidad	1.00				1.00	Q 5,967.71	Q 5,967.71	0.4	0	0.4	40.00%	Q 2,387.08	Q -	Q 2,387.08	40.00%	Q 3,580.63	60.00%
11	RAMPA DE ACCESO	M2	2.60				2.60	Q 416.00	Q 1,081.60	2.6	0	2.6	100.00%	Q 1,081.60	Q -	Q 1,081.60	100.00%	Q -	0.00%
12	BORDILLO	ML	71.20				71.20	Q 221.50	Q 15,770.80	1.5	65	66.5	93.40%	Q 332.25	Q 14,397.50	Q 14,729.75	93.40%	Q 1,041.05	6.60%
13	JUEGOS INFANTILES	Unidad	2.00				2.00	Q 9,422.70	Q 18,845.40		0	0	0.00%	Q -	Q -	Q -	0.00%	Q 18,845.40	100.00%
14	REGILLA	ML	19.35				19.35	Q 623.00	Q 12,055.05		0	0	0.00%	Q -	Q -	Q -	0.00%	Q 12,055.05	100.00%
15	JUEGOS INFANTILES GRANDE	Unidad	1.00				1.00	Q 59,543.09	Q 59,543.09		0	0	0.00%	Q -	Q -	Q -	0.00%	Q 59,543.09	100.00%
16	MAQUINAS DE EJERCICIO	Unidad	5.00				5.00	Q 34,229.40	Q 171,147.00		0	0	0.00%	Q -	Q -	Q -	0.00%	Q 171,147.00	100.00%
17	PERGOLA	Unidad	1.00				1.00	Q 37,844.64	Q 37,844.64	0.65	0.35	1	100.00%	Q 24,599.02	Q 13,245.62	Q 37,844.64	100.00%	Q -	0.00%
18	SISTEMA DE DRENAJE Y AGUA	Unidad	1.00				1.00	Q 8,390.60	Q 8,390.60	0.50	0.5	1	100.00%	Q 4,195.30	Q 4,195.30	Q 8,390.60	100.00%	Q -	0.00%
19	POSTES Y FAROLES	Unidad	10.00				10.00	Q 13,140.50	Q 131,405.00	2	0	2	20.00%	Q 26,281.00	Q -	Q 26,281.00	20.00%	Q 105,124.00	80.00%
								TOTAL CONTRATADO	Q798,555.00			VALOR DE LA ESTIMACION		Q 142,681.25	Q 255,218.08	Q 397,899.33	49.8274170%	Q 400,655.67	50.17258%
												AMORTIZACION DEL ANTICIPO		Q 28,536.25					
												TOTAL LIQUIDO A RECIBIR		Q 114,145.00					

SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES
CARLOS RAMIRO ORTEGA LIMA
Carlos Ramiro Ortega Lima
Ingeniero Civil
Col. 7118

Municipalidad de
GUASTATOYA
Departamento de El Progreso, Guatemala, C.A.
info@muniguasta.com
www.muniguastatoya.com
Telefax: 7945-1594, 7945-1602, 7945-1603

Guastatoya, miércoles, 15 de diciembre de 2021

SEÑOR(es):

ALCALDE MUNICIPAL Y
HONORABLE CORPORACION
GUASTATOYA, EL PROGRESO

Respetables señor(es):

Respetuosamente me dirijo a usted, con el proposito de REMITIR el INFORME DE SUPERVISION que acontinuacion se describe:

Nombre del Proyecto:	**MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO BARRIO LA DEMOCRACIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO**		
No. De Contrato del Proyecto:	25-2021	**Fecha del Contrato:**	8/07/2021
NOG.	14877120		
Empres constructura:	CONSTRUCTORA SOLAR		

Se realizo la visita al proyecto antes en mencion para hacer constar los avances de los renglones contratados en su avance fisico notificado por la empresa Constructora los cuales se describen a continuacion:

Municipalidad de
GUASTATOYA
Departamento de El Progreso, Guatemala, C.A.
info@muniguasta.com
www.muniguastatoya.com
Telefax: 7945-1594, 7945-1602, 7945-1603

3 M2 DE JARDINIZACION
110 M2 DE ALFOMBRA IMITACION GRAMA
118 M2 DE PISO DE PATIO
0.4 Unidad DE ACOMETIDA Y SISTEMA ELECTRICO
2.6 M2 DE RAMPA DE ACCESO
1.5 ML DE BORDILLO
0.65 Unidad DE PERGOLA
0.5 Unidad DE SISTEMA DE DRENAJE Y AGUA
2 Unidad DE POSTES Y FAROLES

TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR

72.15 M2 DE JARDINIZACION
12 M2 DE ALFOMBRA IMITACION GRAMA
9.55 M2 DE PISO DE PATIO
0.6 Unidad DE ACOMETIDA Y SISTEMA ELECTRICO
4.7 ML DE BORDILLO
2 Unidad DE JUEGOS INFANTILES
19.35 ML DE REGILLA
1 Unidad DE JUEGOS INFANTILES GRANDE
5 Unidad DE MAQUINAS DE EJERCICIO
8 Unidad DE POSTES Y FAROLES

Municipalidad de
GUASTATOYA
Departamento de El Progreso, Guatemala, C.A.
info@muniguasta.com
www.muniguastatoya.com
Telefax: 7945-1594, 7945-1602, 7945-1603

Estimacion del Avance Fisico:	49.8274170%

Se adjunta anexo que contiene el detalle de la presente estimacion para que se continúe con lo procedente.

Agradeciendo desde ya, me suscribo.


Atentamente,

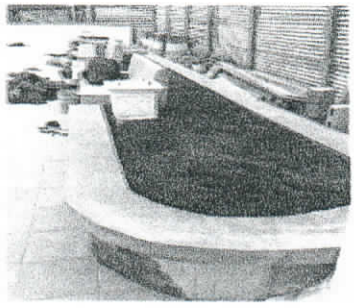
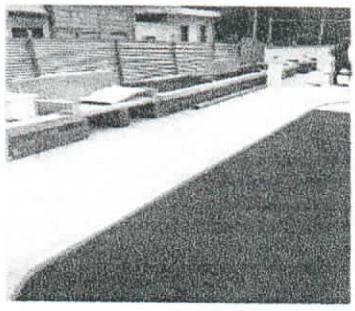
ING. CARLOS RAMIRO ORTEGA LIMA
COLEGIADO: 7118
SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

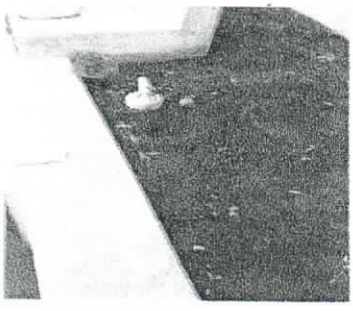
Carlos Ramiro Ortega Lima
Ingeniero Civil
Col. 7118

Municipalidad de
GUASTATOYA
Departamento de El Progreso, Guatemala, C.A.
info@muniguasta.com
www.muniguastatoya.com
Telefax: 7945-1594, 7945-1602, 7945-1603

INFORME FOTOGRAFICO	MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO BARRIO LA DEMOCRACIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO



CONSTRUCTORA
SOLAR
Construimos lo mejor!!!!!!!!!!!!!!!

Guastatoya, 15 de Diciembre de 2021

HONORABLE
ALCALDE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA,
EL PROGRESO

Por medio de la presente, me dirijo a usted con el fin de saludarlo, y a la vez solicitarle el pago de la estimación correspondiente al 49.8274170% sobre el proyecto denominado: **MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO BARRIO LA DEMOCRACIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO.** El cual se encuentra estipulado en contrato No.25-2021 de Fecha 08 de Julio de 2021**.** Ya que dicho pago es necesario para dar seguimiento a los renglones de trabajo correspondientes a la obra arriba descrita, estipulados en el contrato.

Sin otro particular, agradecido con usted, me suscribo.

ATENTAMENTE:

CONSTRUCTORA
SOLAR
Construimos lo mejor!!!!!!!!!!!!!!!

KELIAN GUILLERMO SOLARES ORELLANA
CONSTRUCTORA SOLAR
PROPIETARIO

CONSTRUCTORA SOLAR

ESTIMACION No. 2

Nombre del proyecto: MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO BARRIO LA DEMOCRACIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

Contrato No. 25-2021 Fecha: 08 de Julio de 2021

Monto Original del Contrato: Q.798,555.00

Renglón	RENGLONES DE TRABAJO/CANTIDADES	Cantidad Contratada				Cantidad EJECUTADA				Cantidad pendiente de EJECUTAR			
	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	Precio	Costo total	Este	Acumulado	Q	%	Este	Q		%
1	Preliminares	Unidad	1.00	Q 5,115.70	Q 5,115.70	0.00	1.00	Q 5,115.70	100.00%	0.00	Q	-	0.00%
2	Demolicion y Retiro Infraestructura Existente	Unidad	1.00	Q 65,411.50	Q 65,411.50	0.00	1.00	Q 65,411.50	100.00%	0.00	Q	-	0.00%
3	Base de parque (Nivelacion Relleno y Compactacion)	M2	324.70	Q 203.50	Q 66,076.45	0.00	324.70	Q 66,076.45	100.00%	0.00	Q	-	0.00%
4	Muro de Jardin	ML	41.60	Q 364.85	Q 15,177.76	0.00	41.60	Q 15,177.76	100.00%	0.00	Q	-	0.00%
5	Jardinizacion	M2	75.15	Q 298.00	Q 22,394.70	3.00	0.00	Q 894.00	3.99%	72.15	Q	21,500.70	96.01%
6	Alfombra Imitacion Grama	M2	122.00	Q 357.90	Q 43,663.80	110.00	0.00	Q 39,369.00	90.16%	12.00	Q	4,294.80	9.84%
7	Muro de Circulacion	ML	24.75	Q 1,871.00	Q 46,307.25	0.00	24.75	Q 46,307.25	100.00%	0.00	Q	-	0.00%
8	Bancas de Concreto	Unidad	7.00	Q 3,613.00	Q 25,291.00	0.00	7.00	Q 25,291.00	100.00%	0.00	Q	-	0.00%
9	Piso de Patio	M2	127.55	Q 369.00	Q 47,065.95	118.00	0.00	Q 43,542.00	92.51%	9.55	Q	3,523.95	7.49%
10	Acometida y Sistema Electrico	Unidad	1.00	Q 5,967.71	Q 5,967.71	0.40	0.00	Q 2,387.08	40.00%	0.60	Q	3,580.63	60.00%
11	Rampa de Acceso	M2	2.60	Q 416.00	Q 1,081.60	2.60	0.00	Q 1,081.60	100.00%	0.00	Q	-	0.00%
12	Bordillo	ML	71.20	Q 221.50	Q 15,770.80	1.50	65.00	Q 14,729.75	93.40%	4.70	Q	1,041.05	6.60%
13	Juegos Infantiles	Unidad	2.00	Q 9,422.70	Q 18,845.40	0.00	0.00	Q -	0.00%	2.00	Q	18,845.40	100.00%
14	Rejilla	ML	19.35	Q 623.00	Q 12,055.05	0.00	0.00	Q -	0.00%	19.35	Q	12,055.05	100.00%
15	Juegos Infantiles Grande	Unidad	1.00	Q 59,543.09	Q 59,543.09	0.00	0.00	Q -	0.00%	1.00	Q	59,543.09	100.00%
16	Maquinas de Ejercicio	Unidad	5.00	Q 34,229.40	Q 171,147.00	0.00	0.00	Q -	0.00%	5.00	Q	171,147.00	100.00%
17	Pergola	Unidad	1.00	Q 37,844.64	Q 37,844.64	0.65	0.35	Q 37,844.64	100.00%	0.00	Q	-	0.00%
18	Sistema de Drenaje y Agua	Unidad	1.00	Q 8,390.60	Q 8,390.60	0.50	0.50	Q 8,390.60	100.00%	0.00	Q	-	0.00%
19	Postes y Faroles	Unidad	10.00	Q 13,140.50	Q 131,405.00	2.00	0.00	Q 26,281.00	20.00%	8.00	Q	105,124.00	80.00%
	Total cantidad contratada				Q 798,555.00	Cantidad ejecutada		Q 397,899.33	49.8274170%		Q	400,655.67	50.17258%

CONSTRUCTORA SOLAR
Construimos lo mejor!!!!!!!!!!!!

KELIAN GUILLERMO SOLARES ORELLANA
CONSTRUCTORA SOLAR
PROPIETARIO

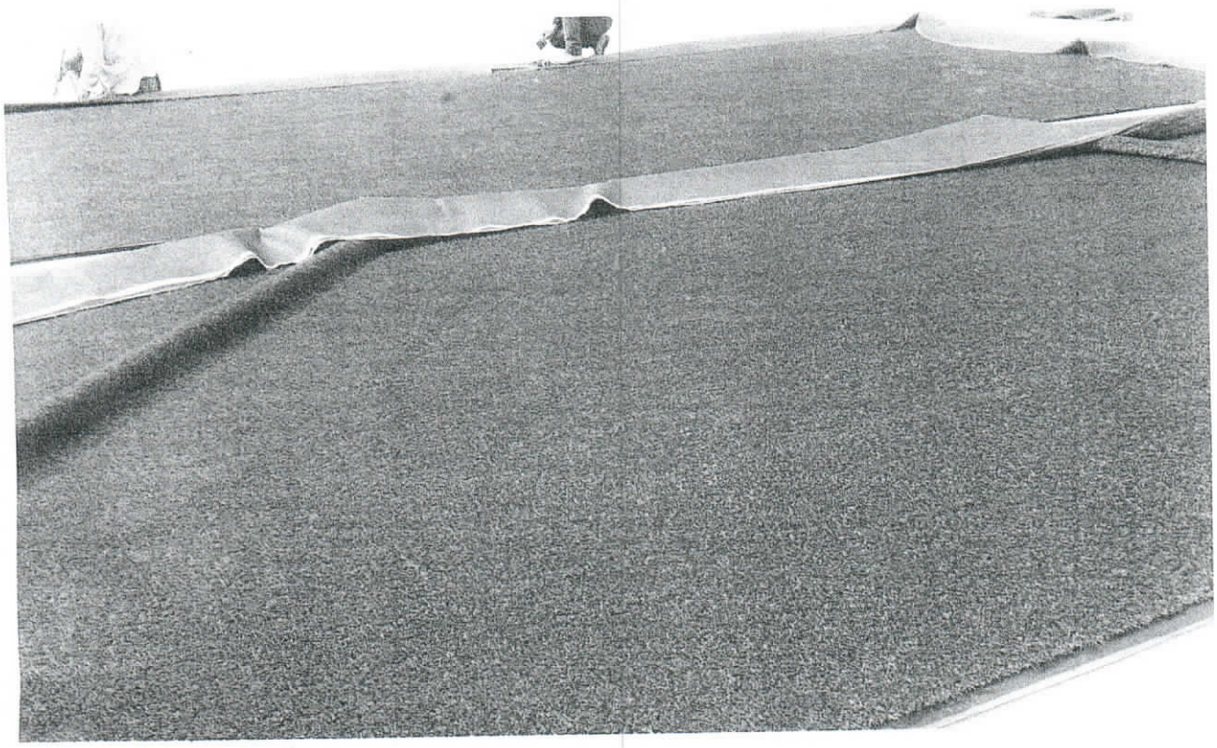
LUIS LEONEL URIZAR MUÑOZ
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO No. 4001

LUIS LEONEL URIZAR MUÑOZ
ING. CIVIL

Monto bruto de esta Estimación	Q	397,899.33
Anticipo	Q	159,711.00
Amortizacion	Q	79,579.87
Monto neto de esta Estimación	Q	318,319.47
Menos Primer Pago	Q	204,174.47
Menos Segundo Pago		
Liquido a Recibir	**Q**	**114,145.00**

GUASTATOYA, 15 DE DICIEMBRE DE 2021

CONSTRUCTORA
SOLAR
Construimos lo mejor!!!!!!!!!!!!!!!





GUASTATOYA

CONSTANCIA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

GUASTATOYA
DAFIM
Dirección de Administración Financiera Municipal

CDF No. 027

MONTO RESERVADO VIGENTE (Q): Q 800,000.00 **Ejercicio Fiscal:** 2021

MONTO EN LETRAS:

OCHOCIENTOS MIL 00/100

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
FECHA DE EMISION: **martes, 22 de junio de 2021**
MODALIDAD DE COMPRA O CONTRATACION: **COTIZACION**
NUMERO DE OPERACIÓN GUATECOMPRAS:

DESCRIPCION DEL PROCESO:

MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO BARRIO LA DEMOCRACIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

NIT:
NOMBRE O RAZON SOCIAL:
CORREO ELECTRONICO:

PROGRAMCION No.: Q 800,000.00

ESTUCTURA (S) PRESUPUESTARIA (S) ASIGNADA (S) ES 15-00-001-000-002, RENGLON # 331
UNA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21-0101-0001

MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO BARRIO LA DEMOCRACIA, GUASTATOYA, EL PROGRESO

OCHOCIENTOS MIL 00/100 **Q 800,000.00**

MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO
ENCARGADO DE PRESUPUESTO
EDGAR IVAN MONTERROSO GONZALEZ
TU NUEVA MUNI

Edgar Ivan Monterroso Gonzalez
Encargado del Presupuesto

ULTIMA LINEA
